



FUNDAÇÃO
renova

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

Outubro/2022

Sumário

Apresentação	<u>5</u>
PG001 Levantamento e Cadastro dos Impactados	<u>6</u>
PG002 Ressarcimento e Indenização dos Impactados	<u>14</u>
PG003 Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida dos Povos Indígenas	<u>21</u>
PG004 Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida de Outros Povos e Comunidades Tradicionais	<u>30</u>
PG005 Programa de Proteção Social	<u>47</u>
PG006 Comunicação, Participação, Diálogo e Controle Social	<u>56</u>
PG007 Programa de Assistência aos Animais	<u>99</u>
PG008 Reconstrução de Vilas	<u>109</u>
PG009 Recuperação do Reservatório da UHE Risoleta Neves	<u>124</u>
PG010 Programa de recuperação das demais comunidades e infraestruturas impactadas entre Fundão e Candonga	<u>146</u>
PG011 Recuperação das Escolas Impactadas e Fortalecimento da Educação Pública na Bacia do Rio Doce	<u>156</u>
PG012 Programa de Memória Histórica, Cultural e Artística	<u>166</u>
PG013 Programa de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer	<u>172</u>

PG014 Programa de Apoio à Saúde Física e Mental da População Impactada	<u>180</u>
PG015 Promoção da Inovação	<u>189</u>
PG016 Retomada das Atividades Aquícolas e Pesqueiras	<u>196</u>
PG017 Retomada das Atividades Agropecuárias	<u>203</u>
PG018 Desenvolvimento e Diversificação Econômica	<u>214</u>
PG019 Recuperação de Micro e Pequenos Negócios	<u>222</u>
PG020 Estímulo à Contratação Local	<u>229</u>
PG021 Auxílio Financeiro Emergencial	<u>238</u>
PG023 Manejo de Rejeitos	<u>244</u>
PG025 Programa de Recuperação da Área Ambiental 1	<u>253</u>
PG026 Programa de Recuperação de Áreas de Preservação Permanente (APPs) e Recargas Hídricas	<u>260</u>
PG027 Programa de Recuperação de Nascentes	<u>266</u>
PG028 Conservação da Biodiversidade	<u>273</u>
PG029 Recuperação da Fauna Silvestre	<u>280</u>
PG030 Fauna e Flora terrestre	<u>286</u>
PG031 Coleta e Tratamento de Esgoto e Destinação de Resíduos Sólidos	<u>292</u>
PG032 Melhoria dos Sistemas de Abastecimento de Água	<u>305</u>

PG033 Programa de Educação para Revitalização da Bacia do Rio Doce (Educação Ambiental)	<u>314</u>
PG034 Preparação para Emergências Ambientais	<u>320</u>
PG035 Programa de Informação para a População	<u>327</u>
PG036 Comunicação Nacional e Internacional	<u>334</u>
PG038 Monitoramento da Bacia do Rio Doce	<u>342</u>
PG039 Unidades de Conservação	<u>352</u>
PG040 Programa de Fomento ao CAR e PRA	<u>360</u>
PG042 Ressarcimento dos Gastos Públicos Extraordinários	<u>367</u>
Glossário	<u>374</u>
Gestão Econômica*	<u>381</u>

Apresentação

O presente documento cumpre com a CLÁUSULA 192 do TERMO DE TRANSAÇÃO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TTAC), que determina a elaboração de relatório mensal sobre o andamento de todos os PROGRAMAS – SOCIOAMBIENTAIS e SOCIOECONÔMICOS desenvolvidos e executados pela FUNDAÇÃO RENOVA – e envio do documento ao COMITÊ INTERFEDERATIVO (CIF), sempre no décimo dia útil de cada mês. Os programas têm como objetivo recuperar o meio ambiente e as condições socioeconômicas da área de abrangência impactada pelo rompimento da barragem de Fundão, em novembro de 2015, de forma a restaurar a situação anterior ao rompimento, como está disposto na CLÁUSULA 05, INCISO I do referido termo.

PG001 Levantamento e Cadastro dos Impactados

Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivo

Levantar informações quanto às perdas materiais e das atividades econômicas impactadas através da realização do cadastro individualizado de pessoas físicas e jurídicas (apenas micro e pequenas empresas) e famílias diretamente atingidas pelo rompimento da barragem de Fundão na área de abrangência socioeconômica do TTAC. As informações levantadas pelo cadastro serão utilizadas para a realização de estudos e avaliações socioeconômicas voltados para apoiar a implementação de ações de reparação e compensação dos impactos socioeconômicos. Esse programa abrange as cláusulas 19 a 30 do TTAC.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	19	Caput	Judicializada
Cláusula	20	Caput	Judicializada
Cláusula	22	Caput	Em andamento
Cláusula	25	Caput	Em andamento
Cláusula	26	Caput	Em andamento
Cláusula	28	Caput	Em andamento
Deliberação	127	1.2 e 2	Judicializada
Deliberação	127	1.3	Concluída Internamente
Deliberação	141	1	Judicializada
Deliberação	141	2	Concluída Internamente
Deliberação	141	3	Concluída Internamente
Deliberação	141	5	Concluída Internamente
Deliberação	19	n/a	Concluída Internamente
Deliberação	234	3	Concluída Internamente
Deliberação	251	1	Concluída Internamente
Deliberação	277	único	Judicializada
Deliberação	346	2	Concluída Internamente
Deliberação	58	2	Judicializada
Deliberação	58	3	Judicializada
Deliberação	71	n/a	Concluída Internamente
Deliberação	93	2	Concluída Internamente
Deliberação	93	3	Concluída Internamente
Deliberação	93	4	Concluída Internamente
Deliberação	93	6	Concluída Internamente

Entregas do ano de 2022



● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Grandes números do programa

- 175.766 solicitações de cadastro, desde o início do programa até o momento;
- 35.318 cadastros enviados ao CIF, correspondente a 30.821 famílias e 99.553 pessoas, desde o início do programa até o momento.

Fatos relevantes do mês

Não houve fatos relevantes no mês.

Indicadores

I01 – Taxa de Atendimento aos Manifestantes

Percentual(%)

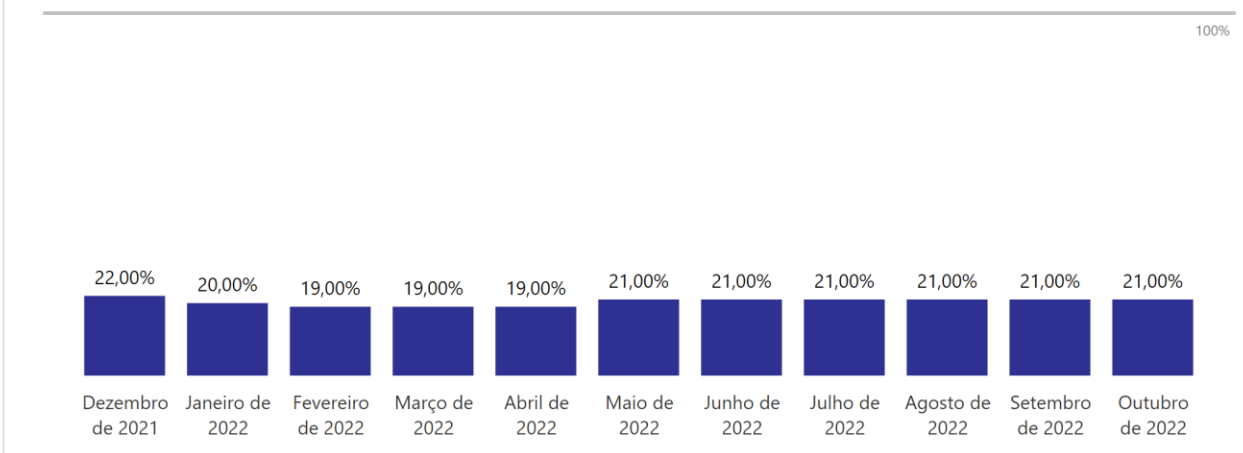


Gráfico 1: I01 – Taxa de Atendimento aos Manifestantes - Frequência Mensal

O indicador de atendimento não registrou evolução em função de ajustes internos na etapa de consistência dos dados coletados na pesquisa socioeconômica.

I02 – Taxa de Atendimento ao Cadastro Emergencial

Percentual(%)

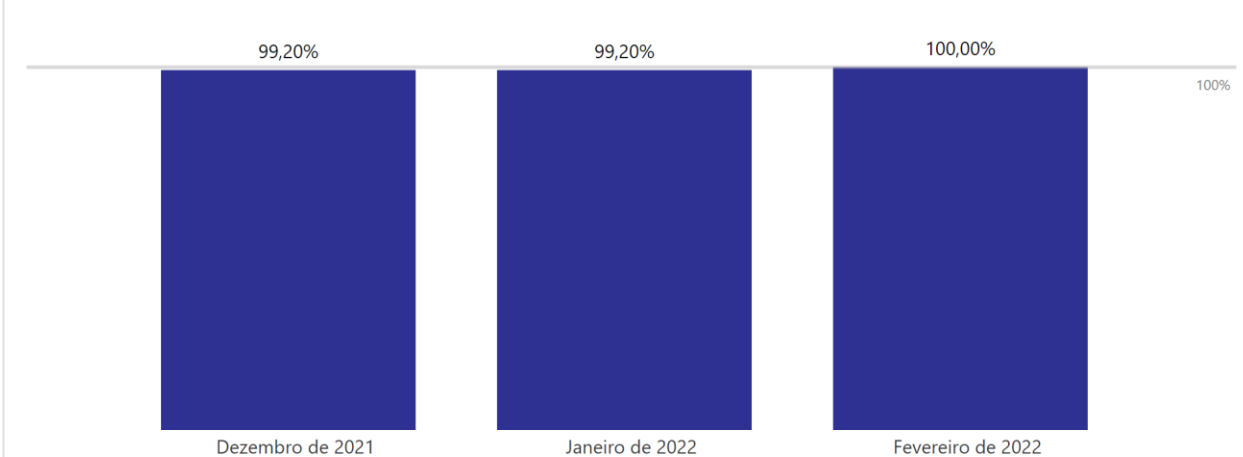


Gráfico 2: I02 – Taxa de Atendimento ao Cadastro Emergencial - Frequência Mensal

Indicadores

I04 – Taxa de solicitantes de cadastro não localizados

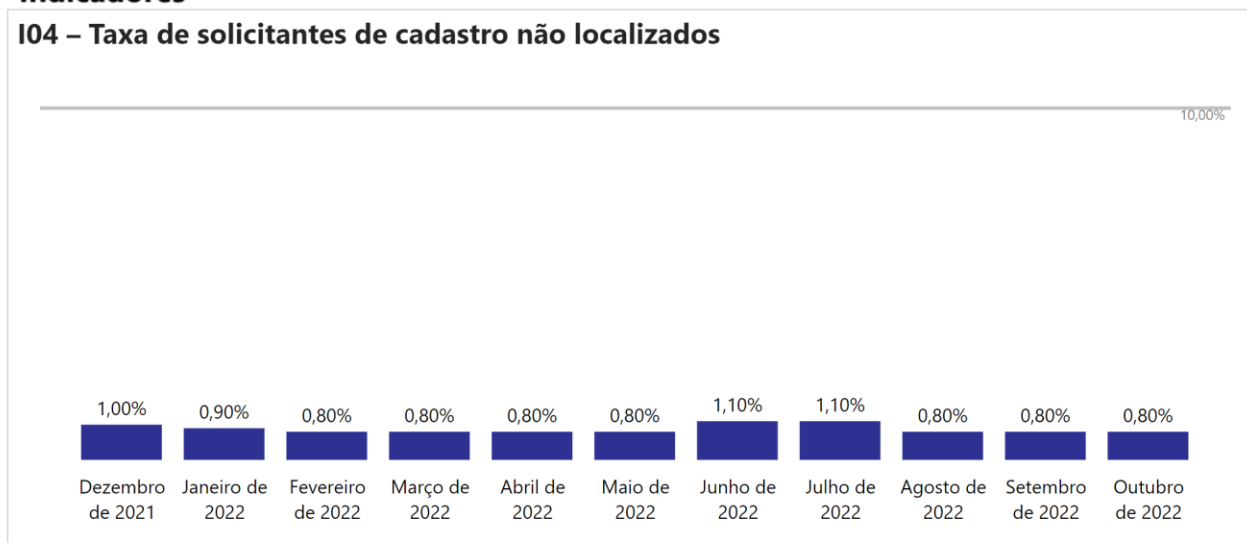


Gráfico 3: I04 – Taxa de solicitantes de cadastro não localizados - Frequência Mensal

Indicadores de Acompanhamento

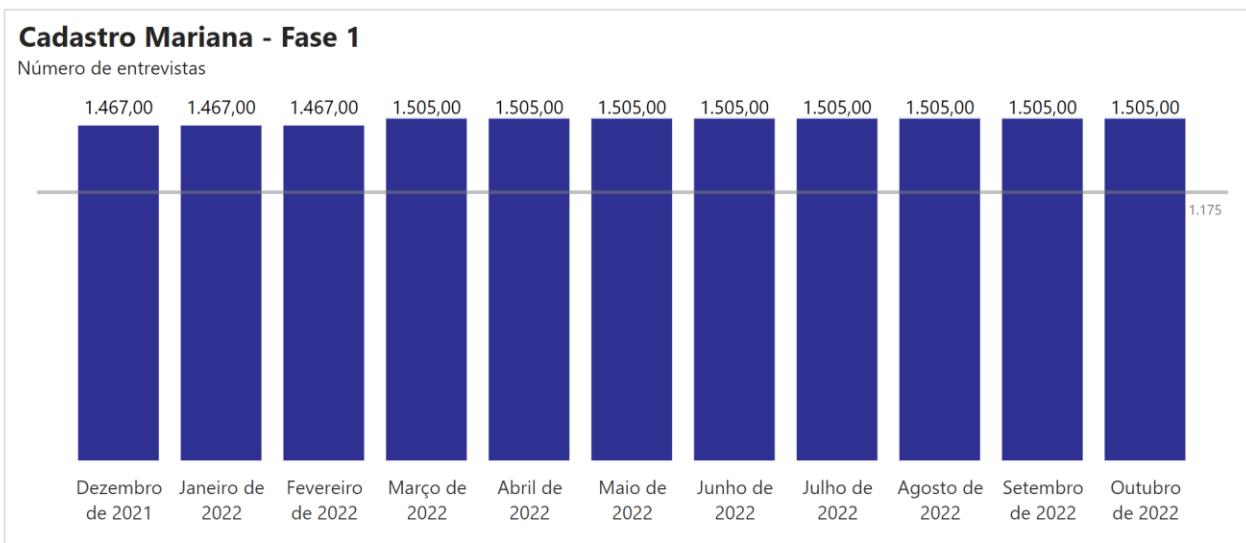


Gráfico 4: Cadastro Mariana - Fase 1 - Frequência Mensal

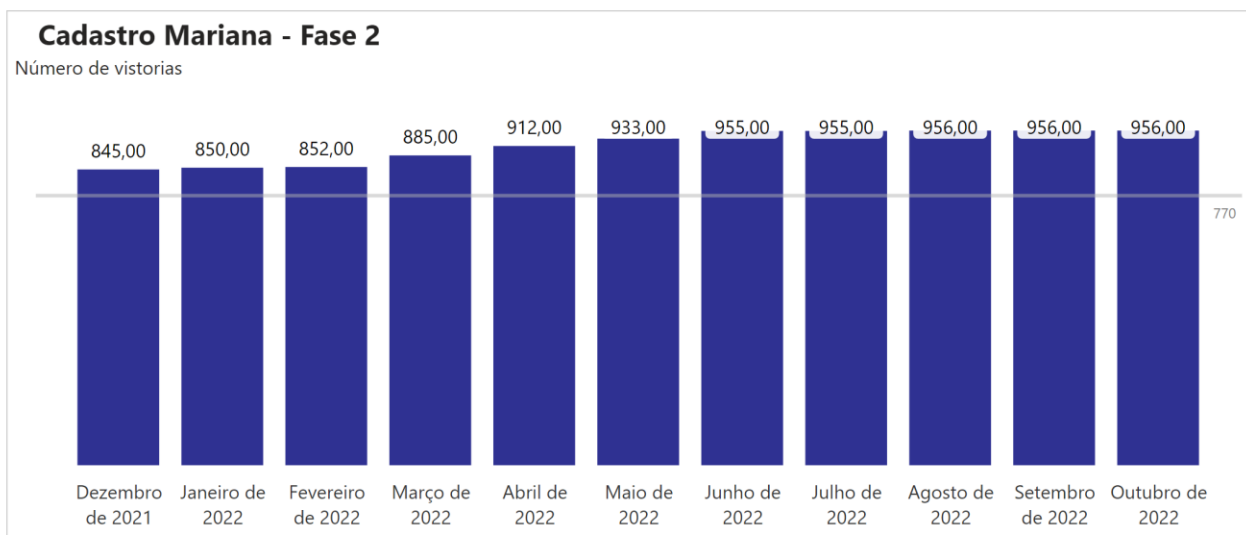


Gráfico 5: Cadastro Mariana - Fase 2 - Frequência Mensal

PG002 Ressarcimento e Indenização dos Impactados

Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivo

Ressarcir pessoas físicas ou jurídica (neste último caso, apenas micro e pequenas empresas) que tenham sofrido danos materiais, lucro cessante e/ou morais, bem como perdas referentes às suas atividades econômicas, em consequência direta do rompimento da barragem de Fundão, de forma justa, célere, simples, transparente e sem a burocracia e os ônus de uma ação judicial. Cláusulas 31 a 38 do Termo de Transação e Ajustamento de Conduta - TTAC.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	38	Caput(ação 1)	Judicializada
Cláusula	38	Caput(ação 2)	Judicializada
Deliberação	111	3-a (ação 1)	Judicializada
Deliberação	111	3-a (ação 2)	Judicializada
Deliberação	111	3-b (ação 1)	Judicializada
Deliberação	111	3-b (ação 2)	Judicializada
Deliberação	118	2	Judicializada
Deliberação	119	10	Concluída Internamente
Deliberação	119	2	Concluída Internamente
Deliberação	119	5-a	Judicializada
Deliberação	119	5-b	Judicializada
Deliberação	181	5	Em Andamento
Deliberação	181	6	Judicializada
Deliberação	181	7	Judicializada
Deliberação	181	8	Em Andamento
Deliberação	182	1	Concluída Internamente
Deliberação	182	3	Judicializada
Deliberação	211	2	Judicializada
Deliberação	236	único	Concluída Internamente
Deliberação	469	2	Concluída Internamente

Entregas do ano de 2022

A Fundação Renova entende que o Planejamento deste Programa tem sido determinado por decisões judiciais (a exemplo da decisão de 30/11/2021), e, em função disso, não é possível precisar o Planejamento 2022 em sede administrativa.

Grandes números do programa

- **Para Dano Água**, até o momento foram atendidas 320.179 pessoas, sendo que 270.372 aceitaram propostas. Destas, 265.005 propostas já foram pagas (98,0% das propostas aceitas). Os pagamentos somam **R\$ 304,20 Mi** .
- **Para Danos Gerais**, 10.768 núcleos familiares cadastrados aceitaram as propostas de indenização, sendo que 10.718 já foram pagos (99,5% dos casos). Os pagamentos de Danos Gerais somam **R\$ 1.781,49 Mi** .
- **Para a campanha de Mariana**, até o momento foi realizado o pagamento de 789 indenizações, o que representa 98% do total das 805 propostas aceitas.

Fatos relevantes do mês

Até o momento, 72.968 requerentes tiveram seus acordos homologados junto à 12ª Vara Federal, no âmbito do Sistema Indenizatório Simplificado.

Até o momento, foi realizado o pagamento de 789 indenizações em Mariana na Fase de Negociação Extrajudicial – FNE, o que representa 98,0% do total das 805 propostas aceitas. Foram 10 indenizações pagas no mês.

Indicadores

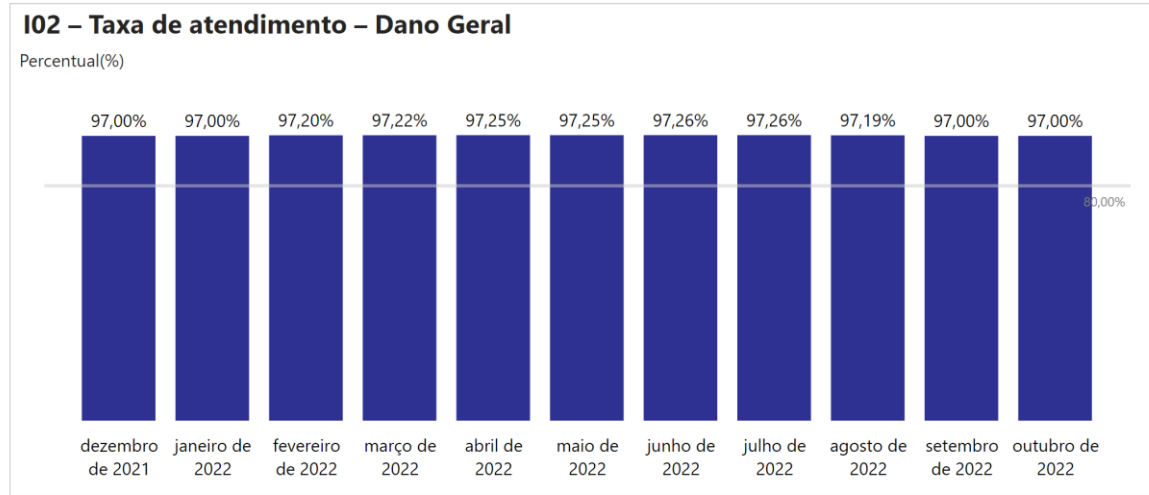


Gráfico 1: I02 – Taxa de atendimento – Dano Geral - Frequência Mensal

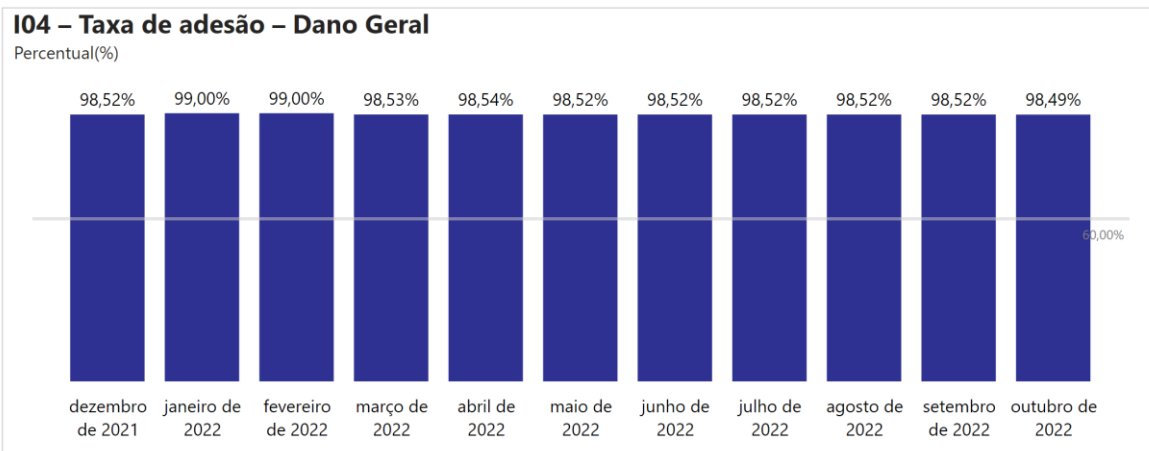


Gráfico 2: I04 – Taxa de adesão – Dano Geral - Frequência Mensal

Indicadores

I06 – Taxa de pagamentos realizados – Dano Geral




Gráfico 3: I06 – Taxa de pagamentos realizados – Dano Geral - Frequência Mensal

PG003 Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida dos Povos Indígenas

Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivo

Implementar as ações mitigatórias, reparatórias e compensatórias para povos indígenas Tupiniquim, Guarani e Krenak em acordo com os impactos identificados conforme cláusulas 39 a 45 do Termo de Transação e Ajustamento de Conduta - TTAC.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	39	Caput	Em andamento
Cláusula	43	§1º	Em andamento
Cláusula	43	Inc I	Em andamento
Cláusula	43	Inc II	Em andamento
Cláusula	43	Inc III	Concluída Internamente
Cláusula	43	Inc IV	Em andamento
Cláusula	43	Inc V	Em andamento
Cláusula	44	Inc I (ação 1)	Concluída Internamente
Cláusula	44	Inc I (ação 2)	Concluída Internamente
Cláusula	44	Inc II	Em andamento
Cláusula	44	Inc III e §3º	Concluída Internamente
Cláusula	44	Inc IV	Em andamento
Cláusula	44	Inc V	Em andamento
Deliberação	201	2	Concluída Internamente
Deliberação	206	1	Em andamento
Deliberação	227	1	Concluída Internamente
Deliberação	227	2	Concluída Internamente
Deliberação	299	único	Concluída Internamente
Deliberação	335	3	Concluída Internamente
Deliberação	360	1 e 1.1	Concluída Internamente
Deliberação	445	1.1	Em andamento
Deliberação	445	2.1	Concluída Internamente
Deliberação	445	2.2	Concluída Internamente
Deliberação	445	2.3	Concluída Internamente
Deliberação	445	2.4	Concluída Internamente
Deliberação	445	2.5	Concluída Internamente

Entregas do ano de 2022

- dezembro de 2022 ● Aprovação da deliberação do documento de definição do Programa de Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida dos Povos Indígenas
- dezembro de 2022 ● Envio da versão final da revisão do Programa de Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida dos Povos Indígenas à Câmara Técnica Indígena e Povos e Comunidades Tradicionais (CT-IPCT)
- dezembro de 2022 ● Envio da versão final da revisão do Programa de Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida dos Povos Indígenas ao Comitê Interfederativo (CIF)

Grandes números do programa

- 600 **pessoas abastecidas com água mineral** Povos Indígenas de Resplendor (total de 93 Mil litros);
- 142 **pontos de abastecimento de água mineral** Povos Indígenas de Resplendor;
- 174 **pontos de abastecimento de água potável** Povos Indígenas de Resplendor (total de 4.255 m³);
- 65 **pontos de abastecimento de água bruta** Povos Indígenas de Resplendor (total de 1.264 m³).

Fatos relevantes do mês

Tupiniquim-Guarani

Sem Fatos Relevantes no mês de Outubro/2022 .

Comboios

Distribuição de água mineral para a Comunidade de Comboios – 41.080 litros distribuídos nos dias 22 e 29 de setembro, 06, 13 e 20 de outubro de 2022 (total de 2.054 galões de 20 litros).

Resplendor

A Fundação Renova pagou no mês corrente, através de transferência eletrônica, um total de R\$ 1.494.396,00 das associações indígenas (UATU; ATORÃN; BAKÃN; BURUM ERERRÉ-AIBE; KRENAK; NÁKNENUK; NAKRERRÉ; e BURUM TAKRUK), registradas sob os números de CNPJ (08.882.323/0001-80; 07.864.625/0001-40; 30.862.050/0001-49; 23.675.495/0001-54; 03.640.055/0001-54; 07.918.506/0001-23; 12.078.678/0001-76 e 20.076203/0001-79 respectivamente), para ser distribuído pelas Associações Indígenas às 137 famílias indígenas da terra de Resplendor. As 137 famílias indígenas estão distribuídas nas 8 associações conforme segue: 31 famílias da Associação Indígena ATORÃN, 10 famílias da Associação Indígena BAKÃN, 17 famílias da Associação Indígena BURUM ERERRE, 20 famílias da Associação Indígena KRENAK, 12 famílias da Associação Indígena NAKNENUK, 10 famílias da Associação Indígena NAKRERRE, 12 famílias da Associação Indígena TAKRUK e 25 famílias da Associação Indígena UATU. O total de R\$ 1.494.396,00, compreende o pagamento mensal de R\$ 1.212,00 para cada uma das 137 famílias.

Distribuição de Água Mineral para os Povos Indígenas de Resplendor – total de 5 litros por pessoa por dia (600 pessoas) de 21/09/2022 até 20/10/2022 no total diário de 3000 litros. (total de 93.000 litros).

Distribuição de ração na Terra Indígenas de Resplendor – 2.268 sacos de 40kg para 108 famílias de 21/09/2022 até 20/10/2022

Distribuição de sal mineral para bovinos na Terra Indígenas de Resplendor – 300 sacos de 25 kg para 100 famílias de 21/09/2022 até 20/10/2022

Distribuição de silagem de milho na Terra Indígenas de Resplendor – 240 toneladas para 100 famílias de 21/09/2022 até 20/10/2022

Três Palmeiras

Sem Fatos Relevantes no mês de Outubro/2022

Indicadores

Os indicadores do Programa estão em revisão.

PG004 Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida de Outros Povos e Comunidades Tradicionais

Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivo






Implantar as ações mitigatórias, reparatórias e compensatórias para povos e comunidades tradicionais em acordo com os impactos identificados conforme Cláusulas 46 a 53 do Termo de Transação e Ajustamento de Conduta - TTAC.




Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	46	§1º	Concluída Internamente
Cláusula	46	§2º	Concluída Internamente
Cláusula	46	§3º	Concluída Internamente
Cláusula	46	Caput	Concluída Internamente
Cláusula	50	Caput	Em andamento
Deliberação	280	1	Concluída Internamente
Deliberação	281	1	Concluída Internamente
Deliberação	298	1	Concluída Internamente
Deliberação	329	1	Concluída Internamente
Deliberação	430	1	Concluída Internamente
Deliberação	494	1	Concluída Internamente
Deliberação	356	1; 1.1 e 1.2	Concluída Internamente
Deliberação	256	2	Concluída Internamente
Deliberação	298	2	Concluída Internamente
Deliberação	430	2	Concluída Internamente
Deliberação	494	2	Concluída Internamente
Deliberação	256	3	Concluída Internamente
Deliberação	281	3	Concluída Internamente
Deliberação	423	3	Concluída Internamente
Deliberação	281	4	Concluída Internamente
Deliberação	423	4	Concluída Internamente
Deliberação	280	4 (ação 1)	Concluída Internamente
Deliberação	280	4 (ação 2)	Concluída Internamente
Deliberação	355	1	Em andamento
Deliberação	300	1	Judicializada
Deliberação	300	2	Judicializada
Deliberação	333	2	Judicializada
Deliberação	493	2	Judicializada
Deliberação	493	3	Judicializada
Deliberação	501	3	Judicializada

Deliberação	154	1	Concluída Internamente
Deliberação	155	2	Concluída Internamente
Deliberação	161	1	Concluída Internamente
Deliberação	161	2	Concluída Internamente
Deliberação	161	3	Concluída Internamente
Deliberação	202	1	Concluída Internamente
Deliberação	202	2c	Concluída Internamente
Deliberação	202	3	Concluída Internamente
Deliberação	202	4	Concluída Internamente
Deliberação	202	5	Concluída Internamente
Deliberação	256	1	Concluída Internamente

Entregas do ano de 2022

- janeiro de 2022  Aprovação pela Câmara Técnica (CT-IPCT) e Comitê Interfederativo (CIF) do detalhamento do Plano Básico Ambiental Quilombola (PBAQ) de Degredo
- novembro de 2022  Submissão da versão final da revisão do Programa de Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida de Outros Povos e Comunidades Tradicionais à diretoria da Fundação Renova (Degredo)
- dezembro de 2022  Deliberação da aprovação do documento de definição do Programa de Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida de Outros Povos e Comunidades Tradicionais
- dezembro de 2022  Envio da versão final da revisão do Programa de Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida de Outros Povos e Comunidades Tradicionais à CT-IPCT
- dezembro de 2022  Envio da versão final da revisão do Programa de Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida de Outros Povos e Comunidades Tradicionais ao CIF

 Concluído  Planejado  Reprogramado

Grandes números do programa

O programa não possui grandes números.

Fatos relevantes do mês

Quilombolas

Realização da Segunda Oficina para Definição de Escopo de Programa - PG04, com os Grupos de Trabalho.

Fiscadores

Realização da Segunda Oficina para Definição de Escopo de Programa - PG04, com os Grupos de Trabalho.

Indicadores

Os indicadores do programa estão em revisão

PG005 Programa de Proteção Social

Eixo Pessoas e Comunidades


Objetivo

Desenvolver e executar ações para promover a proteção social, por meio de ações socioassistenciais, incluindo ações socioculturais e apoio psicossocial, desenvolvendo o acompanhamento às famílias e aos indivíduos impactados pelo EVENTO, priorizando os IMPACTADOS com deslocamento físico, e considerando os agravos das vulnerabilidades decorrentes do evento, segundo a CLÁUSULA 54 e demais cláusulas do TTAC.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	54	Caput	Em andamento
Deliberação	141	4	Concluída Internamente
Deliberação	167	1	Concluída Internamente
Deliberação	167	2	Concluída Internamente
Deliberação	167	3	Judicializada
Deliberação	180	1	Concluída Internamente
Deliberação	192	2	Concluída Internamente
Deliberação	234	4	Concluída Internamente
Deliberação	234	5	Concluída Internamente
Deliberação	278	1.1	Concluída Internamente
Deliberação	278	1.2	Concluída Internamente
Deliberação	278	1.3	Concluída Internamente
Deliberação	292	2	Concluída Internamente
Deliberação	307	1	Concluída Internamente
Deliberação	307	2a	Concluída Internamente
Deliberação	330	único	Concluída Internamente
Deliberação	332	único	Concluída Internamente
Deliberação	422	2	Concluída Internamente
Deliberação	533	4	Judicializada

Entregas do ano de 2022

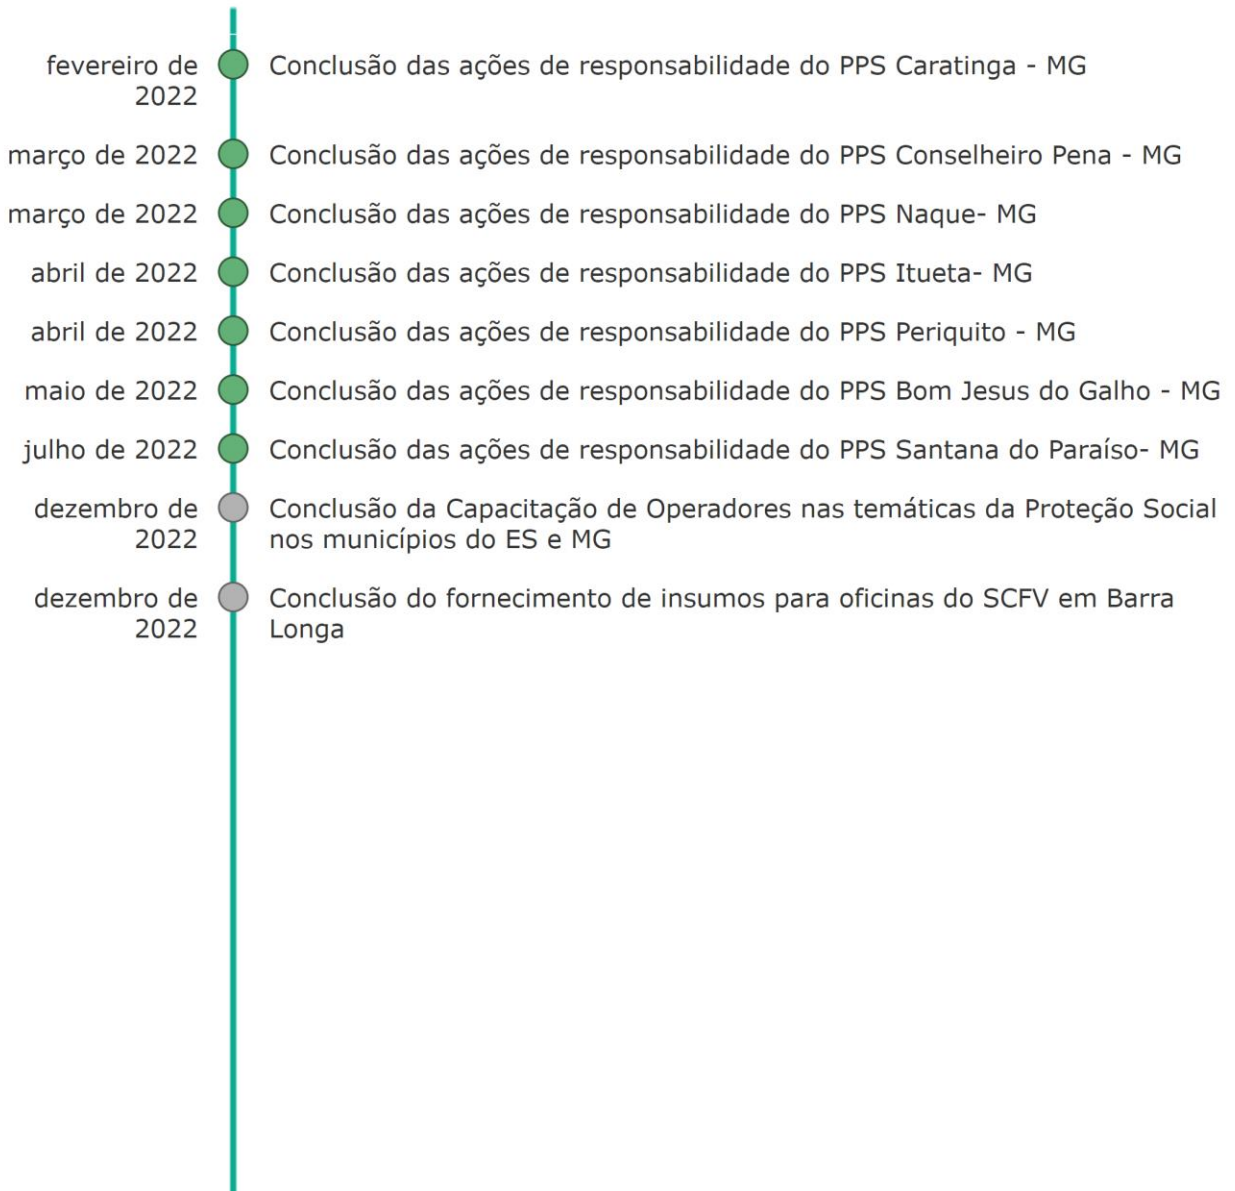

 Concluído  Planejado  Reprogramado

Grandes números do programa

- Disponibilização de recursos para a suplementação de 134 **profissionais** (assistentes sociais, psicólogos, motoristas e oficinairos) em 13 municípios atingidos e no Estado do Espírito Santo, para promover a proteção social, por meio de ações socioassistenciais, incluindo ações socioculturais e apoio psicossocial, desenvolvendo o acompanhamento às famílias e aos indivíduos atingidos pelo rompimento, priorizando as famílias com deslocamento físico;
- **Repasso financeiro de RS 17,79 Mi**, além da contratação dos profissionais, compra de equipamentos e insumos nos demais municípios da Calha, conforme previsto nos termos pactuados, para realização de atividades coletivas com o objetivo de fortalecer vínculos familiares e comunitários das famílias atingidas;
- Disponibilização de 17 **veículos** com cartão combustível, para transporte das equipes profissionais suplementadas, garantindo acesso às famílias e comunidades atingidas;
- 23370 **famílias cadastradas pela Fundação** a serem beneficiadas por meio dos Planos de Proteção Social implementados pelos municípios atingidos com o apoio da Fundação Renova.

Fatos relevantes do mês

Realização de reuniões de prestação de contas e acompanhamento das atividades dos planos de proteção social, com a participação dos atingidos e municípios nos municípios de: Linhares, Aimorés, Itueta, Santana do Paraíso e Periquito.

-Entrega de veículos para apoiar no deslocamento da equipe suplementar para atender as famílias das comunidades atingidas em Pingo D'Água, Rio Casca e Barra Longa.

Conclusão da sexta capacitação para operadores de proteção social dos municípios de Minas Gerais com a temática "Trabalho social com famílias", com foco na qualidade do atendimento social às famílias vulneráveis atingidas.

Acompanhamento em audiência judicial de conciliação para tentativa de negociação com os municípios não aderentes de Resplendor e Galileia

Publicação de portaria para oficialização do COMAPPS (Comissão de acompanhamento das atividades dos planos de proteção social) pelo município de Marilândia.

Conclusão décima primeira capacitação para os operadores de proteção social do município de Mariana com a temática "Práticas colaborativas na intervenção social junto de pessoas em situação de vulnerabilidade".

Assinatura do plano de reparação em proteção social com o município de Belo Oriente.

Indicadores

I01 - % de Municípios/Estados aderentes com recursos repassados/disponibilizados pela Fundação Renova para implementação do plano de reparação em proteção social

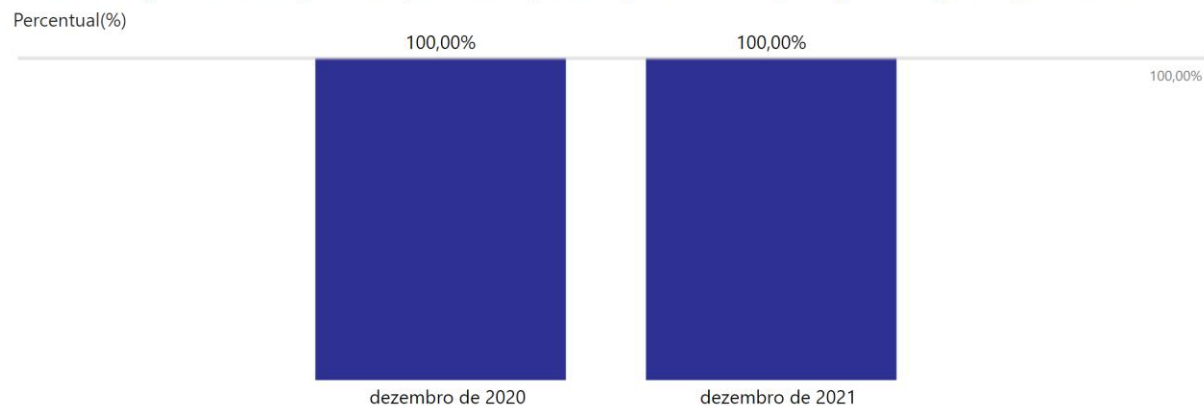


Gráfico 1: I01 - % de Municípios/Estados aderentes com recursos repassados/disponibilizados pela Fundação Renova para implementação do plano de reparação em proteção social - Frequência Anual

Memória de Cálculo do Programa: 37/37 (36 municípios e 1 estado)

I02 – % Ofertar vagas pela Fundação Renova para os técnicos contratados para suplementar o RH pelos municípios/estados atingidos

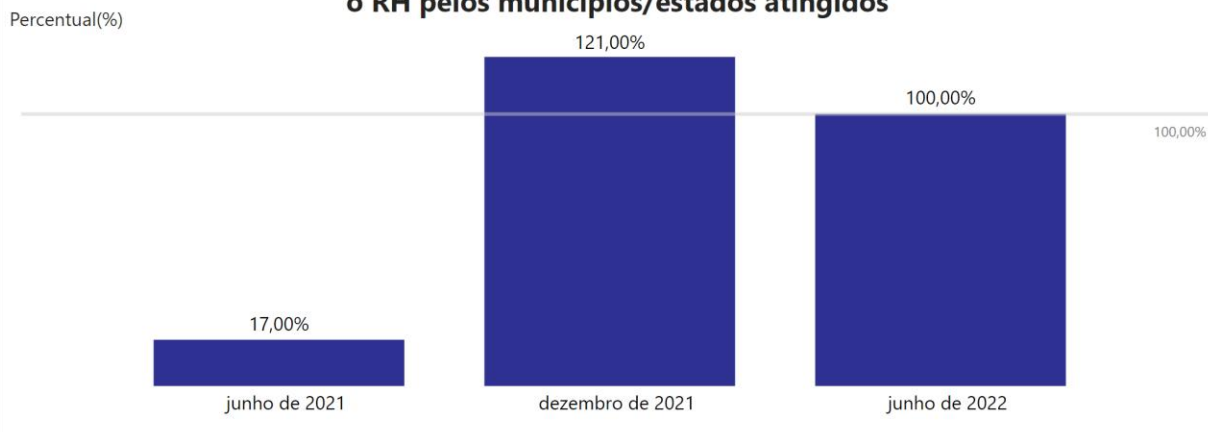


Gráfico 2: I02 – % Ofertar vagas pela Fundação Renova para os técnicos contratados para suplementar o RH pelos municípios/estados atingidos - Frequência Semestral

Vagas ofertadas no primeiro semestre de 2022.

Indicadores

I03 - % Oferta pela Fundação Renova para pelo menos dois técnicos de cada CRAS e dois técnicos de cada CREAS dos municípios/estados atingidos

Percentual(%)

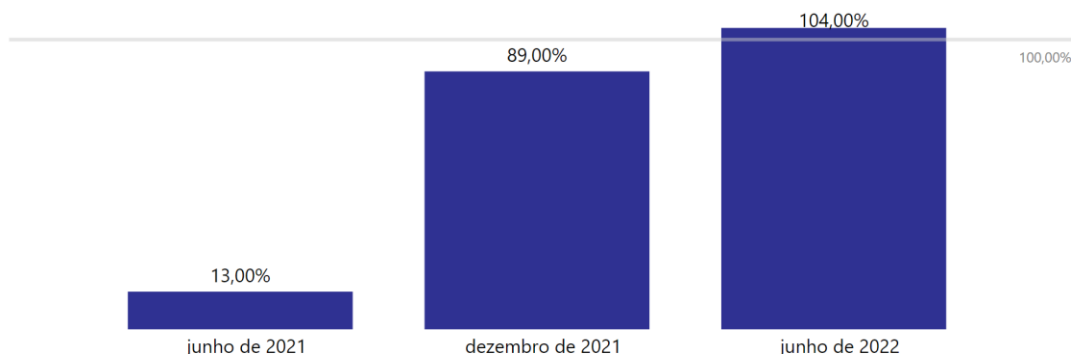


Gráfico 3: I03 - % Oferta pela Fundação Renova para pelo menos dois técnicos de cada CRAS e dois técnicos de cada CREAS dos municípios/estados atingidos - Frequência Semestral

Vagas ofertadas no primeiro semestre de 2022.

I04 – % Oferta de pelo menos duas vagas pela Fundação Renova para técnicos do órgão gestor dos municípios/estados atingidos

Percentual(%)

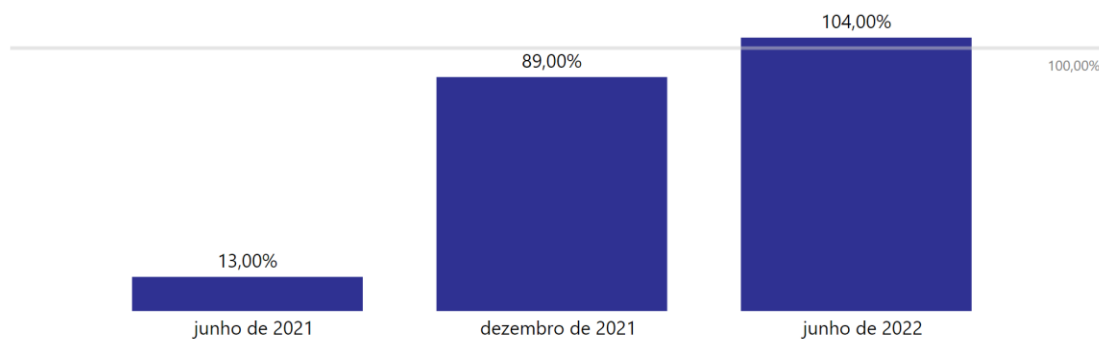


Gráfico 4: I04 – % Oferta de pelo menos duas vagas pela Fundação Renova para técnicos do órgão gestor dos municípios/estados atingidos - Frequência Semestral

Vagas ofertadas no primeiro semestre de 2022.

Indicadores

I05 – % de indivíduos vulneráveis elegíveis às políticas da Fundação Renova identificados e encaminhados para priorização junto aos programas aos quais têm direito

Percentual(%)

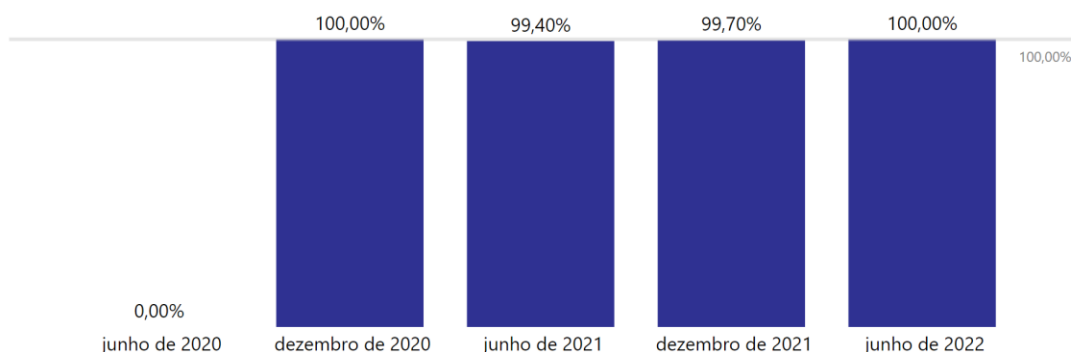


Gráfico 5: I05 – % de indivíduos vulneráveis elegíveis às políticas da Fundação Renova identificados e encaminhados para priorização junto aos programas aos quais têm direito - Frequência Semestral

I06 – % de indivíduos vulneráveis elegíveis com a rota de reparação concluída pelos programas da Fundação Renova

Percentual(%)

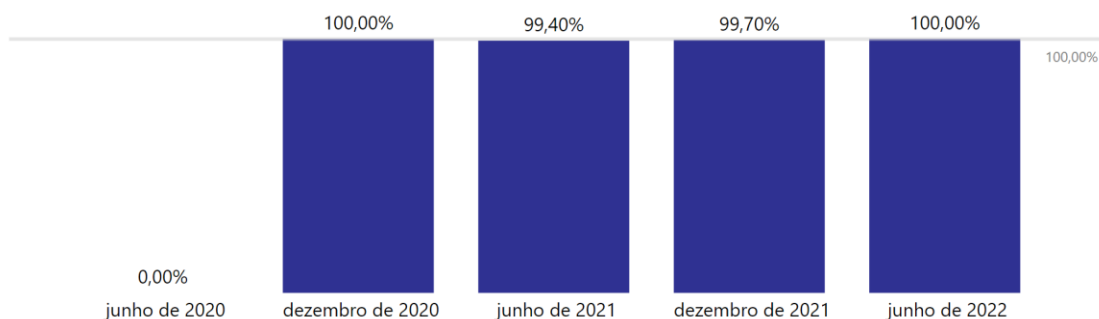


Gráfico 6: I06 – % de indivíduos vulneráveis elegíveis com a rota de reparação concluída pelos programas da Fundação Renova - Frequência Semestral

Indicadores

I07 – % de famílias com deslocamento físico que tenham anuído ao acompanhamento social até a entrega das residências concluídas ou retorno às suas residências de origem ou entrega da solução reparatória acordada (Mariana, Barra Longa, Sooretama e Linhares)

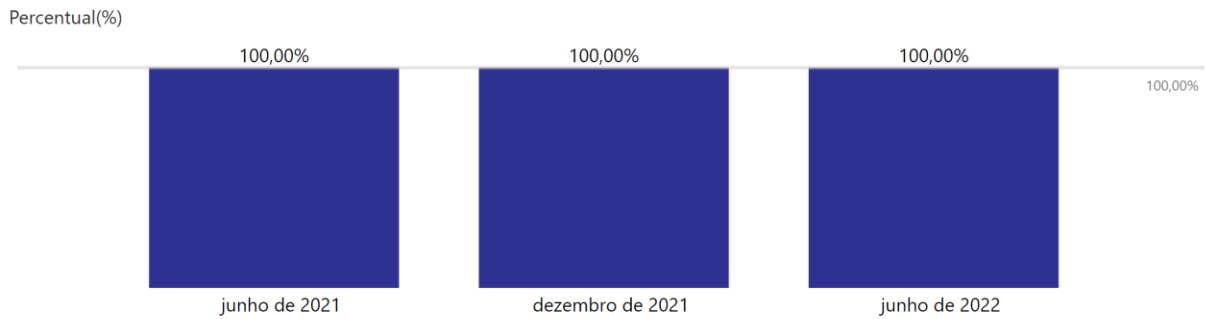


Gráfico 7: I07 – % de famílias com deslocamento físico que tenham anuído ao acompanhamento social até a entrega das residências concluídas ou retorno às suas residências de origem ou entrega da solução reparatória acordada (Mariana, Barra Longa, Sooretama e Linhares) - Frequência Semestral

Memória de Cálculo Programa: 417 famílias anuentes atendidas / 417 famílias anuentes

PG005 Programa de Proteção Social

Eixo Pessoas e Comunidades


Objetivo

Desenvolver e executar ações para promover a proteção social, por meio de ações socioassistenciais, incluindo ações socioculturais e apoio psicossocial, desenvolvendo o acompanhamento às famílias e aos indivíduos impactados pelo EVENTO, priorizando os IMPACTADOS com deslocamento físico, e considerando os agravos das vulnerabilidades decorrentes do evento, segundo a CLÁUSULA 54 e demais cláusulas do TTAC.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	54	Caput	Em andamento
Deliberação	141	4	Concluída Internamente
Deliberação	167	1	Concluída Internamente
Deliberação	167	2	Concluída Internamente
Deliberação	167	3	Judicializada
Deliberação	180	1	Concluída Internamente
Deliberação	192	2	Concluída Internamente
Deliberação	234	4	Concluída Internamente
Deliberação	234	5	Concluída Internamente
Deliberação	278	1.1	Concluída Internamente
Deliberação	278	1.2	Concluída Internamente
Deliberação	278	1.3	Concluída Internamente
Deliberação	292	2	Concluída Internamente
Deliberação	307	1	Concluída Internamente
Deliberação	307	2a	Concluída Internamente
Deliberação	330	único	Concluída Internamente
Deliberação	332	único	Concluída Internamente
Deliberação	422	2	Concluída Internamente
Deliberação	533	4	Judicializada

Entregas do ano de 2022

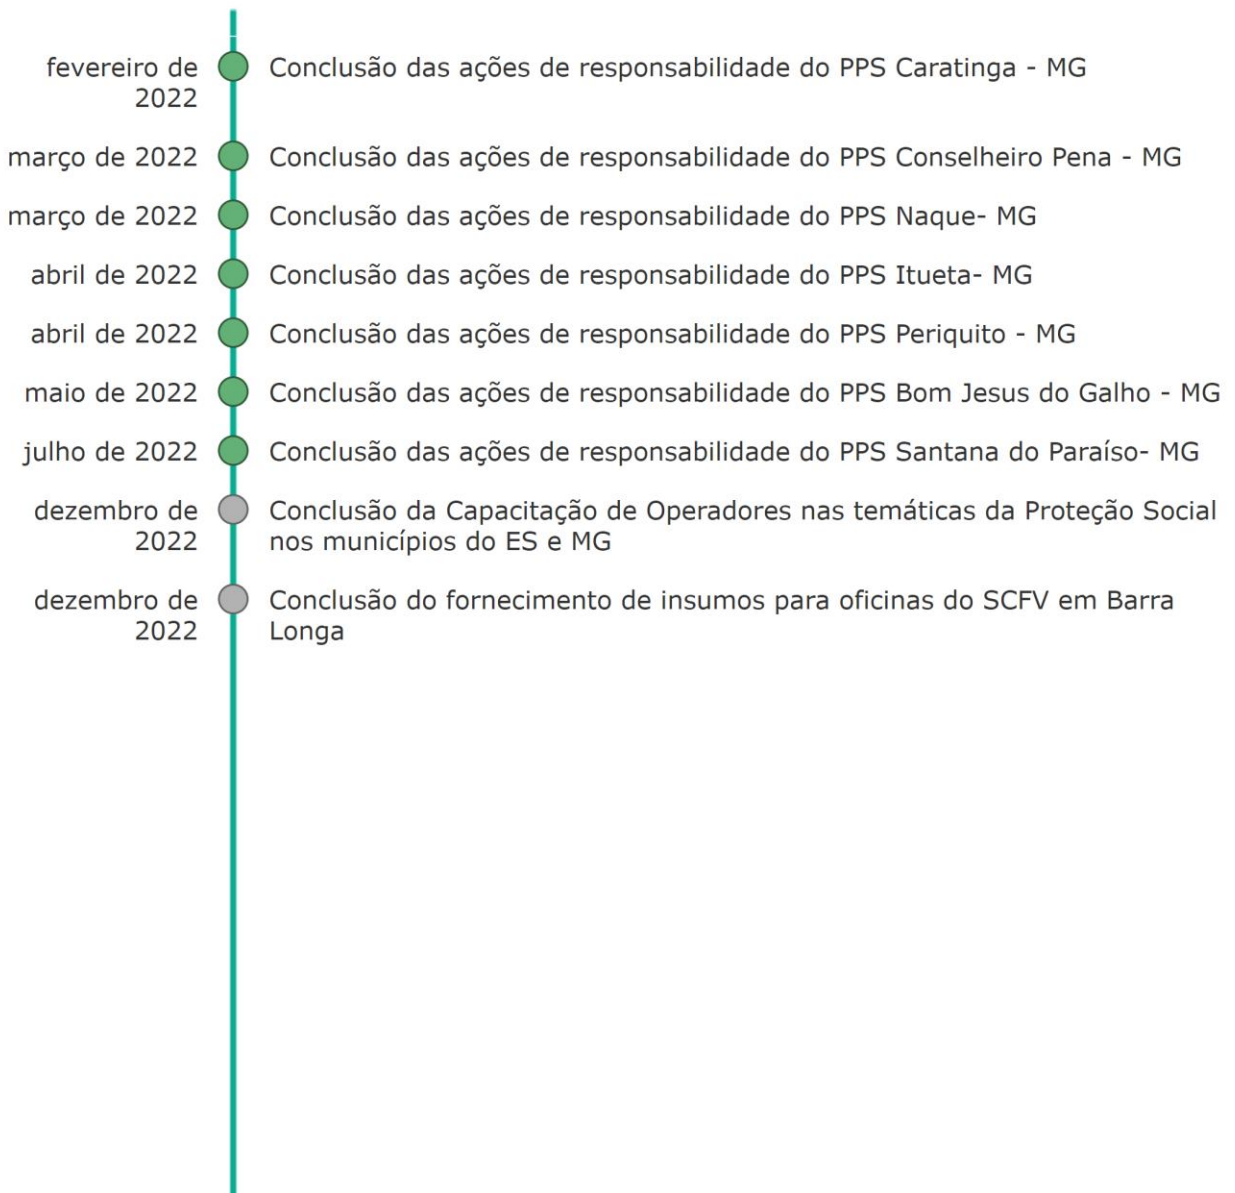

● Concluído
 ● Planejado
 ● Reprogramado

Grandes números do programa

- Disponibilização de recursos para a suplementação de 134 **profissionais** (assistentes sociais, psicólogos, motoristas e oficinairos) em 13 municípios atingidos e no Estado do Espírito Santo, para promover a proteção social, por meio de ações socioassistenciais, incluindo ações socioculturais e apoio psicossocial, desenvolvendo o acompanhamento às famílias e aos indivíduos atingidos pelo rompimento, priorizando as famílias com deslocamento físico;
- **Repasso financeiro de RS 17,79 Mi**, além da contratação dos profissionais, compra de equipamentos e insumos nos demais municípios da Calha, conforme previsto nos termos pactuados, para realização de atividades coletivas com o objetivo de fortalecer vínculos familiares e comunitários das famílias atingidas;
- Disponibilização de 17 **veículos** com cartão combustível, para transporte das equipes profissionais suplementadas, garantindo acesso às famílias e comunidades atingidas;
- 23370 **famílias cadastradas pela Fundação** a serem beneficiadas por meio dos Planos de Proteção Social implementados pelos municípios atingidos com o apoio da Fundação Renova.

Fatos relevantes do mês

Realização de reuniões de prestação de contas e acompanhamento das atividades dos planos de proteção social, com a participação dos atingidos e municípios nos municípios de: Linhares, Aimorés, Itueta, Santana do Paraíso e Periquito.

-Entrega de veículos para apoiar no deslocamento da equipe suplementar para atender as famílias das comunidades atingidas em Pingo D'Água, Rio Casca e Barra Longa.

Conclusão da sexta capacitação para operadores de proteção social dos municípios de Minas Gerais com a temática "Trabalho social com famílias", com foco na qualidade do atendimento social às famílias vulneráveis atingidas.

Acompanhamento em audiência judicial de conciliação para tentativa de negociação com os municípios não aderentes de Resplendor e Galileia

Publicação de portaria para oficialização do COMAPPS (Comissão de acompanhamento das atividades dos planos de proteção social) pelo município de Marilândia.

Conclusão décima primeira capacitação para os operadores de proteção social do município de Mariana com a temática "Práticas colaborativas na intervenção social junto de pessoas em situação de vulnerabilidade".

Assinatura do plano de reparação em proteção social com o município de Belo Oriente.

Indicadores

I01 - % de Municípios/Estados aderentes com recursos repassados/disponibilizados pela Fundação Renova para implementação do plano de reparação em proteção social

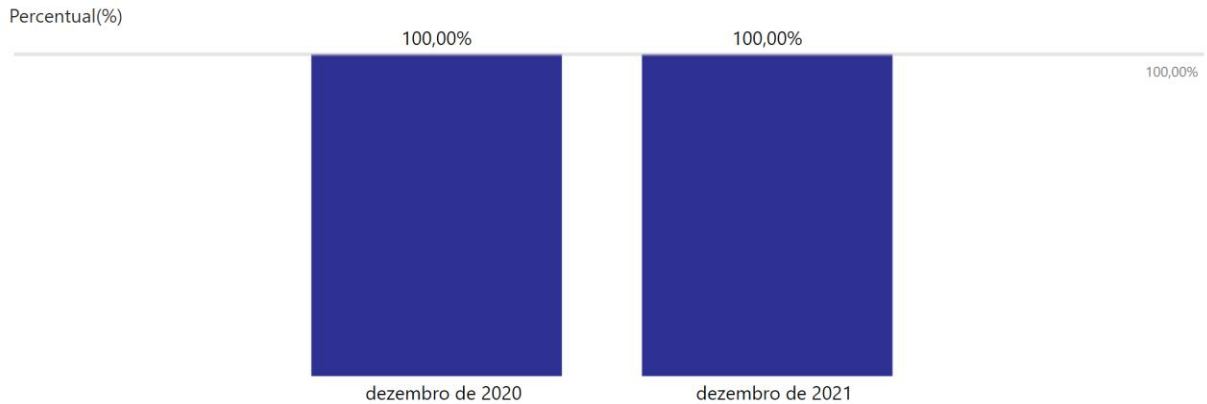


Gráfico 1: I01 - % de Municípios/Estados aderentes com recursos repassados/disponibilizados pela Fundação Renova para implementação do plano de reparação em proteção social - Frequência Anual

Memória de Cálculo do Programa: 37/37 (36 municípios e 1 estado)

I02 – % Ofertar vagas pela Fundação Renova para os técnicos contratados para suplementar o RH pelos municípios/estados atingidos




Gráfico 2: I02 – % Ofertar vagas pela Fundação Renova para os técnicos contratados para suplementar o RH pelos municípios/estados atingidos - Frequência Semestral

Vagas ofertadas no primeiro semestre de 2022.

Indicadores

I03 - % Oferta pela Fundação Renova para pelo menos dois técnicos de cada CRAS e dois técnicos de cada CREAS dos municípios/estados atingidos

Percentual(%)

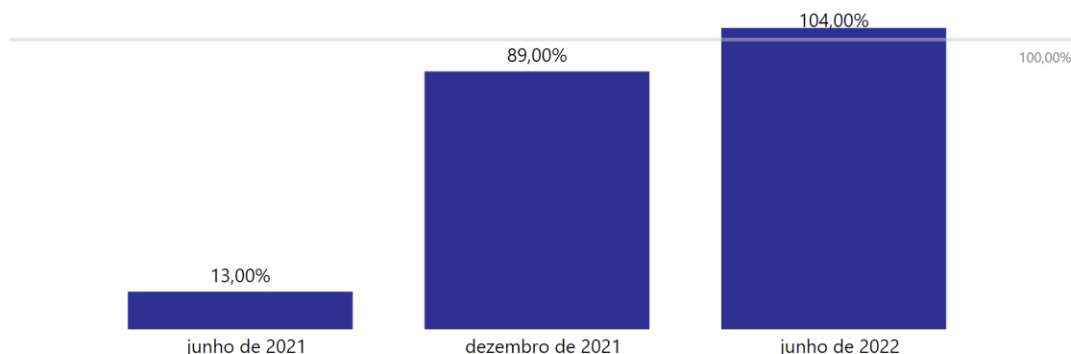


Gráfico 3: I03 - % Oferta pela Fundação Renova para pelo menos dois técnicos de cada CRAS e dois técnicos de cada CREAS dos municípios/estados atingidos - Frequência Semestral

Vagas ofertadas no primeiro semestre de 2022.

I04 – % Oferta de pelo menos duas vagas pela Fundação Renova para técnicos do órgão gestor dos municípios/estados atingidos

Percentual(%)

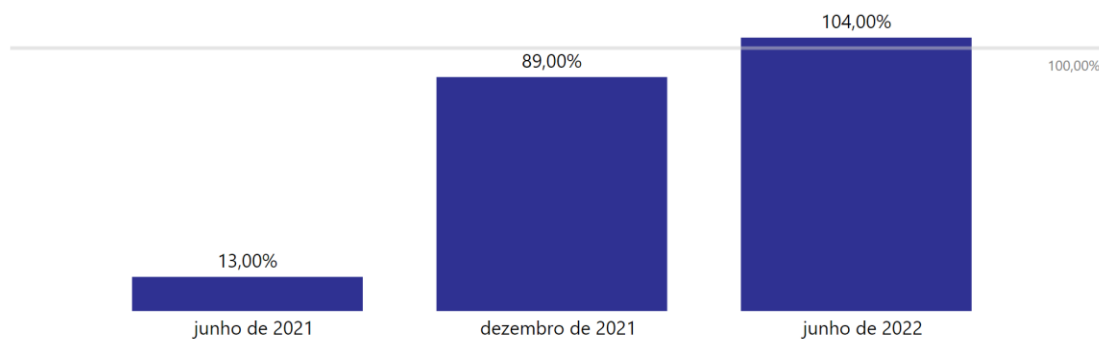


Gráfico 4: I04 – % Oferta de pelo menos duas vagas pela Fundação Renova para técnicos do órgão gestor dos municípios/estados atingidos - Frequência Semestral

Vagas ofertadas no primeiro semestre de 2022.

Indicadores

I05 – % de indivíduos vulneráveis elegíveis às políticas da Fundação Renova identificados e encaminhados para priorização junto aos programas aos quais têm direito

Percentual(%)




Gráfico 5: I05 – % de indivíduos vulneráveis elegíveis às políticas da Fundação Renova identificados e encaminhados para priorização junto aos programas aos quais têm direito - Frequência Semestral

I06 – % de indivíduos vulneráveis elegíveis com a rota de reparação concluída pelos programas da Fundação Renova

Percentual(%)

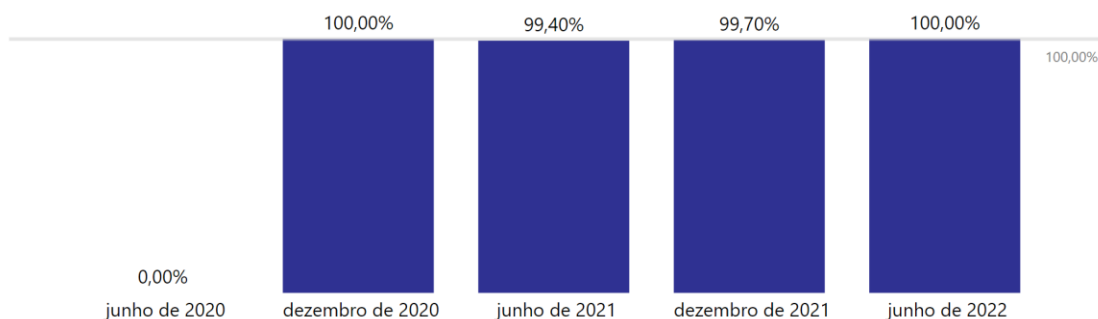


Gráfico 6: I06 – % de indivíduos vulneráveis elegíveis com a rota de reparação concluída pelos programas da Fundação Renova - Frequência Semestral

Indicadores

I07 – % de famílias com deslocamento físico que tenham anuído ao acompanhamento social até a entrega das residências concluídas ou retorno às suas residências de origem ou entrega da solução reparatória acordada (Mariana, Barra Longa, Sooretama e Linhares)

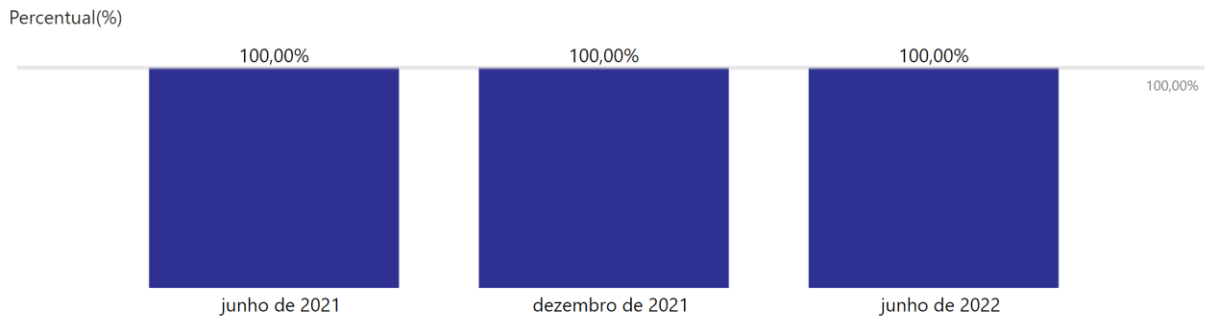


Gráfico 7: I07 – % de famílias com deslocamento físico que tenham anuído ao acompanhamento social até a entrega das residências concluídas ou retorno às suas residências de origem ou entrega da solução reparatória acordada (Mariana, Barra Longa, Sooretama e Linhares) - Frequência Semestral

Memória de Cálculo Programa: 417 famílias anuentes atendidas / 417 famílias anuentes

PG006 Comunicação, Participação, Diálogo e Controle Social

Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivos

- (i) Assegurar canais de interação, diálogo e relacionamento contínuo com a população atingida e demais públicos interessados, zelando sempre pela transparência e integridade, junto a todos os grupos e territórios.
- (ii) Garantir acesso à informação ampla, transparente, acessível e contínua a todos os atingidos e interessados, de modo a favorecer a participação esclarecida da sociedade nos processos de reparação e compensação.
- (iii) Assegurar os processos de participação social e garantir espaços de diálogos em todos os programas, projetos e ações de reparação e compensação executados pela Fundação Renova no que tange à promoção de participação social e comunicação no desenvolvimento e implementação dos projetos socioeconômicos e socioambientais previstos no TTAC e deliberações do CIF.
- (iv) Assegurar os processos de participação social e garantir espaços de diálogos em todos os programas, projetos e ações de reparação e compensação.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	59	Caput	Em andamento
Cláusula	63	§único	Em andamento
Cláusula	63	Caput	Em andamento
Cláusula	68	Caput	Encerrada
Cláusula	71	Caput	Em andamento
Cláusula	72	Caput	Em andamento
Deliberação	105	1.1	Concluída Internamente
Deliberação	105	1.2	Concluída Internamente
Deliberação	105	1.3	Concluída Internamente
Deliberação	105	1.4	Concluída Internamente
Deliberação	105	1.6	Concluída Internamente
Deliberação	140	1	Concluída Internamente
Deliberação	228	2	Concluída Internamente
Deliberação	230	1	Concluída Internamente
Deliberação	506	2	Concluída Internamente
Deliberação	506	2.2	Concluída Internamente
Deliberação	506	3	Concluída Internamente
Deliberação	506	4	Concluída Internamente
Deliberação	506	5	Concluída Internamente
Deliberação	506	6	Concluída Internamente

Entregas do ano de 2022

dezembro de 2022		Conclusão da análise Integrada por Território em 2022.
dezembro de 2022		Conclusão da aproximação junto às Partes Interessadas em 2022.
dezembro de 2022		Conclusão da articulação com programas para obtenção de informações e atualização do FAQ em 2022.
dezembro de 2022		Conclusão da atualização de informações sobre a tratativa e conclusão das solicitações no SGS e em controle de ofícios em 2022.
dezembro de 2022		Conclusão da compreensão do Território e Análise de Cenário em 2022
dezembro de 2022		Conclusão da etapa de garantir periodicidade e assertividade dos canais permanentes de comunicação com a sociedade atingida: Momento Renova nas Rádios do trecho; boletim Jornada; Jornais da Comunidade em 2022
dezembro de 2022		Conclusão da identificação de oportunidades de Controle Social junto aos públicos e programas em 2022.
dezembro de 2022		Conclusão da identificação e caracterização de oportunidades de Participação Social em 2022.
dezembro de 2022		Conclusão do planejamento da Participação Social em 2022.
dezembro de 2022		Conclusão do reconhecimento dos atingidos e demais partes interessadas , Ativos Locais e suas Redes em 2022.
dezembro de 2022		Conclusão dos encaminhamentos das solicitações aos pontos focais dos programas em 2022.

 Concluído
  Planejado
  Reprogramado

Entregas do ano de 2022

dezembro de 2022	●	A ouvidoria encaminhará resposta final ao manifestante, observado o prazo de trinta dias, prorrogável de forma justificada uma única vez, por igual período, nos termos do art. 16 da LEI Nº 13.460, DE 26 DE JUNHO DE 2017 em 2022
dezembro de 2022	●	Conclusão do acolhimento de solicitações e ofícios junto aos públicos em 2022
dezembro de 2022	●	Conclusão do acompanhamento das tratativas e devolutivas (intermediárias e finais) aos públicos em 2022.
dezembro de 2022	●	Conclusão do alinhamento interno e planejamento das Agendas de Diálogo em 2022.
dezembro de 2022	●	Conclusão do mecanismo para monitoramento das ações de reparação e recebimento de denúncias e reclamações das comunidades impactadas em 2022
dezembro de 2022	●	Conclusão do monitoramento dos índices de satisfação com a Ouvidoria em 2022
dezembro de 2022	●	Conclusão do processo de identificar oportunidades e executar as melhores formas de repasse de conteúdos para aumentar conhecimento da sociedade sobre as entregas dos programas em 2022
dezembro de 2022	●	Conclusão do registro e classificação das solicitações no SGS e em controle de ofícios em 2022

Entregas do ano de 2022

- dezembro de 2022 ● Conclusão da ampla divulgação nos canais institucionais em 2022
- dezembro de 2022 ● Conclusão da mobilização dos públicos e implementação dos Espaços Dialogais em 2022.
- dezembro de 2022 ● Conclusão da publicação de relatórios trimestrais de atividades com dados estatísticos em 2022
- dezembro de 2022 ● Conclusão dos encaminhamentos das Decisões, Acompanhamento das Tratativas e Devolutivas aos Públicos em 2022.

DIÁLOGO

Grandes números do pilar

INDICADOR MÊS	set/2022	out/2022	ACUMULADO
Diálogo: Reuniões Realizadas – Espírito Santo (Mês)	11	5	1.171
Diálogo: Reuniões Realizadas – Minas Gerais (Mês)	21	18	3.871
Diálogo: Reuniões Realizadas – Outras Localidades (Mês)	0	0	11
Diálogo: Total de Participantes em Reuniões (Acumulado)	-	-	132.020

Fatos relevantes do mês

Realização de Oficina de Elaboração de Projetos na Calha do Rio Doce, junto a moradores e atingidos de Ipatinga/MG, Ipaba/MG, Santana do Paraíso/MG, Bugre/MG, Córrego Novo/MG, Bom Jesus do Galho/MG e Timóteo/MG em atendimento a demandas coletivas relacionadas à temática. A ação é desenvolvida no bojo da Mostra de Projetos. No território foi realizado também o Circuito das Águas, atividade desenvolvida em parceria com a Área da Comunicação da Fundação Renova, equipes do Doce Vivo e do Programa de Coleta e Tratamento de Esgoto e Destinação de Resíduos Sólidos (PG31). O evento promoveu junto à comunidade escolar da rede pública estadual de Córrego Novo/MG (Sede), a apresentação de um conjunto de atividades desenvolvidas pela Fundação Renova relacionadas ao monitoramento da qualidade da água, preservação de mananciais e afluentes do rio Doce e, também a ações na área de saneamento básico. Por fim, destaque para fórum de prestação de contas “Resulta” junto a moradores de Santana do Paraíso/MG, para apresentar atividades desenvolvidas e previstas pela equipe de Diálogo Social e Programa de Proteção Social PG05.

No território do Espírito Santo foi realizada reunião com a diretoria e os feirantes da Associação de Comerciantes de Povoação (Linhares/ES), para atualização de alinhamentos e encaminhamentos sobre a Feira Comunitária. Ainda no território foi realizada reunião para apresentação das ações de reparação ambiental da Fundação Renova aos moradores da comunidade de Itapina (Colatina/ES) e reunião com os moradores das comunidades de Lagoa do Óleo e Fazenda do Batista (Marilândia/ES), para apresentação dos programas socioeconômicos da Fundação Renova.

No Médio Rio Doce, foi realizada reunião de apresentação do Plano Municipal de Reparação em Proteção Social e formação do Comitê Municipal de Avaliação do Programa de Proteção Social (COMAPPS), em Aimorés/MG. Ainda no território, foram realizadas oficinas para apresentação do Projeto Doce Vivo junto aos alunos da Escola Municipal Professora Martins Godoy no distrito de Serraria - Periquito/MG. A oficina teve a participação de 66 alunos do 1º ao 4º ano do Ensino Fundamental.

Em Mariana, foi dada continuidade às visitas presenciais e grupos de trabalho de Paracatu de Baixo para discussão acerca do reassentamento coletivo, fiscalização, acompanhamento do status e avanço das obras com a participação da Comissão de Atingidos. Realização do “Reencontre” na comunidade de Bento Rodrigues, ação realizada pela Fundação Renova com o objetivo de promover interação social entre um pequeno grupo de moradores que serão vizinhos em novo Bento.

Indicadores

I03 - Pilar diálogo - Média mensal de espaços de diálogo coletivo nos territórios

Percentual(%)




Gráfico 1: I03 - Pilar diálogo - Média mensal de espaços de diálogo coletivo nos territórios - Frequência Mensal

I01 - Pilar diálogo - Apresentação dialógica dos programas nos territórios

Percentual(%)

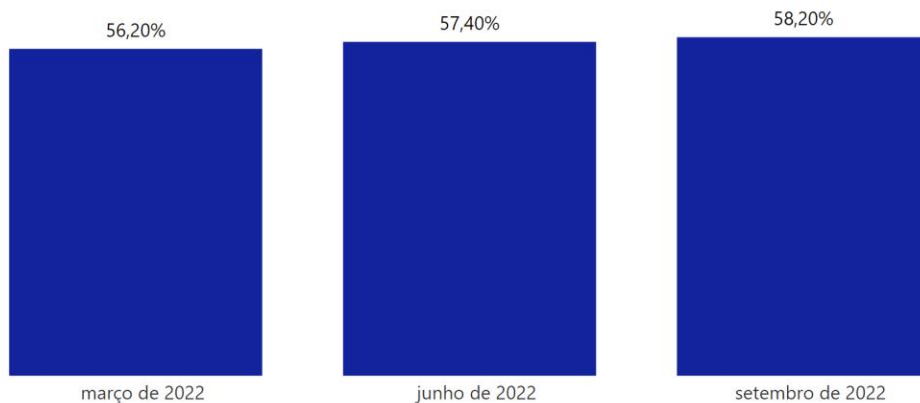


Gráfico 2: I01 - Pilar diálogo - Apresentação dialógica dos programas nos territórios- Frequência Trimestral

Indicadores

I02 - Pilar diálogo - Nível de compreensão da população atingida sobre as decisões resultantes dos processos participativos

Percentual(%)




Gráfico 3: I02 - Pilar diálogo - Nível de compreensão da população atingida sobre as decisões resultantes dos processos participativos - Frequência Trimestral

I04 - Pilar diálogo - Disponibilidade de informações sobre as tratativas dos encaminhamentos definidos em Diálogos Coletivos

Percentual(%)



Gráfico 4: I04 - Pilar diálogo - Disponibilidade de informações sobre as tratativas dos encaminhamentos definidos em Diálogos Coletivos - Frequência Semestral

Indicadores

I05 - Pilar diálogo - Compreensão dos atingidos em relação às informações sobre o andamento dos encaminhamentos definidos em diálogos coletivos



Gráfico 5: I05 - Pilar diálogo - Compreensão dos atingidos em relação às informações sobre o andamento dos encaminhamentos definidos em diálogos coletivos - Frequência Semestral

I06 - Pilar diálogo - Avaliação dos espaços de participação e controle social




Gráfico 6: I06 - Pilar diálogo - Avaliação dos espaços de participação e controle social - Frequência Semestral

Indicadores

I08 - Pilar diálogo - Percepção de efetividade dos espaços de participação e controle social

Percentual(%)

6,90%

dezembro de 2021

Gráfico 7: I08 - Pilar diálogo - Percepção de efetividade dos espaços de participação e controle social - Frequência Anual

I07 - Pilar diálogo - Satisfação com a transparência das ações da Fundação Renova

Percentual(%)

60,55%

dezembro de 2021

Gráfico 8: I07 - Pilar diálogo - Satisfação com a transparência das ações da Fundação Renova - Frequência Anual

Indicadores

I10 - Pilar de Diálogo - Satisfação Com o Processo De Construção Coletiva Dos Encaminhamentos Em Diálogos Coletivos

Percentual(%)




Gráfico 9: I10 - Pilar de Diálogo - Satisfação Com o Processo De Construção Coletiva Dos Encaminhamentos Em Diálogos Coletivos - Frequência Mensal

I09 - Pilar de Diálogo - Número De Encaminhamentos Definidos Em Diálogos Coletivos Realizados Nos Territórios

Percentual(%)

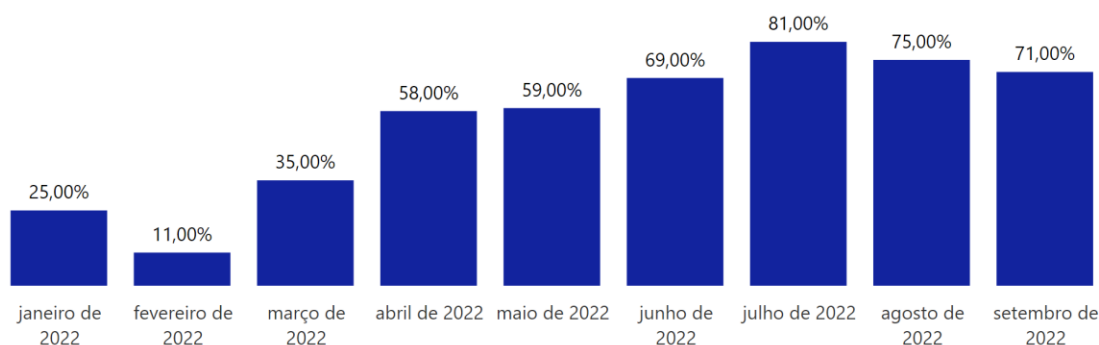


Gráfico 10: I09 - Pilar de Diálogo - Número De Encaminhamentos Definidos Em Diálogos Coletivos Realizados Nos Territórios - Frequência Trimestral

OUVIDORIA

Grandes números do pilar

Tabela 2. Manifestações recebidas - Acumulado.

MANIFESTAÇÕES RECEBIDAS ACUMULADO	MANIFESTAÇÕES RECEBIDAS MÉDIA MENSAL ACUMULADA
15.570,00	185,36

Tabela 3. Manifestações recebidas.

MÊS/ANO	REALIZADO MENSAL	MÉDIA ACUMULADA ANUAL
janeiro de 2022	177	172,67
fevereiro de 2022	131	
março de 2022	210	207,33
abril de 2022	206	
maio de 2022	187	193,33
junho de 2022	229	
julho de 2022	214	231,00
agosto de 2022	209	
setembro de 2022	157	
outubro de 2022	231	

Fatos relevantes do mês

Não houve fatos relevantes no mês.

Indicadores

I01 - Pilar ouvidoria - Proporção de respostas disponibilizadas pela ouvidoria dentro do prazo

Percentual(%)

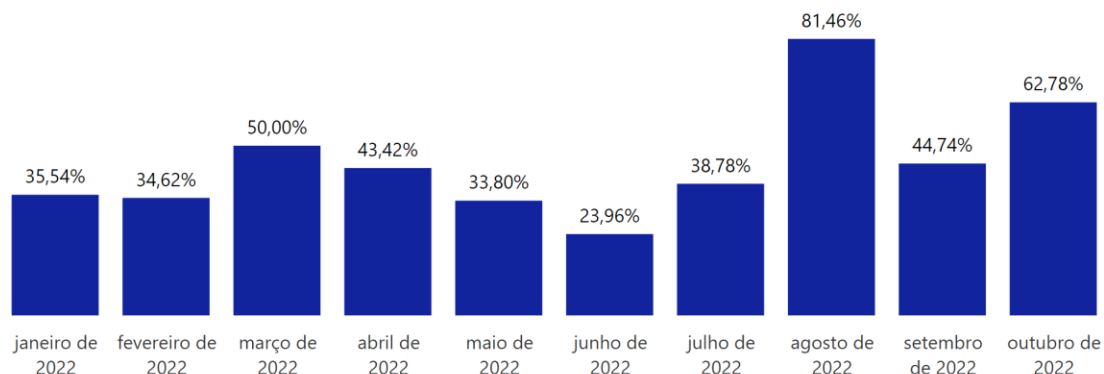


Gráfico 9: I01 - Pilar ouvidoria - Proporção de respostas disponibilizadas pela ouvidoria dentro do prazo - Frequência Mensal

I02 - Pilar ouvidoria - Média de tempo para disponibilização de respostas pela ouvidoria

Percentual(%)




Gráfico 10: I02 - Pilar ouvidoria - Média de tempo para disponibilização de respostas pela ouvidoria - Frequência Mensal

Indicadores

I03 - Pilar ouvidoria - Avaliação do atendimento pela ouvidoria

Percentual(%)




Gráfico 11: I03 - Pilar ouvidoria - Avaliação do atendimento pela ouvidoria - Frequência Mensal

Apesar de na definição do programa esse indicador constar com medições mensais, as pesquisas serão realizadas semestralmente. O programa está providenciando a formalização dessa informação com CTPDCS e CIF.

CANAIS DE RELACIONAMENTO

Grandes números do pilar

Tabela 4. Grandes Números.

Grande Número	set/2022	out/2022
Canais: Número total de manifestações	1.210.637	1.236.551
Canais: Número de manifestações respondidas	1.149.701	1.177.160
Canais: Número de manifestações registradas pelo 0800	902.179	921.068
Canais: Número total de pessoas registradas no SGS (que fizeram contato com os Canais)	314.095	317.160
Canais: Número de manifestações registradas pelos Centros de Informação e Atendimento (CIAs)	158.760	161.287
Canais: Número de manifestações registradas pelo Portal do Usuário	72.898	76.137
Canais: Número de manifestações classificadas como Outros (Abordagem presencial, E-mail, Eventos, Fórum, Mobilização, Ofício, Ouvidoria, Redes Sociais, Reunião de Diálogo, Telefone)	62.229	63.374
Canais: Número de manifestações em tratamento	60.936	59.391
Canais: Número de manifestações registradas pelo Fale Conosco	14.571	14.685
Canais: Número de manifestações encaminhadas à Ouvidoria no mês	12	15

Pesquisa de Opinião 0800

Q2: O quanto você está satisfeito?




Gráfico 11: Pesquisas de Satisfação 0800 - Q2

Pesquisa de Opinião 0800

Q1: Você obteve a informação de que precisava neste atendimento?




Gráfico 12: Pesquisas de Satisfação 0800 - Q1

Pesquisa de Opinião 0800

Q3: Como você avalia o atendimento que acabou de receber? Q1 = Sim




Gráfico 13: Pesquisas de Satisfação 0800 - Q3 , Q1 = Sim.

Pesquisa de Opinião 0800

Q3: Como você avalia o atendimento que acabou de receber? Q1 = Parcialmente




Gráfico 14: Pesquisas de Satisfação 0800 - Q3, Q1= Parcialmente.

Pesquisa CIAs

Como você avalia o profissional que lhe atendeu hoje?




Gráfico 15: Como você avalia o profissional que lhe atendeu hoje? - Frequência Mensal

Em relação às informações recebidas neste atendimento, você ficou?




Gráfico 16: Em relação às informações recebidas neste atendimento, você ficou? - Frequência Mensal


Você recebeu a informação que solicitou neste atendimento?



Legenda ● SIM ● EM PARTES ● NÃO

Gráfico 17: Você recebeu a informação que solicitou neste atendimento? - Frequência Mensal

Avalie o Conforto e qualidade do espaço

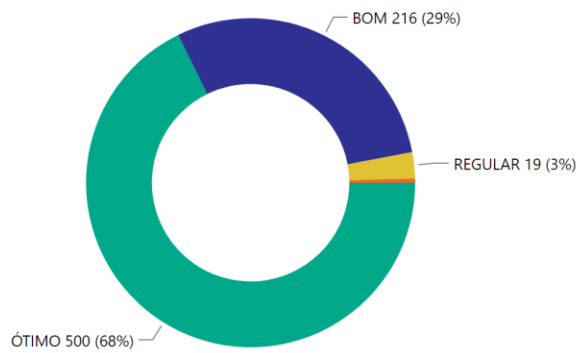

Legenda ● ÓTIMO ● BOM ● REGULAR ● PÉSSIMO ● RUIM

Gráfico 18: Avalie o Conforto e qualidade do espaço - Frequência Mensal

Fatos relevantes do mês

Ao longo do mês de outubro, destaque para a realização de 16 CIAs Móveis: nas comunidades de Patrimônio e Biboca (São José do Goiabal/MG) no dia 05/10; comunidades de Messias Gomes e Firma Araújo (São José do Goiabal/MG) no dia 06/10; no Assentamento Liberdade (Periquito/MG) no dia 08/10; comunidade de Ipabinha (Santana do Paraíso/MG) nos dias 25/10, 26/10 e 27/10; na comunidade de Baguari (Governador Valadares/MG) no dia 27/10; nas comunidades de Regência (Linhares/ES) nos dias 04/10 e 18/10; Povoação (Linhares/ES) nos dias 06/10 e 19/10; e Bebedouro (Linhares/ES) no dia 13/10; nas comunidades Maria Ortiz (Colatina/ES) 26/10 e Itapina (Colatina/ES) dia 27/10; e em Mascarenhas (Baixo Guandu/ES) dia 25/10; comunidade Barra do Riacho (Aracruz/ES) no dia 27/10. Durante as ações realizadas foram atendidos diversos públicos das comunidades e regiões vizinhas, essas ações contaram com acolhimento, registro de manifestações e esclarecimento de dúvidas relacionadas ao processo de reparação, cumprindo o propósito de ser imagem e presença física da Fundação Renova no território.

Continuidade do trabalho de acolhimento e esclarecimento de dúvidas nos Centros de Informação e Atendimento; monitoramento, pelos atendentes CIAs, de manifestações registradas em todas as unidades CIAs que estão pendentes de respostas intermediárias ou finais.

Cronograma Trimestral dos CIAs Móveis referente aos territórios da Calha do Rio Doce, Médio Rio Doce e Espírito Santo, com o intuito de subsidiar as ações a serem realizadas no último trimestre do ano de 2022.

Discussão e levantamento das pautas para envio a pedido da equipe de Comunicação Fundação Renova para elaboração da 2ª Edição do Jornal Mural.

Levantamento e qualificação de informações do histórico de manifestações de atingidos de categorias diversas, que apresentam dificuldades para acessar o direito indenizatório via Fluxo Ágil.

Indicadores

I01 - Pilar canais - Taxa de manifestações reincidentes

Percentual(%)

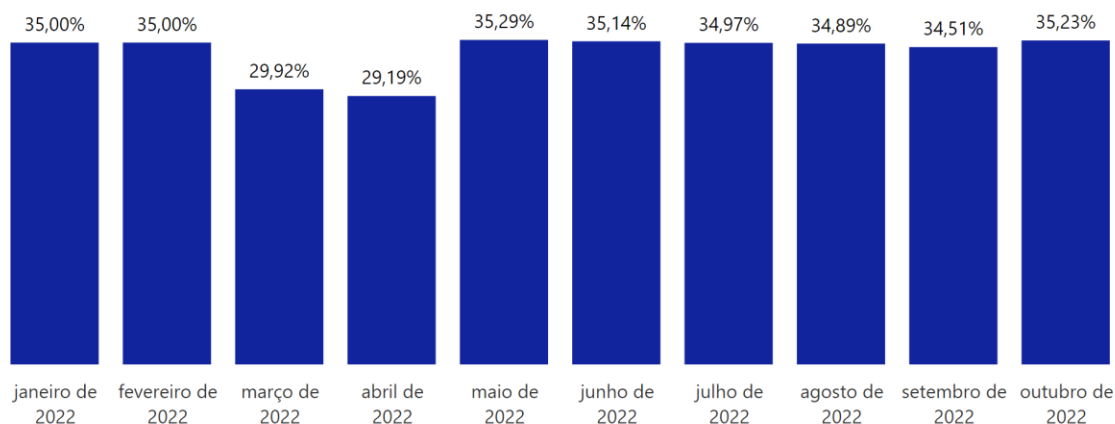


Gráfico 19:I01 - Pilar canais - Taxa de manifestações reincidentes - Frequência Mensal

I02 - Pilar canais - Proporção de manifestações respondidas

Percentual(%)




Gráfico 20: I02 - Pilar canais - Proporção de manifestações respondidas - Frequência Mensal

Indicadores

I03 - Pilar canais - Proporção de manifestações respondidas no prazo estipulado

Percentual(%)

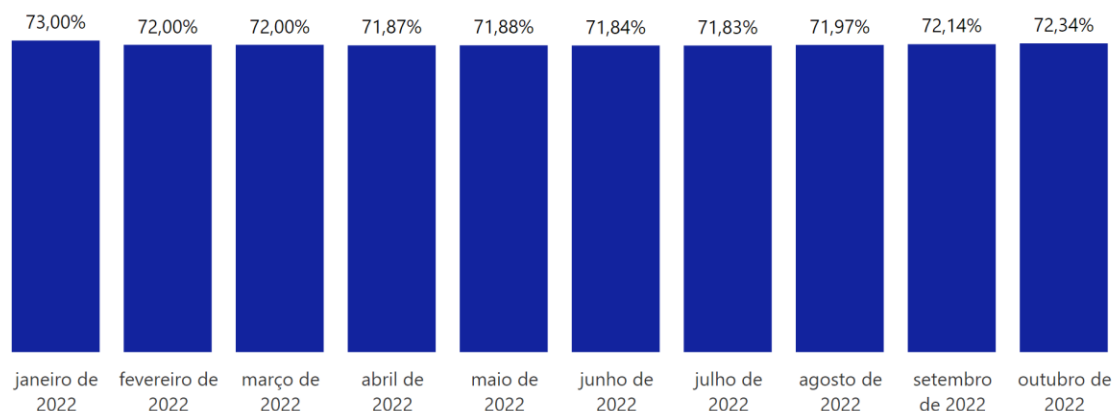


Gráfico 21: I03 - Pilar canais - Proporção de manifestações respondidas no prazo estipulado - Frequência Mensal

I04 - Pilar canais - Avaliação do atendimento pelos usuários dos cias

Percentual(%)

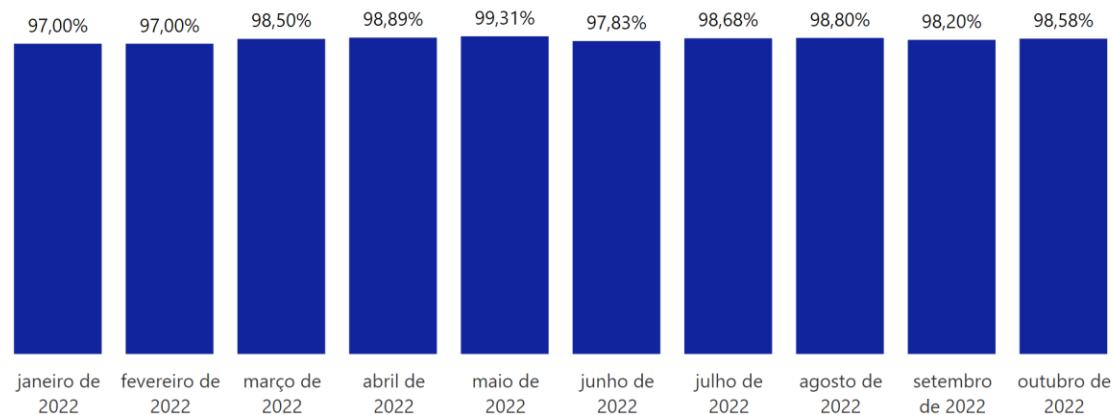


Gráfico 22: I04 - Pilar canais - Avaliação do atendimento pelos usuários dos cias - Frequência Mensal

Indicadores

I06 - Pilar canais - Satisfação com a resolução das solicitações

Percentual(%)




Gráfico 24: I06 - Pilar canais - Satisfação com a resolução das solicitações - Frequência Mensal

I05 - Pilar canais - Avaliação do atendimento pelos usuários da central 0800 e fale conosco

Percentual(%)




Gráfico 23: I05 - Pilar canais - Avaliação do atendimento pelos usuários da central 0800 e fale conosco - Frequência Mensal

Indicadores

I07 - Pilar canais - Oferta das informações solicitadas nos cias

Percentual(%)

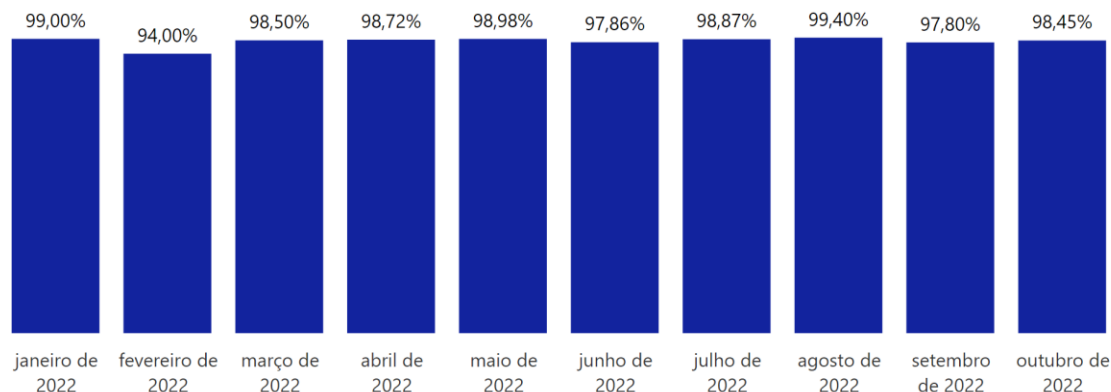


Gráfico 25: I07 - Pilar canais - Oferta das informações solicitadas nos cias - Frequência Mensal

I08 - Pilar canais - Oferta das informações solicitadas na central 0800 e fale conosco

Percentual(%)

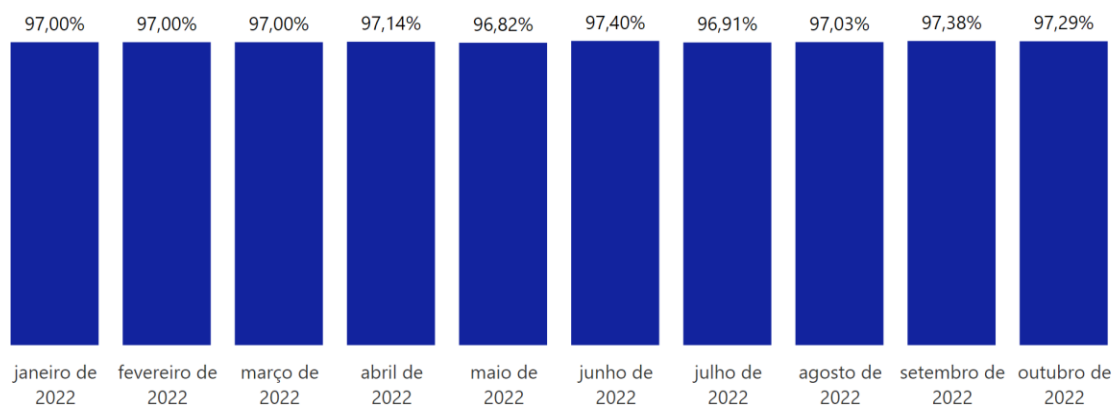


Gráfico 26: I08 - Pilar canais - Oferta das informações solicitadas na central 0800 e fale conosco - Frequência Mensal

Indicadores

I09 - Pilar canais - Satisfação com a estrutura física dos cias

Percentual(%)




Gráfico 27: I09 - Pilar canais - Satisfação com a estrutura física dos cias - Frequência Mensal

COMUNICAÇÃO

Grandes números do pilar

1º Semestre de 2022

DADO	jan	fev	mar	abr	mai	jun	Acumulado no ano
▲ Áudios produzidos	0	0	0	1	0	0	1
Carros de som produzidos	4	1	3	0	2	0	10
Cartazes produzidos	0	0	4	0	3	0	7
Cartilhas produzidos	0	0	1	1	2	0	4
E-mails de Marketing produzidos	0	1	5	2	0	2	10
Informes do Reassentamento produzidos	2	2	3	2	3	0	12
Jornais da Comunidade produzidos	5	0	20	0	16	0	41
Matéria - Boletim Jornada produzidos	0	15	33	10	33	0	91
Mídias Sociais produzidas	15	3	6	2	1	5	32
Newsletter produzidos	3	3	2	2	4	5	19
Outros itens produzidos	2	1	18	6	14	3	44
Panfletos produzidos	0	0	1	0	1	0	2
Pílulas de whatsapp produzidos	39	21	40	36	26	26	188
Rádios produzidos	18	20	41	40	48	39	206
Vídeos produzidos	1	0	1	1	15	2	20

COMUNICAÇÃO

Grandes números do pilar

2º Semestre de 2022


DADO	jul	ago	set	out	Acumulado no ano
Áudios produzidos	0	6	7	21	34
Carros de som produzidos	7	0	2	3	12
Cartazes produzidos	1	1	0	0	2
Cartilhas produzidos	0	0	1	1	2
E-mails de Marketing produzidos	0	2	0	0	2
Informes do Reassentamento produzidos	2	3	3	1	9
Jornais da Comunidade produzidos	27	30	26	37	120
Matéria - Boletim Jornada produzidos	0	0	0	0	0
Mídias Sociais produzidas	1	6	1	0	8
Newsletter produzidos	11	3	3	0	17
Outros itens produzidos	48	11	13	1	73
Panfletos produzidos	1	1	0	0	2
Pílulas de whatsapp produzidos	34	33	16	22	105
Rádios produzidos	32	28	10	8	78
Vídeos produzidos	6	7	1	4	18

COMUNICAÇÃO

Grandes números do pilar

Publicações por Território


Canais: ● Áudio ● Carro de som ● Cartilha ● Informe do Reassentamento ● Jornal da Comunidade ● Matéria – Jornal Mural CIA ● Outros ● Pílula ● Rádio ● Vídeo

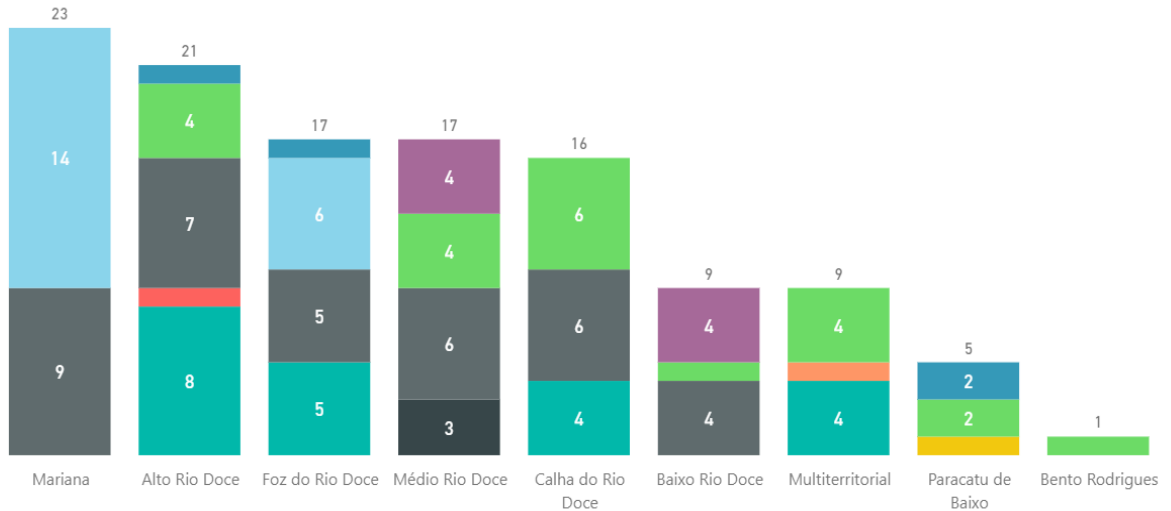

Observação: os números apresentados nas colunas dos reassentamentos de Bento Rodrigues, Gesteira e Paracatu de Baixo não são contabilizados na coluna do território de Mariana.

Principais Temas Veiculados

Canais: ● Áudio ● Carro de som ● Cartilha ● Informe do Reassentamento ● Jornal da Comunidade ● Matéria – Jornal Mural CIA ● Outros ● Pílula ● Rádio ● Vídeo



Fatos relevantes do mês

Territórios

Baixo Rio Doce

Produção de matéria para a edição de outubro do Jornal Repara Cidadão sobre judicialização. Explicamos o que é e como funciona este processo na reparação.

Produção de pílula convidando a comunidade de Itueta para uma reunião sobre Proteção Social e também a formação do comitê de acompanhamento das ações de proteção social (Comaps)

Calha do Rio Doce

Produção de áudio (Momento Renova) com o atendimento da Ouvidoria da Fundação Renova.

Produção de áudio (Momento Renova) sobre a realização do Circuito da Água em Baixa Verde, distrito de Dionísio.

Produção de pílula de WhatsApp convidando moradores de comunidades de São José do Goiabal para o CIA Móvel nos dias 05 e 06/10.

Produção de pílula de WhatsApp convidando moradores de Santana do Paraíso para o CIA Móvel na comunidade de Ipaba do Paraíso, nos dias 26 e 27/10.

Produção de pílula de WhatsApp convidando moradores de Santana do Paraíso para o Resulta na comunidade de Ipaba do Paraíso, no dia 27/10.

Publicação de matéria sobre a terceira safra do Projeto Feijão, em Rio Casca, na 4ª edição do boletim Vozes do Território.

Fatos relevantes do mês

Territórios

Calha do Rio Doce

Publicação de matéria sobre as oficinas de elaboração de projetos do Projetar na 4ª edição do boletim Vozes do Território.

Publicação de matéria sobre o atendimento do CIA Móvel na 4ª edição do boletim Vozes do Território.

Foz do Rio Doce

Produção de áudio (Momento da Reparação) para distribuição por whatsapp sobre a realização do Centro de Informações e Atendimento Móvel em Regencia e em Povoação.

Produção de áudio (Momento da Reparação) para distribuição por whatsapp sobre o site do Centro de Informações Técnicas (CIT).

Produção de matéria para o mural do Centro de Informações e Atendimento de Linhares sobre como acessar o plataforma do Centro de Informações Técnicas (CIT Rio Doce).

Produção de nota para a edição de outubro do Jornal Voz da Foz esclarecendo que a Renova não faz parte do processo de repactuação.

Mariana

Criação de cartaz para o JM do CIA de Mariana sobre os canais de comunicação da Renova

Criação de lâmina para o JM do CIA de Mariana sobre barraquinha da Eliana de Paracatu de Baixo

Criação de lâmina para o JM do CIA de Mariana sobre incentivo para dose de reforço da vacinação

Produção de matéria para a 23ª edição do Voz da Comunidade sobre jogo de labirinto para as crianças

Fatos relevantes do mês

Suporte aos Programas

Suporte ao PG001 Levantamento e Cadastro dos Impactados

Produção de áudio (Momento da Reparação) sobre o processo de cadastro.

Produção de áudio (Momento Renova) informando que o cadastro de atingidos continua sendo realizado nos territórios.

Produção de matéria para o mural do Centro de Informações e Atendimento de Linhares sobre a possibilidade de solicitar a revisão do cadastro.

Produção de matéria para o mural do Centro de Informações e Atendimento de Linhares sobre dicas importantes sobre o cadastro

Produção de pílula de WhatsApp informando que o cadastro de atingidos continua sendo realizado nos territórios.

Suporte ao PG002 Ressarcimento e Indenização dos Impactados

Criação de lâmina para o JM do CIA de Mariana sobre retorno do pagamento do Auxílio Financeiro Emergencial (AFE)

Produção de áudio (Momento da Reparação) sobre o pagamento aos atingidos dos valores correspondentes aos honorários advocatícios.

Produção de pílula de WhatsApp sobre o pagamento aos atingidos dos valores correspondentes aos honorários advocatícios.

Fatos relevantes do mês

Suporte aos Programas

Suporte ao PG006 Pilar de Ouvidoria

Produção de matéria para o mural do Centro de Informações e Atendimento de Linhares sobre como acessar a Ouvidoria.

Produção de áudio (Momento da Reparação) para distribuição por whatsapp sobre como acessar a Ouvidoria.

Suporte ao PG005 Programa de Proteção Social

Publicação de matéria sobre o Termo de Cooperação Técnica e Financeira, da Proteção Social, na 4ª edição do boletim Vozes do Território.

Produção de matéria para o boletim Terra da Gente sobre as ações realizadas em apoio ao desenvolvimento social de Barra Longa.

Suporte ao PG002 Ressarcimento e Indenização dos Impactados

Produção de matéria para a edição de outubro do Jornal Repara Cidadão sobre o Auxílio Financeiro Emergencial - AFE.

Produção de matéria para a edição de outubro do boletim Voz do Rio Doce sobre a indenização dano água pelo PIM e SIS nas cidades que ficaram desabastecidas pelo rio Doce durante o rompimento da barragem de Fundão.

Produção de matéria para a edição de outubro do boletim Voz do Rio Doce sobre a comprovação de danos por pescadores profissionais de Tumiritinga.

Produção de áudio (Momento Renova) com informações sobre medidas antifraude.

Produção de áudio (Momento da Reparação) com esclarecimentos sobre a volta do pagamento do Auxílio Financeiro Emergencial (AFE).

Fatos relevantes do mês

Suporte aos Programas

Suporte ao PG008 Reconstrução de Vilas - Paracatu

Produção de vídeo de um minuto sobre o reassentamento de Paracatu de Baixo com os principais avanços das obras no mês de setembro de 2022.

Produção de pílula/convite para a comunidade de Paracatu de Baixo participar da Roda de conversas com as famílias, realizado no dia 23/10.

Produção de pílula de WhatsApp sobre o Dia Mundial dos Animais em atendimento a condicionante do Licenciamento de Paracatu de Baixo.

Produção da 44ª edição, versão em vídeo do Informe do Reassentamento de Paracatu de Baixo, com as chamadas para os principais assuntos.

Produção da 44ª edição do informativo mensal para as famílias do reassentamento de Paracatu de Baixo, com conteúdo e fotos sobre os avanços das obras, status dos projetos protocolados na prefeitura, alvarás emitidos, número de atendimentos às famílias, entre outros.

Suporte ao PG008 Reconstrução de Vilas - Bento Rodrigues

Produção de pílula de WhatsApp para envio às famílias com esclarecimentos sobre a atual situação do novo distrito de Bento Rodrigues.

Produção de matéria para a 23ª edição do Voz da Comunidade sobre comércios em Bento Rodrigues

Criação de lâmina para o JM do CIA de Mariana sobre negócios dos reassentamentos

Suporte ao PG008 Reconstrução de Vilas

Produção de matéria para a 23ª edição do Voz da Comunidade sobre patrimônio arqueológico nos reassentamentos

Fatos relevantes do mês

Suporte aos Programas

Suporte ao PG010 Recuperação das Demais Comunidades e Infraestruturas Impactadas

Criação de lâmina para o JM do CIA de Mariana sobre obras de campo de futebol, área cavalgada e quadra poliesportiva

Criação de lâmina para o JM do CIA de Mariana sobre obras em pontes em Santa Rita Durão

Criação de lâmina para o JM do CIA de Mariana sobre obras nas vias de distritos de Mariana

Produção de áudio (Momento da Reparação) sobre as manutenções de vias e conscientização no trânsito no território do Alto Rio Doce.

Produção de áudio (Momento Renova) anunciando as obras em pontes de Barra Longa.

Produção de matéria para a 23ª edição do Voz da Comunidade sobre os reparos nas duas pontes em Santa Rita Durão

Produção de pílula de WhatsApp sobre as manutenções de vias e conscientização no trânsito em Mariana e no Alto Rio Doce.

Produção de pílula de WhatsApp sobre as obras de reformas em pontes de Barra Longa.

Suporte ao PG011 Recuperação das Escolas e Reintegração da Comunidade Escolar

Produção de matéria para o boletim Terra da Gente sobre a atuação do programa de recuperação de escolas e reintegração da comunidade escolar no território.

Fatos relevantes do mês

Suporte aos Programas

Suporte ao PG012 Memória Histórica, Cultural e Artística

Criação de lâmina para o JM do CIA de Mariana sobre inscrições abertas para o Coral de Paracatu

Produção de áudio (Momento da Reparação) divulgando o Torneio de Futebol de Veteranos, em Rio Doce.

Produção de matéria para a 23ª edição do Voz da Comunidade sobre festas em devoção a nossa senhora Aparecida

Produção de matéria para o boletim Terra da Gente sobre a atuação do programa de memória histórica, cultural e artística no território.

Produção de matéria para o boletim Terra da Gente sobre os cursos de música que estão sendo oferecidos no território via PG-12.

Suporte ao PG013 Turismo, Cultura, Esporte e Lazer

Criação de lâmina para o JM do CIA de Mariana sobre convite para o Encontro Internacional de Palhaços apoiado pelo Edital Doce

Produção de áudio (Momento da Reparação) para distribuição por whatsapp sobre os resultados do projeto Impulso Rio Doce.

Produção de matéria para a 23ª edição do Voz da Comunidade sobre o Iron Biker

Produção de matéria para o boletim Terra da Gente sobre a atuação do programa de cultura, turismo, esporte e lazer.

Fatos relevantes do mês

Suporte aos Programas

Suporte ao PG017 Retomada das Atividades Agropecuárias

Produção de calendário ATER 2023 para os produtores rurais do território com o intuito de disseminar informações importantes sobre plantio, temperatura, vacinas etc

Produção de matéria para a edição de outubro do Jornal Voz da Foz sobre as ações de assistência técnica e rural para os produtores da Foz.

Produção de pílula de WhatsApp sobre o curso de apicultura para os produtores rurais de Barra Longa e região.

Produção de vídeo de prestação de contas das ações em desenvolvimento referentes à retomada das atividades agropecuárias no território.

Publicação de matéria sobre o projeto Quintais Produtivos na 4ª edição do boletim Vozes do Território.

Suporte ao PG018 Desenvolvimento e Diversificação Econômica

Produção de matéria para a 23ª edição do Voz da Comunidade sobre negócios gerados pelo Brota nos reassentamentos

Produção de matéria para a edição de outubro do Jornal Voz da Foz sobre o projeto Rio Doce, Doce Mar, que está sendo realizado com as comunidades de Regência e de Povoação.

Suporte ao PG020 Estímulo à Contratação Local

Criação de lâmina para o JM do CIA de Mariana sobre vagas do Recoloca Rio Doce para Mariana

Produção de matéria para a edição de outubro do boletim Voz do Rio Doce sobre as vagas abertas para o Recoloca Rio Doce no Médio Rio Doce.

Fatos relevantes do mês

Suporte aos Programas

Suporte ao PG020 Estímulo à Contratação Local

Criação de lâmina para o JM do CIA de Mariana sobre cursos ofertados pelo Recoloca Rio Doce

Criação de lâmina para o JM do CIA de Mariana sobre vagas de empregos ofertadas em Mariana

Produção de áudio (Momento da Reparação) divulgando os cursos em parceria com o Senai com inscrições abertas para moradores de Ipatinga e região.

Produção de áudio (Momento da Reparação) para distribuição por whatsapp da edição mensal da série de apresentação dos programas da reparaç;ao (Programa de Estímulo à Contratação Local)

Produção de matéria para o mural do Centreo de Informações e Atendimento de Linhares sobre o Encontro de Negócios a ser realizado em Linhares.

Produção de pílula de WhatsApp com as oportunidades de emprego em Barra Longa e região.

Produção de pílula de WhatsApp para informar a população de Ipatinga e região sobre as inscrições para a turma I do curso de Eletricidade Básica em parceria com o Senai.

Produção de pílula de WhatsApp para informar a população de Ipatinga e região sobre as inscrições para a turma II do curso de Eletricidade Básica em parceria com o Senai.

Produção de pílula de WhatsApp para informar a população de Ipatinga e região sobre as inscrições para o curso de Eletrodo Revestido, em parceria com o Senai.

Fatos relevantes do mês

Suporte aos Programas

Suporte ao PG021 Auxílio Financeiro Emergencial

Produção de áudio (Momento Renova) com esclarecimentos sobre a volta do pagamento do Auxílio Financeiro Emergencial (AFE).

Produção de pílula de WhatsApp com esclarecimentos sobre a volta do pagamento do Auxílio Financeiro Emergencial (AFE).

Produção de pílula de WhatsApp informando sobre o pagamento em parcela única do retroativo do Auxílio Financeiro Emergencial (AFE).

Suporte ao PG025 Recuperação Ambiental Área 1

Produção de matéria para o boletim Terra da Gente sobre a recuperação de nascentes na região de Barra Longa.

Suporte ao PG026 Recuperação de Áreas de Preservação Permanente APP

Produção de programa de rádio sobre importância da restauração florestal para recuperação do rio Doce e os investimentos feitos na região

Suporte ao PG028 Conservação da Biodiversidade

Produção de matéria para a edição de outubro do Jornal Voz da Foz sobre peixe com anomalia pescado na foz do rio Doce.

Suporte ao PG031 Coleta e Tratamento de Esgoto e Destinação de Resíduos Sólidos

Produção de matéria para a edição de outubro do boletim Voz do Rio Doce sobre as obras de tratamento de esgoto e destinação de resíduos sólidos na região.

Suporte ao PG032 Melhoria dos Sistemas de Abastecimento de Água

Produção de matéria para a edição de outubro do Jornal Repara Cidadão sobre como funciona o Programa de Melhoria dos Sistemas de Abastecimento de Água.

Produção do programa de rádio Momento da Reparação sobre a marca de 35 km de tubulação instalada nas obras da nova captação de água de Governador Valadares.

Fatos relevantes do mês

Suporte aos Programas

Suporte ao PG033 Programa de Educação para Revitalização do Rio Doce

Produção de matéria para o boletim Terra da Gente sobre a última fase do projeto Lideranças Jovens.

Produção de programa de rádio sobre o projeto Rio Doce Escolar que está com inscrições abertas para formação de professores de rede pública. São vagas para especialização e aperfeiçoamento no ES.

Produção do programa de rádio Momento da Reparação sobre a aula inaugural do curso técnico em agropecuária com ênfase em Agroecologia, no assentamento oziel, em Governador Valadares

Suporte ao PG035 Informação para a População

Produção de áudio (Momento Renova) sobre a reformulação da plataforma do Centro de Informação Técnica (CIT).

Produção de matéria para a 23ª edição do Voz da Comunidade sobre a plataforma do CIT

Produção de matéria para a edição de outubro do Jornal Repara Cidadão sobre o portal do CIT - Centro de Informação Técnica e convidando a comunidade a inscrever suas histórias sobre o rompimento.

Produção de matéria para o mural do Centro de Informações e Atendimento de Linhares sobre o Portal da Transparência.

Produção de programa de rádio sobre a plataforma do Centro de Informação Técnica (CIT) e convite para que a população acesse e cadastre suas histórias sobre o rompimento

Produção do programa de rádio Momento da Reparação convidando a população a conhecer a plataforma CIT Rio Doce e enviar seu relato.

Publicação de matéria sobre a plataforma do CIT na 4ª edição do boletim Vozes do Território.

Indicadores

I01 - Pilar comunicação - Nível de acesso da população a informações sobre os programas atuantes no território

Pontos



Gráfico 28: I01 - Pilar comunicação - Nível de acesso da população a informações sobre os programas atuantes no território - Frequência Anual

I02 - Pilar comunicação - Grau de compreensão dos atingidos sobre os programas executados pela Fundação Renova no território

Percentual(%)



Gráfico 29: I02 - Pilar comunicação - Grau de compreensão dos atingidos sobre os programas executados pela Fundação Renova no território - Frequência Anual

Indicadores

I03 - Pilar comunicação - Conhecimento das ações de comunicação com o território

Pontos



Gráfico 30: I03 - Pilar comunicação - Conhecimento das ações de comunicação com o território - Frequência Anual

I04 - Pilar comunicação - Percepção de qualidade da comunicação com o território

Pontos



Gráfico 31: I04 - Pilar comunicação - Percepção de qualidade da comunicação com o território - Frequência Anual

PG007 Programa de Assistência aos Animais

Eixo Terra e Água

Objetivo

Assistência aos animais domésticos extraviados e desalojados pelo evento de rompimento da barragem de Fundão, na região de Mariana e Barra Longa, na forma prevista nas cláusulas 73 à 75 do TTAC.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	73	Caput	Em andamento
Cláusula	74	a	Encerrada
Cláusula	74	b	Encerrada
Cláusula	74	c	Em andamento
Cláusula	74	d	Em andamento
Cláusula	74	e	Encerrada
Cláusula	74	f	Em andamento
Cláusula	74	g	Em andamento
Deliberação	226	2	Em andamento
Deliberação	328	1	Em andamento
Deliberação	328	2	Concluída Internamente
Deliberação	328	3	Em andamento
Deliberação	563	4	Planejada

Entregas do ano de 2022

Em virtude do replanejamento do programa, visando o alinhamento entre Estrutura Analítica de Projetos e Estrutura Analítica de Custos, os marcos previstos foram replanejados para após 2022.

Grandes números do programa

- 1287 registros de prontuários de atendimentos internos, sendo 161 adoções, 449 devoluções, 197 óbitos, 13 extravios, 30 registros de dados insuficientes de destinação e 437 animais sob a guarda temporária da Fundação Renova;
- Atualmente existem 336 bovinos, 56 equinos, 24 caninos, 18 suínos, 3 cães e 3 muaras sob a guarda temporária da Fundação Renova nos Centros de Acolhimento Temporário de Animais 1 e 2;
- No âmbito de atendimentos externos do programa, foram registrados 1813 prontuários médicos para animais atendidos nas propriedades de origem ou em situação de moradia temporária.

Fatos relevantes do mês

Não houve fatos relevantes no mês.

Indicadores

I01 - Porcentagem de conformidade em bem-estar animal nos Centros de Acolhimento Temporário de Animais (CATA 1 e 2)

Percentual(%)

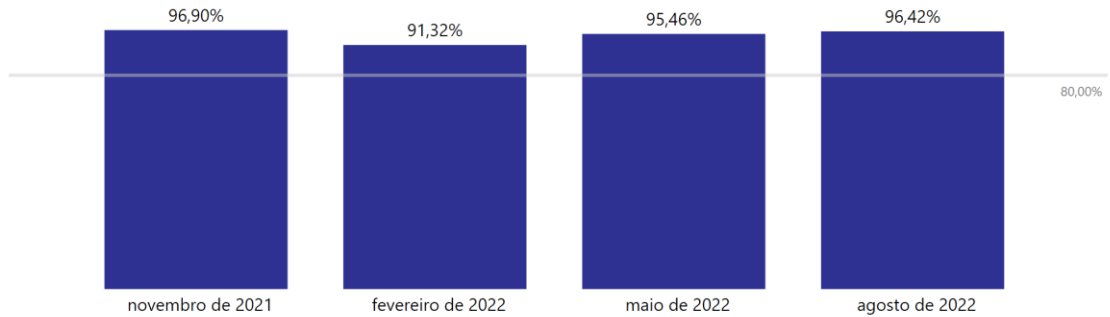


Gráfico 1:I01 - Porcentagem de conformidade em bem-estar animal nos Centros de Acolhimento Temporário de Animais (CATA 1 e 2) - Frequência Trimestral

Os resultados apontados nos gráficos a seguir são referentes à aferição do indicador de conformidade em bem-estar animal no período da estação de inverno (agosto de 2022).

O reporte de resultados deste indicador para a estação de primavera/22 está previsto para o relatório de dezembro de 2022 (ref. novembro/22).

Indicadores de Acompanhamento

O resultado por espécie para o indicador Porcentagem de conformidade em bem-estar animal nos CATA 1 e 2 está apresentado a seguir:

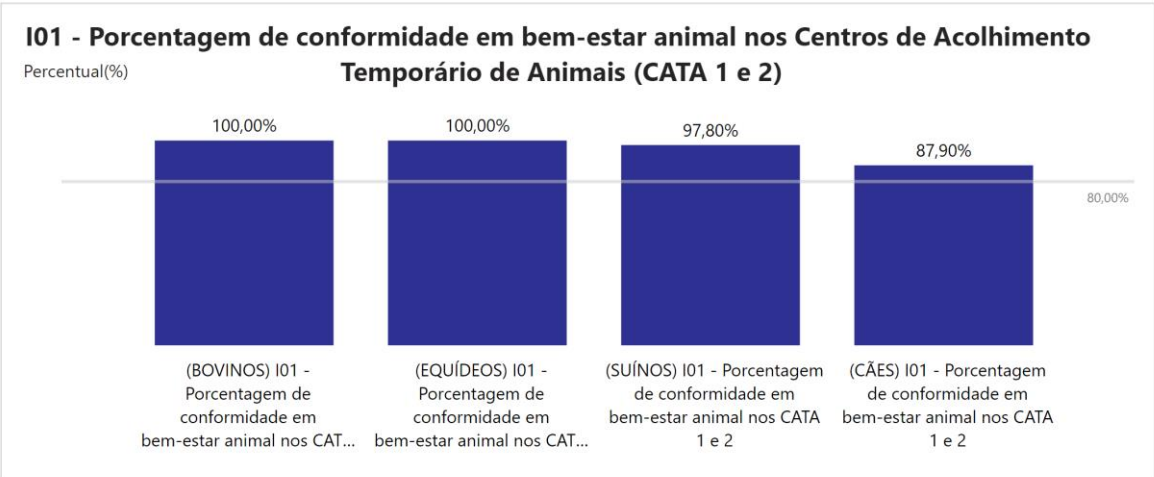


Gráfico 2: I01 - Porcentagem de conformidade em bem-estar animal nos Centros de Acolhimento Temporário de Animais (CATA 1 e 2) - Frequência Trimestral

Os desvios apresentados em relação à meta não são significativos do ponto de vista de atendimento aos quesitos mínimos de bem-estar animal. A metodologia utilizada prevê um padrão no escalonamento dos diferentes graus, de modo que ações possam ser tomadas prioritariamente em formato preventivo.

GRAU DE BEM-ESTAR	REFERÊNCIA EM %
Muito Alto	≥ 90%
Alto	≥ 80%
Regular	≥ 60%
Baixo	≥ 30%
Muito Baixo	≤ 29%

Quadro 1: Percentuais de referência para os 5 graus de bem-estar

Indicadores

I02 - Porcentagem de animais em processos adotivos finalizados

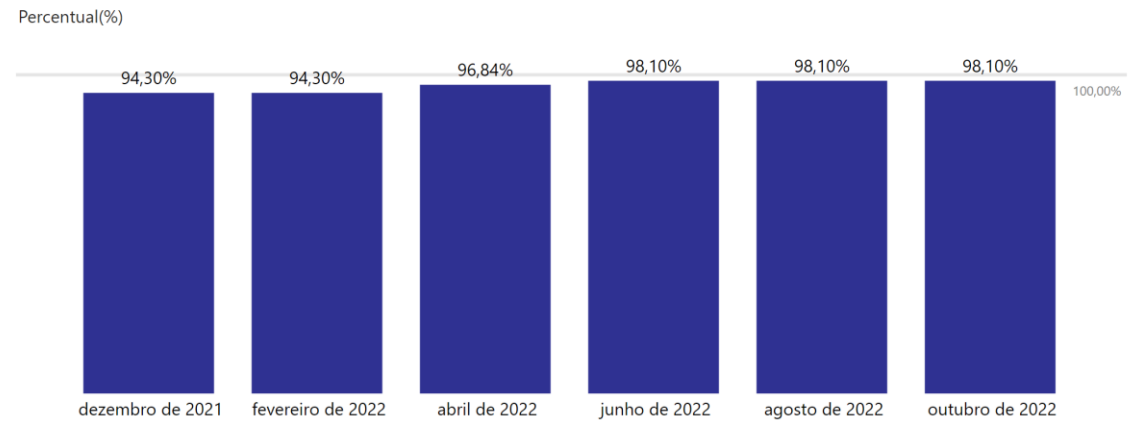


Gráfico 3: I02 - Porcentagem de animais em processos adotivos finalizados - Frequência Bimestral

No bimestre de setembro e outubro de 2022 não houve ocorrência de finalização de adoções, mantendo-se o valor aferido para o este indicador no último bimestre. A próxima verificação deste está prevista para o mês de janeiro de 2023 (referência ao bimestre nov./dez. de 2022).

Indicadores

I03 - Porcentagem de animais sob guarda temporária restituídos na fase de reassentamento

Percentual(%)

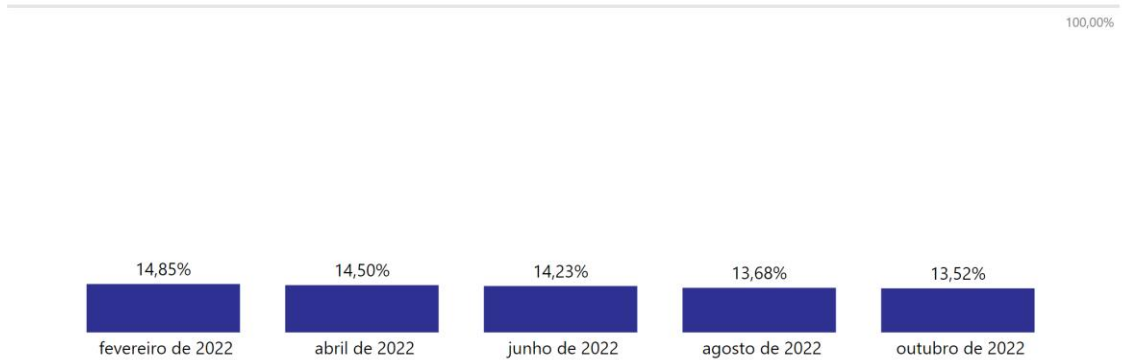


Gráfico 4: I03 - Porcentagem de animais sob guarda temporária restituídos na fase de reassentamento- Frequência Bimestral

No bimestre de setembro e outubro de 2022, não houve ocorrências de novas restituições definitivas de animais. A próxima verificação deste está prevista para o mês de janeiro de 2023 (referência ao bimestre nov./dez. de 2022). variação entre os dois últimos bimestres se deu em função de novos registros de animais sob guarda da Fundação Renova provenientes de nascimentos e/ou recolhimentos, conforme previsto no indicador.

ERRATA DO INDICADOR I03 – JUNHO DE 2022

Durante as atividades do 3º Ciclo de Auditoria Externa do Programa, realizada pela empresa EY, foi constatada divergência entre o valor reportado pela Fundação no bimestre “maio/junho” de 2022. A porcentagem encontrada pela EY (I03 = 68/478 = 14,23%) diverge do valor reportado pela equipe do PG007 por meio do Relatório Mensal de Atividades de julho de 2022 (14,14%).

A divergência de valor verificada pela auditoria procede, e o erro se deu em função da inclusão de 3 animais disponíveis para adoção no universo total de animais sob guarda temporária. Sendo que, para este indicador, o correto é considerar apenas o universo de animais que possuem tutor e que estão sob guarda do PG07.

Indicadores

I04 - Porcentagem de finalização dos acompanhamentos pós-ocupação

Percentual(%)

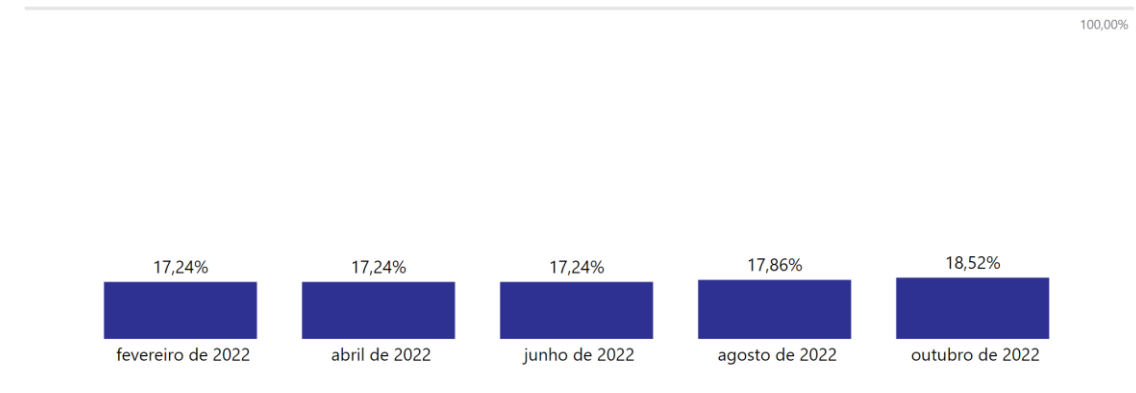


Gráfico 5: I04 - Porcentagem de finalização dos acompanhamentos pós-ocupação - Frequência Bimestral

No bimestre de setembro e outubro de 2022, não houve ocorrências de novas restituições definitivas de animais. A próxima verificação deste está prevista para o mês de janeiro de 2023 (referência ao bimestre nov./dez. de 2022). A variação entre os dois últimos bimestres se deu em função do registro de um óbito de um animal para família que ainda se encontra em fase de reparação do direito à moradia.

PG008 Reconstrução de Vilas

Eixo Reconstrução e Infraestrutura

Objetivo

Reconstrução, recuperação e realocação das famílias que sofreram deslocamento físicos e/ou econômicos das localidades de Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo, Gesteira e famílias impactadas residentes na área rural às margens do Rio Gualaxo do Norte com projetos específicos por localidade. Após a conclusão da reconstrução e do reassentamento será realizado o monitoramento dos reassentamentos com abrangência dos programas sociais nas localidades por até 36 meses.


Projeto Reconstrução de Vilas

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	76	Caput	Judicializada
Deliberação	257	1	Concluída Internamente
Deliberação	96	2	Concluída Internamente
Deliberação	96	4	Concluída Internamente

Projeto Reconstrução de Bento Rodrigues

Entregas acumuladas até o ano de 2022

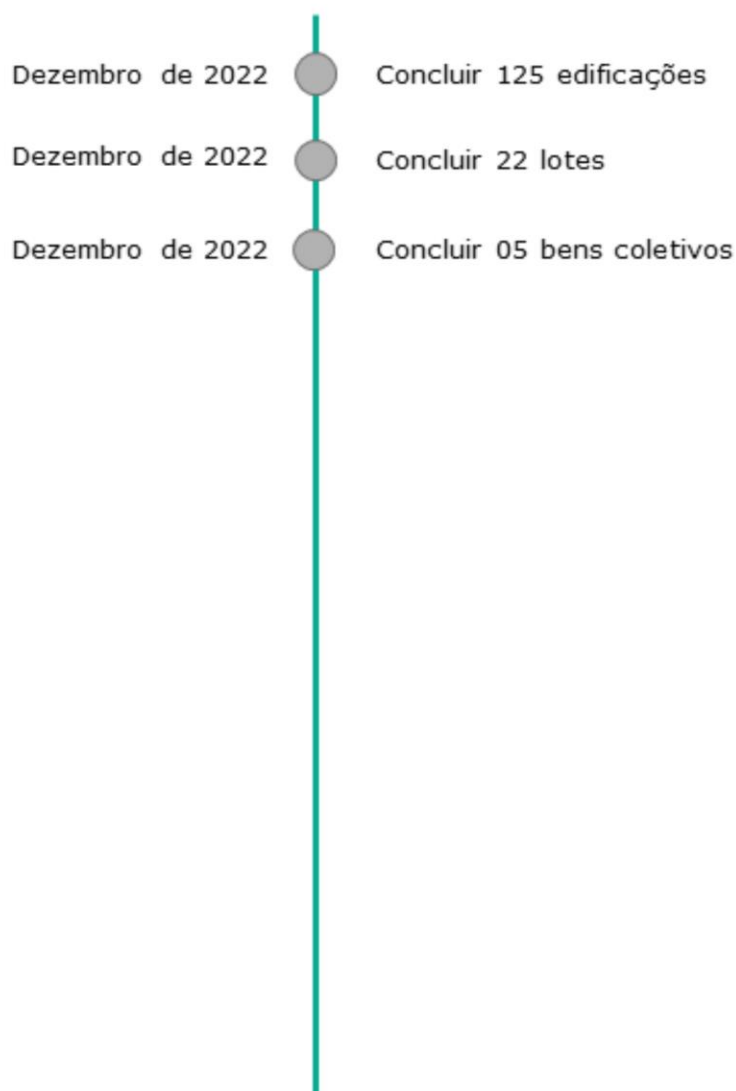

● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Projeto Reconstrução de Bento Rodrigues

Grandes números do projeto

Social:

- 196 famílias atendidas (Com Novos Núcleos).

Obras:

- 70 Construções de **edificações** (Casas, comércios e mistos) com obra iniciada;
- 84 **Edificações** (Casas, comércios e mistos) concluídas;
- 6 Construções de **bens coletivos** com obras iniciadas;
- 4 Construção de **bens coletivos** concluídos;
- 9 Contratos assinados para construções de **edificações** (Casas, comércios e mistos;)
- 14 estruturações de **lotes vagos** com obras iniciadas;

Engenharia:

- **Projetos conceituais concluídos** ou não necessários para 183 edificações (Casas, comércios e mistos), 25 lotes vagos e 16 bens coletivos;
- **Projeto básicos concluídos** ou não necessários para 182 edificações (Casas, comércios e mistos), 25 lotes vagos e 17 bens coletivos;
- **Projetos protocolados** na prefeitura ou não necessários para 178 edificações (Casas, comércios e mistos), 23 lotes e 16 bens coletivos;
- **Licenças simplificadas** ou não necessárias para 23 lotes vagos;
- **Alvarás** emitidos ou não necessários para 176 edificações (Casas, comércios e mistos) e para 14 bens coletivos.

Projeto Reconstrução de Bento Rodrigues

Fatos relevantes do mês

Finalização de obra do ID CC.218.

Finalização de obra do ID 83.

Finalização de obra do ID 77.

Finalização de obra do ID 37.

Finalização de obra do ID 35.

Finalização de obra do ID 261.

Finalização de obra do ID 218.

Finalização de obra do ID 207.

Finalização de obra do ID 04.

Projeto Reconstrução de Bento Rodrigues

Fatos relevantes do mês

Finalização do serviço de estruturação de lote - ID 59A.


Finalização de obra dos IDs 135-UH1 e 135-UH2.

Finalização de obra do IDs 160.

Finalização de obra do ID 21D-UH2.

Projeto Reconstrução de Paracatu de Baixo

Entregas acumuladas até o ano de 2022



Dezembro de 2022	●	Concluir 37 edificações
Dezembro de 2022	●	Concluir 04 bens coletivos
Dezembro de 2022	●	Concluir 02 lotes

● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Projeto Reconstrução de Paracatu de Baixo

Grandes números do projeto

Social:

- 79 famílias atendidas (Com novos núcleos);

Obras:

- 56 Edificações (Casa, comércio e misto) com obras iniciadas;
- 7 Bens coletivos com obras iniciadas;
- 2 Lotes com obras iniciadas;

Engenharia:

- **Projetos conceituais concluídos** ou não necessários para 69 edificações (Casas, comércios e mistos), 8 lotes vagos e 13 bens coletivos;
- **Projeto básicos concluídos** ou não necessários para 70 edificações (Casas, comércios e mistos), 7 lotes vagos e 13 bens coletivos;
- **Projetos protocolados** na prefeitura ou não necessários para 64 edificações (Casas, comércios e mistos), 7 lotes e 12 bens coletivos;
- **Licenças simplificadas** ou não necessárias para 7 lotes vagos;
- **Alvarás** emitidos ou não necessários para 64 edificações (Casas, comércios e mistos) e para 12 bens coletivos.

Nota¹: Edificações são correspondentes a "casas e pontos comerciais".

Projeto Reconstrução de Gesteira

Entregas para o ano de 2022

Devido a judicialização do Reassentamento de Gesteira, não há entregas previstas.

Projeto Reconstrução de Gesteira

Grandes números do projeto

Social:

- Atendimentos para 37 **famílias;**
- 29 famílias com acordo homologados;
- 24 atendimentos finalizados para famílias que possuem acordo homologado, **com aquisição de imóvel;**
- 4 atendimentos finalizados para famílias que possuem acordo homologado, **sem aquisição de imóvel;**

Projeto Reassentamento Familiar e Reconstruções

Entregas acumuladas até o ano de 2022



● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Projeto Reassentamento Familiar e Reconstruções

Grandes números do Familiar

Obras:

- 6 construções de casas novas com obra iniciada;
- 1 reformas com obra iniciada;
- 1 estruturações de lotes vagos com obra iniciada;
- 1 reconstruções com obra iniciada;

Engenharia:

- **Projetos conceituais concluídos** ou não necessários para construções de 78 edificações (Casa nova, reforma, comércios e mistos), e 10 lotes vagos;
- **Projeto básicos concluídos** ou não necessários para construções de 79 edificações (Casa nova, reforma, comércios e mistos) e 9 lotes vagos;
- **Projetos protocolados** na prefeitura ou não necessários para construções de 72 edificações (Casa nova, reforma, comércios e mistos), e 9 lotes vagos;
- **Licenças, alvarás, dispensa** emitidos pela prefeitura ou não necessários para 71 construções de edificações (Casa nova, reforma, comércios e mistos), para 8 lotes vagos.

Projeto Reassentamento Familiar e Reconstruções

Grandes números do Familiar

Social:

- 105 famílias atendidas (com novos núcleos);
- 93 edificações adquiridas para famílias que optaram por esta modalidade de reparação do direito à moradia (com Novos Núcleos);
 - 49 construção de casas novas;
 - 34 edificações para reformar;
 - 10 lotes vagos (executar obra de adequação);
- Atendimento a 13 famílias na modalidade de reconstruções nas Comunidades Rurais;
- Reconstruções de 16 edificações;
- Reconstruções entregues para 14 **edificações**;

Projeto Reassentamento Familiar e Reconstruções

Fatos relevantes do mês

Finalização do serviço de estruturação de lote - ID 151.

Finalização de obra do ID 87.

Indicadores de acompanhamento

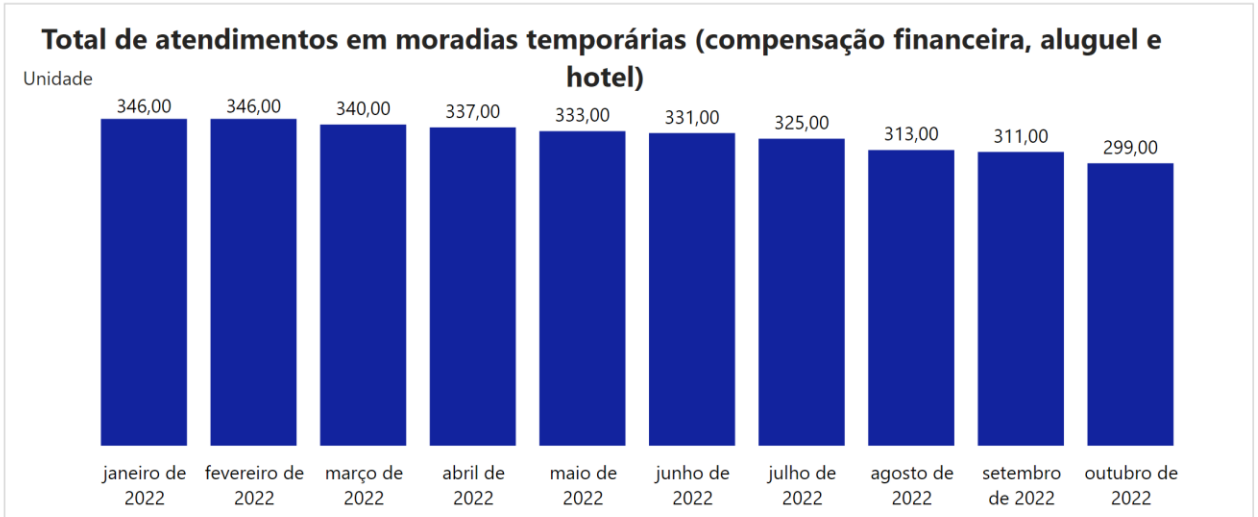


Gráfico 1: Total de atendimentos em moradias temporárias (compensação financeira, aluguel e hotel) - Frequência Mensal

PG009 Recuperação do Reservatório da UHE Risoleta Neves

Eixo Terra e Água


Objetivo

Restabelecimento das condições de operação da Usina Hidrelétrica Risoleta Neves por meio da implantação de ações de desassoreamento na área de alagamento da hidrelétrica e de reparo de infraestrutura.


Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	79	Caput	Judicializado
Cláusula	150	§3º	Judicializado
Deliberação	30	N/A	Concluído internamente
Deliberação	80	2.1	Judicializado
Deliberação	80	2.2	Concluído internamente
Deliberação	80	4.1	Concluído internamente
Deliberação	80	4.2	Concluído internamente
Deliberação	225	2	Judicializado
Deliberação	286	3	Concluído internamente

Entregas do Ano de 2022

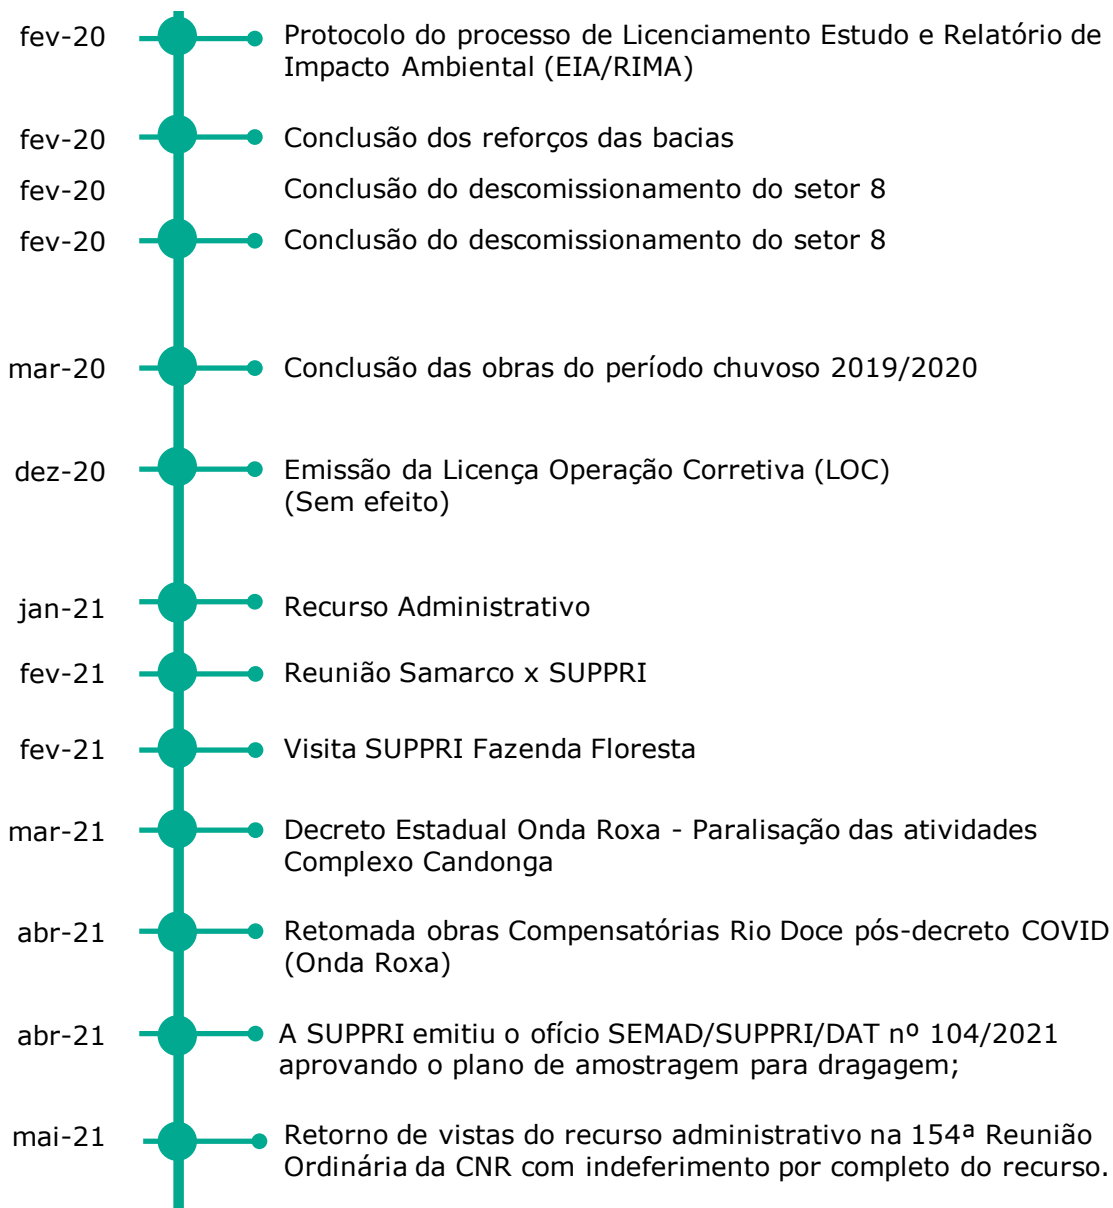

Entregas do Ano de 2022

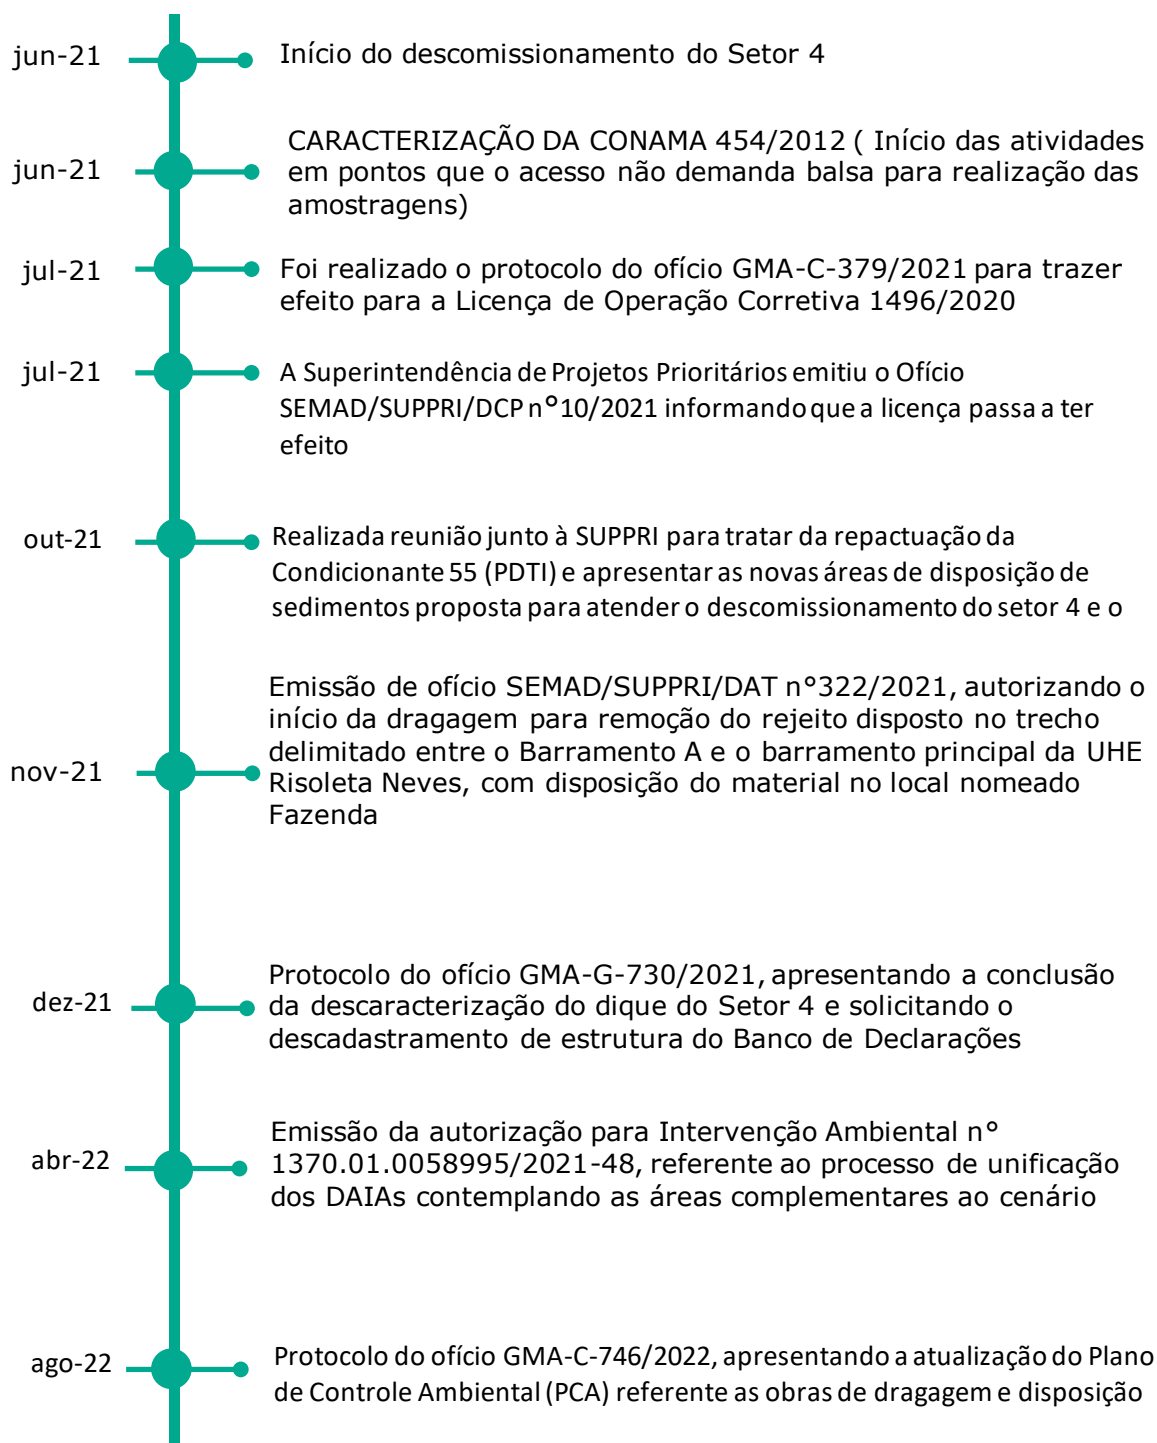

Grandes números do programa

- **1ª fase** – período emergencial 959 mil m³ de material foram bombeados do reservatório da Usina Risoleta Neves para as áreas de disposição.
- **2ª fase** – Em cumprimento da LOC 1496/2020, após analisados resultados da cond. 38 (caracterização dos sedimentos conforme CONAMA 454/2012), foi autorizada pela SUPPRI a retomada na remoção dos sedimentos nas proximidades do barramento principal, considerando as informações conhecidas e descritas no EIA/RIMA, visando num primeiro momento a retomada da UHE Risoleta Neves.

Até a data de 30/10/2022:

- O volume de sedimentos removidos do reservatório foi de **420.341 m³**.
- Na obra de reforço do barramento principal da UHE Risoleta Neves, foram executados **19.507 m³** de concreto distribuídos entre os blocos BME1, BME2, BME3, BME4, BME5, BME6, BMD1, BMD3, BMD4, BMD5, BMD6 e BML.

Fatos relevantes do mês

- ✓ **Remoção de sedimentos – proximidades do barramento principal da UHE (na região dos 400M)**
- Remoção de Sedimentos



Figura 1 – Ciclo de Atividades de descarga nas baias localizadas no Ponto de Apoio



Figura 2 – Remoção de sedimentos de dois conjuntos guindaste/ balsa e um conjunto escavadeira/balsa

✓ Disposição de Sedimentos Provenientes do Reservatório da UHE (área dos 400m)

• Áreas de Desaguamento Primário e Secundário



Figura 3 - Foto aérea das áreas de desaguamento primário e secundário do Setor 11



Figura 4 - Foto aérea das áreas de desaguamento primário do reservatório da UHE



Figura 5 - Foto aérea das áreas de desagamento localizadas no setor 1

- Disposição final de Sedimentos



Figura 6 - Compactação de sedimentos O.E Dique Principal



Figura 7 – Disposição de sedimentos Berma do Equilíbrio



Figura 8 – Disposição de sedimentos Bacia 4 e ADME2



Figura 9 – Disposição de sedimentos Bacia 2

✓ Recuperação dos pontos de margens

✓ Dentre os 79 pontos identificados como necessitados de algum tipo de recuperação, têm-se a seguinte situação:

Pontos já executados em recuperação	Obras Entregues	Obras em Andamento	Obras a Iniciar
• 13	• 57	• 07	• 0

Descrição	Total Previsto	Concluído	Saldo
Margem direita	24	24	0
Margem Esquerda	53	33	20
TOTAL	77	57	20

Tabela 1 - Status 01/11 - Recuperação dos pontos de margens UHERN

▪ Destaques:

Ponto 23

✓ Status atual:

- Execução de enrocamento.



Figura 10 –Foto aérea ponto 23

Pontos 116

- ✓ Status atual:
 - Concluído.



Figura 11 – Foto aérea ponto 116

Ponto 1

- ✓ Status atual:
 - Concluído.



Figura 12 – Foto aérea ponto 1

Ponto 54

- ✓ Status atual:
 - Em andamento.



Figura 13 – Foto aérea ponto 54

➤ UHE Candonga

▪ Reforço Barramento Principal UHE

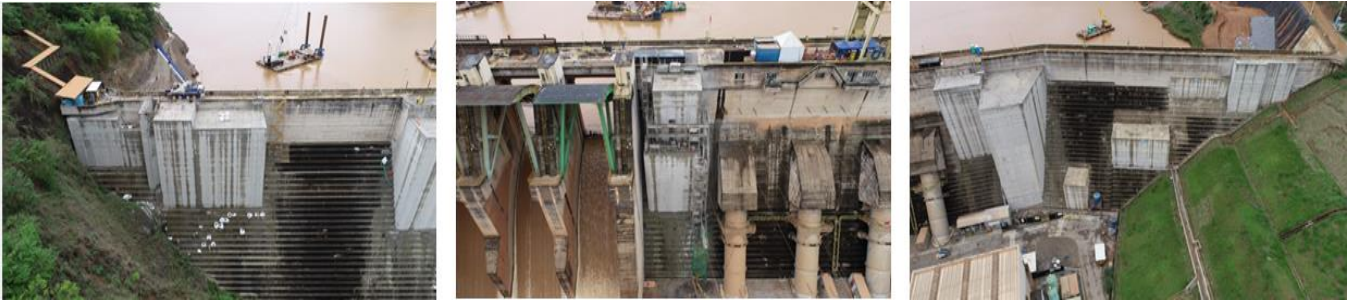


Figura 14 – Foto aérea blocos MD e ME

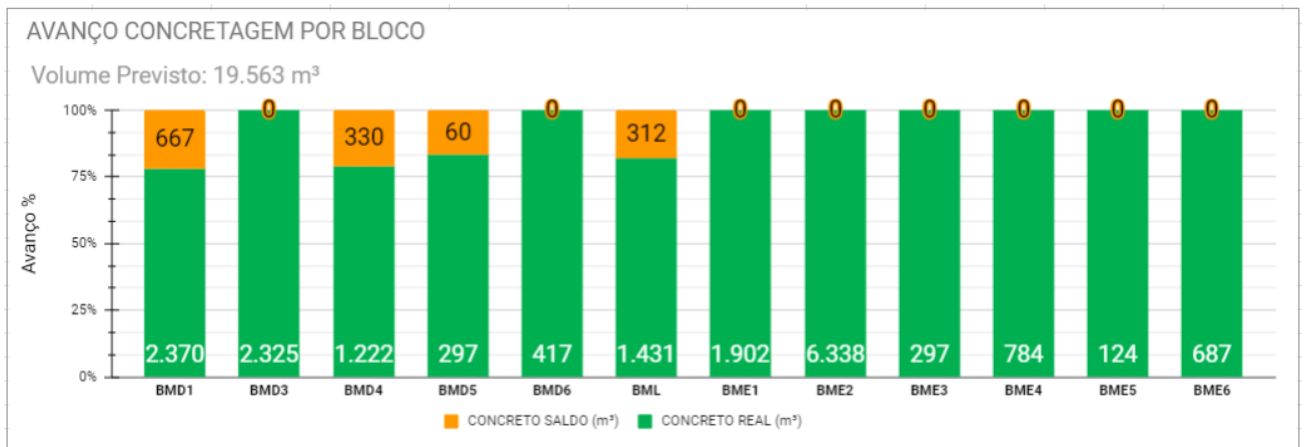


Figura 15 – Avanço concretagem por bloco (Vol. Real. Acum.: 18.192 m³)

- Atividades de Limpeza e Reabilitação das UGs
 - Limpeza à Jusante e a Montante da Casa de Força

Atividade Jusante	Avanço
Mergulho para Limpeza das ranhuras (Jusante)	82,6%
Limpeza do acesso aos tuneis saída d água (Jusante)	95,6%
Mergulho para Limpeza dos tuneis saída d água (Jusante)	66,7%
Limpeza do canal de fuga (Jusante)	55,1%
Geral	69,1%
Atividade Montante	Avanço
Mergulho para limpeza da tomada d'agua (Montante)	40,3%
Retirada das grades da tomada d água (Montante)	0,0%
Geral	36,3%

Tabela 2 - Avanço Atividades à Jusante

Status atual:

- Mergulhos para limpeza das ranhuras e dos túneis de saída d'água;
- Limpeza canal de fuga jusante em andamento;
- Mergulhos para limpeza dos túneis da tomada d'água.



Figura 16 – Fotos da limpeza jusante e montante

▪ Reabilitação das UG's

Atividades	Avanço Físico
Escopo Inicial	77,98%
Canteiro	0,00%
Engenharia e Suprimentos	100,00%
Materiais de Fornecimento	100,00%
BOP - Tubulação sistema do filtro autolimpante	100,00%
Comporta vagão Tomada d água	70,33%
Grades e Comporta Ensecadeira da Tomada D' água	35,17%
UG1- Atividades na Casa de Força	100,00%
UG2- Atividades na Casa de Força	98,00%
UG3- Atividades na Casa de Força	89,00%
Transformador Elevador	60,33%
Vertedouro	87,00%
Comissionamento sem água	16,00%
Comissionamento com água	0,00%
Comportas ensecadeiras jusante - Tubo de Sucção	0,00%
Serviços Adicionais	97,73%
Projeto Consolidado	82,59%

Tabela 3 - Avanço Físico Reabilitação da UG's



Figura 17 – Atividades na casa de força

✓ Status atual:

- Comissionamento a seco da UG1;
- Montagem da máquina UG2;
- Montagem da máquina UG3;
- Instalação das talas das comportas da tomada d'água;
- Recuperação metalúrgica da caixa espiral e sucção da UG3;
- Troca da chapa danificada da VT3.

➤ MONITORAMENTO DAS ESTRUTURAS

Nota: As informações apresentadas não coincidem necessariamente com o mês de referência do reporte em função dos prazos necessários ao tratamento dos dados.

Destques:

- Permanece em andamento o aterro de conquista para reconstituição das cotas na margem direita do Barramento B.
- Os sensores SAT instalados nos Barramentos Metálicos permaneceram com suas leituras em níveis normais de operação.
- Os marcos superficiais do Barramento C permanecem estabilizados.
- O monitoramento dos níveis d'água e piezômetros segue apresentando redução dos níveis.
- Os marcos da encosta da antiga ADME OE não apresentam tendência de deslocamento.
- Um marco da ADME OD permanece com tendência de recalque. Os dois novos marcos instalados na mesma seção transversal da estrutura não apresentaram recalque em suas primeiras leituras. O monitoramento diário dos marcos segue em andamento. Não houve variação significativa na reabertura das trincas monitoradas no período.
- Os marcos superficiais e crack meters da ombreira direita do contrapilamento permaneceram sem deslocamentos significativos.
- O monitoramento dos marcos da Bacia 8 permanece sem deslocamentos significativos após o fechamento da estrutura.

- O monitoramento dos medidores de nível d'água instalados no entorno da Bacia 4 apresentou redução dos níveis d'água durante sua escavação.
- Foi finalizada a instalação dos marcos na Bacia 2. Está em andamento o rastreio do marco de centragem forçada e da referência para início do monitoramento.
- O monitoramento da tenda da Samarco foi reiniciado após a instalação de um marco de centragem forçada e da fixação de prismas nos pontos monitorados. Não foram registrados deslocamento significativos até o momento, nem tampouco novas anomalias no local. A casa do Colono será interditada preventivamente.
- Os marcos superficiais da Pedreira Corsini não apresentaram variação no período. A área segue isolada.
- As obras da fase emergencial da encosta do antigo campo de futebol de Santana do Deserto foram finalizadas. Foram instalados quatro novos instrumentos para monitoramento da freática e das poropressões. Os instrumentos estão em fase de liberação para início do monitoramento.

Recomendações:

- Finalizar o lançamento do enrocamento na margem direita do Barramento Metálico B.
- Iniciar monitoramento da Bacia 2.
- Realizar testes nos sensores verticais instalados nos barramentos, de forma semelhante ao realizado nos sensores horizontais.
- Finalizar as campanhas de investigação geológico-geotécnicas da ADME OD e do talude da OD do contrapilhamento, que irão subsidiar as análises de estabilidade.
- Dar continuidade e acompanhamento do programa de inspeções, monitoramentos e manutenções preventivas e corretivas das estruturas.

➤ **MONITORAMENTO AMBIENTAL**

Nota: Informações de monitoramento e fotos apresentadas referem-se ao período da campanha, o qual não coincide com o mês de referência do reporte em função dos prazos necessários ao tratamento dos dados. As imagens visam representar os locais quando da realização das amostragens.

✓ **Monitoramento de Efluentes – Bacia 2**

- Ponto seco, haja vista que não havia efluente chegando à bacia 2.

✓ **Monitoramento de Efluentes – Bacia 1**

- Entrada: Ponto seco, haja vista que não havia efluente chegando à bacia 1.
- Saída: Houve bombeamento para o Rio Doce, sem desvios.

✓ **Monitoramento Hídrico Superficial (Qualidade da água superficial)**

Conforme relatado no relatório anterior:

Conclusões / considerações:

- O ponto de monitoramento Córrego Micaela Montante, proposto nos planos de monitoramento dos estudos de licenciamento localiza-se dentro da Área Diretamente Afetada (ADA). Por conceito esse ponto poderá sofrer impactos provenientes do empreendimento e a qualidade deve ser garantida à jusante da ADA (que se finda no Dique Micaela).
- Especificamente no que tange aos parâmetros Ferro, Manganês e Alumínio, Candonga está localizada a menos de 5 km do cinturão do grupo Dom Silvério, composto por rochas ultramáficas, o que reforça fortemente o indicativo de que os índices encontrados no monitoramento refletem o background da região.
- Os estudos de valores de referência concluirão sobre essas hipóteses.
- Síntese conclusiva – Córrego Micaela:
 - Desvios de Ferro Dissolvido e Manganês nos pontos de montante e jusante (jusante somente Manganês). Estes configuram-se como background da região.
- Síntese conclusiva – Córrego dos Borges:
 - Desvios de Cor Verdadeira, Ferro Dissolvido, Manganês e Turbidez nos pontos de montante e jusante. Como houve desvio no ponto de montante onde não há influência do empreendimento conclui-se por não guardar nexos causal com o empreendimento.
- Síntese conclusiva – Rio de Peixe:
 - Desvios de Cor Verdadeira, Fósforo, Manganês e Turbidez nos pontos de montante e jusante. Como houve desvio no ponto de montante onde não há influência do empreendimento conclui-se por não guardar nexos causal com o empreendimento.

- Síntese conclusiva – Ponto de Monitoramento Fazenda Jerônimo:
 - Desvio pontual de Manganês e Ferro dissolvido. Este monitoramento é feito em área brejosa estagnada. Foi proposto na atualização do PCA a retirada deste da relação de pontos de monitoramento devido à interferência de áreas de terceiros entre a disposição passada e a área brejosa supracitada.
- ✓ **Monitoramento Atmosférico**
 - Sem registros. Caso venham a ocorrer eventos que ultrapassem o limite permitido, será realizada análise de causa do incidente. Nestes casos, a Samarco irá comunicar a investigação do incidente via ofício à SUPRAM à FEAM/GESAR e também acusará o evento no relatório CIF.

✓ Monitoramento Subterrâneo



Figura 18 - Localização Nascente 2



Figura 19 – Nascente 2

✓ Conclusões / considerações finais

- A Nascente 2 apresentou desvios de Alumínio, Ferro e Manganês no período no monitoramento.



Nota: Os estudos em desenvolvimento avaliarão os valores de referência para se confirmar ou refutar a hipótese de background.

✓ Monitoramento futuro: Instalação dos Poços de Monitoramento

- Atividades de perfuração e instalação de poços de monitoramento em andamento na Fazenda Fervedouro. No mês de outubro foram perfurados e instalados 3 poços, sendo eles FER-PM-PROP-01, FER-PM-PROP-02 e FER-PM-PROP-03.

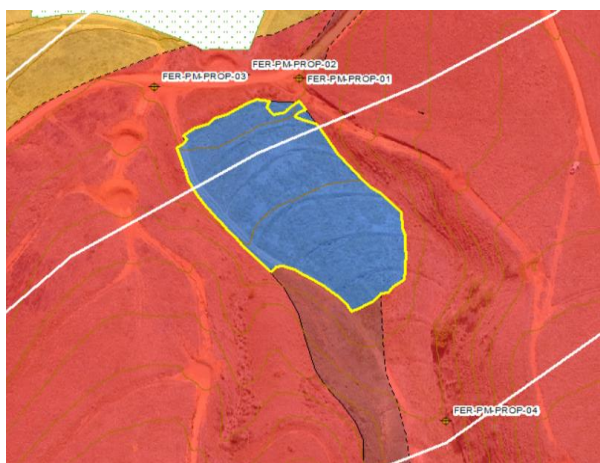


Figura 20 – Localização Poços de Monitoramento na Fazenda Fervedouro

✓ Monitoramento de Ruídos e Vibração

- Não foram identificados registros de ocorrências de desvios dos níveis de ruído nas comunidades monitoradas (rurais: Viana, Gerônimo, Florestinha, Pedra do Escalvado, Marimbondo, Funil, Buraco e Pontal. Predominantemente residenciais: Santana do Deserto, Tapera, Sede Rio Doce e Porto Plácido). Da mesma maneira não foram identificados desvios de vibração nas comunidades monitoradas (Pedra do Escalvado, Gerônimo, Porto Plácido, Santana do Deserto e Viana), assim como também não foram encontrados desvios nos 38 pontos de monitoramento dentro da ADA.

INDICADORES

Os indicadores do PG009 que foram implementados e estão em medição, encontram-se apresentados nos gráficos a seguir:

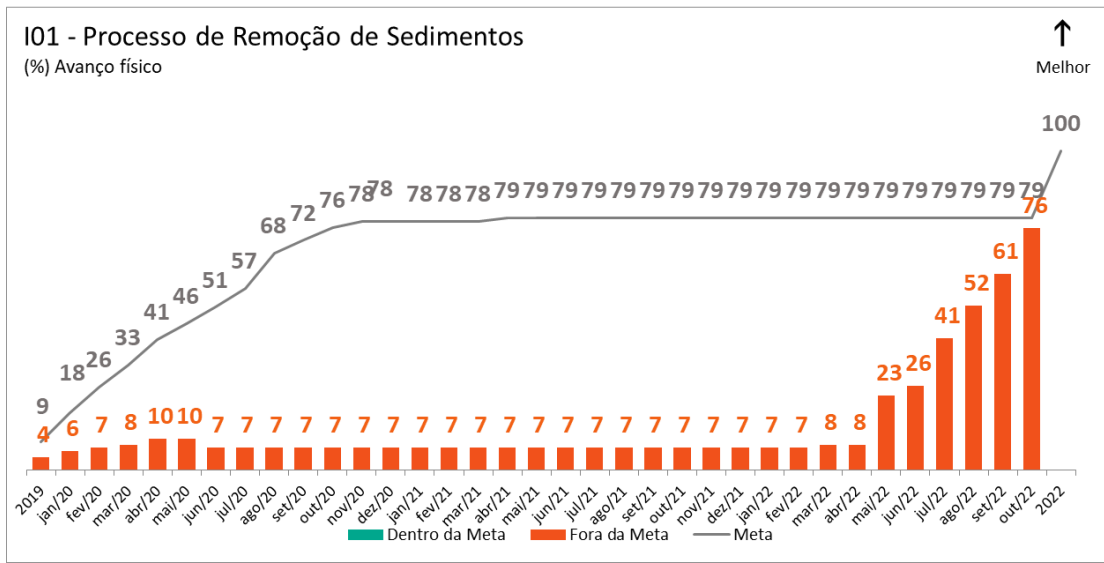


Gráfico 1 - Avanço físico do processo de remoção de sedimentos. Gráfico Acumulado.

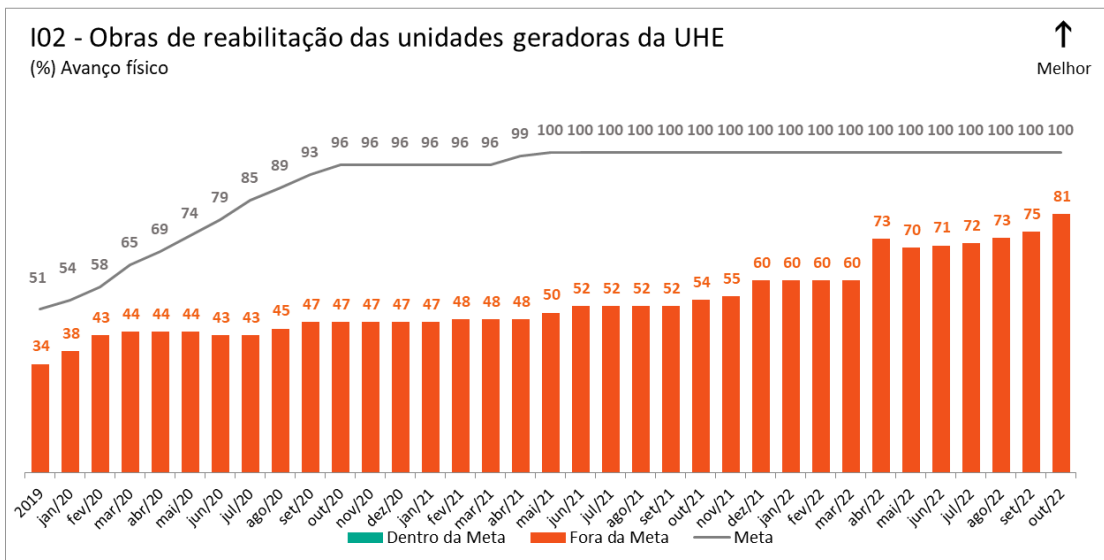


Gráfico 2 - Obras de reabilitação das unidades geradoras da UHE. Gráfico Acumulado.

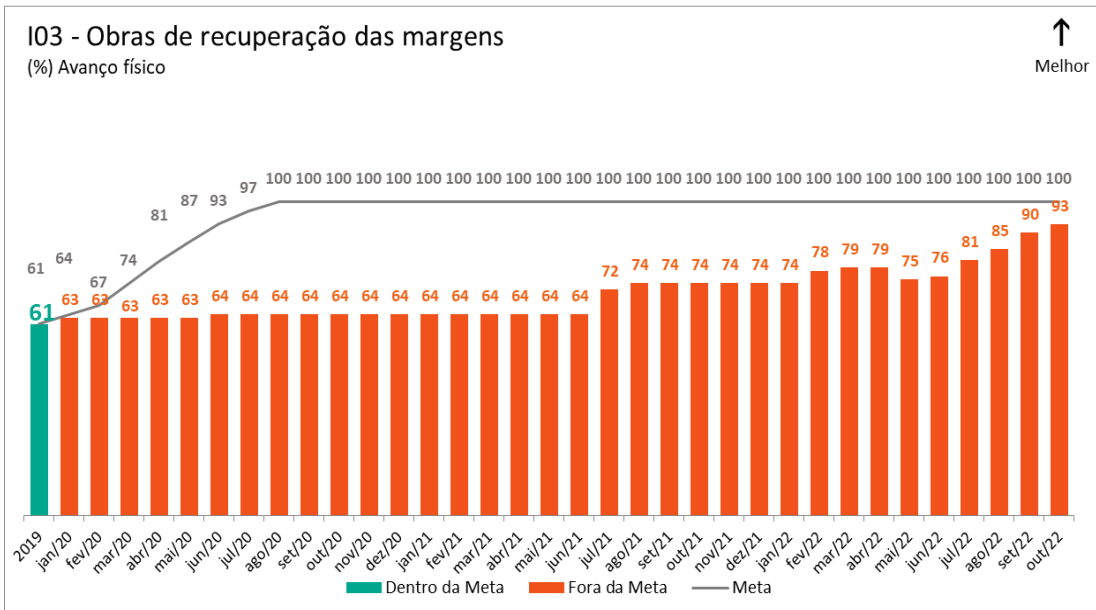


Gráfico 3 - Avanço físico as obras de recuperação das margens. Gráfico Acumulado.

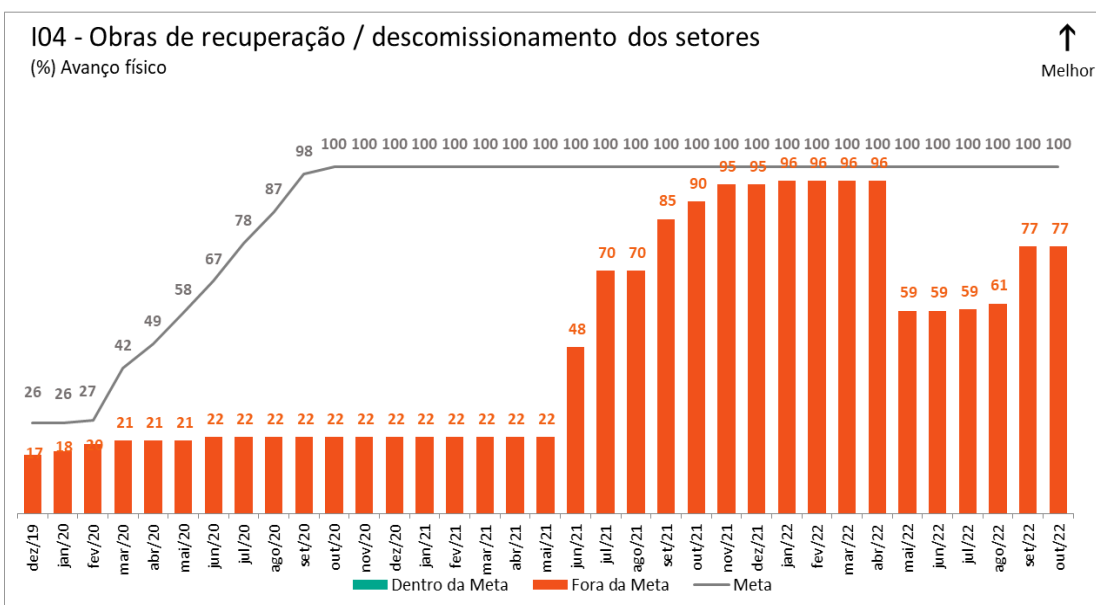


Gráfico 4 - Avanço físico obras de descaracterização/descomissionamento dos setores

Nota:: A partir do mês de maio/22, os indicadores apresentados são compatíveis com o Cronograma-Cenário de Retomada da UHE, no qual estão contempladas todas as atividades necessárias para que sejam atingidas as condições operacionais da UHE, tendo em vista que a LOC 1496/2020 autoriza prioritariamente todas as atividades previstas para retomada da usina.

PG010 Programa de recuperação das demais comunidades e infraestruturas impactadas entre Fundão e Candonga

Eixo Reconstrução e Infraestrutura

Objetivo





Executar as atividades de recuperação e reconstrução das infraestruturas danificadas pelo evento tais como: reestabelecimentos de acessos, limpeza e retirada de resíduos nas estruturas impactadas, entulho e detritos decorrentes do evento de rompimento da barragem de Fundão, demolição de estruturas comprometidas remanescentes e consequente limpeza, reconstrução de pontes, reconstrução ou reforma de cercas, currais e paiol, drenagem, reconstrução ou reforma de igrejas e outros templos religiosos, reconstrução ou reforma de campos de futebol e espaços de prática esportiva de acesso público, reconstrução ou reforma de centros comunitários, praças e locais públicos de lazer, reconstrução ou reforma de poços artesianos e pinguelas, recuperação ou reforma das vias de acessos impactadas pelo evento, contenções de taludes e encostas para acessos, reconstrução ou reforma das unidades habitacionais impactadas, reconstrução e recuperação das estruturas de educação e saúde impactadas. Cláusulas: 82 a 88.


Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	82	§2º	Judicializada
Cláusula	82	§3º	Judicializada
Cláusula	82	Caput	Judicializada
Cláusula	84	a	Em andamento
Cláusula	84	b	Em andamento
Cláusula	84	c	Em andamento
Cláusula	84	d	Em andamento
Cláusula	84	e	Em andamento
Cláusula	84	f	Em andamento
Cláusula	84	g	Em andamento
Cláusula	84	h	Em andamento
Cláusula	84	i	Em andamento
Cláusula	84	j	Em andamento
Cláusula	84	k	Em andamento
Cláusula	84	l	Em andamento
Cláusula	84	m	Judicializada
Cláusula	84	n	Em andamento
Cláusula	84	o	Em andamento
Cláusula	84	p	Em andamento
Cláusula	84	q	Em andamento
Cláusula	84	r	Em andamento
Cláusula	84	s	Em andamento
Cláusula	87	Caput	Em andamento
Cláusula	88	Caput	Judicializada

Deliberação	127	1.1	Concluída Internamente
Deliberação	127	1.4	Concluída Internamente
Deliberação	127	1.5	Concluída Internamente
Deliberação	127	1.6	Concluída Internamente
Deliberação	190	1	Concluída Internamente
Deliberação	190	2	Judicializada
Deliberação	191	1	Concluída Internamente
Deliberação	207	1	Judicializada
Deliberação	207	2	Judicializada
Deliberação	217	2	Em andamento
Deliberação	217	3	Em andamento
Deliberação	217	4	Concluída Internamente
Deliberação	23	2	Em andamento
Deliberação	24	2	Em andamento

Entregas do ano de 2022

- novembro de 2022  Reconstrução de Pontes - Entrega da Obra (Ponte Bueno)
- novembro de 2022  Reconstrução de Pontes - Entrega da Obra (Ponte Curvina)
- dezembro de 2022  Reconstrução de Pontes - Entrega da Obra (Ponte Juca Ponciano)
- dezembro de 2022  Reconstrução de Pontes - Entrega da Obra (Passarela Campinas Barreto)

 Concluído  Planejado  Reprogramado

Grandes números do programa

Geral Infraestrutura e Reconstrução: 1.787 **obras concluídas** (projetos e processos), sendo que, desse total, pode-se citar alguns exemplos:

- 988 obras correspondem a manutenção/recuperação de acessos e cercamentos que totalizam: 2.024 Km de manutenções realizadas, 142 km de acessos recuperados e 213 km de cercamentos de propriedades rurais executados;
- 109 obras correspondem a residências e propriedades recuperadas;
- 16 obras correspondem a casas reconstruídas;
- 28 obras correspondem a comércios reformados;
- 189 obras correspondem a quintais e lotes reformados;

Barra Longa:

- 105 obras correspondem a residências e propriedades recuperadas;
- 9 obras correspondem a casas reconstruídas;
- 27 obras correspondem a comércios reformados;
- 189 obras correspondem a quintais e lotes reformados.

Mariana:

- 4 obras correspondem a residências e propriedades recuperadas;
- 7 obras correspondem a casas reconstruídas;
- 1 obras correspondem a comércios reformados;
- 0 obras correspondem a quintais e lotes reformados;

Termos de entrega para Moradias e Comércio:

Moradias Barra Longa:

- Concluído com termo: 83
- Concluído sem termo: 6
- Paralisado: 3
- Pendente: 147
- Total: 239

Comércio Barra Longa:

- Concluído com termo: 17
- Concluído sem termo: 5
- Paralisado: 1
- Pendente: 4
- Total: 27 :

Fatos relevantes do mês

Retomada das atividades na ponte Santa Rita em 18/10/22 após liberação do IPHAN.

Início das atividades de estaqueamento na Ponte Bento Rodrigues.

Execução do tabuleiro e guarda corpo da passarela pênsil de Campinas x Barretos.

Estaqueamento e concretagem do bloco de coroamento na Ponte Borba.

Emissão do AVCB do Parque de Exposição de Barra Longa.

Concretagem dos tabuleiros da Ponte Tiara.

Concretagem dos tabuleiros da Ponte Juca Ponciano.

Campo de Pedras - Realizado pagamento do formal de partilha do requerimento de Retificação de área Rural no dia 31/10 para prosseguimento na aquisição do terreno.

Atividades Ponte do Gama:

- Lançamento e reaterro das sapatas da quadra – atividade concluída;
- Concretagem da rampa de acesso ao cruzeiro – atividade concluída;
- Espalhamento do lastro de brita na quadra;
- Espalhamento da camada de areia grossa no campo;
- Assentamento da alvenaria no vestiário;
- Confecção das armaduras da mureta do campo.

Fatos relevantes do mês

Manutenção em 27,6km de vias não pavimentadas;

Indicadores

I01 – Obras entregues – Diagnóstico total

Percentual(%)

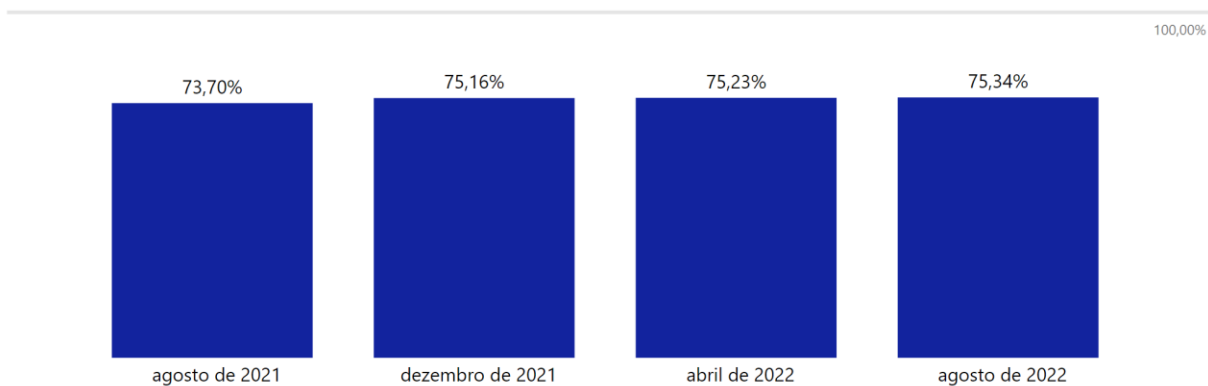


Gráfico 1: I01 – Obras entregues – Diagnóstico total - Frequência Quadrimestral

I02 – Obras entregues – Temporal

Percentual(%)

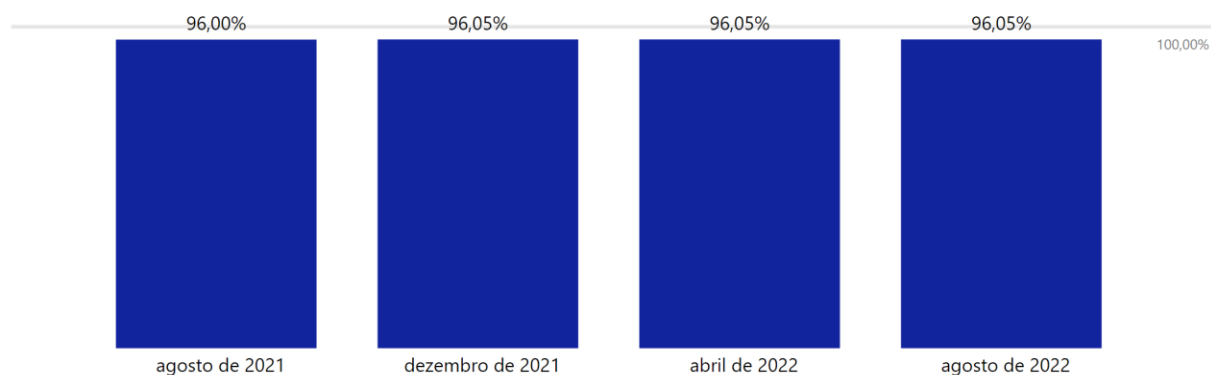


Gráfico 2: I02 – Obras entregues – Temporal - Frequência Quadrimestral

Indicadores

I03 – Termos de aceite oficiais de obras entregues – Diagnóstico total

Percentual(%)

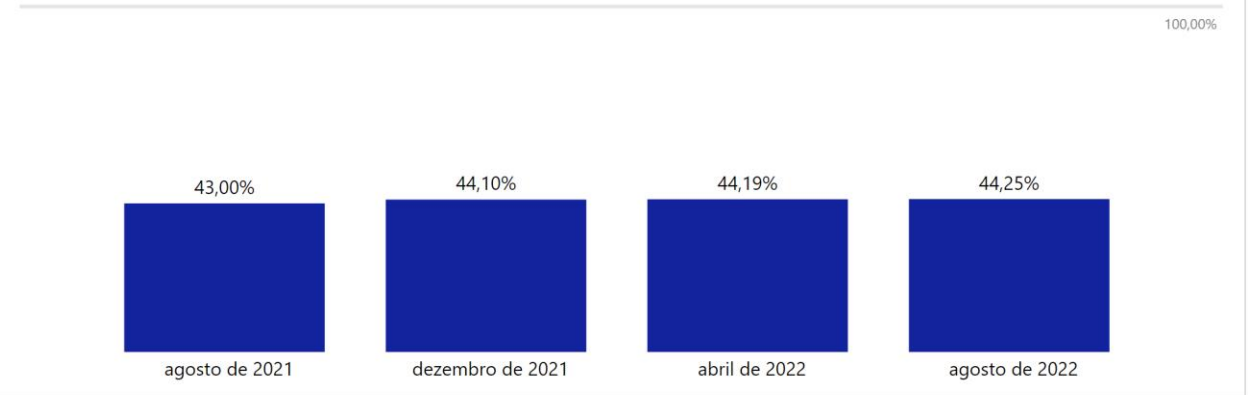


Gráfico 3: I03 – Termos de aceite oficiais de obras entregues – Diagnóstico total - Frequência Quadrimestral

I04 – Termos de aceite oficiais de obras entregues – Temporal

Percentual(%)

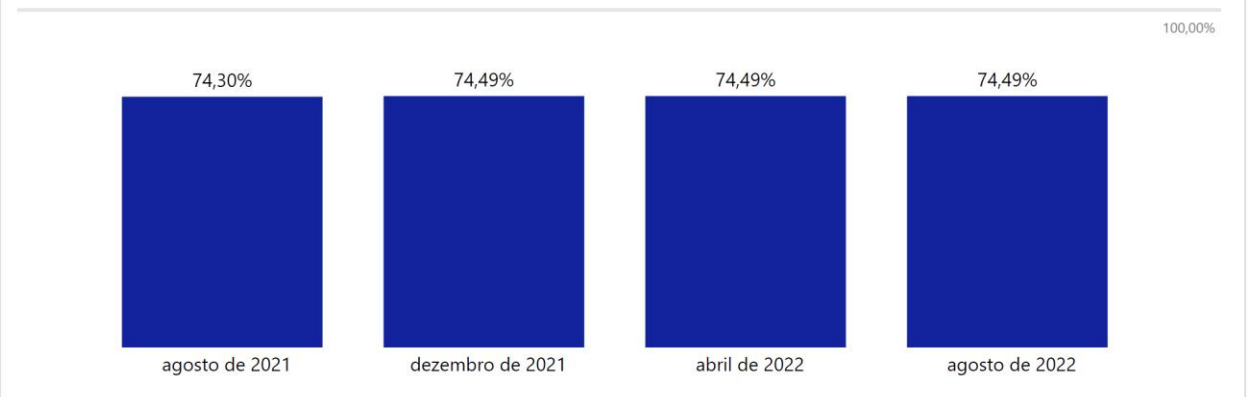


Gráfico 4: I04 – Termos de aceite oficiais de obras entregues – Temporal - Frequência Quadrimestral

PG011 Recuperação das escolas impactadas e reintegração da comunidade escolar

Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivo

Reparar os danos causados às comunidades escolares atingidas de Fundão até Candonga, nas dimensões impactadas, por meio da reconstrução das condições materiais, estruturais, pedagógicas, institucionais, psicopedagógicas e sócio comunitárias, observadas as características anteriores ao rompimento da barragem para que o poder público possa garantir a manutenção do direito à educação, de acordo com as determinações do TTAC (cláusulas 89 a 94).

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	89	Caput	Em andamento
Cláusula	91	Caput	Em andamento
Cláusula	92	Caput	Em andamento
Cláusula	93	Caput	Em andamento
Deliberação	183	2	Concluída Internamente
Deliberação	183	3	Concluída Internamente
Deliberação	238	1	Concluída Internamente
Deliberação	390	3	Concluída Internamente
Deliberação	508	2	Em andamento
Deliberação	587	2	Concluída Internamente

Entregas do ano de 2022



 Concluído

 Planejado

 Reprogramado

Grandes números do programa

O programa não possui grandes números.

Fatos relevantes do mês

Apoio à realização da Festa dos Dia das Crianças das escolas de Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo, no dia 7 de outubro. Em Paracatu, o evento aconteceu na Casa do Lago e teve oficinas e caça ao tesouro. Em Bento Rodrigues, a comemoração ocorreu na escola do novo distrito e as crianças participaram de brincadeiras, danças e gincanas, além de se divertirem com os brinquedos infláveis. Ao todo, mais de 230 crianças participaram das duas comemorações.

Indicadores

I01 - Atendimento às solicitações de reposição de equipamentos e materiais das escolas temporárias de Mariana e Barra Longa

Percentual(%)

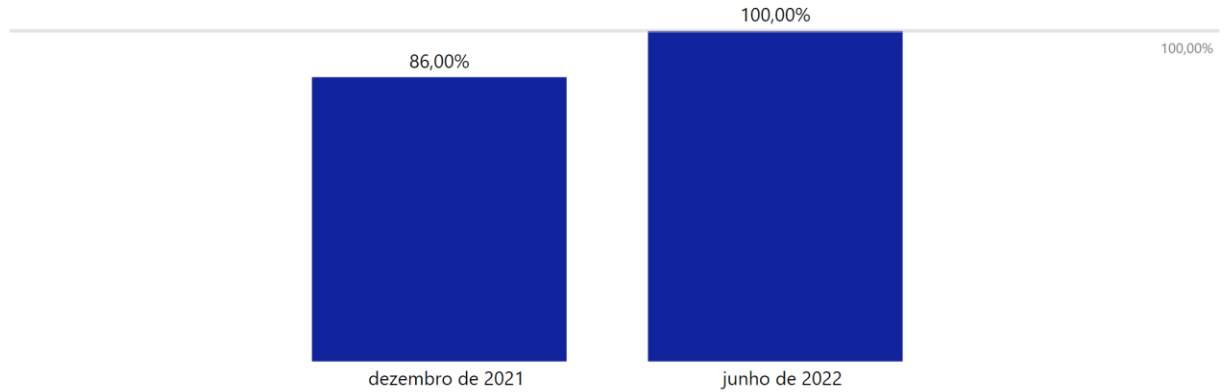


Gráfico 1: I01 - Atendimento às solicitações de reposição de equipamentos e materiais das escolas temporárias de Mariana e Barra Longa - Frequência Semestral

I02 - Cumprimento do Plano de Manutenção e demandas de manutenção predial das escolas temporárias

Percentual(%)

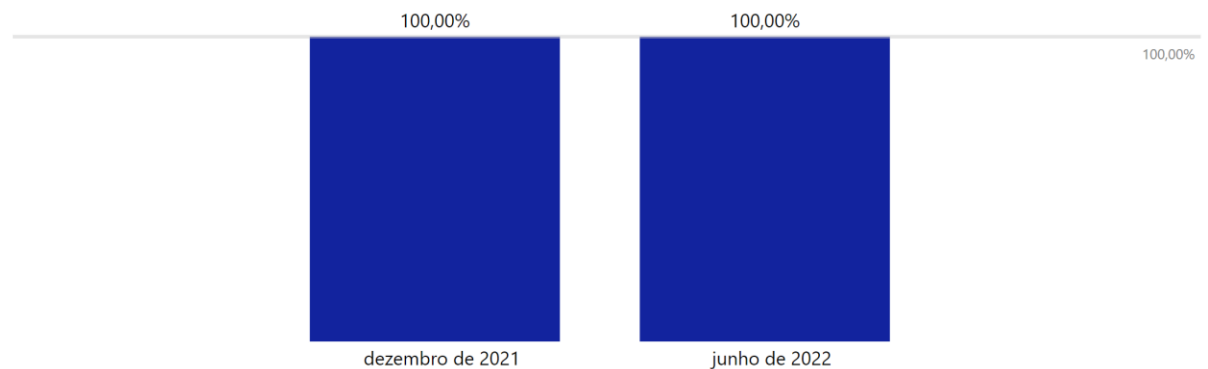


Gráfico 2: I02 - Cumprimento do Plano de Manutenção e demandas de manutenção predial das escolas temporárias - Frequência Semestral

Indicadores

I03 - Disponibilidade de vagas para transporte de estudantes

Percentual(%)




Gráfico 3: I03 - Disponibilidade de vagas para transporte de estudantes - Frequência Anual

I04 - Atendimento das demandas sobre transporte escolar aderentes ao escopo

Percentual(%)




Gráfico 4: I04 - Atendimento das demandas sobre transporte escolar aderentes ao escopo - Frequência Anual

Indicadores

I05 - Cumprimento das atividades de convivência das comunidades atingidas

Percentual(%)




Gráfico 5: I05 - Cumprimento das atividades de convivência das comunidades atingidas - Frequência Semestral

I06 - Satisfação do público alvo com as ações realizadas

Pontos

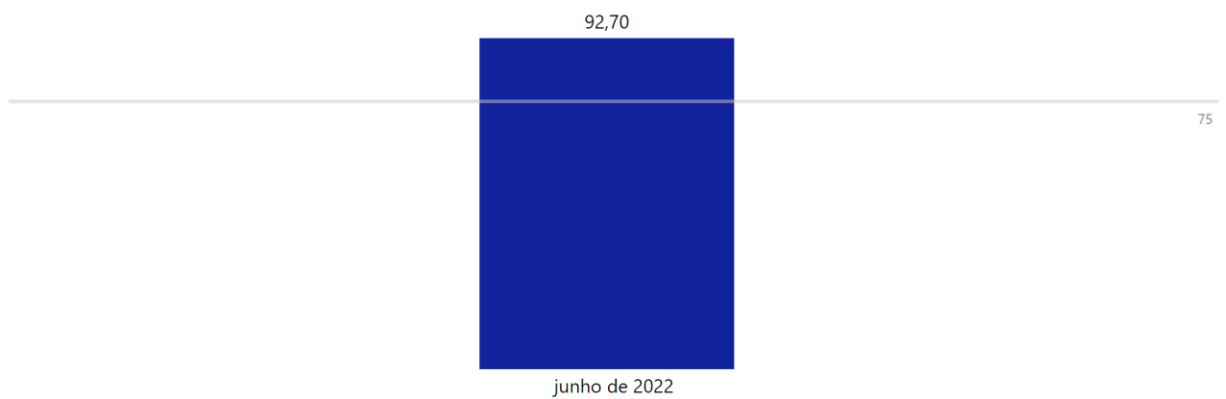


Gráfico 6: I06 - Satisfação do público alvo com as ações realizadas - Frequência Anual

Indicadores

I07 - Atendimento ao público alvo

Percentual(%)



Gráfico 7: I07 - Atendimento ao público alvo - Frequência Semestral

Indicador se encontra em revisão. Ofício FR.2022.0142-01 enviado dia 01/08/22 solicitando ao GT11 a revisão da fórmula de cálculo ou a suspensão do indicador I07.

I12 - Verificação de realização de atendimento pelo projeto de apoio psicopedagógico clínico

Percentual(%)



Gráfico 8: I12 - Verificação de realização de atendimento pelo projeto de apoio psicopedagógico clínico - Frequência Anual

Indicadores

I13 - Escolas atendidas pelo apoio psicopedagógico institucional

Percentual(%)




Gráfico 9: I13 - Escolas atendidas pelo apoio psicopedagógico institucional - Frequência Anual

Nota explicativa:

As medições dos indicadores I09 e I11 foram postergadas para dezembro de 2022 com previsão de *report* em fevereiro de 2023, para atender a solicitação pela SME de reprogramação da última formação com os pedagogos que seria realizada em julho de 2022. Está em andamento tratativas com a SME para definição de uma nova data e ementa do curso.

PG012 Programa de Memória Histórica, Cultural e Artística

Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivo

Garantir, em parceria com a comunidade e poder público, a reparação, restauração, preservação, fortalecimento e restituição do patrimônio cultural histórico e artístico dos territórios impactados, assegurando suas condições de existência, realização e reprodução autônoma, e criando espaços de sociabilidade, convivência e fortalecimento de vínculos comunitários.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	95	Caput	Em andamento
Cláusula	96	Caput	Em andamento
Cláusula	97	Caput	Em andamento
Cláusula	98	a	Em andamento
Cláusula	98	b	Em andamento
Cláusula	98	c	Em andamento
Cláusula	98	d	Em andamento
Cláusula	99	Caput	Em andamento
Deliberação	349	2	Concluída Internamente
Deliberação	547	2	Concluída Internamente
Deliberação	547	3	Em andamento

Entregas do ano de 2022

- setembro de 2022 Segunda etapa de publicações dentro do Projeto de Educação Patrimonial
- outubro de 2022 Segunda etapa de oficinas sobre Educação Patrimonial dentro do eixo 4 do plano de reparação da parceria com a UNESCO
- dezembro de 2022 Validação do plano de destinação dos bens restaurados da Reserva Técnica
- dezembro de 2022 Conclusão do calendário 2022 das ações na Casa dos Saberes e Horta Comunitária 2022
- dezembro de 2022 Primeira etapa de atividades dentro do Eixo 7, esporte e Lazer da Parceria com a Unesco, para promover o reestabelecimento de condições de sociabilidade para as populações atingidas
- dezembro de 2022 Primeira etapa de atividades dos Eixos 1, 2, 5 e 6 do plano de reparação das manifestações culturais da Parceria com a UNESCO, para o resgate, transmissão geracional e a promoção das atividades culturais das comunidades¹

Concluído
 Planejado
 Reprogramado

Grandes números do programa

O programa não possui grandes números.

Fatos relevantes do mês

Realização de 4 (quatro) percursos de patrimônio previstos para o público escolar de Rio Doce e 2 percursos previstos para o público escolar de Barra Longa, dentro das ações de Educação Patrimonial do Plano de Reparação. Os Percursos do Patrimônio consistem em atividades culturais, educacionais, lúdicas e recreativas, que exploram os sentidos e a percepção da paisagem, e visam despertar um novo olhar sobre o patrimônio cultural das localidades impactadas onde o público-alvo está inserido.

Primeira ação do Plano Transição cultural para o reassentamento de Paracatu com uma roda de conversa e de violão.

Apoio ao calendário de celebrações das comunidades impactadas por meio da Festa de Nossa Senhora Aparecida.

Indicadores

Revisão dos indicadores do Programa de Preservação da Memória Histórica, Cultural e Artística (PG12) em processo de aprovação pelo CIF (Deliberação CIF nº 547, de 22 de outubro de 2021).

PG013 Programa de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer

Eixo Pessoas e Comunidades


Objetivo

Promover ações nas áreas de turismo, cultura, esporte e lazer, visando contribuir para a melhoria da qualidade de vida nos municípios atingidos e fomentar o desenvolvimento turístico dos polos definidos.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	101	Caput	Concluída Internamente
Cláusula	102	Caput	Concluída Internamente
Cláusula	103	Caput	Em andamento
Cláusula	104	a	Em andamento
Cláusula	104	b	Concluída Internamente
Cláusula	104	c	Em andamento
Cláusula	104	d	Em andamento
Cláusula	104	e	Em andamento
Cláusula	104	f	Em andamento
Cláusula	104	g	Em andamento
Deliberação	239	1a	Concluída Internamente
Deliberação	239	1b	Concluída Internamente
Deliberação	239	1c	Concluída Internamente
Deliberação	239	3	Concluída Internamente
Deliberação	239	4	Concluída Internamente
Deliberação	239	5	Concluída Internamente
Deliberação	287	3	Concluída Internamente
Deliberação	287	4	Concluída Internamente
Deliberação	321	2	Em andamento
Deliberação	321	3	Concluída Internamente
Deliberação	377	3.1	Concluída Internamente
Deliberação	377	3.2	Concluída Internamente
Deliberação	377	4	Concluída Internamente
Deliberação	377	5	Concluída Internamente
Deliberação	454	2	Concluída Internamente
Deliberação	454	3	Concluída Internamente
Deliberação	462	3	Concluída Internamente

Entregas do ano de 2022



setembro de 2022	●	Divulgação dos projetos da 2ª edição do Edital Doce
outubro de 2022	●	Realização do Torneio de Pesca Esportiva em Minas Gerais
outubro de 2022	●	Encerramento da 1ª edição do Edital Doce
novembro de 2022	●	Execução de ações do plano de promoção dos polos turísticos
dezembro de 2022	●	Realização do Torneio de Pesca Esportiva no Espírito Santo
dezembro de 2022	●	Realização de capacitações para empreendedores da cadeia do turismo em 2022
dezembro de 2022	●	Realização de missão empreendedora para a cadeia de turismo dos polos em 2022

● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Grandes números do programa

O programa não possui grandes números.

Fatos relevantes do mês

Realização do Torneio de Pesca Esportiva em Minas Gerais, em parceria com a APARD, em Governados Valadares.

As ações do Projeto Torneio de Pesca Esportiva ocorreram pré e pós evento central, sendo ele o Torneio de Pesca Esportiva, como estimativa de 250 participantes, além de toda movimentação econômica da cadeia turística da região (hotéis, restaurantes etc).

Anteriormente, houve a Oficina e Torneio Infantil contando com a participação de 100 crianças da rede municipal de ensino. Além disso, o projeto proporcionou a realização da 1ª Capacitação de Conductor de Turismo de Pesca, tendo na primeira turma o quantitativo de 14 participantes, dentre pescadores artesanais e esportivos e pessoas ligadas a cadeia do turismo.

Ainda estão previstas outras ações de capacitações para este projeto ao longo do ano. As ações do projeto Torneio de Pesca esportiva estão atreladas ao turismo de pesca na região do Rio Doce, como forma de recuperação de imagem, geração de renda e de atividades econômicas alternativas, desenvolvimento local e valorização do patrimônio imaterial.

Além do cumprimento das cláusulas 103h, 104f e 104g do TTAC.

Realização de Missão empreendedora para a cadeia do turismo é uma ação promovida pelo Programa 13 para apoiar o desenvolvimento dos empreendedores locais e promover benchmarking. Participaram da ação representantes dos três polos de turismo nas cidades de Mariana – MG, Marliéria – MG, Governador Valadares – MG e Linhares – ES.

O evento ocorreu na cidade de Brotas – SP e contou com a participação de profissionais do turismo, empreendedores locais, bem como foi aberta aos integrantes dos APLs e divulgada por meio de Edital.

O objetivo foi realizar uma imersão nas estruturas de governança, estudar sobre o ambiente local, entender como surgiram os movimentos do empresariado em prol do objetivo comum, permitir o contato com diversos atrativos culturais e empreendimentos turísticos, realizar atividades relacionadas à gestão dos espaços visitados, especialmente a partir da observação dos pontos fortes e fracos e por fim realizar uma conexão entre os temas abordados nas capacitações técnicas do projeto e a realidade prática observada.

A ação faz parte do projeto de desenvolvimento do empreendedorismo turístico e avança no cumprimento das cláusulas 104A e 104C, bem como no indicador I05 (Percentual de implementação do plano de empreendedorismo).

Execução de projetos aprovados na 2ª Edição do Edital Doce, modalidade Reparação do Lazer. As ações da 2ª Edição do Edital Doce ocorreram nos municípios de Mariana e Linhares. O público participante contou com moradores de Mariana e Linhares, empreendedores ligados a cadeia do turismo (hotéis, restaurantes, guias, entre outros), além dos turistas que estiveram nas regiões para participarem dos eventos.

Os projetos executados neste primeiro momento somam quase R\$ 500 mil de investimentos da Fundação Renova.

A modalidade de Reparação o Lazer no Edital Doce visa atender a cláusula 104D do TTAC que versa sobre o enfrentamento das perdas do ambiente necessário para a realização de práticas de lazer, esporte e sociabilidade.

Indicadores

I01 – Disponibilização de ferramentas para a Institucionalização do Turismo no Município

Percentual(%)




Gráfico 1: I01 – Disponibilização de ferramentas para a Institucionalização do Turismo no Município - Frequência Anual

I04 – Índice de Iniciativas realizadas a partir da formação em fortalecimento organizacional

Percentual(%)




Gráfico 2: I04 – Índice de Iniciativas realizadas a partir da formação em fortalecimento organizacional - Frequência Anual

Indicadores

I04.1 – Índice de conclusão do Processo formativo em relação ao número de selecionados

Percentual(%)




Gráfico 3: I04.1 – Índice de conclusão do Processo formativo em relação ao número de selecionados - Frequência Anual

I05 – Percentual de implementação do plano de empreendedorismo Turístico

Percentual(%)




Gráfico 4: I05 – Percentual de implementação do plano de empreendedorismo Turístico - Frequência Anual

As metas de execução são anuais.

Indicadores

I07.1 – Percentual de Servidores que concluíram a formação em relação ao número de indicados

Percentual(%)




Gráfico 5: I07.1 – Percentual de Servidores que concluíram a formação em relação ao número de indicados - Frequência Anual

I08 – Percentual de capacitação dos gestores em relação ao número de inscritos

Percentual(%)




Gráfico 6: I08 – Percentual de capacitação dos gestores em relação ao número de inscritos - Frequência Anual

A ficha de indicadores do PG13 passou por revisão e atualização no indicador I07.1, sendo atualizado o resultado final do indicador e realizado novo report para atualização do mesmo.

PG014 Programa de Apoio à Saúde Física e Mental da População Impactada

Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivo

Prestar apoio técnico à elaboração e implantação de estudos, dos protocolos de monitoramento da saúde da população exposta aos efeitos do rompimento e elaboração de programa para prestar apoio técnico para o atendimento às prefeituras de municípios atingidos na execução dos planos de ação de saúde ou das ações de saúde já pactuadas em função dos efeitos decorrentes do rompimento – conforme cláusulas 106, 107 e 111 do TTAC.*

* A Fundação Renova ajuizou, em 17/01/2022, Incidente de Divergência que visa à declaração de nulidade da Deliberação do Comitê Interfederativo (“CIF”) nº 551/2021, que aprovou a definição do Programa de Apoio à Saúde Física e Mental da População Impactada (PG-14).

A Fundação Renova demonstrou que a definição de escopo aprovada na Deliberação CIF nº 551 está em manifesto desacordo com o Termo de Transação e de Ajustamento de Conduta celebrado em 02/03/2016 (“TTAC”) e com deliberações prévias do próprio CIF. Várias de suas disposições carecem de fundamentos técnicos, pois não foram disponibilizadas informações essenciais para a execução do Programa (como avaliação de risco e correlações decorrentes do rompimento da barragem de Fundão, prazos, orçamentos e monitoramento de indicadores) ou dos seus subprogramas.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	106	Caput	Em andamento
Cláusula	107	Caput	Judicializada
Cláusula	108	Caput	Em andamento
Cláusula	111	Caput	Judicializada
Deliberação	220	2	Concluída Internamente
Deliberação	220	3	Concluída Internamente
Deliberação	252	2	Concluída Internamente
Deliberação	264	4	Concluída Internamente
Deliberação	266	2	Concluída Internamente
Deliberação	386	3	Concluída Internamente
Deliberação	416	3	Judicializada
Deliberação	434	1	Judicializada
Deliberação	435	1	Judicializada
Deliberação	436	1	Judicializada
Deliberação	452	2	Judicializada
Deliberação	487	7	Judicializada
Deliberação	492	1a, 1b,1c	Judicializada
Deliberação	504	2	Judicializada
Deliberação	504	3	Judicializada
Deliberação	504	4	Judicializada
Deliberação	598	1	Judicializada
Deliberação	599	1	Judicializada
Deliberação	611	3	Em andamento
Deliberação	73	1	Em andamento

Deliberação	106	3	Concluída Internamente
Deliberação	130	4	Concluída Internamente
Deliberação	189	1	Concluída Internamente
Deliberação	189	2	Concluída Internamente
Deliberação	197	1 e 2	Concluída Internamente
Deliberação	219	4	Concluída Internamente
Deliberação	416	4	Judicializada
Deliberação	611	4	Concluída Internamente

Entregas do ano de 2022

- março de 2022 ● Implementação e acompanhamento do plano de Barra Longa – 5º Repasse financeiro para contratação de RH
- junho de 2022 ● Implementação e acompanhamento do plano de Barra Longa – 6º Repasse financeiro para contratação de RH
- julho de 2022 ● Acompanhamento do plano de Mariana – 3º Repasse financeiro para contratação de RH
- setembro de 2022 ● Implementação e acompanhamento do plano de Barra Longa – 7º Repasse financeiro para contratação de RH e Conclusão dos repasses financeiros de RH para o município de Barra Longa
- setembro de 2022 ● Finalização das Área temáticas de capacitação dos profissionais do SUS
- outubro de 2022 ● Acompanhamento do plano de Mariana – 4º Repasse financeiro para contratação de RH

● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Grandes números do programa*

- 48 **profissionais** (entre médicos, enfermeiros, assistentes sociais, psicólogos e psiquiatras) atuaram nos municípios de Mariana/MG (34 **profissionais**) e Barra Longa/MG (14 **profissionais**).

* Os números serão melhores detalhados, no tópico seguinte.

Fatos relevantes do mês

Barra Longa

Desde o rompimento da Barragem de Fundão, o município de Barra Longa tem recebido apoio ao SUS para atendimento à população atingida. Atualmente, por meio de ACP homologada pela 12ª Vara, são disponibilizados recursos financeiros para a contratação de 2 médicos plantonistas, 2 enfermeiros plantonistas, 2 técnicos de enfermagem, 1 médico psiquiatra, 1 psicólogo e, para o Departamento de Vigilância em Saúde, 2 profissionais de nível médio, 2 profissionais de nível técnico e 2 profissionais de nível superior.

Neste relatório semestral, referente ao período de outubro/21 a abril/22, a Secretaria de Saúde reportou que os profissionais médicos e enfermeiros realizaram 4.709 consultas (média de 784 por mês) e 1059 procedimentos clínicos como aferição de glicemia, pressão arterial, administração de insulina, medicação, retirada de pontos e curativos, coleta de amostras para testes COVID-19, entre outros (média de 176 procedimentos por mês) no Centro Assistencial de Saúde (CAS) 24h.

Os profissionais contratados também podem apoiar as ações desenvolvidas na Atenção Primária em Saúde (APS), por meio da Estratégia Saúde da Família (ESF), que oferece serviços de promoção, prevenção e tratamento da saúde física e mental das comunidades tanto da área urbana quanto rural do Município.

No relatório supracitado, a Secretaria de Saúde relatou o importante trabalho desenvolvido pelos profissionais da Vigilância em Saúde na atualização dos sistemas de informação do SUS (agravos de notificação, SIM, plataformas Covid-19, entre outros), monitoramento de dados do Sistema de monitoramento da qualidade da água para consumo humano (SISAGUA), fiscalização e orientação aos comerciantes e população referente medidas sanitárias a serem seguidas para combate ao COVID-19 e inspeção sanitária em estabelecimentos comerciais, dentre outras.

Para o apoio logístico, a Fundação Renova disponibiliza 02 veículos para a Secretaria Municipal de Saúde de Barra Longa, com os respectivos cartões-combustível, que são utilizados para o transporte de pacientes, atendimento à Estratégia da Saúde da Família, atendimento à equipe de Vigilância em Saúde para execuções de ações de prevenção, promoção e recuperação à saúde, entre outros.

A Fundação Renova também apoia o município com o valor de R\$ 175.000,00 (dois repasses anuais em 2020 e 2021) para complementação de exames e consultas especializadas, aquisição de material médico, insumos e medicamentos. Além disso, disponibilizou 04 notebooks e 04 desktops e entregou Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e uniformes para o Departamento de Vigilância em Saúde.

Fatos relevantes do mês

Mariana

Desde o rompimento da Barragem de Fundão, o município de Mariana tem recebido apoio para atendimento à população atingida. A partir da primeira quinzena de janeiro/22, todos os profissionais atuantes pela empresa Contexto foram substituídos por profissionais contratados diretamente pela Prefeitura, com financiamento da Fundação Renova, conforme preconizado no Acordo Judicial homologado pela 2ª Vara Cível. Ao todo, como previsto no Plano de Trabalho, são 34 profissionais de saúde que atuam nos seguintes equipamentos municipais de saúde:

- Espaço Conviver, que presta serviços à população atingida na área de Saúde Mental, oferecendo atendimentos psicológicos e psiquiátricos especializados e acompanhamento psicossocial. O aluguel deste espaço é financiado pela Fundação Renova, que também financiou a compra de móveis e equipamentos para seu funcionamento adequado.
- CAPS e CAPSAD, nos quais os atendimentos são realizados por equipe multiprofissional que atua de forma interdisciplinar e realiza prioritariamente atendimento às pessoas em sofrimento mental, incluindo aquelas com necessidades decorrentes do uso abusivo de álcool e outras drogas, em sua área territorial, seja em situações de crise ou nos processos de reabilitação psicossocial.
- UBS de Bento Rodrigues e Paracatu, onde são oferecidos atendimentos com Nutricionista, Fisioterapeuta, Odontóloga, Médico ESF, Médico Psiquiatra, Enfermeiro e Psicóloga. O objetivo desta Unidade de Saúde é atender até 80% dos problemas de saúde da população atingida, sem que haja a necessidade de encaminhamento para outros serviços, como emergências e hospitais. Nesta UBS, assim como em outras UBS do Município, as famílias atingidas podem ter acesso a ações de promoção, prevenção e tratamento relacionadas a saúde da mulher, da criança, saúde mental, planejamento familiar, prevenção a câncer, pré-natal e cuidado de doenças crônicas como diabetes e hipertensão, fazer curativos, inalações, tomar vacinas, coletar amostras para exames laboratoriais, ter tratamento odontológico, receber medicação básica e ser encaminhado para atendimentos com especialistas.

A Fundação Renova também apoia o município de Mariana com 05 veículos para atendimento à população atingida, visando a reforçar o trabalho nas áreas de atenção primária, atenção especializada, saúde mental, vigilância em saúde, assistência farmacêutica, entre outros.

Fatos relevantes do mês

Depósito judicial para suplementação de RH em Mariana - 4º depósito

Apresentação de 04 relatórios semanais sobre a Planilha COVID, Boletim Vacinal e Planilha de Óbitos e Novos casos dos municípios atingidos.

Indicadores

Os indicadores do programa estão em revisão

PG015 Promoção da Inovação

Eixo Pessoas e Comunidades


Objetivo

Fomentar e financiar a produção de conhecimento relacionado à recuperação socioeconômica e socioambiental das áreas impactadas pelo rompimento, por meio da criação e fortalecimento de linhas de pesquisa de tecnologias aplicadas, fortalecimento de capital humano e internalização das tecnologias geradas para o processo de reparação, de acordo com as cláusulas 113 a 115 do TTAC.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	113	Caput	Em andamento
Cláusula	114	a	Em andamento
Cláusula	114	b	Em andamento
Deliberação	100	1	Concluída Internamente
Deliberação	126	2	Concluída Internamente
Deliberação	126	3	Concluída Internamente
Deliberação	20	n/a	Concluída Internamente
Deliberação	31	a	Concluída Internamente
Deliberação	338	4	Concluída Internamente

Entregas do ano de 2022

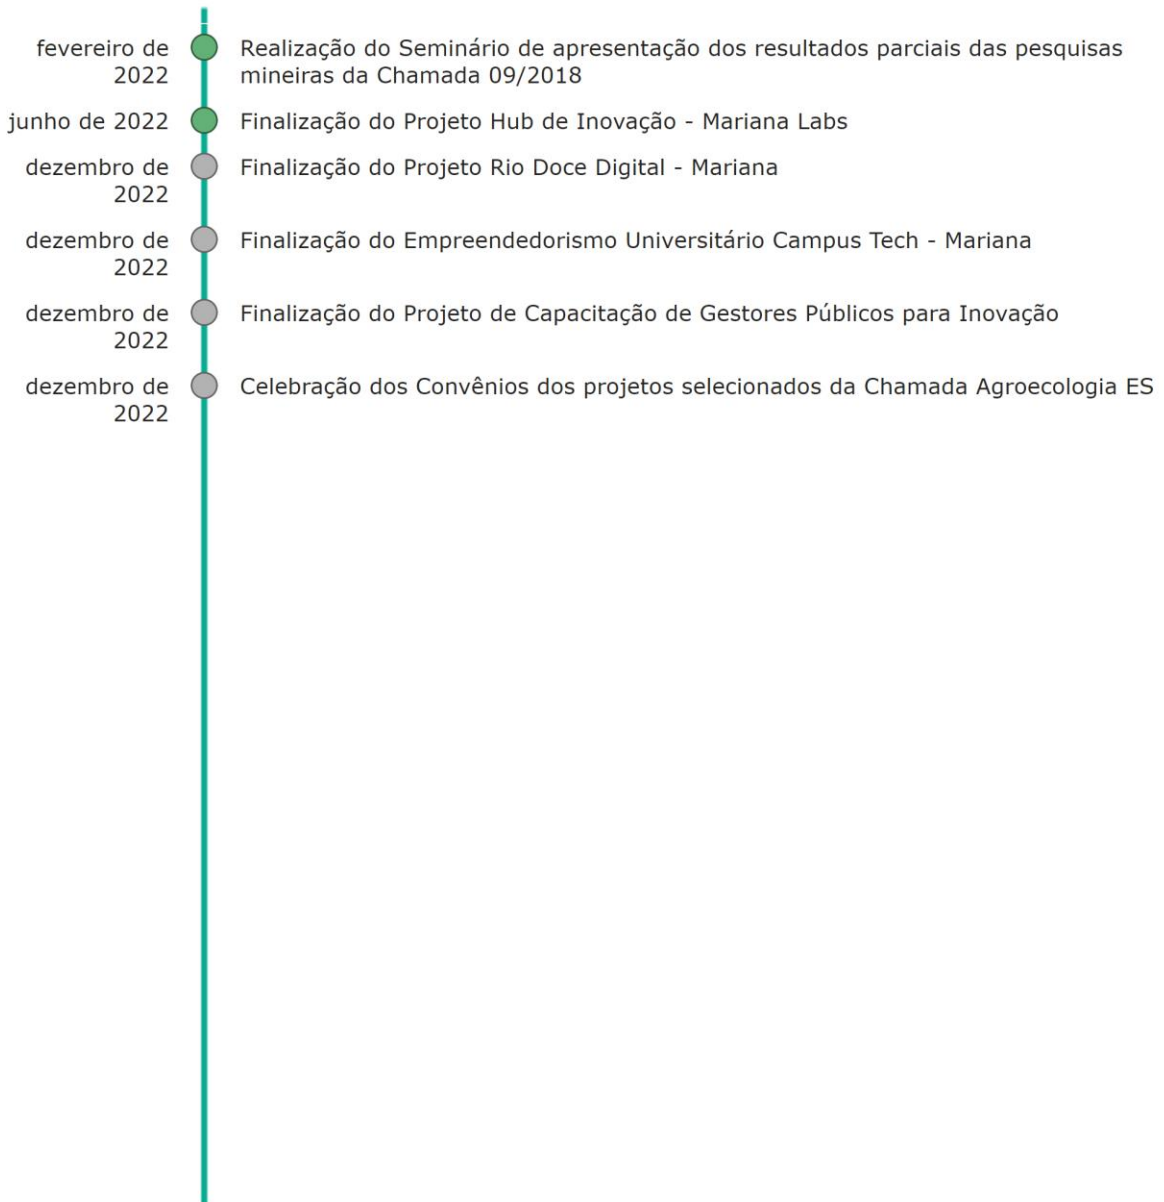

● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Grandes números do programa

O programa não possui grandes números.

Fatos relevantes do mês

Aprovação do Projeto Empreende Rio Doce em Reunião Ordinária da CT-EI realizada dia 19.10.22

Aprovação do Projeto Unidade Demonstrativa de Tumiritinga em Reunião Ordinária da CT-EI realizada dia 19.10.22

Início da execução do Projeto TRL - Serviço Especializado para criação de Escala de Nível de Maturidade

Indicadores

I01 – Número de projetos de pesquisa e inovação financiados pelo programa

Número




Gráfico 1: I01 – Número de projetos de pesquisa e inovação financiados pelo programa - Frequência Anual

I02 – Número de bolsas de formação educacional/profissional financiadas

Número




Gráfico 2: I02 – Número de bolsas de formação educacional/profissional financiadas - Frequência Anual

Indicadores

I03 – Índice de recurso destinado a pesquisas aportado na formação de pessoas

Percentual(%)




Gráfico 3:I03 – Índice de recurso destinado a pesquisas aportado na formação de pessoas - Frequência Bianaual

Após Ciclo 2 da Auditoria da EY para o PG15, houve revisão no cálculo do I03 e o valor atualizado e auditado passa a ser de 13,77%. Este valor será reportado até novo período de medição do indicador.

Os indicadores I04 e I05 não são reportados neste relatório considerando serem indicadores não finalísticos somado ao fato de que a medição de ambos os indicadores é zero

PG016 Retomada das Atividades Aquícolas e Pesqueiras

Eixo Pessoas e comunidade


Objetivo

Possibilitar a retomada das atividades aquícolas e pesqueiras conforme condições anteriores ao rompimento através da aprendizagem e diálogo com as comunidades pesqueiras atingidas, proporcionando oportunidades de renda e qualificação.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	116	Caput	Em andamento
Cláusula	117	Caput	Em andamento
Cláusula	118	Caput	Em andamento
Cláusula	119	Caput	Em andamento
Cláusula	122	Caput	Judicializada
Cláusula	123	Caput	Em andamento
Deliberação	121	2	Concluída Internamente
Deliberação	20	n/a	Concluída Internamente
Deliberação	480	4	Concluída Internamente
Deliberação	480	5	Concluída Internamente
Deliberação	542	1	Concluída Internamente
Deliberação	542	1.1	Concluída Internamente
Deliberação	542	2	Concluída Internamente

Entregas do ano de 2022

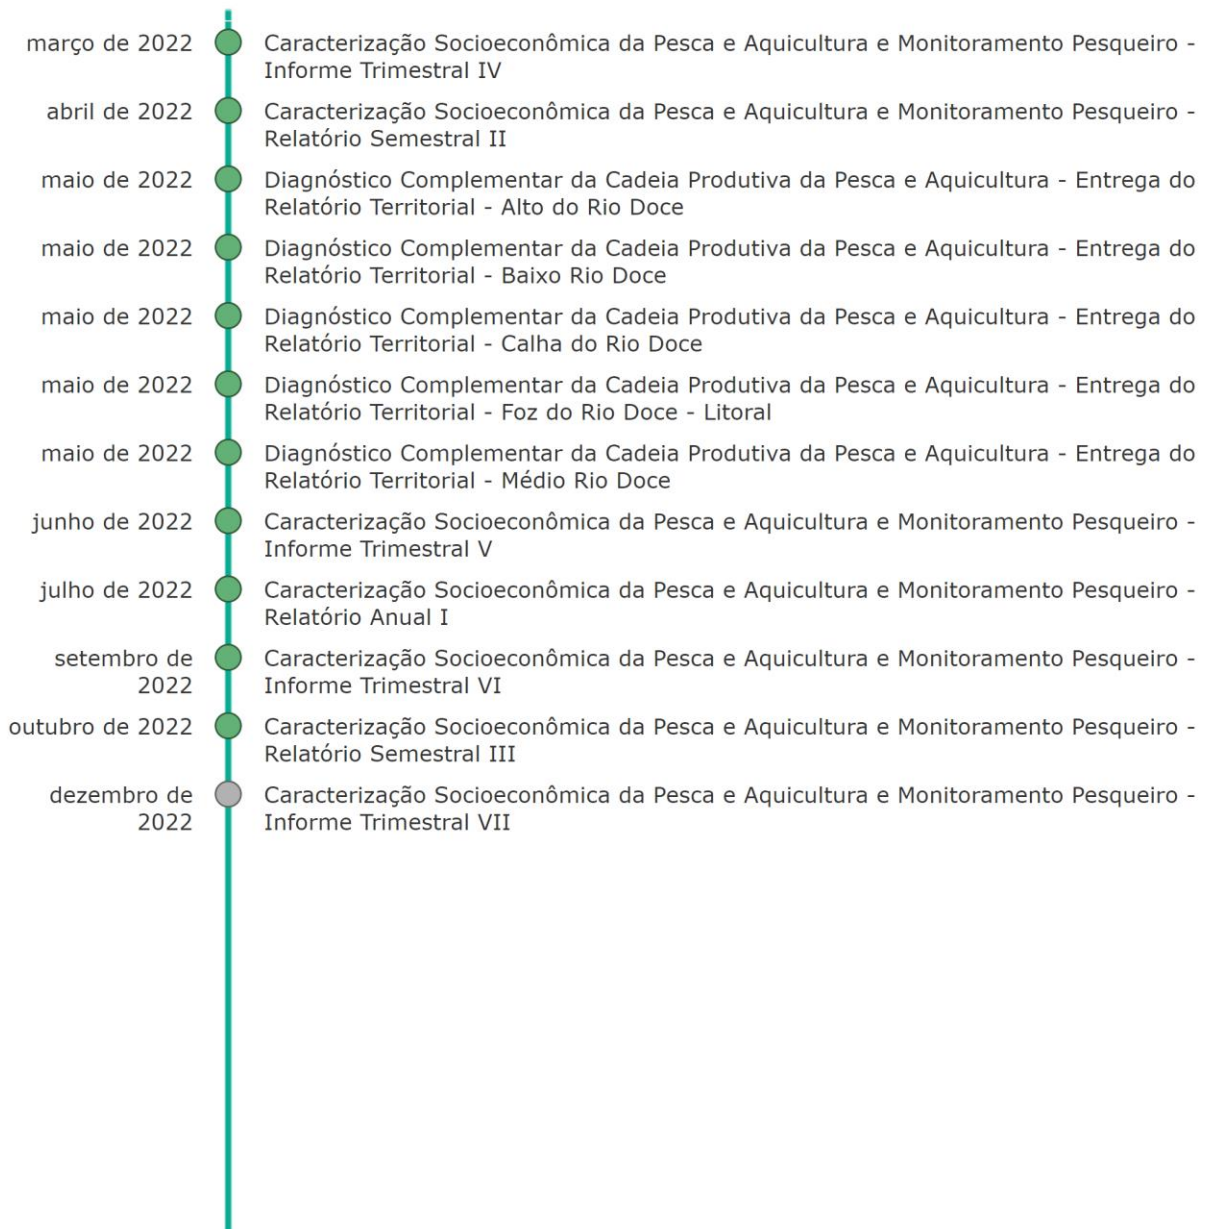

 Concluído

 Planejado

 Reprogramado

Grandes números do programa

Eixo 1 - Processo para contribuir com a superação das limitações e restrições ao exercício da pesca e atividades aquícolas:

- Articulação Junto aos Órgãos Públicos e Comunidades:
 - 3 Caravanas Devolutivas para apresentação de resultados ambientes nos territórios da Calha e Médio Rio Doce;
 - 246 Participantes das Oficinas Devolutivas nos municípios de Governador Valares, Rio Casca e Ipatinga.
- Caracterização Socioeconômica da Pesca e Aquicultura e Monitoramento Pesqueiro:
 - 12,7 Mil formulários de coletas de dados primários e de desembarque pesqueiro aplicados, de forma remota com pescadores e aqüicultores;
 - 6 informes trimestrais, 3 semestrais e 1 anual entregues sobre a produção pesqueira e perfil socioeconômico dos pescadores no rio Doce e litoral do ES.

Eixo 2 - Processo de Estruturação produtiva e alternativas de produção e Geração de Renda:

- Projeto Cultivando para Pescar:
 - 4 comunidades atendidas (Areal, Entre Rios, Regência e Povoação), sendo 162 pessoas beneficiadas;
 - 7 capacitações realizadas, 3 temas abordados (Hidroponia, Piscicultura Superintensiva e Processamento do Pescado);
 - 2 visitas técnicas em 1 tema abordado (Piscicultura Superintensiva);
 - 187 Materiais Virtuais produzidos e disponibilizados no período de distanciamento social.

Grandes números do programa

- Fomento e Fortalecimento do Associativismo e Cooperativismo:
 - 197 beneficiários atendidos nos estados de MG e ES;
 - 3 municípios beneficiados, Rio Doce e Periquito em MG e Linhares no ES;
 - 4 associações beneficiadas:
 - 30 ASPERDOCE (Rio Doce)
 - 77 ASPIPEC (Pedra Corrida)
 - 38 APIGUA (Guaxe)
 - 52 APAP (Povoação);
 - 2 associações formalizadas em MG (ASPIPEC e ASPERDOCE);
 - 40 capacitações em gestão e rotinas administrativas, funcionalidades e elaboração de plano de negócios, estratégias de vendas e negociação (ASPERDOCE e ASPIPEC);
 - 4 Planos de negócio entregues.
- Mapeamento das potencialidades econômicas na pesca e aquicultura - Diagnóstico Complementar da Cadeia da Pesca e Aquicultura e Estudo de Mercado:
 - 3090 Entrevistas realizadas, de forma remota, para levantamento de dados primários junto a Instituições Governamentais, Instituições de Pesquisa e Ensino e Estabelecimentos Comerciais.
 - 42 Books municipais com informações da cadeia produtiva e comercialização do pescado nas comunidades;
 - 5 Relatórios sobre a atividade pesqueira exercida nos territórios (Foz do Rio Doce, Baixo Rio Doce, Médio Rio Doce, Alto Rio Doce e Calha do Rio Doce) que irão fornecer subsídios para o programa.

Fatos relevantes do mês

Realização do torneio de pesca em Governador Valadares - MG, da linha de Fortalecimento da Cultura e Atividade Pesqueira.

Entrega do terceiro Relatório Semestral da Caracterização Socioeconômica da Pesca e Aquicultura e Monitoramento Pesqueiro referente a produção pesqueira no rio Doce e litoral do Espírito Santo.

Entrega da primeira fase da Micro Estação fotovoltaica na Associação dos Pescadores de Regência (ASPER).

Indicadores

Os indicadores não iniciaram suas medições, encontram-se em revisão na CTEI, onde foi encaminhada nova proposta de indicadores finalísticos.

PG017 Retomada das Atividades Agropecuárias

Eixo Terra e Água

Objetivo

Reparar os danos socioeconômicos e ambientais aos produtores rurais ao longo da calha do rio Doce em virtude do rompimento da barragem de Fundão, bem como oferecer apoio técnico de modo a viabilizar ao público-alvo o restabelecimento da rotina produtiva em condição pré-existente ao evento. Ainda, para além da reparação propriamente dita, serão fornecidos serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural, que fomentarão a utilização de técnicas produtivas sustentáveis.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	125	a	Judicializada
Cláusula	125	b	Judicializada
Cláusula	125	c	Judicializada
Cláusula	125	d	Judicializada
Cláusula	125	e	Em andamento
Cláusula	125	f	Em andamento
Cláusula	125	g	Judicializada
Cláusula	125	h	Judicializada
Cláusula	125	i	Em andamento
Cláusula	125	j	Judicializada
Deliberação	145	3	Concluída Internamente
Deliberação	20	n/a	Concluída Internamente
Deliberação	263	2	Concluída Internamente
Deliberação	263	3	Concluída Internamente
Deliberação	341	1	Concluída Internamente
Deliberação	343	1.4	Concluída Internamente
Deliberação	354	1 e 2	Concluída Internamente

Entregas do ano de 2022

- de dezembro de 2022 ● Conclusão da implantação das atividades de Reestruturação Produtivas nas propriedades de Barra Longa, Mariana, Ponte Nova, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado
- de dezembro de 2022 ● Término dos contratos de aluguel de pastagem

● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Grandes números do programa

Alto Rio Doce

- 246 propriedades elegíveis ao programa, sendo 49 direcionados ao reassentamento e 197 ao Plano de Adequação Socioeconômica e Ambiental (PASEA), 197 são do PASEA planejados sendo que 196 devolutivas foram realizadas, e a diferença dos 1 refere-se à pendência de CAR ou problema fundiário. Até o presente momento, 162 propriedades aderiram à implantação do PASEA, 34 não aderiram e 0 estão em análise pelo produtor;
- 52.987,5 toneladas acumuladas de silagem entregues para produtores impactados, sendo 4,8 toneladas no mês;
- 20.986,0 horas de Assistência Técnica e Extensão Rural para 140 propriedades;
- 461 barraginhas realizadas;
- 900 infraestruturas rurais simples e complexas concluídas;
- 238 nascentes cercadas e 58 nascentes com plantio florestal realizado;
- 2.587 hectares de reestruturação produtiva executados.

- Elaborados e implantados os projetos de 79 hortas e 84 pomares, nos municípios de Mariana, Barra Longa, Ponte Nova, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado, no Alto Rio Doce.

Médio Rio Doce

- 7.749 horas individuais de Assistência Técnica e Extensão Social (ATES) no Lote 3 – Tumiritinga/MG (1º Junho, Terra Prometida e Águas da Prata I e II) e Periquito/MG (Liberdade);
- 14.532 horas coletivas de Assistência Técnica e Extensão Social (ATES) no Lote 3 – Tumiritinga/MG (1º Junho, Terra Prometida e Águas da Prata I e II) e Periquito/MG (Liberdade);
- 2 feiras de apoio à comercialização de produtos realizada para o Lote 3 – Tumiritinga/MG (1º Junho, Terra Prometida e Águas da Prata I e II) e Periquito/MG (Liberdade);
- 159 Indicadores de Sustentabilidade em Agroecossistemas (ISA) elaborados para o Lote 3 – Tumiritinga/MG (1º Junho, Terra Prometida e Águas da Prata I e II) e Periquito/MG (Liberdade);
- 61.901 toneladas acumuladas de silagem para produtores impactados, sendo 1.906 toneladas no mês.

Baixo Rio Doce

- 1.000 horas individuais de Assistência Técnica e Extensão Social (ATES) no Lote 4 - Linhares/ES (Assentamento Sezínio Fernandes de Jesus);
- 1.051 horas coletivas de Assistência Técnica e Extensão Social (ATES) no Lote 4 - Linhares/ES (Assentamento Sezínio Fernandes de Jesus);
- 1 feira de apoio à comercialização de produtos para o Lote 4 - Linhares/ES (Assentamento Sezínio Fernandes de Jesus);
- 98 Indicadores de Sustentabilidade em Agroecossistemas (ISA) elaborados para o Lote 4 - Linhares/ES (Assentamento Sezínio Fernandes de Jesus);
- 6.819 toneladas acumuladas de silagem para produtores impactados, sendo 234 toneladas no mês.

Parcerias

- 59 capacitações técnicas **presenciais** realizadas pela EMATER - MG;
- 30 capacitações técnicas **online** realizadas pela EMATER - MG
- 18 Unidades Demonstrativas implantadas em propriedades localizadas no território Alto Rio Doce. Sendo 16 Unidades Demonstrativas implantadas em parceria com o World Resources Institute (WRI), Fazenda Ecológica e Centro Internacional de Pesquisa Agroflorestal (ICRAF), e 2 Unidade Demonstrativa implantada em parceria com a Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais (EPAMIG).

Notas

Nome do dado	Resultado	Observações
ALTO DOCE: Quantidade de toneladas de silagem entregues para produtores impactados	52.987	Houve correção dos valores acumulado de fornecimento de silagem em função de validação dos termos de entrega após auditoria realizada.

Fatos relevantes do mês

Finalização dos cursos ministrados pela Emater em parceria com a Fundação Renova.

Indicadores

I01 – Taxa de reposição de alimentação animal

Percentual(%)




Gráfico 1: I01 – Taxa de reposição de alimentação animal - Frequência Semestral

I02 – Taxa de Reconstrução de Benfeitorias Impactadas

Percentual(%)

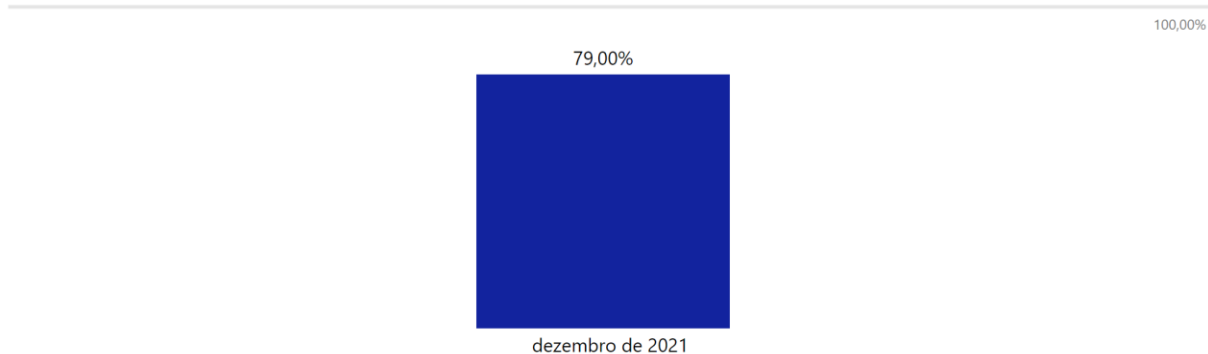


Gráfico 2: I02 – Taxa de Reconstrução de Benfeitorias Impactadas - Frequência Anual

Indicadores

I04 – Taxa da evolução do índice de sustentabilidade das propriedades rurais

Percentual(%)



Gráfico 3: I04 – Taxa da evolução do índice de sustentabilidade das propriedades rurais - Frequência Semestral

Indicadores

Tabela 1. Indicadores que não iniciaram a medição.

INDICADOR	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDADE DE MEDIDA	INÍCIO PREVISTO DE MEDIÇÃO
I03 – Taxa de assistência técnica a produtores rurais	I03 – número total de horas de assistência técnica e extensão rural para as famílias atendidas / Número de famílias atendidas participantes do Programa e que aderiram a ATER	Horas	dezembro/2022

PG018 Desenvolvimento e Diversificação Econômica

Eixo Pessoas e Comunidades


Objetivo

Promover o surgimento de novos negócios e o fortalecimento de negócios existentes, de forma a contribuir para o desenvolvimento econômico dos municípios impactados.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	129	Caput	Em andamento
Cláusula	130	a	Em andamento
Cláusula	130	b	Em andamento
Cláusula	130	c	Concluída Internamente
Cláusula	130	d	Em andamento
Cláusula	130	e	Em andamento
Cláusula	130	f	Em andamento
Deliberação	109	n/a	Concluída Internamente
Deliberação	163	3	Concluída Internamente
Deliberação	20	n/a	Concluída Internamente
Deliberação	343	1.4	Concluída Internamente
Deliberação	463	3	Concluída Internamente
Deliberação	503	2	Concluída Internamente
Deliberação	503	3	Reprogramada
Deliberação	589	2	Em andamento

Entregas do ano de 2022



maio de 2022	●	Entrega das Colméias - Cadeia da Meliponicultura
agosto de 2022	●	Inauguração da sede do Banco Comunitário em Baixa Verde / Dionisio
outubro de 2022	●	Repasse do recurso Renova - BDMG - Distrito Empresarial (complemento)
outubro de 2022	●	Repasse do recurso Renova - BDMG - Distrito Empresarial (deliberado)
dezembro de 2022	●	Entrega da Casa do Empreendedor para a Prefeitura de Mariana
dezembro de 2022	●	Repasse Inicial de Recursos para o BDMG - Fundo Diversifica Mariana

● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Grandes números do programa

Fundo Desenvolve Rio Doce

- **R\$ 83,10 milhões** emprestados para negócio em Minas Gerais e Espírito Santo.
- Em **Minas Gerais**, R\$ 64,10 milhões foram **desembolsados** para 1828 contratos e 1347 empresas.
- No **Espírito Santo**, R\$ 18,99 milhões foram **desembolsados** para 550 contratos e 510 empresas.

Fundo Diversifica Mariana

- **R\$ 55 milhões** em linhas de crédito

Fundo Compete Rio Doce

- Em **Minas Gerais**, R\$ 7 milhões foram **desembolsados** para 225 contratos e 127 empresas.

Fatos relevantes do mês

Assinatura do Acordo de Cooperação dos recursos do Distrito Empresarial de Mariana entre a Fundação Renova, BDMG e PMM. Movimentação de 25% do indicador I02 do PG 18

Indicadores

I01 – Promoção de ações de desenvolvimento

Percentual(%)

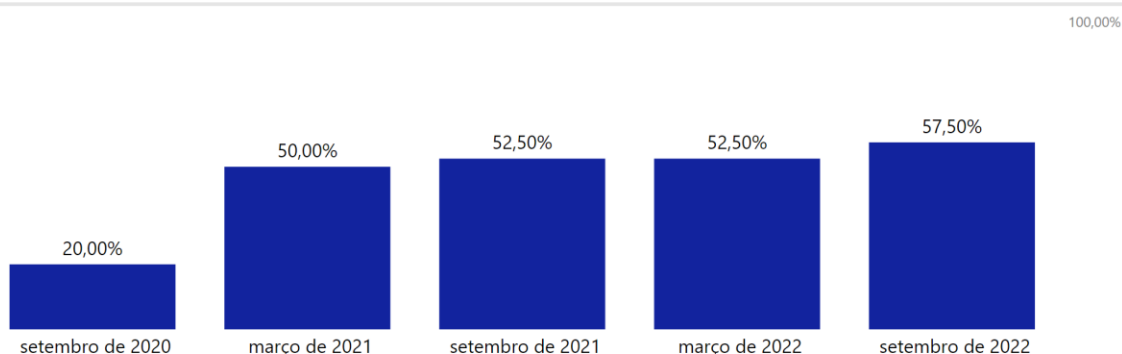


Gráfico 1: I01 – Promoção de ações de desenvolvimento - Frequência Semestral

I02 – Diversificação Econômica de Mariana - MG

Percentual(%)

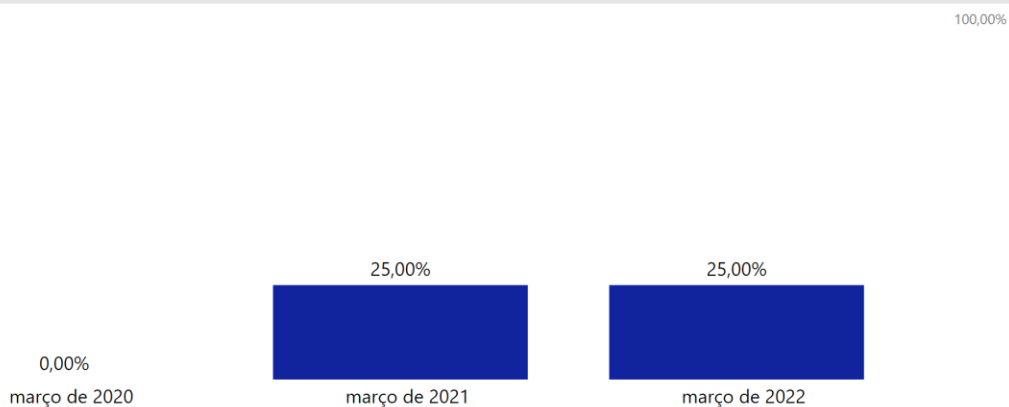


Gráfico 2: I02 – Diversificação Econômica de Mariana - MG - Frequência Anual

Indicadores

I03 – Financiamento – Acesso ao Crédito

Contratos




Gráfico 3: I03 – Financiamento – Acesso ao Crédito - Frequência Mensal

I04 - Distribuição dos atendimentos do Eixo 2 – Financiamento nos territórios

Percentual(%)

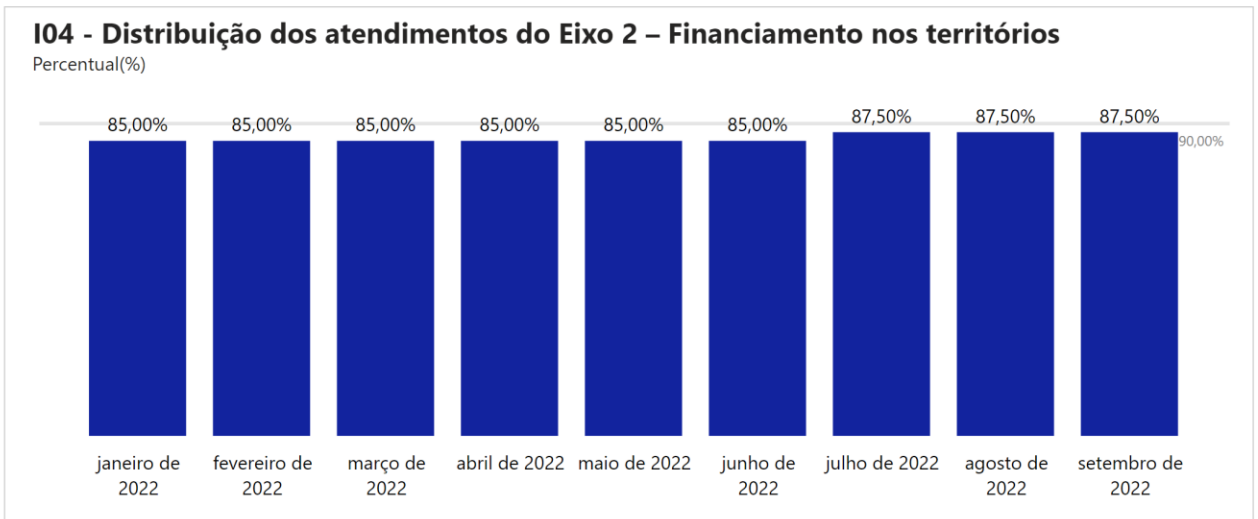


Gráfico 4: I04 - Distribuição dos atendimentos do Eixo 2 – Financiamento nos territórios - Frequência Mensal

Indicadores

I05 - Número de atendimentos realizados com foco na Geração de Renda

Atendimentos

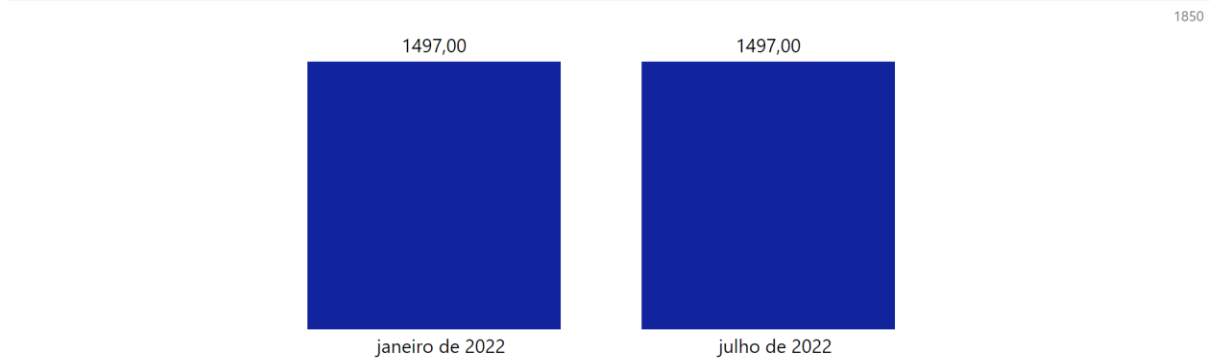


Gráfico 5: I05 - Número de atendimentos realizados com foco na Geração de Renda - Frequência Semestral

I07 - Número de empreendedores atendidos no PG 18

Atendimentos

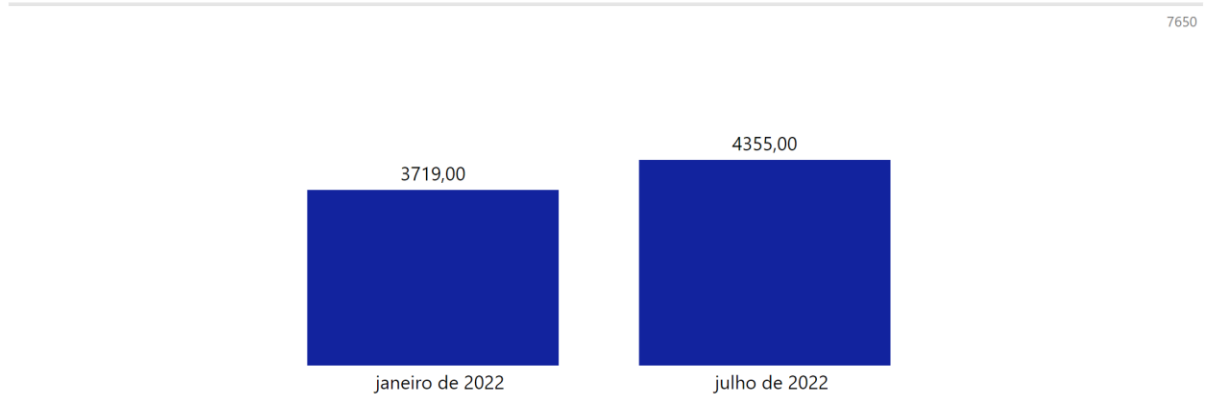


Gráfico 6: I07 - Número de empreendedores atendidos no PG 18 - Frequência Semestral

PG019 Recuperação de Micro e Pequenos Negócios

Eixo Pessoas e Comunidades


Objetivo

Elaborar e executar um programa específico para a recuperação de micro e pequenos negócios no setor de comércio, serviços e produtos, localizados de Fundão até Candonga em Minas Gerais, e Regência e Povoação no Espírito Santo, áreas diretamente atingidas pelo EVENTO (Cláusulas 132 a 133 do TTAC).

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	132	Caput	Em andamento
Cláusula	133	Caput	Em andamento
Deliberação	20	n/a	Concluída Internamente
Deliberação	342	2	Concluída Internamente

Entregas do ano de 2022

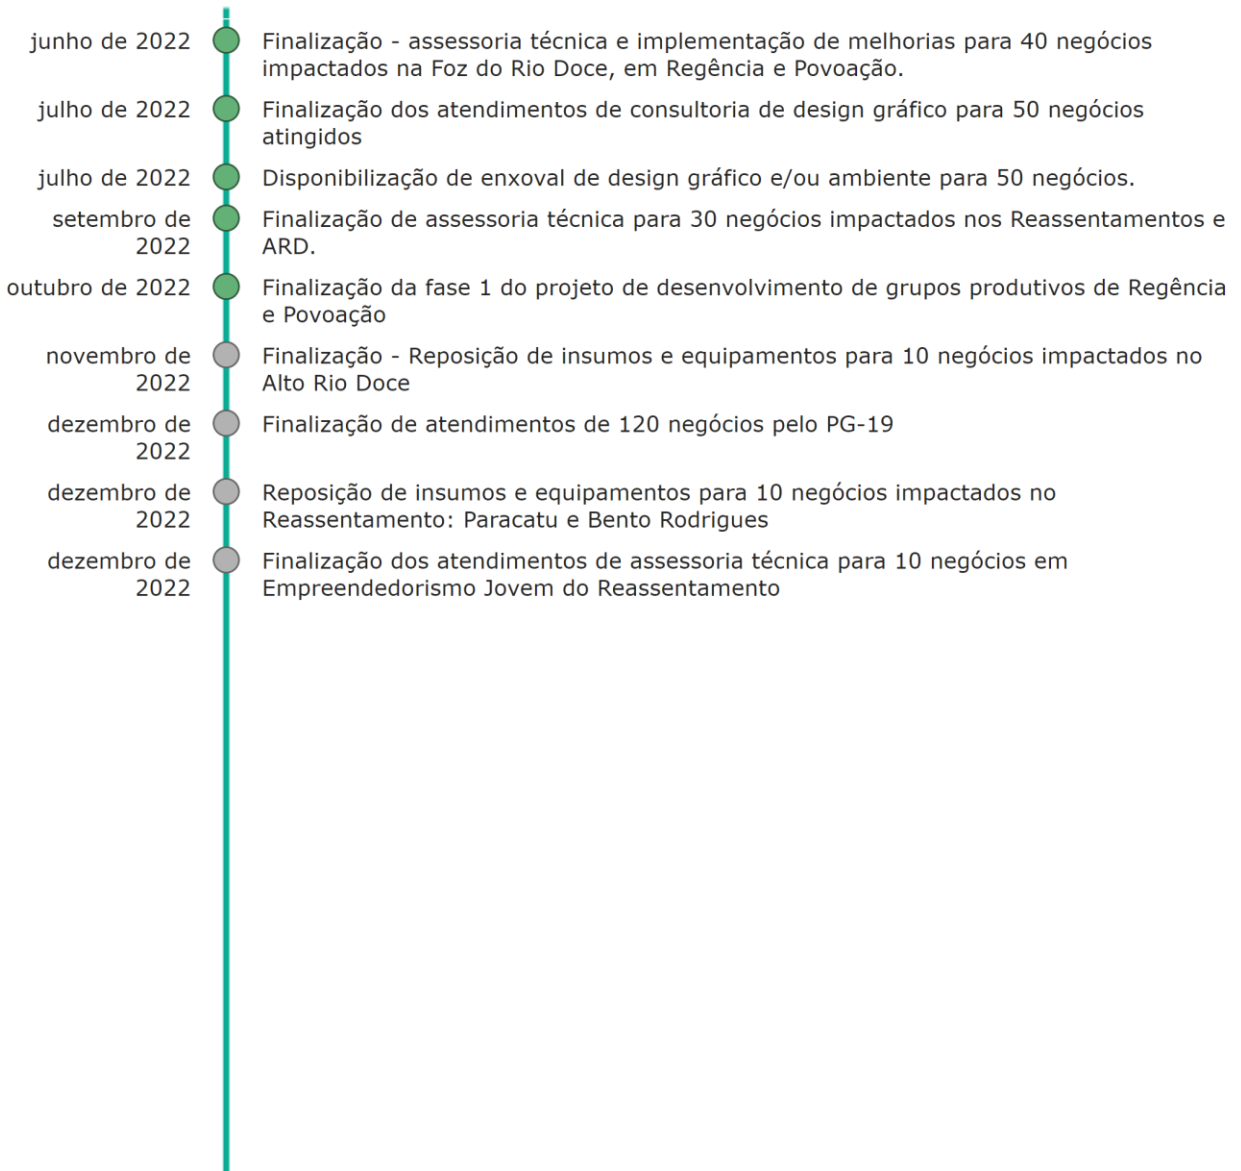

 Concluído

 Planejado

 Reprogramado

Grandes números do programa

953 atendimentos realizados a 458 micro e pequenos negócios, por meio de 692 ações de assessoramento e planejamento de negócios, 17 locações de espaços comerciais, 235 reposições de insumos e equipamentos e 9 reformas e/ou adequação de infraestrutura.

Fatos relevantes do mês

Finalização de atendimento pelo PG-19 para 10 negócios.

Indicadores

I01 - % de negócios impactados com condições de produção recuperadas

Percentual(%)

100,00%



Gráfico 1: I01 - % de negócios impactados com condições de produção recuperadas - Frequência Semestral

I02 - % de novos negócios em substituição ao anterior que acessaram consultoria/assessoria especializada

Percentual(%)

100,00%




Gráfico 2: I02 - % de novos negócios em substituição ao anterior que acessaram consultoria/assessoria especializada - Frequência Semestral

Indicadores

I03 - % de negócios impactados adequados à novas condições de mercado

Percentual(%)

100,00%



Gráfico 3: I03 - % de negócios impactados adequados à novas condições de mercado - Frequência Semestral

PG020 Estímulo à Contratação Local

Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivo

Estabelecer e executar um processo de desenvolvimento de ações que auxiliem na priorização de contratação local, com ênfase na população atingida, visando capacitar e estimular o uso da força de trabalho e redes de fornecedores locais para as ações que forem desenvolvidas na área de atuação da Fundação Renova, conforme cláusulas 134 a 136 do TTAC.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	134	Caput	Em andamento
Cláusula	135	a	Em andamento
Cláusula	135	b	Em andamento
Cláusula	136	Caput	Em andamento
Deliberação	146	1	Concluída Internamente
Deliberação	20	n/a	Concluída Internamente
Deliberação	352	5	Concluída Internamente
Deliberação	84	n/a	Concluída Internamente

Entregas do ano de 2022

- julho de 2022 Conclusão da execução da 2ª Turma do Programa de Desenvolvimento do Fornecedor no Espírito Santo (marco CIF- Planejamento 2022)
- julho de 2022 Conclusão das capacitações de preparação para o Mercado de Trabalho (Recoloca Rio Doce)

● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Grandes Números

Ações em andamento

- Nos cursos de qualificação presencial foram ofertadas 290 **turmas, abertas** 8.492 **vagas**, 7.647 **pessoas matriculadas**, 5.233 **concluintes**, 406 **reprovadas** e 1.556 **evadidos**.

Ações realizadas

- 10.504 vagas foram abertas nos cursos de qualificação on-line ofertadas pela Fundação Renova, 7.332 **pessoas matriculadas**, 1.566 **concluintes**, 1.218 **reprovadas** e 2.607 **evadidos**. Atividades dos cursos on-line foram encerradas em 27/08/2021.
- **R\$ 3.064.071** de **Geração de Renda** para os atingidos, oportunizados pelo poder de compra da Fundação Renova.

Fatos relevantes do mês

Qualificação Profissional e Preparação para o Mercado de Trabalho:

RECOLOCA: Foram realizados treze eventos no mês de outubro com o tema "Preparação para o Mercado de trabalho", nos municípios de Ipatinga. Onde foram ofertadas 498 vagas e tivemos 498 participantes.

SENAI: No mês de outubro iniciamos quatorze turmas de capacitação profissional. No Espírito Santo foram ofertadas duas em Colatina (Iniciação técnicas de marcenaria) e (Noções de Rotinas Administrativas), uma em Baixo Guandu (Risco e Corte), duas em Linhares (Solda MAG) e (Fabricação de Salgados) e uma em Povoação (Iniciação técnicas de marcenaria). Em Minas Gerais foram ofertadas cinco turmas em Mariana (Aperfeiçoamento - Montador de Padrão), (Fundamentos de Gestão), (Instalador de Sistema Fotovoltaico), (Assistente Administrativo), uma turma em Ipatinga (Solda MIG), e quatro turmas em Governador Valadares/ Resplendor (Informática Básica), (Elétrica Predial), (Assistente Administrativo) e (Informática Básica). No total foram ofertadas 395 vagas e tivemos 318 alunos matriculados.

Monitoramento de Contratações Locais:

Realizada a contratação de 281 pessoas pelos fornecedores da Fundação Renova, sendo 162 contratações locais e 119 contratações não locais. Dessas 281 contratações, 186 profissionais são de Minas Gerais, 29 do Espírito Santo e 66 dos demais estados.

Por meio da Plataforma "Recoloca Rio Doce", foram cadastrados 406 currículos e prospectadas 419 vagas de emprego no mês. No acumulado, 7.530 currículos estão cadastrados e 6.408 vagas já foram captadas.

Desenvolvimento de Fornecedor | +Gestão:

Encontro de Negócios do Projeto +Gestão realizado em Mariana com a participação de 70 pessoas que teve o objetivo de estabelecer relacionamentos entre grandes empresas que estão atuando no município com empresários locais para que tenham a oportunidade de se apresentar e de negociar seus produtos e serviços a partir desse contato. Grandes empresas participantes: Fundação Renova, Dinâmica, ERG, Gemma e Sapore.

Indicadores

I01 – Utilização da rede local de fornecedores – MG e ES

Percentual(%)

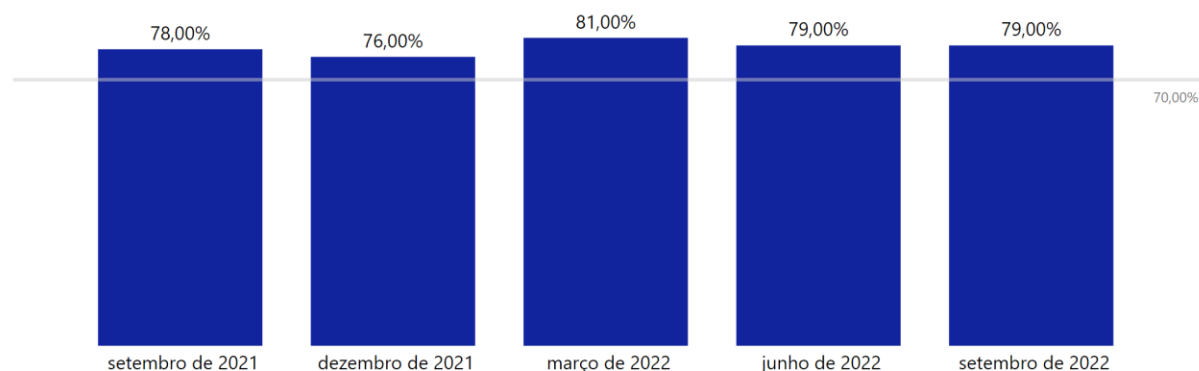


Gráfico 1: I01 – Utilização da rede local de fornecedores – MG e ES - Frequência Trimestral

I02 – Utilização da rede local de fornecedores – 39 Municípios

Percentual(%)

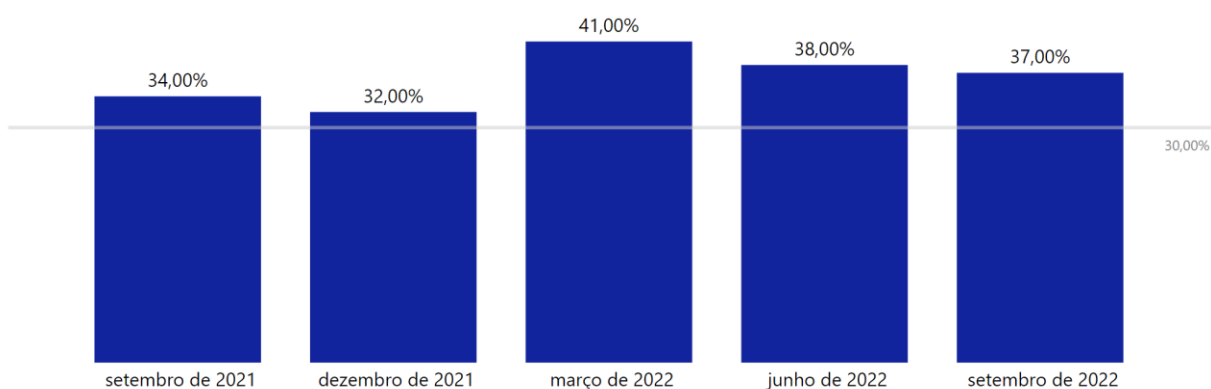


Gráfico 2: I02 – Utilização da rede local de fornecedores – 39 Municípios - Frequência Trimestral

Indicadores

I03 – Relação de profissionais admitidos em cada região – MG e ES

Percentual(%)

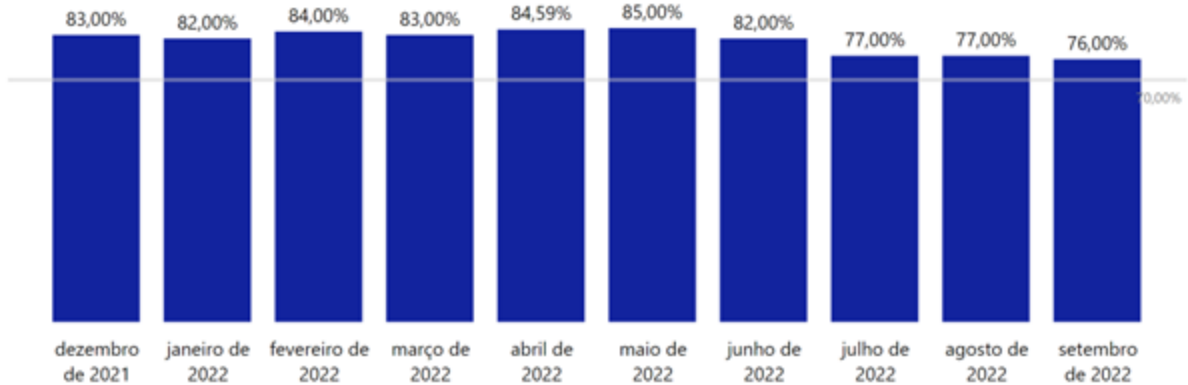


Gráfico 3: I03 – Relação de profissionais admitidos em cada região – MG e ES - Frequência Mensal

I04 – Relação de profissionais admitidos em cada região – 39 Municípios

Percentual(%)

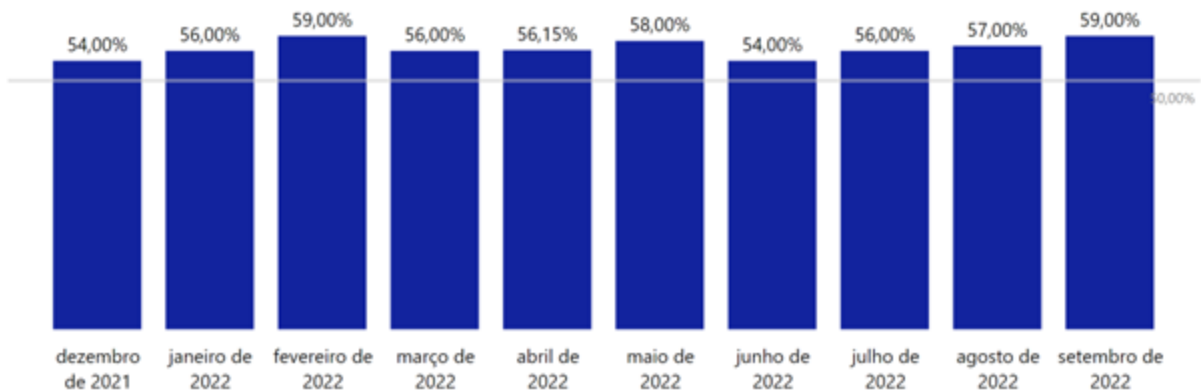


Gráfico 4: I04 – Relação de profissionais admitidos em cada região – 39 Municípios - Frequência Mensal

*Os indicadores I03 e I04 são reportados com delay de um mês.

Indicadores

I05 – Quantidade de profissionais que finalizaram os cursos de aperfeiçoamento profissional

Quantidade

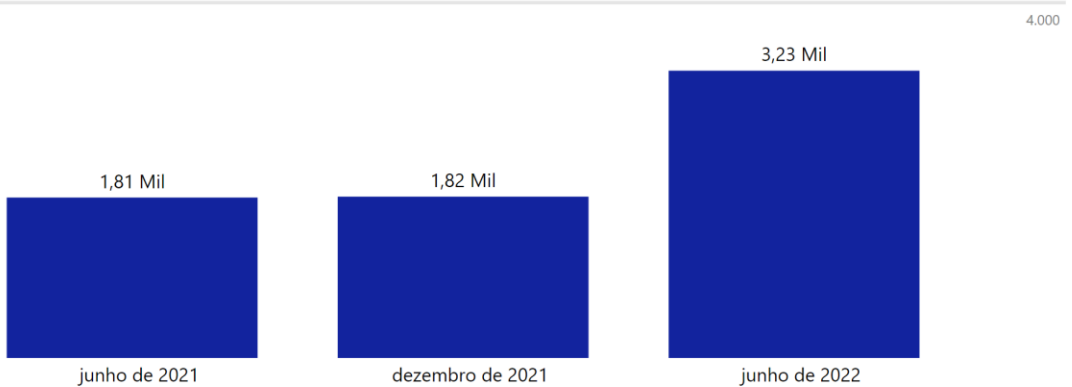


Gráfico 5: I05 – Quantidade de profissionais que finalizaram os cursos de aperfeiçoamento profissional - Frequência Semestral

IC -Total de recursos recolhidos (ISS/ICMS) por estadualna área de atuação da Renova

Percentual(%)

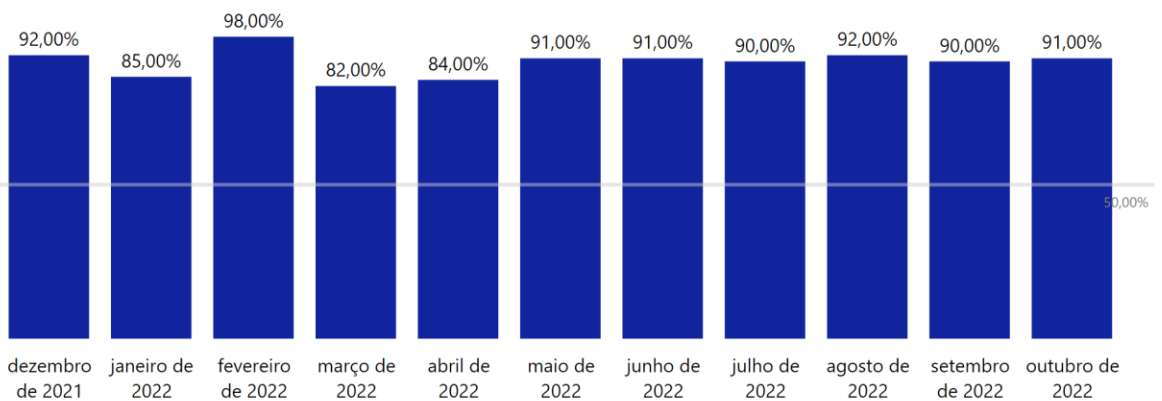


Gráfico 6: IC -Total de recursos recolhidos (ISS/ICMS) por estadualna área de atuação da Renova - Frequência Mensal

Indicadores

Ic – Valor Total de recursos aplicados em compras de materiais, realizadas pela Fundação Renova nos estados de MG e ES

Quantidade

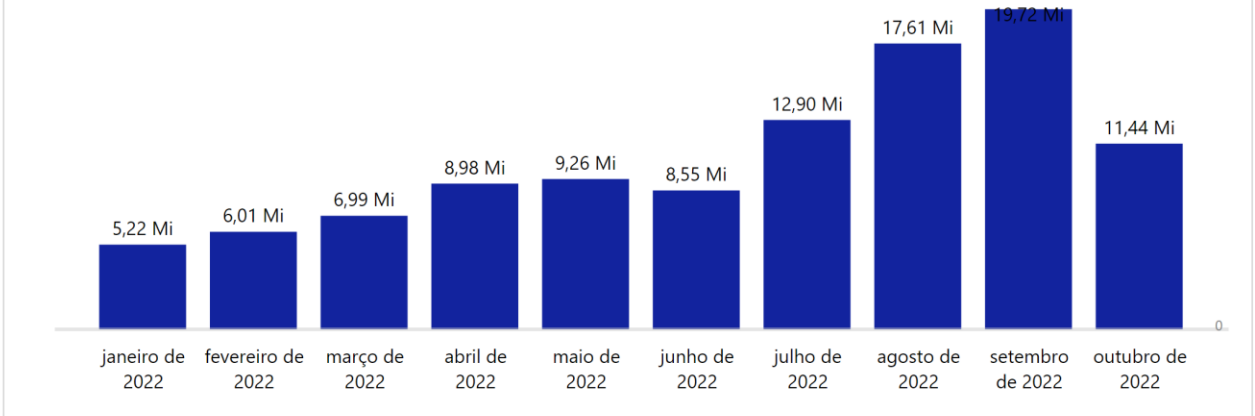


Gráfico 7: Ic – Valor Total de recursos aplicados em compras de materiais, realizadas pela Fundação Renova nos estados de MG e ES - Frequência Semestral

PG021 Auxílio Financeiro Emergencial

Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivo

Fornecer auxílio financeiro emergencial à população impactada que tenha tido comprometimento de sua renda em razão de interrupção comprovada de suas atividades produtivas ou econômicas em decorrência do Rompimento, conforme as Cláusulas de 137 a 140 e 21 a 24 do TTAC.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	137	Caput	Judicializada
Deliberação	111	6	Concluída Internamente
Deliberação	141	4	Concluída Internamente
Deliberação	167	1	Concluída Internamente
Deliberação	167	2	Concluída Internamente
Deliberação	167	3	Judicializada
Deliberação	210	único	Concluída Internamente
Deliberação	234	4	Concluída Internamente
Deliberação	234	5	Concluída Internamente
Deliberação	292	2	Concluída Internamente
Deliberação	307	2b	Concluída Internamente
Deliberação	35	n/a	Concluída Internamente
Deliberação	420	3-a	Judicializada
Deliberação	422	2	Concluída Internamente
Deliberação	457	1 e 2	Judicializada
Deliberação	48	n/a	Concluída Internamente
Deliberação	485	1 e 2	Concluída Internamente

Entregas do ano de 2022

A Fundação Renova entende que o Planejamento deste Programa tem sido determinado por decisões judiciais (a exemplo da decisão de 30/11/2021), e, em função disso, não é possível precisar o Planejamento 2022 em sede administrativa.

Grandes números do programa

- Atualmente há 14.558 **titulares** que recebem auxílio financeiro emergencial. Considerando titulares e dependentes, são 32.459 pessoas assistidas pelo Programa;
- Até o momento foram **pagos R\$** 2.214,4 Mi .

Fatos relevantes do mês

Inclusão de 7132 auxílios

Exclusão de 47 auxílios

Indicadores

I01 – Adimplência dos pagamentos de auxílio financeiro emergencial

Percentual(%)




Gráfico 1: I01 – Adimplência dos pagamentos de auxílio financeiro emergencial - Frequência Trimestral

I02 – Percentual de pagamento de Programa de Auxílio Financeiro Emergencial

Percentual(%)

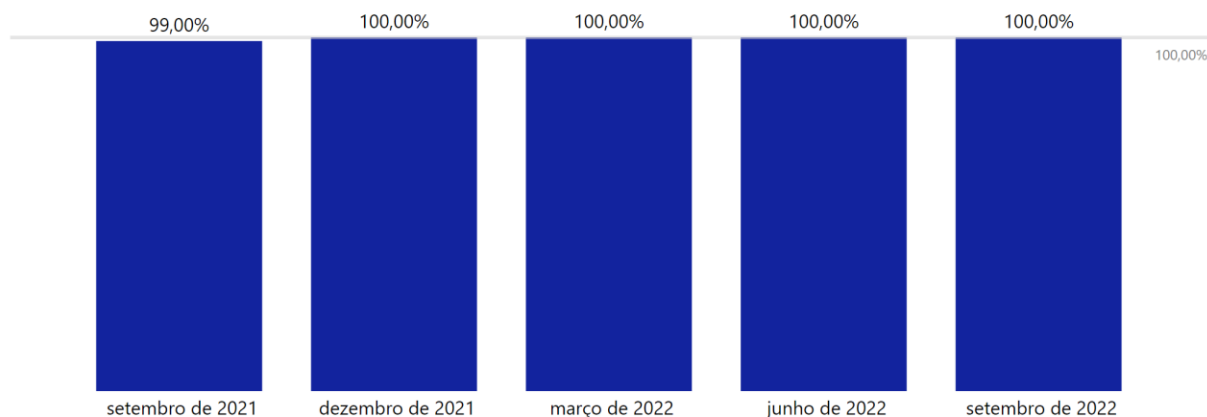


Gráfico 2: I02 – Percentual de pagamento de Programa de Auxílio Financeiro Emergencial - Frequência Trimestral

PG023 Manejo de Rejeitos

Eixo Terra e Água

Objetivo

Apresentar diretrizes, conceitos, metodologias, técnicas, critérios e indicadores para tomada de decisão quanto ao manejo dos rejeitos para elaboração e execução de projetos aplicáveis a cada fração territorial nas áreas afetadas pelo rompimento da Barragem de Fundão.

Status de Cláusulas e Deliberações



Cláusula	150	Caput	Concluída Internamente
Cláusula	151	Caput	Judicializada
Cláusula	180	§único	Judicializada
Cláusula	180	Caput	Em andamento
Deliberação	142	2	Concluída Internamente
Deliberação	164	1	Concluída Internamente
Deliberação	165	1	Concluída Internamente
Deliberação	165	2	Concluída Internamente
Deliberação	173	3	Concluída Internamente
Deliberação	180	2	Concluída Internamente
Deliberação	194	2	Em andamento
Deliberação	222	1	Concluída Internamente
Deliberação	222	1.1	Concluída Internamente
Deliberação	222	1.2	Concluída Internamente
Deliberação	222	1.3	Concluída Internamente
Deliberação	222	1.4	Concluída Internamente
Deliberação	222	1.5	Concluída Internamente
Deliberação	222	1.6	Concluída Internamente
Deliberação	222	1.7	Concluída Internamente
Deliberação	245	1	Em andamento
Deliberação	245	1.1	Concluída Internamente
Deliberação	245	1.2	Concluída Internamente
Deliberação	245	1.3	Concluída Internamente
Deliberação	245	1.4	Em andamento
Deliberação	246	2	Concluída Internamente
Deliberação	246	3	Concluída Internamente
Deliberação	261	1.14	Concluída Internamente
Deliberação	261	1.15	Concluída Internamente
Deliberação	261	1.16	Concluída Internamente




Deliberação	261	1	Em andamento
Deliberação	261	1.1	Concluída Internamente
Deliberação	261	1.10	Em andamento
Deliberação	261	1.11	Em andamento
Deliberação	261	1.12	Em andamento
Deliberação	261	1.13	Concluída Internamente
Deliberação	261	1.17	Concluída Internamente
Deliberação	261	1.18	Concluída Internamente
Deliberação	261	1.19	Concluída Internamente
Deliberação	261	1.2	Concluída Internamente
Deliberação	261	1.3	Concluída Internamente
Deliberação	261	1.4	Concluída Internamente
Deliberação	261	1.5	Concluída Internamente
Deliberação	261	1.7	Concluída Internamente
Deliberação	261	1.8	Judicializada
Deliberação	261	1.9	Em andamento
Deliberação	273	1	Em andamento
Deliberação	273	1.1	Em andamento
Deliberação	273	1.2	Concluída Internamente
Deliberação	273	1.3	Em andamento
Deliberação	273	1.5	Em andamento
Deliberação	323	1	Em andamento
Deliberação	324	2	Concluída Internamente
Deliberação	345	2	Concluída Internamente
Deliberação	358	1	Concluída Internamente
Deliberação	358	2	Concluída Internamente
Deliberação	358	3	Judicializada
Deliberação	362	2	Reprogramada
Deliberação	363	1	Concluída Internamente
Deliberação	364	1	Concluída Internamente
Deliberação	378	5	Concluída Internamente
Deliberação	378	6	Concluída Internamente

Deliberação	273	1.4	Em andamento
Deliberação	273	1.6	Em andamento
Deliberação	273	1.7	Em andamento
Deliberação	284	1	Concluída Internamente
Deliberação	284	2	Concluída Internamente
Deliberação	285	3	Concluída Internamente
Deliberação	285	4	Concluída Internamente
Deliberação	285	5	Concluída Internamente
Deliberação	3	n/a	Concluída Internamente
Deliberação	304	2	Judicializada
Deliberação	384	1	Concluída Internamente
Deliberação	431	2	Concluída Internamente
Deliberação	45	n/a	Concluída Internamente
Deliberação	453	3	Concluída Internamente
Deliberação	488	2	Judicializada
Deliberação	488	4	Judicializada
Deliberação	497	1	Concluída Internamente
Deliberação	497	2	Concluída Internamente
Deliberação	497	3	Concluída Internamente
Deliberação	516	2	Concluída Internamente
Deliberação	516	3	Concluída Internamente
Deliberação	544	2	Concluída Internamente
Deliberação	544	3	Concluída Internamente
Deliberação	590	2	Concluída Internamente
Deliberação	592	2	Concluída Internamente
Deliberação	592	5	Em andamento
Deliberação	86	1-c (ação 1)	Concluída Internamente
Deliberação	86	e	Concluída Internamente
Deliberação	86	f	Concluída Internamente

Deliberação	86	1-a	Concluída Internamente
Deliberação	86	1-c	Concluída Internamente

Entregas do ano de 2022

- maio de 2022  Conclusão do 2º ano de estudos na região deltaica do Baixo Doce
- novembro de 2022  Conclusão dos Serviços de Monitoramento Ambiental de Intervenções Prioritárias (Monitoramento da Vegetação e Monitoramento de Processos Erosivos) - 4º Ano hidrológico

 Concluído  Planejado  Reprogramado

Grandes números do programa

O programa não possui grandes números.

Fatos relevantes do mês

Realizado protocolo do relatório de monitoramento da qualidade do ar, referente ao 3º trimestre, em 17/10/2022.

NOTA TÉCNICA CT-GRSA Nº 10/2022 referente ao Mapeamento da mancha de inundação do período chuvoso 2021/2022 no Estado do Espírito Santo.

NOTA TÉCNICA CT-GRSA Nº 09/2022 referente a análise dos estudos Hidrológico e de Modelagem Hidrodinâmica da Mancha de Inundação de 2016 e 2020 para os trechos T13 a T16, protocolados pela Fundação Renova em atendimento à deliberação CIF nº 497/2021.

Indicadores

Conforme estabelecido pela Nota Técnica 12/2018/CTPDCS/CIF e Deliberação CIF nº230, os indicadores do Programa estão em discussão no âmbito da 12ª Vara Cível e Agrária, na Ação Civil Pública (ACP) 69758-91.2018.4.01.3400. Portanto, esse processo encontra-se em andamento.

PG025 Programa de Recuperação da Área Ambiental 1


Eixo Terra e Água

Recuperação da área diretamente impactada pelo rompimento da barragem de Fundão (ÁREA AMBIENTAL 1) nos municípios de Mariana, Barra Longa, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado, em atendimento as cláusulas 158, 159 e 160 do TTAC, bem como do distrito de Chopotó, localizado no município de Ponte Nova, que foi parcialmente impactado.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	158	Caput	Encerrada
Cláusula	159	§único	Em andamento
Cláusula	159	Caput	Em andamento
Cláusula	160	Caput	Concluída Internamente
Deliberação	186	2	Concluída Internamente
Deliberação	223	3	Concluída Internamente
Deliberação	249	3	Concluída Internamente
Deliberação	26	n/a	Concluída Internamente
Deliberação	613	2.1	Planejada
Deliberação	613	2.2	Concluída Internamente
Deliberação	66	Ação 1	Concluída Internamente
Deliberação	66	Ação 3	Concluída Internamente

Entregas do ano de 2022

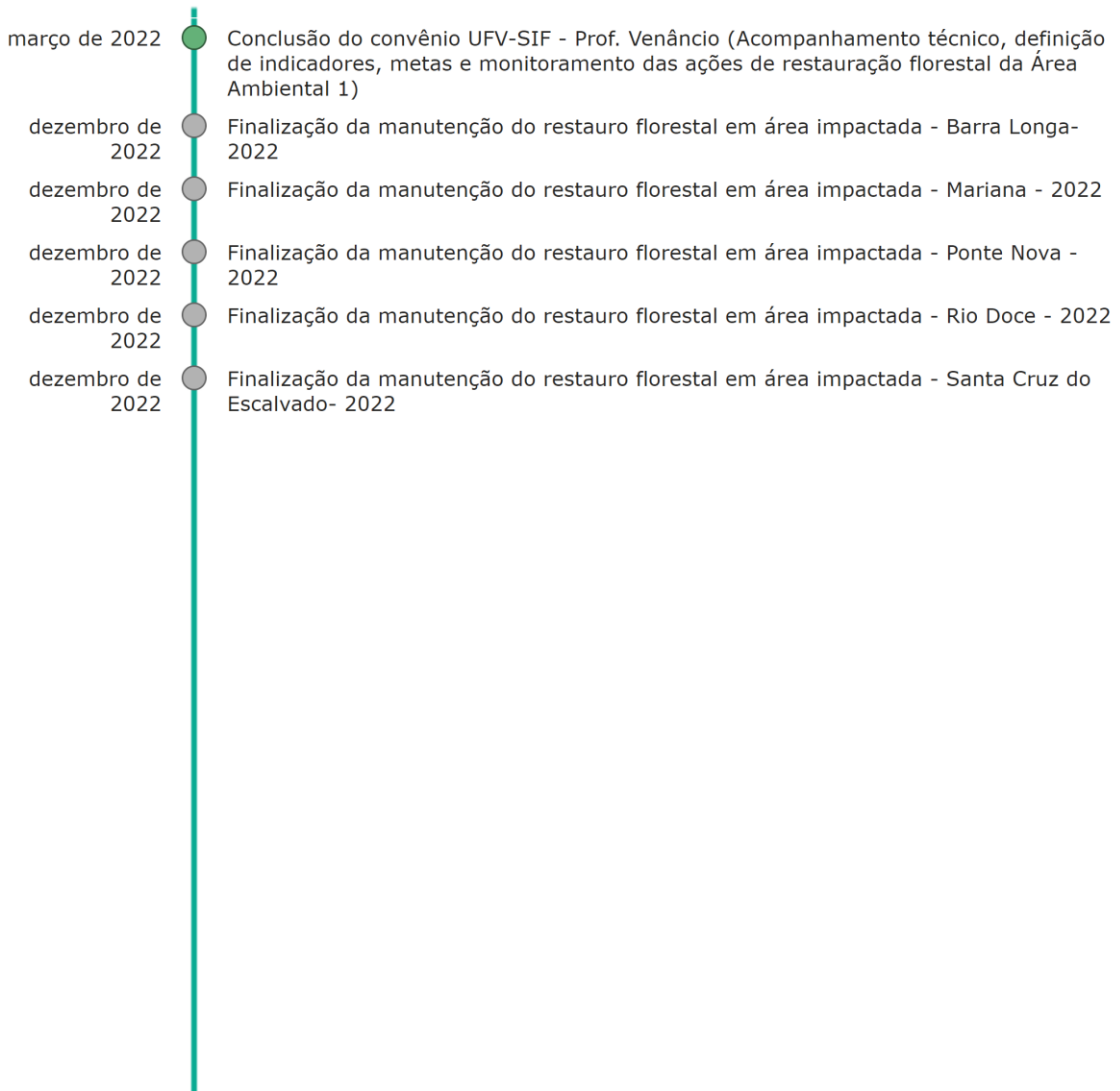

● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Grandes números do programa

- 808 **hectares** de plantio emergencial para controle de erosão;
- 113 **afluentes** recuperados;
- 542 **hectares** de restauração florestal implantados e em manutenção.

Fatos relevantes do mês

As atividades de manutenção da restauração florestal vem sendo desenvolvidas nos municípios atingidos.

Indicadores

I08 - Índice de solo exposto – Cenários B e C

Percentual(%)

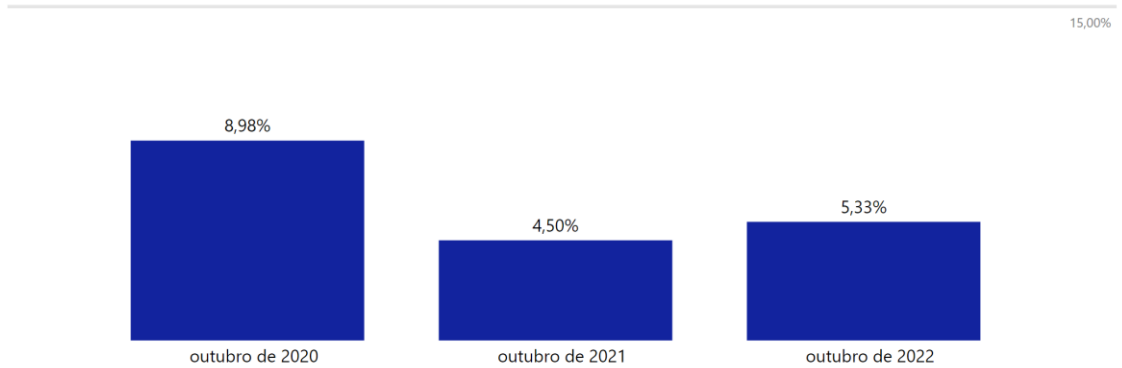


Gráfico 1: I08 - Índice de solo exposto – Cenários B e C - Frequência Bianaual

Indicadores

Tabela 1. Indicadores do programa.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDADE DE MEDIDA
I01	Índice de Cobertura Vegetal	$(\text{Área total com cobertura vegetal herbácea - arbustiva} / \text{Área total passível de revegetação emergencial/inicial}) * 100$	%
I02	Índice de Solo Exposto	$(\text{Área total com solo exposto} / \text{Área total passível de revegetação emergencial/inicial}) * 100$	%
I03	Biomassa Total da Vegetação	$(0,011 * \text{banda } 2 * \text{NDVI2}) + (-0,008 * \text{Banda } 3 * \text{NDVI2})$	t/ha
I04	Índice de Redução de Perda de Solo	$(\text{Perda de solo [t/há] nas parcelas de monitoramento tratadas por bioengenharia} / \text{Perda de solo [t/há] nas parcelas de monitoramento e controle}) * 100$	%
I05	Diversidade de Espécies Nativas para Cenários A, B e C	$(\text{Diversidade de espécies nativas no sexto ano de intervenção} / \text{diversidade de espécies nativas do ecossistema de referência}) * 100$	%
I06	Densidade Total de Espécies Nativas (Mudas + Regenerantes) – Cenários A, B e C	Número de indivíduos / área amostral	Nº de indivíduos/ha
I07	Controle de Espécies Invasoras – Cenários B e C	$(\text{Área total com espécie invasora} / \text{Total das áreas em recuperação florestal (cenários B e C)}) * 100$	%

PG026 Programa de Recuperação de Áreas de Preservação Permanente (APPs) e Recargas Hídricas

Eixo Terra e Água

Objetivo

Promover a recuperação de APPs e áreas de recarga hídrica degradadas do Rio Doce e tributários preferencialmente, mas não se limitando, nas sub-bacias dos rios definidos como fonte superficial de abastecimento alternativo para os municípios e distritos listados nos parágrafos segundo e terceiro da CLÁUSULA 171 deste acordo, conforme as prioridades definidas pelo COMITÊ INTERFEDERATIVO, através da deliberação 196/2018, numa extensão de 40.000 ha em 10 anos.

Este programa será executado diretamente pela Fundação Renova e/ou em cooperação com os governos dos estados de Minas Gerais e Espírito Santo.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	161	Caput	Judicializada
Deliberação	108	2	Concluída Internamente
Deliberação	108	3	Concluída Internamente
Deliberação	11	n/a	Concluída Internamente
Deliberação	133	2	Concluída Internamente
Deliberação	134	2	Concluída Internamente
Deliberação	14	n/a	Concluída Internamente
Deliberação	143	3	Concluída Internamente
Deliberação	143	5	Concluída Internamente
Deliberação	143	6	Concluída Internamente
Deliberação	144	1	Concluída Internamente
Deliberação	196	4	Concluída Internamente
Deliberação	270	4	Em Andamento
Deliberação	343	1.4	Concluída Internamente
Deliberação	44	n/a	Concluída Internamente
Deliberação	490	1	Concluída Internamente
Deliberação	490	2	Concluída Internamente
Deliberação	62	n/a	Concluída Internamente
Deliberação	65	n/a	Concluída Internamente
Deliberação	88	3	Concluída Internamente
Deliberação	89	3	Concluída Internamente
Deliberação	90	3	Concluída Internamente

Entregas do ano de 2022

fevereiro de 2022		Conclusão das atividades de engajamento/validação nas propriedades para Sub-bacia Manhuaçu - 23/24
fevereiro de 2022		Conclusão das atividades de engajamento/validação nas propriedades para Sub-bacia Corrente Grande - 22/23
fevereiro de 2022		Conclusão das atividades de engajamento/validação nas propriedades para Sub-bacia Pontões e Lagoas- 22/23
maio de 2022		Conclusão da mobilização dos produtores rurais para Sub-bacia Assentamentos, TI Krenak, Uds e Ucs - 23/24
junho de 2022		Conclusão da mobilização dos produtores rurais para Sub-bacia Pontões e Lagoas - 24/25
junho de 2022		Conclusão das atividades de engajamento/validação nas propriedades para Sub-bacia Pontões e Lagoas - 23/24
junho de 2022		Conclusão das atividades de engajamento/validação nas propriedades para Sub-bacia Santa Maria do Doce - 22/23
junho de 2022		Conclusão das atividades de engajamento/validação nas propriedades para Sub-bacia Santa Maria do Doce - 23/24
julho de 2022		Conclusão dos cercamentos/proteção nas propriedades para Sub-bacia Corrente Grande - 22/23
julho de 2022		Conclusão dos cercamentos/proteção nas propriedades para Sub-bacia Pontões e Lagoas - 22/23
novembro de 2022		Conclusão da mobilização dos produtores rurais para Sub-bacia Corrente Grande - 23/24
novembro de 2022		Conclusão da mobilização dos produtores rurais para Sub-bacia Santa Maria do Doce - 24/25
dezembro de 2022		Conclusão dos cercamentos/proteção nas propriedades para Sub-bacia Pontões e Lagoas- 23/24

 Concluído  Planejado  Reprogramado

Grandes números do programa

- 9.210,0 **hectares** com o processo de recuperação iniciada;
- 261 **propriedades rurais** parceiras nas ações de recuperação das áreas de preservação permanente (APP) e áreas de recarga hídrica (ARH);
- 28,5 Mil **hectares** inscritos no edital;
- R\$ 523 Mil pagos de PSA aos produtores rurais.
- 21.562 hectares validados.

Fatos relevantes do mês

A Rede de sementes e midas iniciou o segundo ciclo de retirada de sementes, foram 309 Kg de sementes oriundas do município Dionísio, coletadas próximo a zona de amortecimento do Parque Estadual do Rio Doce_PGs 26 e 27;

Apresentação dos resultados dos PGs 26 e 27 para a comunidade atingida de Pedra Corrida, Periquito – MG_PGs 26 e 27;

Envio do documento Lições Aprendidas para todos os participantes_PGs 26 e 27;

Fiscalização da medição da AMBIPAR referente a medição das parcelas do monitoramento ecológico em Colatina - ES _PGs 26 e 27;

Treinamento da equipe Progen (Manhuaçu) em Ipanema_PGs 26 e 27;

Workshop Lições Aprendidas_PGs 26 e 27;

Indicadores

Tabela 1. Indicadores que não iniciaram a medição.

INDICADOR	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDADE DE MEDIDA	INÍCIO PREVISTO DE MEDIÇÃO
I00 – APPs e recarga hídricas recuperadas	I00 - Hectare recuperado	ha	janeiro/2024
I01 - Riqueza de espécies	I01 - (riqueza de espécies nativas no sexto ano de intervenção / riqueza de espécies nativas do ecossistema de referência) * 100	%	janeiro/2024
I02 – Densidade de regenerantes	I02 - Número de indivíduos / total de área amostral	Nº indivíduos/ha	janeiro/2024
I03 - Cobertura do dossel	I03 - (total da área amostral com cobertura do dossel / total da área amostral) * 100	%	janeiro/2024

PG027 Programa de Recuperação de Nascentes

Eixo Terra e Água

Objetivo
















Promover a recuperação de 5.000 (cinco mil) nascentes, a serem definidas pelo Comitê de Bacia Hidrográfica do Doce (CBH-Doce), iniciando a recuperação de 500 (quinhentas) nascentes por ano, a contar da assinatura do TTAC, em um período máximo de 10 (dez) anos, conforme estabelecido no Plano Integrado de Recursos Hídricos do CBH-Doce, podendo abranger toda área da Bacia do Rio Doce.

Este programa será executado diretamente pela Renova e/ou em cooperação com iniciativas correlatas na bacia do rio Doce.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	163	Caput (ação 1)	Judicializada
Deliberação	135	3	Concluída Internamente
Deliberação	135	4	Concluída Internamente
Deliberação	135	5	Concluída Internamente
Deliberação	490	1	Concluída Internamente
Deliberação	490	2	Concluída Internamente
Deliberação	87	3	Concluída Internamente

Entregas do ano de 2022

janeiro de 2022		Conclusão da mobilização dos produtores rurais para a sub-bacia de Corrente Grande - 21/22
janeiro de 2022		Conclusão da mobilização dos produtores rurais para a sub-bacia de Pancas - 21/22
junho de 2022		Conclusão da mobilização dos produtores rurais para a sub-bacia de Assentamentos MG e TI Krenak - 19/21
julho de 2022		Conclusão as atividades de engajamento / validação nas propriedades para a sub-bacia de Pancas - 21/22
julho de 2022		Conclusão as atividades de engajamento / validação nas propriedades para a sub-bacia de Pancas - 22/23
agosto de 2022		Conclusão dos cercamentos/proteção nas propriedades para a sub-bacia de Pancas - 21/22
setembro de 2022		Conclusão dos cercamentos/proteção nas propriedades para a sub-bacia de Corrente Grande - 19/21
outubro de 2022		Conclusão dos cercamentos/proteção nas propriedades para a sub-bacia de Suaçuí - 21/22
novembro de 2022		Lançamento do Edital de mobilização dos produtores rurais para a sub-bacia de Caratinga - 22/23
novembro de 2022		Lançamento do Edital de mobilização dos produtores rurais para a sub-bacia de Guandu - 22/23
novembro de 2022		Lançamento do Edital de mobilização dos produtores rurais para a sub-bacia de Manhuaçu - 22/23
novembro de 2022		Lançamento do Edital de mobilização dos produtores rurais para a sub-bacia de Manhuaçu - 23/24
novembro de 2022		Lançamento do Edital de mobilização dos produtores rurais para a sub-bacia de Santo Antônio - 22/23
dezembro de 2022		Conclusão as atividades de engajamento / validação nas propriedades para a sub-bacia de Lagoa Nova (Rio Bananal) - 21/22
dezembro de 2022		Conclusão da mobilização dos produtores rurais para a sub-bacia de Pancas - 22/23

 Concluído

 Planejado

 Reprogramado

Entregas do ano de 2022

- dezembro de 2022 ● Conclusão as atividades de engajamento / validação nas propriedades para a sub-bacia de Corrente Grande - 21/22
- dezembro de 2022 ● Conclusão da mobilização dos produtores rurais para a sub-bacia de Lagoa Nova (Rio Bananal) - 21/22
- dezembro de 2022 ● Conclusão da mobilização dos produtores rurais para a sub-bacia de Suaçuí - 21/22

● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Grandes números do programa

- 1621 **nascentes** com o processo de recuperação iniciada;
- 535 **propriedades rurais** parceiras nas ações de recuperação das nascentes;
- 4235 **nascentes** inscritas no edital;
- R\$ 184413 pagos de PSA aos produtores rurais.
- 2686 Nascentes Validadas

Fatos relevantes do mês

A Rede se sementes e midas iniciou o segundo ciclo de retirada de sementes, foram 309 Kg de sementes oriundas do município Dionísio, coletadas próximo a zona de amortecimento do Parque Estadual do Rio Doce_PGs 26 e 27;

Apresentação dos resultados dos PGs 26 e 27 para a comunidade atingida de Pedra Corrida, Periquito – MG_PGs 26 e 27;

Envio do documento Lições Aprendidas para todos os participantes_PGs 26 e 27;

Fiscalização da medição da AMBIPAR referente a medição das parcelas do monitoramento ecológico em Colatina - ES _PGs 26 e 27;

Treinamento da equipe Progen (Manhuaçu) em Ipanema_PGs 26 e 27;

Workshop Lições Aprendidas_PGs 26 e 27;

Indicadores

Tabela 1. Indicadores que não iniciaram a medição.

INDICADOR	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDADE DE MEDIDA	INÍCIO PREVISTO DE MEDIÇÃO
I00 – Nascentes recuperadas	I00 - Nascente Recuperada	ha	janeiro/2024
I01 - Riqueza de espécies	I01 - (riqueza de espécies nativas no sexto ano de intervenção / riqueza de espécies nativas do ecossistema de referência) * 100	%	janeiro/2024
I02 – Densidade de regenerantes	I02 - Número de indivíduos / total de área amostral	Nº indivíduos/ha	janeiro/2024
I03 - Cobertura do dossel	I03 - (total da área amostral com cobertura do dossel / total da área amostral) * 100	%	janeiro/2024

PG028 Conservação da Biodiversidade Aquática

Eixo Terra e Água

Objetivo

Identificar, mensurar e monitorar os impactos agudos e crônicos sobre a biota e ambientes do rio Doce e tributários, da foz, costeiros, estuarinos e marinhos, implementar medidas para a recuperação e conservação desta biota nos ambientes potencialmente impactados pelo rompimento da barragem de Fundão e avaliar a efetividade dessas medidas.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	164	a (ação 1)	Encerrada
Cláusula	164	a (ação 2)	Encerrada
Cláusula	164	a (ação 3)	Encerrada
Cláusula	164	b	Encerrada
Cláusula	164	c (ação 1)	Concluída Internamente
Cláusula	164	c (ação 2)	Em andamento
Cláusula	165	Inc I - a-b	Concluída Internamente
Cláusula	165	Inc II - a	Concluída Internamente
Cláusula	165	Inc II - b	Concluída Internamente
Cláusula	165	Inc III - ES	Em andamento
Cláusula	165	Inc III - MG	Judicializada
Cláusula	166	§1º	Em andamento
Cláusula	166	§2º	Em andamento
Deliberação	102	2	Concluída Internamente
Deliberação	112	2	Concluída Internamente
Deliberação	113	2	Concluída Internamente
Deliberação	148	3	Concluída Internamente
Deliberação	148	4	Concluída Internamente
Deliberação	159	2	Concluída Internamente
Deliberação	159	3	Judicializada
Deliberação	212	3	Concluída Internamente
Deliberação	218	3	Concluída Internamente
Deliberação	218	4	Concluída Internamente
Deliberação	279	2	Concluída Internamente
Deliberação	279	3	Concluída Internamente
Deliberação	282	1	Concluída Internamente
Deliberação	282	2	Concluída Internamente
Deliberação	336	1	Concluída Internamente

Deliberação	337	1	Concluída Internamente
Deliberação	347	1.3	Concluída Internamente
Deliberação	347	1.4	Concluída Internamente
Deliberação	385	3.2	Concluída Internamente
Deliberação	385	3.3	Concluída Internamente
Deliberação	392	1	Concluída Internamente
Deliberação	447	1	Judicializada
Deliberação	450	2	Judicializada
Deliberação	450	5	Concluída Internamente
Deliberação	461	3	Concluída Internamente
Deliberação	578	2	Concluída Internamente
Deliberação	579	1	Em andamento
Deliberação	607	2	Planejada
Deliberação	607	3	Planejada
Deliberação	74	1	Concluída Internamente
Deliberação	79	n/a	Concluída Internamente

Entregas do ano de 2022

janeiro de 2022	●	Protocolo dos relatórios finais das linhas temáticas I a VI
janeiro de 2022	●	Protocolo do Relatório Anual do Ciclo 4 de Monitoramento Reprodutivo de Tartarugas Marinhas junto à CT-Bio
fevereiro de 2022	●	Conclusão do Ciclo 3 de Monitoramento da Biodiversidade Aquática do Rio Doce, da foz e ambientes marinhos e estuarinos impactados na Área Ambiental 1, no Espírito Santo
março de 2022	●	Início da execução do Plano de Ação da Biodiversidade Aquática
abril de 2022	●	Protocolo do Plano de Trabalho para a elaboração do Plano de Ação Integrado para Conservação da Biodiversidade Aquática - Versão revisada
julho de 2022	●	Relatório de avaliação dos impactos para o ambiente marinho e costeiro - PAI
agosto de 2022	●	Protocolo do Relatório subprojeto I - SIF/UFV
agosto de 2022	●	Protocolo do Relatório subprojeto IV - SIF/UFV
agosto de 2022	●	Realização da Oficina I de Elaboração do PA Integrado
outubro de 2022	●	Protocolo do Relatório subprojeto II - SIF/UFV
outubro de 2022	●	Protocolo do Relatório subprojeto III-B - SIF/UFV
novembro de 2022	●	Protocolo do Relatório Semestral do Ciclo 5 de Monitoramento Reprodutivo de Tartarugas Marinhas na CT-Bio
dezembro de 2022	●	Realização da Oficina II de Elaboração do PA Integrado
dezembro de 2022	●	Conclusão da publicação do livro do plano de ação para conservação da biodiversidade aquática

● Concluído

● Planejado

● Reprogramado

Grandes números do programa

O programa não possui grandes números.

Fatos relevantes do mês

Em 24 de outubro de 2022 foi protocolado o Ofício FR.2022.1631 referente à apresentação de relatório e dados brutos dos Subprojetos II (Avaliação dos efeitos da presença de poluentes sobre a ecologia trófica da ictiofauna da bacia do Rio Doce) e IIIB (Dinâmica populacional e evolutiva da ictiofauna na bacia do rio Doce - Análise populacional com uso de microssatélites). Esses Subprojetos compõem o “Estudo da Ictiofauna da bacia do rio Doce após o rompimento da barragem de rejeito da Samarco”, como parte do atendimento à Deliberação CIF nº 521 de 05 de agosto de 2021 e à Cláusula 165 do TTAC.

Indicadores

I01 – Execução de campanhas de campo (Cláusulas 165)

Percentual(%)

100,00%

34,63%

junho de 2022

Gráfico 1: I01 – Execução de campanhas de campo (Cláusulas 165) - Frequência Semestral

PG029 Programa de Fortalecimento das Estruturas de Triagem e Reabilitação da Fauna Silvestre

Eixo Terra e Água

Objetivo

- Efetuar a construção e o aparelhamento de dois Centros de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS), um em Minas Gerais e outro no Espírito Santo; e
- Assegurar recursos para a manutenção operacional desses centros por um período de três anos, contados a partir de sua entrega, de acordo com o Plano de Gestão a ser estabelecido pelo órgão gestor responsável.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	167	Caput	Em andamento
Cláusula	167	§1º	Concluída Internamente
Cláusula	167	§2º	Em andamento
Deliberação	218	3	Concluída Internamente
Deliberação	218	4	Concluída Internamente
Deliberação	478	1	Concluída Internamente
Deliberação	484	1, 2 e 3	Concluída Internamente

Entregas do ano de 2022

Por solicitação do IBAMA, as atividades do CETRAS-MG estão paralisadas e as do CETRAS-ES foram retomadas, porém não há entregas previstas para 2022.

Grandes números do programa

O programa não possui grandes números.

Fatos relevantes do mês

Em 25/10/2022 foi enviado minuta de acordo de cooperação entre Renova, IBAMA ES e IEMA que irá definir papéis e responsabilidades nos processos de obtenção de autorizações e licenciamento ambiental.

Em 04/10/2022 foi protocolado o Projeto Básico do CETRAS ES, conforme solicitações de alterações feitas pela equipe do IBAMA ES.

Indicadores

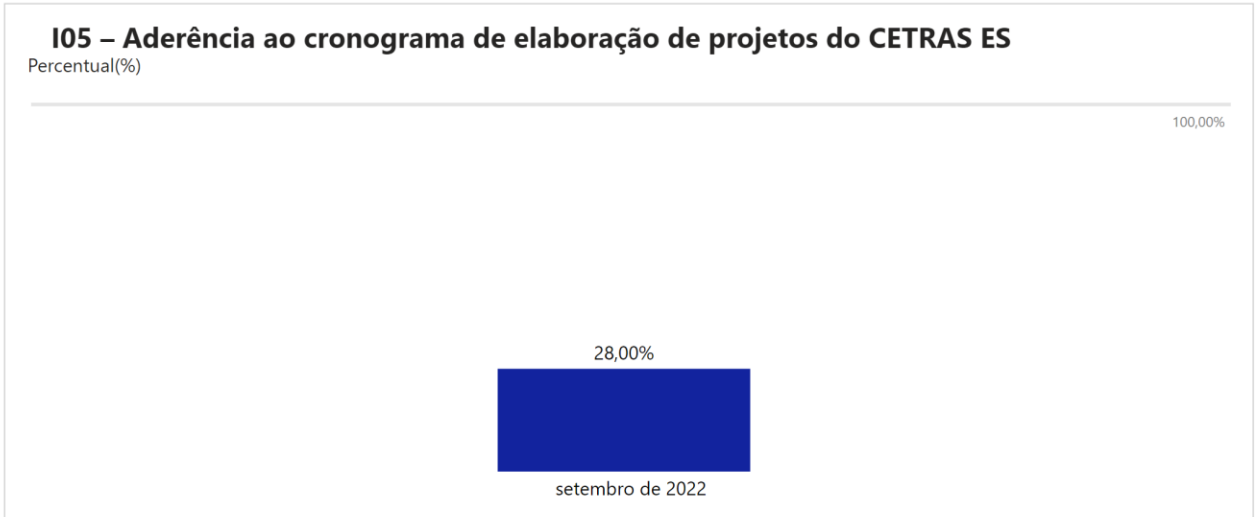


Gráfico 1: I05 – Aderência ao cronograma de elaboração de projetos do CETRAS ES - Frequência Semestral

PG030 Conservação da Biodiversidade Terrestre

Eixo Terra e Água





Objetivo


- Identificar e caracterizar os impactos do rompimento da barragem de Fundão sobre as espécies da biodiversidade terrestre na área de estudo;
- Apresentar e executar um plano de ação para conservação desta biota conforme resultados dos estudos de impacto;
- Demonstrar/indicar os efeitos da implementação do plano de ação sobre a biodiversidade terrestre.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	168	§1º	Encerrada
Cláusula	168	§2º	Em andamento
Cláusula	168	Caput	Encerrada
Deliberação	132	2	Concluída Internamente
Deliberação	218	3	Concluída Internamente
Deliberação	218	4	Concluída Internamente
Deliberação	449	3	Concluída Internamente
Deliberação	517	3	Concluída Internamente
Deliberação	91	2	Concluída Internamente
Deliberação	91	3	Concluída Internamente

Entregas do ano de 2022

abril de 2022		Conclusão da campanha chuvosa do monitoramento
setembro de 2022		Protocolo do relatório anual de monitoria do Plano de ação para Conservação da Biodiversidade Terrestre.
outubro de 2022		Protocolo do relatório da campanha chuvosa do monitoramento de fauna
novembro de 2022		Protocolo do relatório da campanha chuvosa do monitoramento de flora

 Concluído

 Planejado

 Reprogramado

Grandes números do programa

- 10 **grupos faunísticos, além da flora terrestre**, monitorados na área de estudo;
- 49 **ações** definidas no **Plano de Ação para Conservação da Biodiversidade Terrestre**.

Fatos relevantes do mês

Em 17/10/2022 foi protocolado na CTBio o Relatório do Monitoramento de Fauna referente a Campanha Chuvosa 2021/2022.

Em 15/10/2022 foi concluída a Campanha Seca de Flora e Solos 2022 com o encerramento das atividades de amostragem em campo.

Indicadores

I01 – Execução do Plano de Ação

Percentual(%)

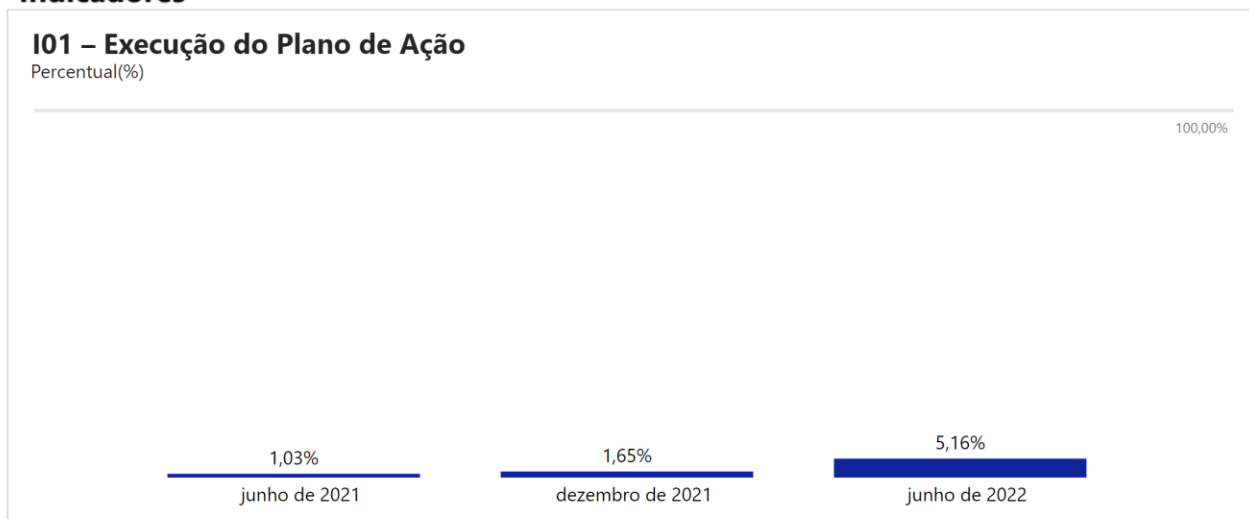


Gráfico 1: I01 – Execução do Plano de Ação - Frequência Sazonal

PG031 Coleta e Tratamento de Esgoto e Destinação de Resíduos Sólidos

Eixo Reconstrução e Infraestrutura

Objetivo

Objetivo Geral:

O objetivo geral do Programa é contribuir para “acelerar o processo de recuperação da Bacia do Rio Doce, regiões estuarinas, costeiras e marinha, em especial a qualidade e a quantidade de águas nos tributários e assim na calha principal impactada”; em conformidade com o Termo de Transação e de Ajustamento de Conduta (TTAC), por meio da disponibilização de recursos financeiros, no valor de R\$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais), provenientes da Cláusula nº 169 para os 39 municípios da Área Ambiental 2 e R\$ 17.000.000,00 (dezesete milhões de reais), provenientes da Cláusula 232 do TTAC, para atendimento ao pleito do Consórcio Público para o Tratamento e Destinação Final Adequada de Resíduos Sólidos da Região Doce Oeste do Estado do Espírito Santo (CONDOESTE), para ações de esgotamento sanitário e de destinação de resíduos sólidos.

Objetivos Específicos:

- Disponibilizar os recursos financeiros aos municípios para as ações de elaboração ou revisão de planos municipais de saneamento básico; elaboração de projetos de sistema de esgotamento sanitário; implementação de obras de coleta e tratamento de esgotos; erradicação de lixões; implantação de aterros sanitários regionais; implantação, ampliação e melhorias de programas de coleta seletiva, unidades de triagem de recicláveis, unidades de tratamento de orgânicos e estações de transbordo;
- Contratar instituições financeiras públicas para realizar o repasse do recurso financeiro, para o custeio da elaboração das ações de esgotamento sanitário e destinação de resíduos sólidos urbanos;
- Fornecer apoio técnico aos municípios na formulação dos pleitos, na análise da relevância, viabilidade e aderência ao Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) e Plano de Gestão Integrada e Resíduos Sólidos (PGIRS); na elaboração de termos de referência e editais dos processos licitatórios, contratação e acompanhamento da execução das ações estruturantes e estruturais, bem como na prestação de contas físico-financeira das soluções implementadas;
- Fornecer capacitação aos municípios, para subsidiá-los técnica e institucionalmente no andamento dos planos, projetos e obras previstos no programa.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	169	Caput	Em andamento
Cláusula	170	4ª Diretriz	Encerrada
Cláusula	170	Inc I	Encerrada
Cláusula	170	Inc II	Encerrada
Cláusula	170	Inc III	Encerrada
Cláusula	170	Inc IV	Encerrada
Cláusula	170	Inc V	Encerrada
Deliberação	122	n/a	Concluída Internamente
Deliberação	224	5	Concluída Internamente
Deliberação	259	2	Concluída Internamente
Deliberação	259	3	Em andamento
Deliberação	295	1	Concluída Internamente
Deliberação	295	2	Concluída Internamente
Deliberação	75	4-4.1	Concluída Internamente
Deliberação	75	4-4.2	Concluída Internamente
Deliberação	75	4-4.3	Concluída Internamente

Entregas do ano de 2022

fevereiro de 2022	●	Conclusão do repasse do Pleito de Alpercata ALPESPJ01 -Elaboração de projeto de sistema de esgotamento sanitário da sede do município e distrito de Era Nova
abril de 2022	●	Conclusão do repasse do Pleito de Itueta ITUESPJ02-Contratação de empresa especializada de engenharia para elaboração de projetos básicos e executivos para ampliação do sistema de esgotamento sanitário nos distritos de Vila Nietzel e Quatituba
maio de 2022	●	Conclusão do repasse Pleito de Rio Casca RICESAO01-Contratação de assessoria técnica para acompanhamento técnico de obras do TC/PAC 0352/14
agosto de 2022	●	Conclusão do repasse do Pleito de Ipaba IPBESPJ01-Elaboração de projeto de sistema de esgotamento sanitário da sede do município e povoado de Boachá
agosto de 2022	●	Conclusão do repasse do Pleito de Rio Casca RICESOB05-Complementação de obras do Sistema de Esgotamento Sanitário na sede do município
agosto de 2022	●	Conclusão do repasse do Pleito de Iapu IAPRSAB02-Aquisição de caminhão carroceria com caçamba basculante
setembro de 2022	●	Conclusão do repasse do Pleito de Naque NAQESPJ02-Elaboração de estudos de concepção, projeto básico, projeto executivo e licenciamento ambiental para a implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) na Sede do Município
outubro de 2022	●	Conclusão do repasse do Pleito de Rio Doce RIDESOB01-Construção de SES para o distrito de Matadouro
outubro de 2022	●	Conclusão do repasse do Pleito de Rio Doce RIDESOB03-Construção de SES para o distrito de São José de Entre Montes
novembro de 2022	●	Conclusão do repasse do Pleito de Galiléia GALEST01-Aquisição de terrenos para implantação do sistema de esgotamento sanitário da sede do município
novembro de 2022	●	Conclusão do repasse do Pleito de Aimorés AIMRSPJ01-Elaboração de projeto de ampliação do aterro sanitário e reforma da Usina de Triagem e Compostagem – UTC
novembro de 2022	●	Conclusão do repasse do Pleito de Rio Doce RIDESOB02-Construção de SES para o distrito de Jorge
dezembro de 2022	●	Conclusão do repasse do Pleito de Dionísio DIOEST01- Desapropriação/aquisição de área para instalação da ETE no Distrito de Conceição de Minas de Dionísio
dezembro de 2022	●	Conclusão do repasse do Pleito de Timóteo TIMRSPM03-Elaboração do Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD) para fins de recuperação da área do antigo lixão de Coronel Fabriciano
dezembro de 2022	●	Conclusão do repasse do Pleito de Dionísio DIORSAB01-Aquisição de caminhão basculante, esteira de triagem, prensa hidráulica, balança e empilhadeira manual hidráulica

● Concluído

● Planejado

● Reprogramado

Entregas do ano de 2022

dezembro de 2022

- Conclusão do repasse do Pleito de Barra Longa BALRSPJ01-Elaboração dos estudos de concepção, projetos básicos e executivos, elaboração do licenciamento ambiental e definição de obras, visando a implementação de Usina de Triagem e Compostagem (UTC)

Nota:

Os pleitos a seguir constavam como ações no Planejamento Anual 2022 junto ao CIF, porém foram reprogramados junto aos municípios para concluir em 2023 e por isso não aparecem mais na *time line*.

AIMESCT02-Aquisição de terreno, CONESOB01-Execução de obras, PERRSOB02-Execução de obras, TUMESPJ01-Elaboração de projeto, DIOESOB03-Execução de obras, PIARSAB01-Aquisição de bens, SAPRSPM01-Planos de estudo, BUGESPJ02-Elaboração de projeto, GALESPJ01-Elaboração de projeto, RASESPJ02-Elaboração de projeto, AIMESPJ03-Elaboração de projeto, NAQESPM01-Planos de estudo, BALEST01-Aquisição de terreno, MREESCT01-Aquisição de terreno e CVPRSAB01-Aquisição de bens.



Concluído



Planejado



Reprogramado

Grandes números do programa

- No mês **outubro de 2022** , **foram repassados R\$ 1.884.318,79** para ações dos municípios*;
- No mês **outubro de 2022** foram ofertadas **0 oficinas de capacitação** para os municípios da Área Ambiental 2;
- No mês **outubro de 2022** a equipe técnica realizou **61 visitas e/ou reuniões de apoio técnico aos municípios.**

Notas

Nome do dado	Resultado	Observações
Valores repassados para ações de esgotamento sanitário e resíduos sólidos (mensal)	1.884.318,79	Repasses para ações nos município de Governador Valadares, Itueta, Periquito, Resplendor, Rio Casca, Rio Doce, Santana do Paraíso, São Domingos do Prata, Sem Peixe e consórcio Condoeste.

Fatos relevantes do mês

Em outubro de 2022 foi realizado repasse ao consórcio CONDOESTE, no valor de R\$ 63.052,43 referente ao gerenciamento da obra para implantação da Central de Tratamento de Resíduos – CTR Colatina.

Em outubro de 2022 foi realizado repasse ao município de Governador Valadares, no valor de R\$ 14.359,00 referente a elaboração de projeto de sistema de esgotamento sanitário.

Em outubro de 2022 foi realizado repasse ao município de Itueta, no valor de R\$ 18.678,06 referente a obras para manutenção do aterro sanitário.

Em outubro de 2022 foi realizado repasse ao município de Periquito, no valor de R\$ 43.388,72 referente a melhorias na Unidade de Triagem de Recicláveis.

Em outubro de 2022 foi realizado repasse ao município de Resplendor, no valor de R\$ 490.638,96 referente as obras emergenciais a serem executadas em conformidade com os projetos já aprovados para o empreendimento na fase de concessão.

Em outubro de 2022 foi realizado repasse ao município de Rio Casca, no valor de R\$ 409.058,70 referente a execução de obras de esgotamento sanitário.

Em outubro de 2022 foi realizado repasse ao município de Rio Doce, no valor de R\$ 11.418,82 referente a execução de obras de esgotamento sanitário para o distrito de Matadouro.

Em outubro de 2022 foi realizado repasse ao município de Rio Doce, no valor de R\$ 11.775,01 referente a execução de obras de esgotamento sanitário para o distrito de Jorge.

Em outubro de 2022 foi realizado repasse ao município de Rio Doce, no valor de R\$ 39.192,23 referente a execução de obras de esgotamento sanitário para o distrito de São José de Entre Montes.

Em outubro de 2022 foi realizado repasse ao município de Santana do Paraíso, no valor de R\$ 155.000,00 referente a aquisição de bens.

Em outubro de 2022 foi realizado repasse ao município de São Domingos do Prata, no valor de R\$ 479.182,34 referente a execução de obras de esgotamento sanitário.

Em outubro de 2022 foi realizado repasse ao município de Sem Peixe, no valor de R\$ 148.574,52 referente a execução de obras de esgotamento sanitário.

Indicadores de Resultados

I01 – Percentual do valor repassado total

Percentual(%)

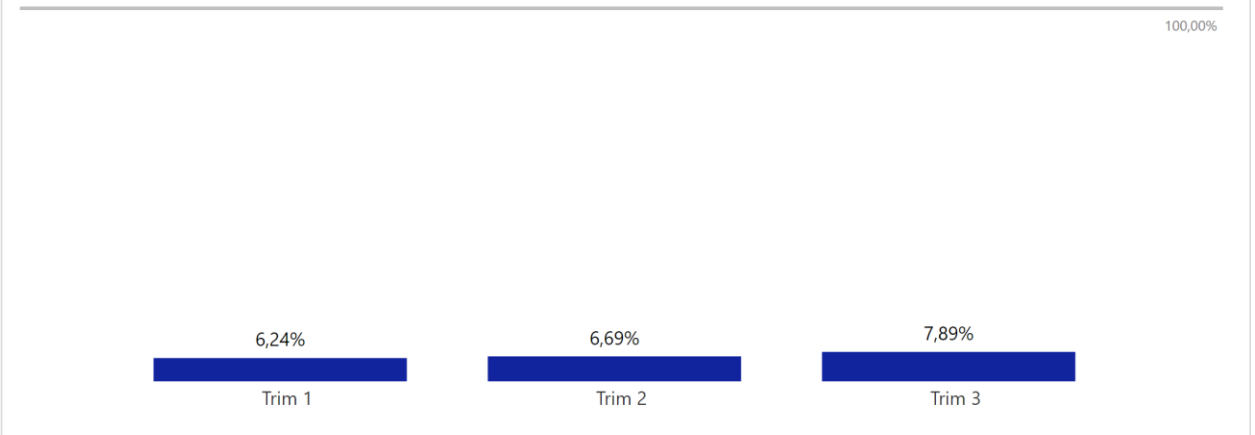


Gráfico 1:I01 – Percentual do valor repassado total - Frequência Trimestral

I02 - Percentual do Valor repassado por município/consórcio

Percentual(%)

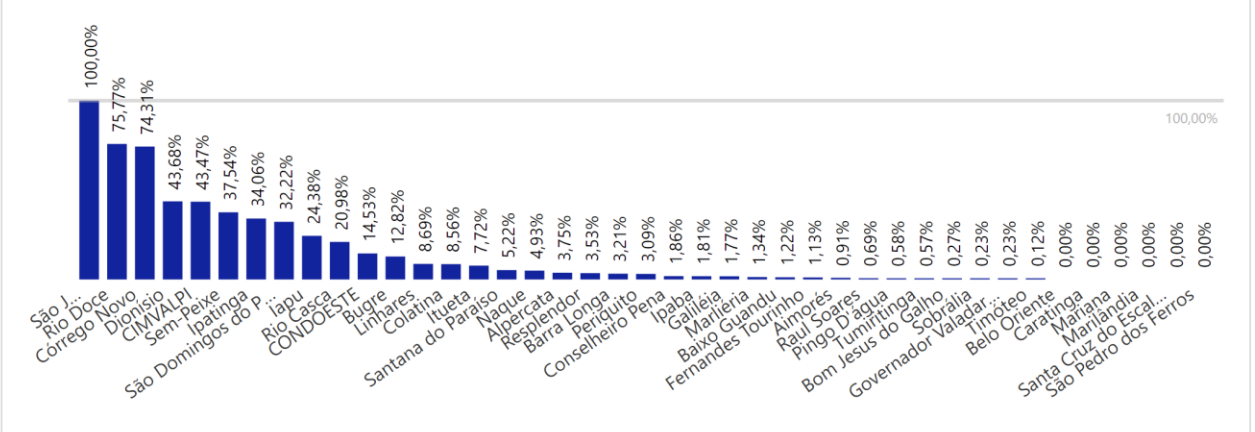


Gráfico 2: I02 - Percentual do Valor repassado por município/consórcio - Frequência Trimestral

Indicadores de Resultados

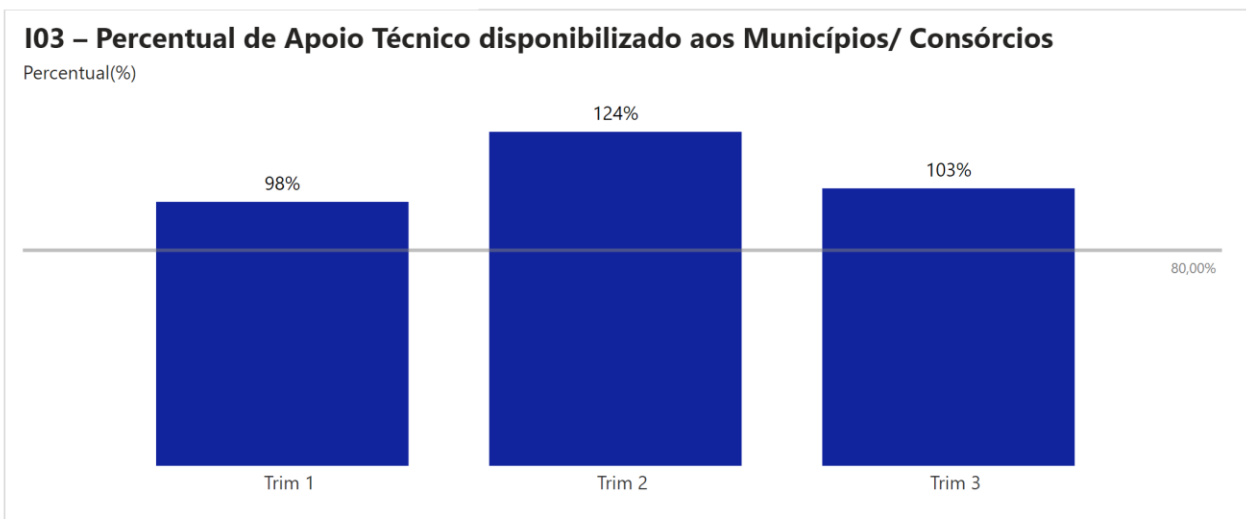


Gráfico 3: I03 – Percentual de Apoio Técnico disponibilizado aos Municípios/ Consórcios - Frequência Trimestral

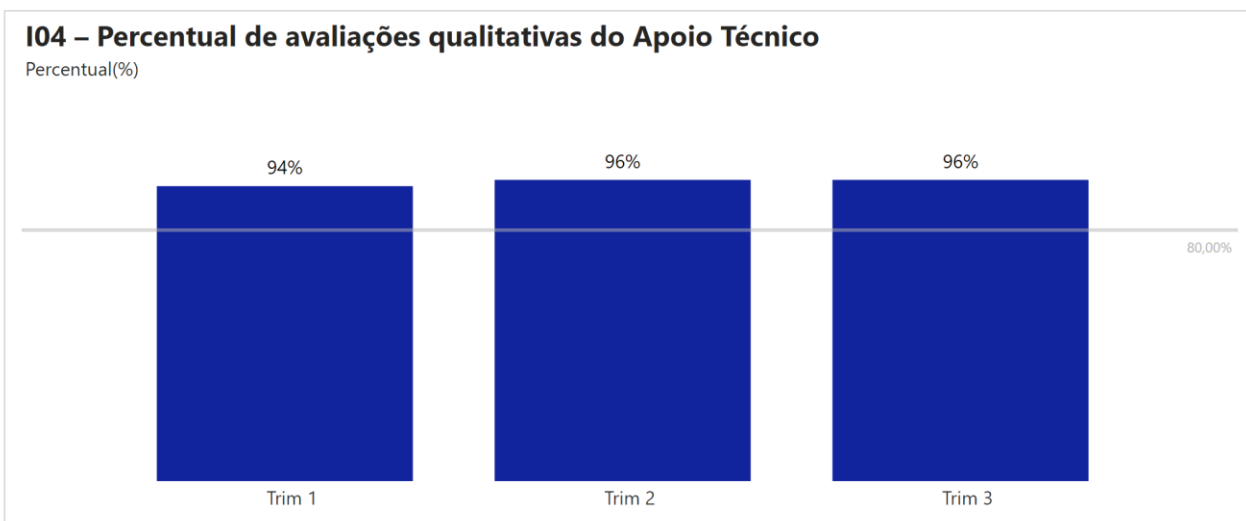


Gráfico 4: I04 – Percentual de avaliações qualitativas do Apoio Técnico - Frequência Trimestral

Indicadores de Resultados

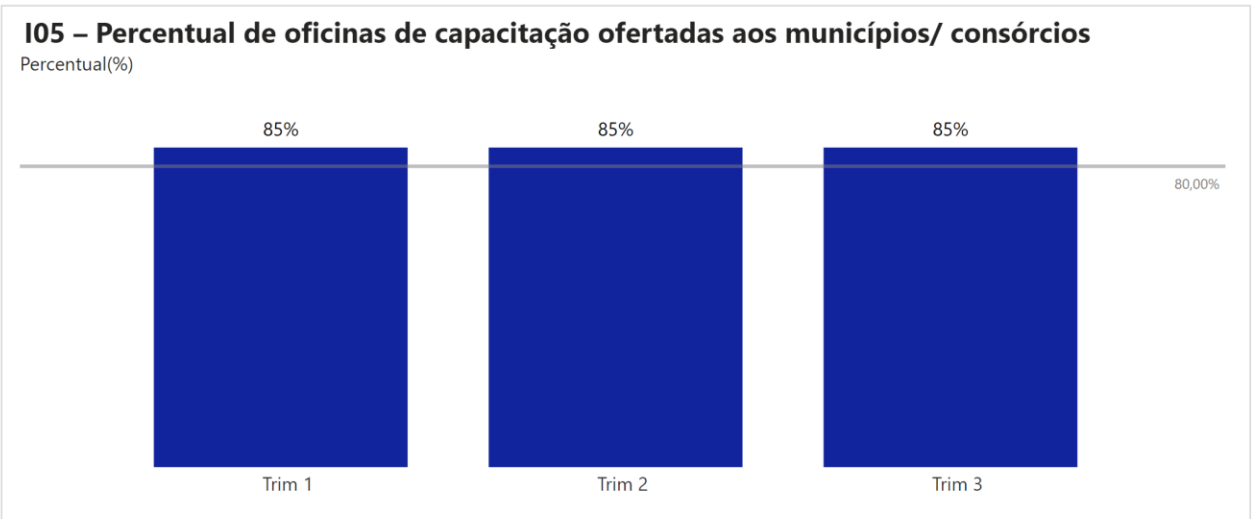


Gráfico 5: I05 – Percentual de oficinas de capacitação ofertadas aos municípios/ consórcios - Frequência Trimestral




Gráfico 6: I06 – Percentual de avaliações qualitativas das oficinas capacitação - Frequência Trimestral

Indicadores Físicos e Qualidade da Água

I07- Percentual de Coleta de Esgoto

Percentual(%)

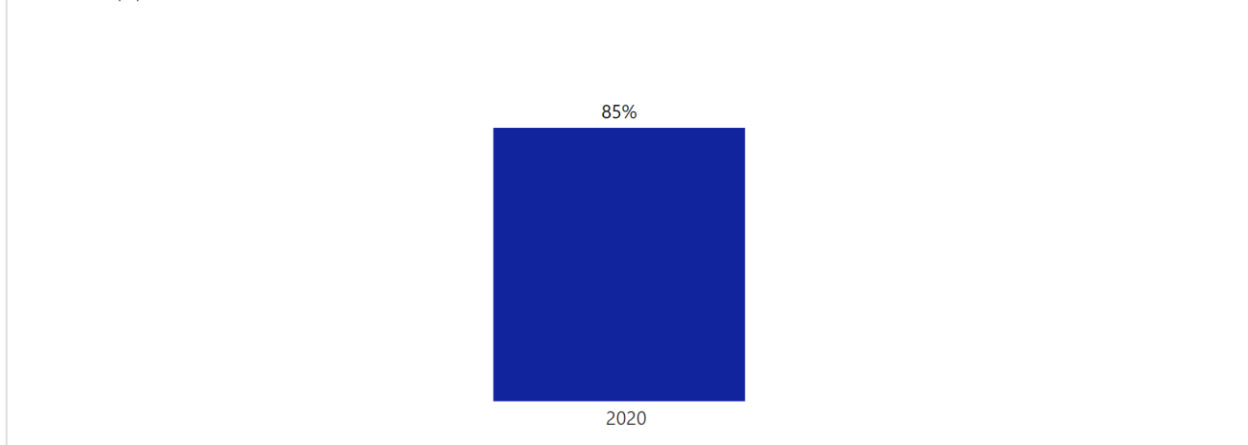


Gráfico 7: I07- Percentual de Coleta de Esgoto - Frequência Anual

I08 – Percentual de Tratamento de Esgoto

Percentual(%)




Gráfico 8: I08 – Percentual de Tratamento de Esgoto - Frequência Anual

- Data base 2020 Os dados referentes ao ano de 2021 ainda não foram divulgados pelo Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento SNIS;
- I 07 No SNIS havia dados disponíveis de 11 municípios, os demais não foram contabilizados na fórmula;
- I 08 No SNIS havia dados disponíveis de 25 municípios, os demais não foram contabilizados na fórmula.

Indicadores Físicos e Qualidade da Água

I09 – Percentual de municípios com coleta seletiva

Percentual(%)



Gráfico 9: I09 – Percentual de municípios com coleta seletiva - Frequência Anual

I10 - Percentual de municípios com presença de lixões ou aterros controlados

Percentual(%)



Gráfico 10: I10 - Percentual de municípios com presença de lixões ou aterros controlados - Frequência Anual

- Data base 2020 Os dados referentes ao ano de 2021 ainda não foram divulgados pelo Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento SNIS;
- I 09 No SNIS havia dados disponíveis de 32 municípios, os demais não foram contabilizados na fórmula;
- I 10 No SNIS havia dados disponíveis de 15 municípios, os demais não foram contabilizados na fórmula.

Indicadores Físicos e Qualidade da Água

I11 - Percentual das faixas do Índice de qualidade da água (IQA)

Percentual(%)

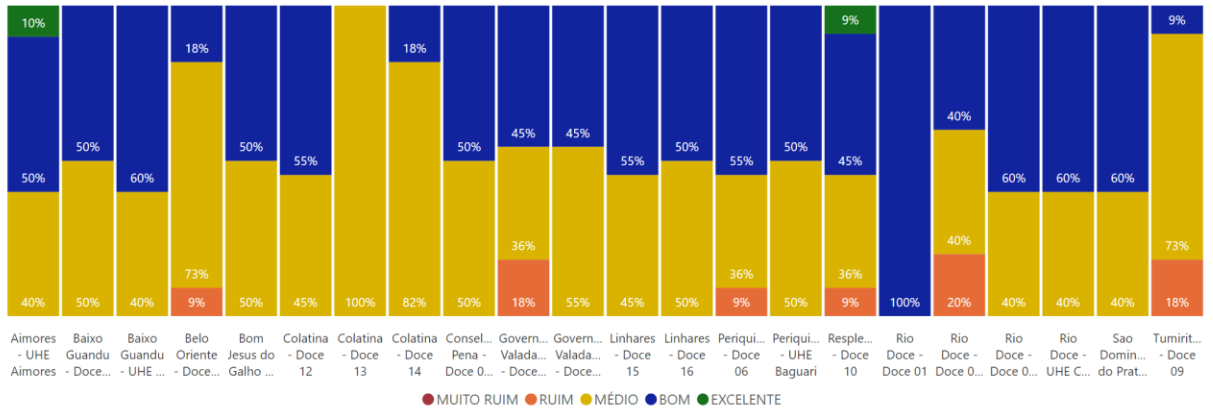


Gráfico 11: I11 - Percentual das faixas do Índice de qualidade da água (IQA)- Frequência Anual

I12 - Percentual das faixas do Índice para Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO)

Percentual(%)

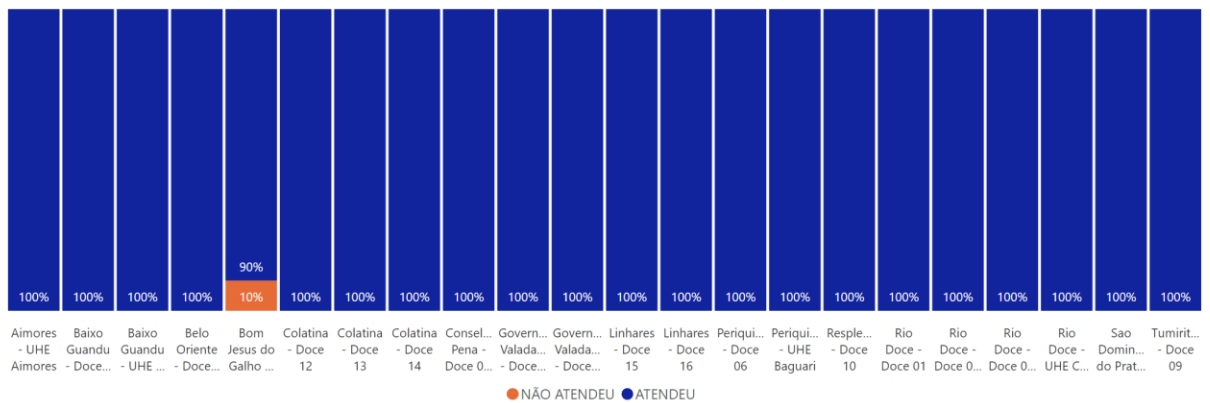


Gráfico 12: I12 - Percentual das faixas do Índice para Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) - Frequência Anual

Indicadores Físicos e Qualidade da Água

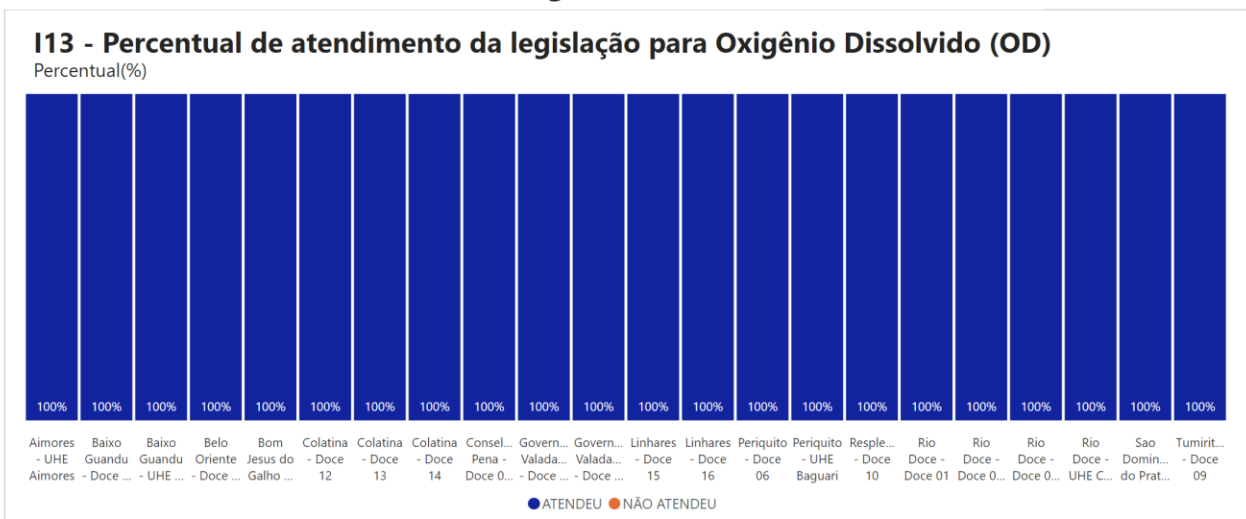


Gráfico 13: I13 - Percentual de atendimento da legislação para Oxigênio Dissolvido (OD) - Frequência Anual

PG032 Melhoria dos Sistemas de Abastecimento de Água

Eixo Reconstrução e Infraestrutura

Promover alternativas de captação e adução de água, visando garantir, em parte, o reestabelecimento do abastecimento de água com a redução de dependência relativa ao rio Doce, e promover melhorias referentes a tratamentos de água para abastecimento público, por meio de medidas de cunhos reparatório e compensatório, em municípios/localidades que tiveram seus sistemas de abastecimento temporariamente inviabilizados.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	171	Caput (obra)	Judicializada
Cláusula	171	Caput (projeto)	Judicializada
Deliberação	10	n/a	Concluída Internamente
Deliberação	107	3.1	Concluída Internamente
Deliberação	107	4	Concluída Internamente
Deliberação	123	2	Concluída Internamente
Deliberação	123	3	Judicializada
Deliberação	124	2	Concluída Internamente
Deliberação	124	4	Concluída Internamente
Deliberação	16	n/a	Judicializada
Deliberação	185	2	Concluída Internamente
Deliberação	185	3	Concluída Internamente
Deliberação	185	4	Judicializada
Deliberação	185	5	Judicializada
Deliberação	185	6	Judicializada
Deliberação	2	1	Em Andamento
Deliberação	258	2	Judicializada
Deliberação	258	4	Concluída Internamente
Deliberação	258	5	Concluída Internamente
Deliberação	308	2	Judicializada
Deliberação	315	1	Concluída Internamente
Deliberação	325	1	Judicializada
Deliberação	33	1	Concluída Internamente
Deliberação	33	i e ii	Em Andamento
Deliberação	378	5	Concluída Internamente
Deliberação	378	6	Concluída Internamente
Deliberação	379	1	Concluída Internamente
Deliberação	379	2	Concluída Internamente
Deliberação	379	3	Concluída Internamente
Deliberação	4	n/a	Judicializada

Deliberação	443	a	Concluída Internamente
Deliberação	76	3	Concluída Internamente
Deliberação	76	4	Concluída Internamente
Deliberação	76	5	Concluída Internamente
Deliberação	98	1	Concluída Internamente

Entregas do ano de 2022

- setembro de 2022 ● Conclusão da Engenharia Conceitual / Básica - Captação principal - Ponte do Gama
- dezembro de 2022 ● Conclusão das Obras - Adutora Rio Corrente - Governador Valadares - Sede

● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Grandes números do Programa

- 17 sistemas de tratamento de água concluídos, entre Estações de Tratamento de Água (ETAs) convencionais e tratamentos simplificados;
- 18 adutoras concluídas (entre concluídas e reformadas);

Fatos relevantes do mês

As ações da Cláusula nº171 do TTAC, que embasam a atuação do Programa 32 - Melhoria dos Sistemas de Abastecimento Público de Água, estão judicializadas desde março de 2020, no contexto do Eixo Prioritário nº 9, da Ação Civil Pública da 12ª Vara Federal Cível e Agrária da Seção Judiciária de Minas Gerais. As tratativas relativas às ações sob controle e supervisão judicial, inclusive as que se referem aos prazos, estão sendo orientadas nesse âmbito.

Em função da judicialização do Programa 32 foram realizadas visitas técnicas pela Perícia da 12ª Vara Federal Cível e Agrária da SJMG, conforme descrito acima.

Em 06 de outubro de 2022, a equipe de perícia juntou aos autos do processo judicial o Laudo complementar – Esclarecimento aos Quesitos das Partes Interessadas da Etapa 1.2 (Análise dos Cronogramas e Projetos) para a localidade Boninsegna, município de Marilândia/ES (ID 1291959881).

Em 05 de outubro de 2022, a equipe de perícia juntou aos autos do processo judicial a revisão dos Laudos complementares – Esclarecimentos aos Quesitos das Partes Interessadas da Etapa 1.2 (Análise dos Cronogramas e Projetos) para as localidades São Vítor, município de Governador Valadares/MG, São Tomé do Rio Doce, município de Tumiritinga/MG e Santo Antônio do Rio Doce, município de Aimorés/MG (ID 1291515362).

Em 05 de outubro de 2022, a equipe de perícia juntou aos autos do processo judicial a emissão inicial dos Laudos complementares – Esclarecimentos aos Quesitos das Partes Interessadas da Etapa 1.2 (Análise dos Cronogramas e Projetos) para as localidades Sede de Baixo Guandu/ES, Gesteira, município de Barra Longa/MG e Mascarenhas, município de Baixo Guandu/ES (ID 1291515362).

Em 03 de outubro de 2022, a equipe de perícia juntou aos autos do processo judicial o Laudo Técnico Pericial da Etapa 1.2 – Análise dos Cronogramas e Projetos referente à localidade Boninsegna, município de Marilândia/ES (ID 1290321364).

Indicadores

I01 –Índice de Localidades com Termos de Compromisso Assinados por Prefeituras e Prestadores de Serviços de Abastecimento de Água: indicador não está sendo medido, pois algumas soluções antes pactuadas com as prefeituras e concessionárias podem não ocorrer , devido à judicialização.

I02 –Índice de Localidades com Projetos Básicos Concluídos: indicador não está sendo medido, pois algumas soluções antes pactuadas com as prefeituras e concessionárias podem não ocorrer , devido à judicialização.

Indicadores

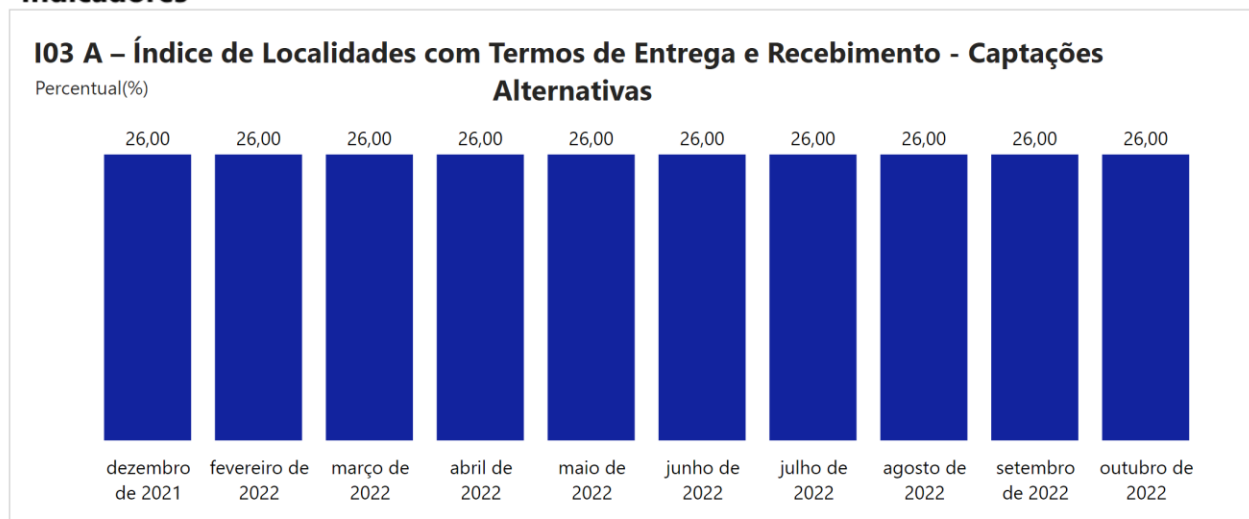


Gráfico 1: I03 A – Índice de Localidades com Termos de Entrega e Recebimento - Captações Alternativas - Frequência Mensal

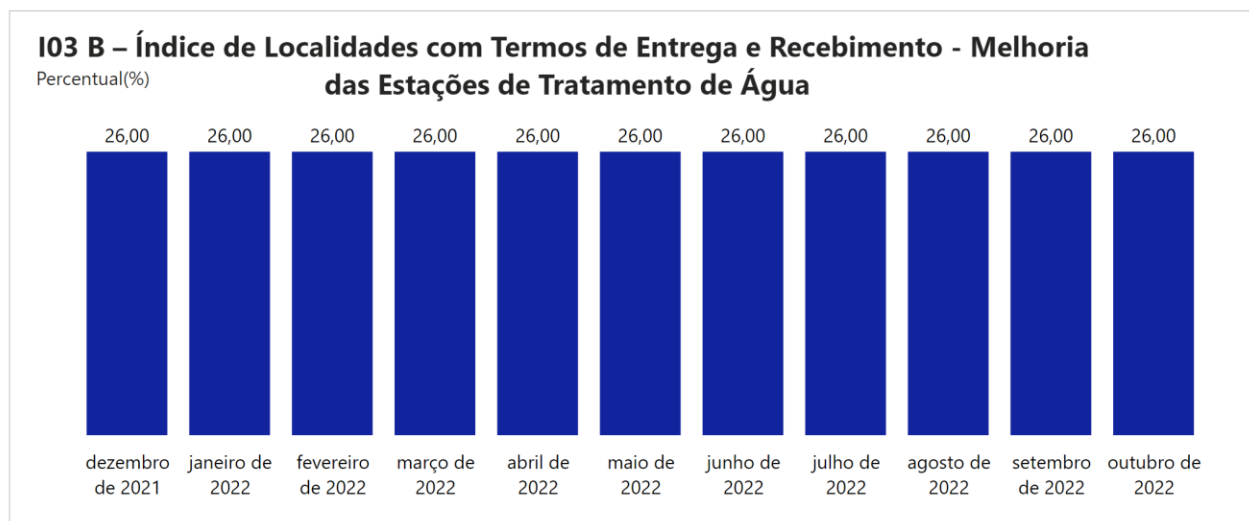


Gráfico 2: I03 B – Índice de Localidades com Termos de Entrega e Recebimento - Melhoria das Estações de Tratamento de Água - Frequência Mensal

Indicadores

I04 - Índice de Localidades com Captações Alternativas Concluídas e Aptas a Operar

Percentual(%)

100,00%




Gráfico 3: I04 - Índice de Localidades com Captações Alternativas Concluídas e Aptas a Operar - Frequência Trimestral

I05 - Índice de Localidades com Melhorias das Estações de Tratamento de Água Concluídas

Percentual(%)

100,00%



Gráfico 4: I05 - Índice de Localidades com Melhorias das Estações de Tratamento de Água Concluídas - Frequência Trimestral

PG033 Programa de Educação para Revitalização da Bacia do Rio Doce (Educação Ambiental)

Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivo

Implementar processos de educação socioambiental que desenvolvam competências e habilidades para engajar pessoas e coletivos no desenvolvimento de iniciativas para a revitalização dos territórios atingidos.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	172	Caput	Em andamento
Deliberação	136	1	Concluída Internamente
Deliberação	240	1	Concluída Internamente
Deliberação	288	1	Concluída Internamente
Deliberação	288	2	Em andamento
Deliberação	343	1.4	Concluída Internamente
Deliberação	549	2	Planejada

Entregas do ano de 2022



janeiro de 2022	●	Conclusão da Formação em Agroecologia de Assentados da Reforma Agrária (Nível Formadores) – MG
julho de 2022	●	Finalização do 1º Ciclo do Projeto de Formação de Lideranças Jovens
dezembro de 2022	●	Conclusão do Curso de Formação de Base (Ano 2) de Assentados da Reforma Agrária - ES
dezembro de 2022	●	Conclusão do Curso de Formação de Base (Ano 3) de Assentados da Reforma Agrária - MG

● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Grandes números do programa

O programa não possui grandes números.

Fatos relevantes do mês

Não houve fatos relevantes no mês.

Indicadores



Gráfico 1: I01 – Número de bolsas de estudo disponibilizadas para o Curso de Aperfeiçoamento em Minas - Frequência Semestral




Gráfico 2: I19 – Número de vagas disponibilizadas para a capacitação de Lideranças Jovens - Frequência Anual

PG034 Preparação para Emergências Ambientais

Eixo Pessoas e Comunidades






Objetivo



Implantação de ações de incremento às estruturas de apoio para os sistemas de emergências ambientais nos Municípios de Mariana, Barra Longa, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado, de forma integrada com a Defesa Civil, conforme previsto na Cláusula 173 do TTAC, promovendo a ampliação da percepção das comunidades e a autonomia da defesa civil para atuação, gestão e convivência em cenários de riscos e desastres.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	173	§1º	Concluída Internamente
Cláusula	173	§2º	Concluída Internamente
Cláusula	173	Caput (ação 1)	Concluída Internamente
Cláusula	173	Caput (ação 2)	Em andamento
Deliberação	128	2	Concluída Internamente
Deliberação	303	2	Concluída Internamente
Deliberação	357	2	Concluída Internamente
Deliberação	357	3	Concluída Internamente
Deliberação	439	2	Concluída Internamente

Entregas do ano de 2022

março de 2022	 Início do Ciclo de Formação Continuada - Cursos de longa duração
outubro de 2022	 Elaboração dos Planos Municipais de Redução de Risco (PMRR) para Mariana, Barra Longa, Santa Cruz do Escalvado e Rio Doce
dezembro de 2022	 Conclusão da Capacitação do Comitê Gestor de Riscos (CGR) em Mariana/MG, Barra Longa/MG, Santa Cruz do Escalvado/MG e Rio Doce/MG
dezembro de 2022	 Conclusão da Capacitação do Núcleo Comunitário de Proteção e Defesa Civil (NUPDEC) em Mariana/MG, Barra Longa/MG, Santa Cruz do Escalvado/MG e Rio Doce/MG
dezembro de 2022	 Realização do Censo Populacional das áreas de risco a partir do mapeamento em Mariana, Barra Longa, Santa Cruz do Escalvado e Rio Doce

 Concluído  Planejado  Reprogramado

Grandes números do programa

O programa não possui grandes números.

Fatos relevantes do mês

Não houve fatos relevantes no mês.

Indicadores

I03 - Índice de Fortalecimento do Sistema de Proteção e Defesa Civil

Percentual(%)




Gráfico 1: I03 - Índice de Fortalecimento do Sistema de Proteção e Defesa Civil - Frequência Anual

I04 - Percentual de cumprimento da implantação de medidas de incremento da estrutura de apoio das defesas civis

Percentual(%)

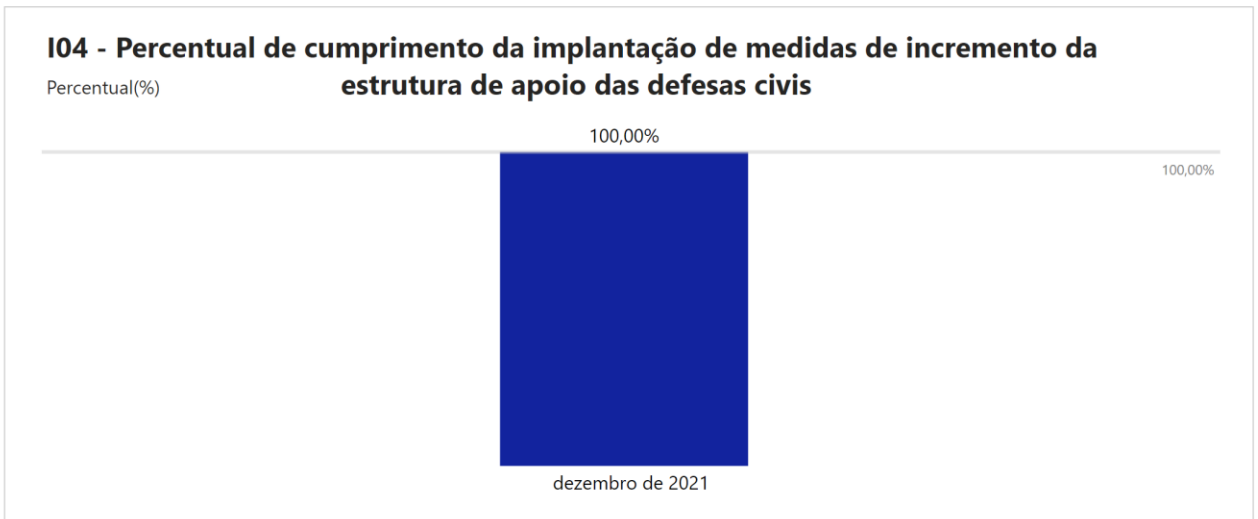


Gráfico 2: I04 - Percentual de cumprimento da implantação de medidas de incremento da estrutura de apoio das defesas civis - Frequência Anual

Os indicadores do programa foram aprovados pelo CIF, porém ainda estão fora do período de medição.

Tabela 1. Indicadores que não iniciaram a medição.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	INÍCIO DA MEDIÇÃO
I01	Percentual de indivíduos capacitados (cursos de longa duração)	%	Junho/25
I02	Taxa de resposta às demandas de Promoção à capacitação da Defesa Civil	%	Dezembro/22

PG035 Programa de Informação para a População

Eixo Pessoas e Comunidade

Objetivo

Salvaguardar e dar acesso às informações sobre o rompimento da barragem de Fundão e seus desdobramentos, incluindo:

- (i) estudos técnicos e ações de reparação e compensação; aos moradores locais, pessoas atingidas, poder público, comunidade acadêmica e outros públicos, por meio de espaços físicos e itinerantes, que constituem o Centro de Informação Técnica; e
- (ii) processos socioeconômicos e socioambientais relacionados às comunidades e municípios atingidos, sobre o modo de vida e memória.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	174	§1º	Em andamento
Cláusula	174	Caput	Em andamento
Cláusula	65	Caput	Em andamento
Deliberação	229	3	Concluída Internamente
Deliberação	229	4	Concluída Internamente
Deliberação	229	5	Concluída Internamente
Deliberação	306	2	Concluída Internamente
Deliberação	306	4.1	Concluída Internamente
Deliberação	306	4.2	Concluída Internamente
Deliberação	376	2	Concluída Internamente
Deliberação	437	1- a	Concluída Internamente
Deliberação	437	1- b	Concluída Internamente
Deliberação	437	1- c	Concluída Internamente
Deliberação	437	1- d	Concluída Internamente
Deliberação	437	1- e	Concluída Internamente
Deliberação	437	1- f	Concluída Internamente
Deliberação	437	1- g	Concluída Internamente
Deliberação	437	1- h	Concluída Internamente
Deliberação	437	1- i	Concluída Internamente
Deliberação	437	1- j	Concluída Internamente
Deliberação	437	1- k	Concluída Internamente
Deliberação	437	1- l	Concluída Internamente
Deliberação	500	I	Concluída Internamente
Deliberação	500	II	Concluída Internamente
Deliberação	500	III	Concluída Internamente
Deliberação	500	IV	Concluída Internamente
Deliberação	500	V	Concluída Internamente

Entregas do ano de 2022


abril de 2022



Elaboração do e-book com os artigos/trabalhos apresentados nos processos de itinerância e descentralização 2021

 Concluído

 Planejado

 Reprogramado

Grandes números do programa

Dado	set/2022	out/2022	Acumulado 2022	Acumulado Total
Quantidade de acessos à plataforma interativa	620	885	4915	5098
Quantidade de atividades de Descentralização e Itinerância	0	1	1	11

Fatos relevantes do mês

Em 14/10/2022, a equipe técnica do Programa 35 realizou a reunião preparatória com a mediadora contratada, Maria Eugenia Salcedo, para o 1º Webinário do Conhecimento em Pauta a ser realizado em 31/10/2022.

A empresa Arquivar, contratada pelo Programa, finalizou a digitalização do acervo fotográfico do Centro Ecológico de Regência em 26/10/2022. A digitalização é a primeira fase da metodologia de execução da oficina Trilhas de Memórias.

Em reunião realizada na cidade de Governador Valadares, em 27/10/2022, com a presença do prefeito, chefe de gabinete e secretário de cultura, além do presidente da Fundação Renova e equipe do Programa 35, equipe de Relações Institucionais e Obras, foi realizada a assinatura do Termo de Parceria entre a Fundação Renova e a Prefeitura Municipal para implantação do Centro de Informação Técnica – CIT.

Foi publicada, em 27/10/2022, nas páginas 3 e 4 do Diário Oficial do Município de GV, a sanção do prefeito à Lei 7.450 de 14 de outubro de 2022 que "DISPÕE SOBRE A DESAFETAÇÃO E A CESSÃO DE USO DE BEM PÚBLICO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS." A lei permite a construção do Centro de Informação Técnica - CIT na Praça Getúlio Vargas pela Fundação Renova.

Visando o constante aprimoramento da plataforma interativa do CIT, uma versão aprimorada foi disponibilizada oferecendo melhorias em diversos quesitos como seguem abaixo. Ressaltamos que estas melhorias na plataforma foram feitas a partir de indicações da CT – PDCS, CIF e equipes internas dos Programas da Fundação Renova: Navegabilidade: reorganização dos menus de navegação, oferecendo mais conteúdos em menos cliques; Acessibilidade: Implantação de tradução de Libras e recursos para pessoas com deficiências visuais; Amplitude de público: tradução para o Inglês; Interatividade: melhoria do sistema no upload de documentos; Design: melhorias nos elementos de design, favorecendo a legibilidade do site; Conteúdo: aumento do acervo com a disponibilização das gravações de todos os webinários Conhecimento em Pauta e da Oficinas Trilhas de Memórias, e novos conteúdos técnico-científicos.

As novas facilidades e os aprimoramentos foram apresentados às equipes de Diálogo Coletivo de Mariana, Alto Rio Doce e Espírito Santo, de modo, a instrumentalizá-las a apoiar e dar suporte aos moradores dos territórios atingidos quando demandados.

Fatos relevantes do mês

As equipes do Programa 35 e do ICMBio reuniram-se em 07 de outubro de 2022, às 15:00h para dar continuidade ao mapeamento de ações a serem realizadas, conjuntamente, com o objetivo de consolidar a atuação do CIT e a parceria com o ICMBio no território.

Realizado em 31/10/2022 às 19h, o primeiro Webinários do Conhecimento em Pauta com o tema: "Ciência cidadã na Bacia do rio Doce: Monitoramento Hídrico Participativo" a ser realizado em 31 de outubro de 2022, das 19h às 21h. O evento contou com a palestra da pesquisadora e consultora da Unesco Vera Lúcia de Miranda Guarda, Doutora em Ciências Farmacêuticas, e com a moderação da pesquisadora e consultora Maria Eugenia Salcedo, Mestranda em Artes e História da Arte.

Indicadores

Os indicadores do Programa foram construídos, revisados e apresentados à CT-PDCS que não apresentou restrição ou divergência. A aprovação definitiva deles está condicionada à aprovação da Definição do Programa.

PG036 Comunicação Nacional e Internacional

Eixo Pessoas e Comunidades





Objetivo


- Estabelecer sítio eletrônico em no mínimo dois idiomas, para divulgar as ações e o andamento dos programas desenvolvidos em função do TTAC. (Cláusula 175 conforme anexo I, e Revisão Extraordinária número 3, de 30 de agosto de 2018);
- Comunicar à sociedade, às comunidades atingidas, aos órgãos reguladores e aos diversos públicos relacionados sobre as ações conduzidas pela Fundação Renova, também como forma de contrapor boatos e notícias de teor falso.
- Ampliar o alcance das informações e abrir espaço para discussão e construção coletiva de ideias relacionadas ao processo de reparação e compensação conduzidos pela Fundação Renova.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	175	Caput (ação 1)	Concluída Internamente
Cláusula	175	Caput (ação 2)	Em andamento
Deliberação	506	2.2	Concluída Internamente
Deliberação	530	1	Concluída Internamente

Entregas do ano de 2022

dezembro de 2022		Conclusão da atualização das entregas e fatos relevantes do mês, reportadas pelos demais programas no relatório mensal do CIF (Comitê Interfederativo) e nas páginas dos programas hospedados no site, nas versões em português e inglês em 2022
dezembro de 2022		Conclusão da atualização e manutenção de conteúdo do site, incluindo relatórios e documentos de interesse da sociedade e órgãos de validação em 2022
dezembro de 2022		Conclusão da atualização e manutenção de conteúdo e informações importantes para as comunidades atingidas e sociedade civil, via Redes Sociais em 2022
dezembro de 2022		Conclusão da atualização e manutenção dos mecanismos relacionados à acessibilidade do site, seguindo como critério recomendações do guia WCAG 2.0 (Web ContentAccessibilityGuidelines) e/ou padrão E-MAG em 2022

 Concluído
  Planejado
  Reprogramado

Grandes números do Programa

Tabela 1. Grandes Números.

Indicador	set/2022	out/2022	Acumulado 2022	Acumulado (2016 - 2022)
Acesso ao Site (mês)	126.369	175.684	2.694.901	9.840.883
Documentos no site (mês)	5	13	86	549
Notícias Publicadas (mês)	15	7	131	1.018
Vídeos (mês)	23	24	136	718

Fatos relevantes do mês

Atualização das entregas e fatos relevantes do mês reportadas pelos demais programas no relatório mensal do CIF (Comitê Interfederativo) e nas páginas dos programas hospedados no site, nas versões em português e inglês.

Indicadores




Gráfico 1: I01 – Acessos das cidades prioritárias ao site - Frequência Mensal




Gráfico 2: I02 – Visualizações de páginas de serviço - Frequência Mensal

Indicadores

I03 – Tempo de resposta

Hora




Gráfico 3: I03 – Tempo de resposta - Frequência Mensal

I04 – Alcance Orgânico LinkedIn

Unidade




Gráfico 4: I04 – Alcance Orgânico LinkedIn - Frequência Mensal

Indicadores

I05 – Alcance Orgânico Facebook

Unidade




Gráfico 5: I05 – Alcance Orgânico Facebook- Frequência Mensal

I06 – Visualizações no Youtube

Unidade




Gráfico 6: I06 – Visualizações no Youtube - Frequência Mensal

PG038 Monitoramento da Bacia do Rio Doce

Eixo Terra e Água

Objetivo

Investigar e monitorar a Bacia do Rio Doce, áreas estuarinas e costeiras (isóbata 10 metros), gerando informações sobre a qualidade da água e sedimentos para subsidiar a tomada de decisão e desenvolvimento dos programas e ações correlatos.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	177	§1º	Encerrada
Cláusula	177	Caput	Em andamento
Cláusula	178	Caput	Em andamento
Deliberação	107	3.1	Concluída Internamente
Deliberação	107	4	Concluída Internamente
Deliberação	129	1	Em andamento
Deliberação	198	1	Em andamento
Deliberação	198	2	Concluída Internamente
Deliberação	198	3	Em andamento
Deliberação	247	1	Concluída Internamente
Deliberação	247	2	Em andamento
Deliberação	265	1	Concluída Internamente
Deliberação	265	2	Concluída Internamente
Deliberação	301	único	Em andamento
Deliberação	310	3.1	Concluída Internamente
Deliberação	310	3.2	Concluída Internamente
Deliberação	313	2	Concluída Internamente
Deliberação	378	5	Concluída Internamente
Deliberação	378	6	Concluída Internamente
Deliberação	381	1	Concluída Internamente
Deliberação	409	2	Concluída Internamente
Deliberação	432	1, 2,3	Concluída Internamente
Deliberação	455	1	Concluída Internamente
Deliberação	458	2	Concluída Internamente
Deliberação	458	3	Concluída Internamente
Deliberação	511	2	Concluída Internamente
Deliberação	511	3	Concluída Internamente
Deliberação	512	1	Concluída Internamente
Deliberação	512	2	Concluída Internamente
Deliberação	512	3	Concluída Internamente

Deliberação	513	1	Concluída Internamente
Deliberação	53	n/a	Concluída Internamente
Deliberação	572	3	Concluída Internamente
Deliberação	572	4	Concluída Internamente
Deliberação	76	3	Concluída Internamente
Deliberação	76	4	Concluída Internamente
Deliberação	76	5	Concluída Internamente
Deliberação	95	1	Em andamento
Deliberação	99	2	Concluída Internamente
Deliberação	99	3	Em andamento

Entregas do ano de 2022

set/22	●	Protocolo do Relatório Trimestral de QA/QC - Abr/22 a Jun/22
jun/22	●	Protocolo do Relatório Trimestral de QA/QC - Jan/22 a Mar/22
mar/22	●	Protocolo do Relatório Trimestral de QA/QC - Out/21 a Dez/21
ago/22	●	Finalização do Plano de Capacitação Presencial PMQQS
abr/22	●	Protocolo do 5º Boletim PMQACH (Campanha 37, 38, 39 e 40)
set/22	●	Protocolo do 6º Boletim PMQACH (Campanha 41, 42, 43 e 44)
mar/22	●	Protocolo Relatório Final da Investigação Complementar da Análise de Água, Sedimento e Material Inconsolidado (Colóides) - Período seco e chuvoso
jul/22	●	Publicação - Boletim das Águas-Rios Abr/22
jun/22	●	Publicação - Boletim das Águas-Rios Fev/22
mai/22	●	Publicação - Boletim das Águas-Rios Jan/22
set/22	●	Publicação - Boletim das Águas-Rios Jun/22
set/22	●	Publicação - Boletim das Águas-Rios Mai/22
jun/22	●	Publicação - Boletim das Águas-Rios Mar/22
jul/22	●	Publicação - Boletim Trimestral das Águas - Estuários/Lagoas/Zona Costeira (Jan/Fev/Mar 2022)
abr/22	●	Publicação - Boletim Trimestral das Águas - Estuários/Lagoas/Zona Costeira (Out/Nov/Dez 2021)
out/22	●	Conclusão do Novo Portal Monitoramento Rio Doce
out/22	●	Publicação - Boletim Trimestral das Águas - Estuários/Lagoas/Zona Costeira (Abr/Mai/Jun 2022)
dez/22	●	Protocolo do Relatório Trimestral de QA/QC - Jul/22 a Set/22
nov/22	●	Protocolo do relatório do Monitoramento de Água para Consumo Humano (PMQACH) - período de Julho 2021 à Junho 2022
dez/22	●	Publicação - Boletim das Águas-Rios Ago/22
nov/22	●	Publicação - Boletim das Águas-Rios Jul/22
dez/22	●	Publicação - Boletim das Águas-Rios Set/22

● Concluído

● Planejado

● Reprogramado

Grandes números do programa

Em 2022 está aprovado um orçamento de **R\$ 39.630.178** para ações de continuidade dos programas de monitoramento de água e sedimentos da bacia do Rio Doce e zona costeira e estuarina;

Plano de Monitoramento Quali-quantitativa Sistemático (PMQQS)

- Atualmente são gerados aproximadamente 1,7 milhão de dados pelo programa de monitoramento. Todos os dados e informações disponíveis em www.monitoramentorioce.org;
- 691 **quilômetros** de monitoramento de **rios**, 244 **quilômetros** de monitoramento ao longo da **zona costeira e estuarina**;
- 82 **pontos de monitoramento** distribuídos na bacia do Rio Doce e na zona costeira e estuarina;
- 22 **estações automáticas** formam uma rede de alerta que gera informações em tempo real;
- 103 **parâmetros físicos, químicos e biológicos** são analisados na água e 38 nos sedimentos.

Grandes números do programa

Plano de Monitoramento da Qualidade da Água para Consumo Humano (PMQACH)

- Atualmente são monitorados 137 pontos, sendo 32 com tratamento e 105 sem tratamento em 24 municípios. Os pontos com tratamento são monitorados quinzenalmente no período chuvoso e mensalmente no período seco. Os pontos sem tratamento são monitorados mensalmente.

Fatos relevantes do mês

Realizada a segunda e última etapa do II Seminário de Revisão do PMQQS em Vitória.

Protocolo ofício de cumprimento da capacitação técnica da equipe responsável pelo monitoramento de água e sedimento, para atendimento ao item 2.3.1 - Garantia da Qualidade (QA) do PMQQS.

Protocolo dos Boletins do PMQACH em atendimento à Deliberação CIF nº 513 e a NT54/2021 da CT-Saúde.

Protocolo do Resumo Executivo do 2º ciclo do Protocolo de Controle e Garantia da Qualidade (QA/QC) do PMQQS.

Protocolo do Relatório de Controle e Garantia da Qualidade (QA/QC) Trimestral do PMQQS de abril a junho/22.

Indicadores

I01 - Aderência ao plano de coletas e análises laboratoriais

Percentual(%)

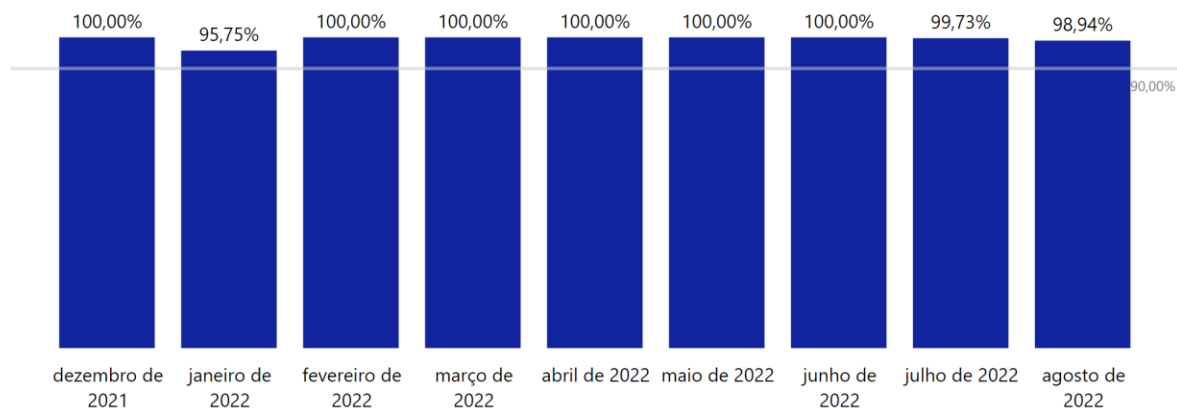


Gráfico 1: I01 - Aderência ao plano de coletas e análises laboratoriais - Frequência Mensal

I02 - Disponibilização dos dados quantitativos do monitoramento das estações automáticas

Percentual(%)

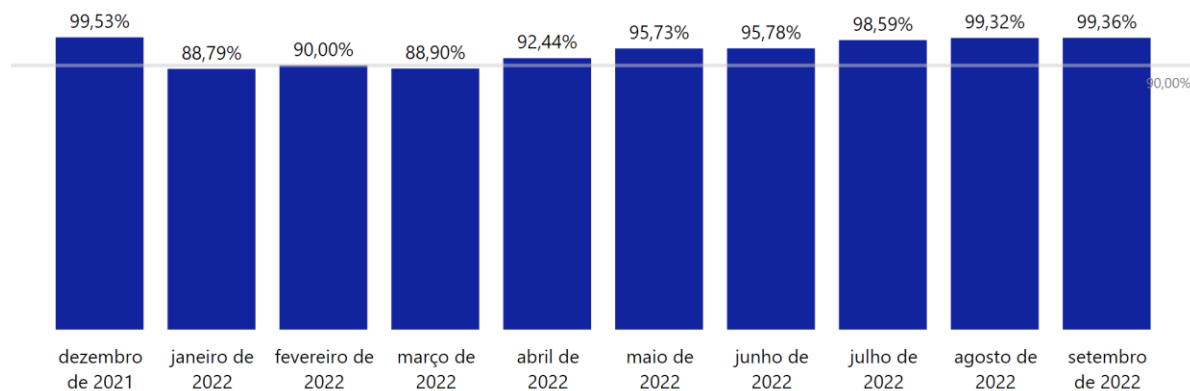


Gráfico 2: I02 - Disponibilização dos dados quantitativos do monitoramento das estações automáticas - Frequência Mensal

Indicadores

I03 - Disponibilização dos dados qualitativos do monitoramento das estações automáticas

Percentual(%)

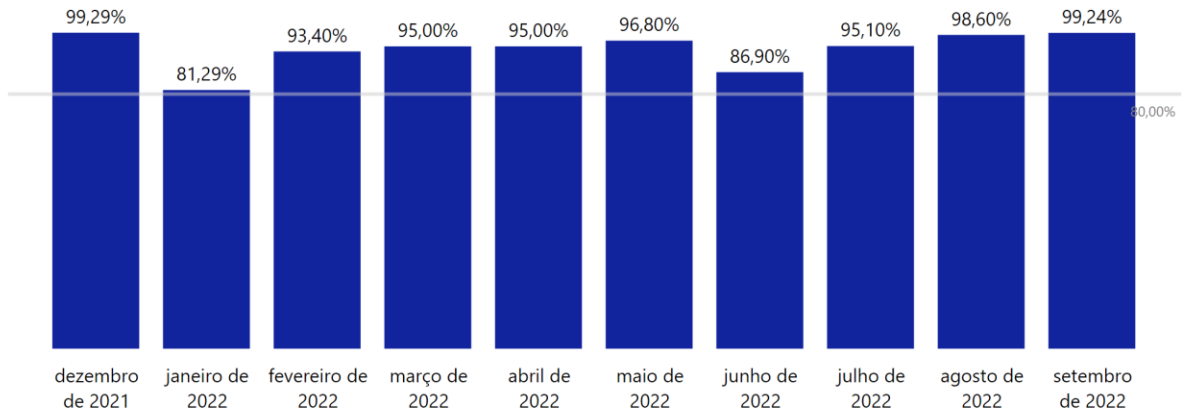


Gráfico 3: I03 - Disponibilização dos dados qualitativos do monitoramento das estações automáticas- Frequência Mensal

I04 - Percentual de dados validados em função de amostras analisadas passíveis de validação

Percentual(%)

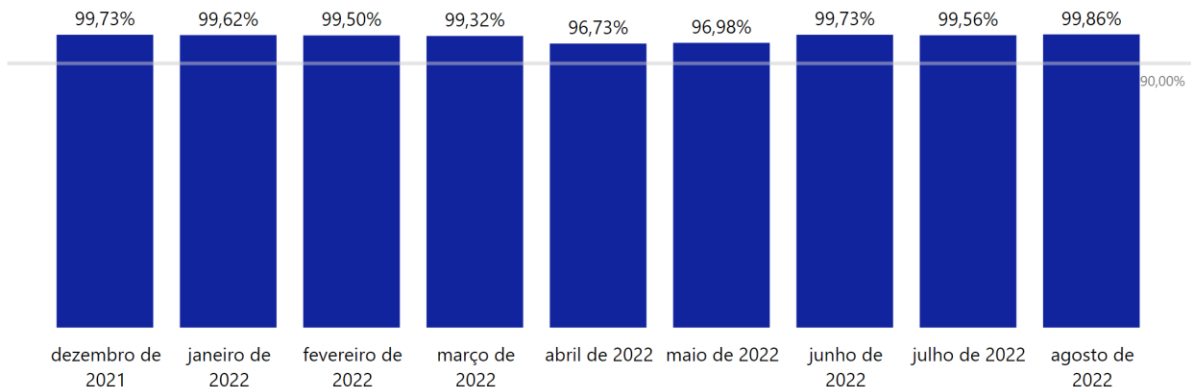


Gráfico 4: I04 - Percentual de dados validados em função de amostras analisadas passíveis de validação - Frequência Mensal

Indicadores

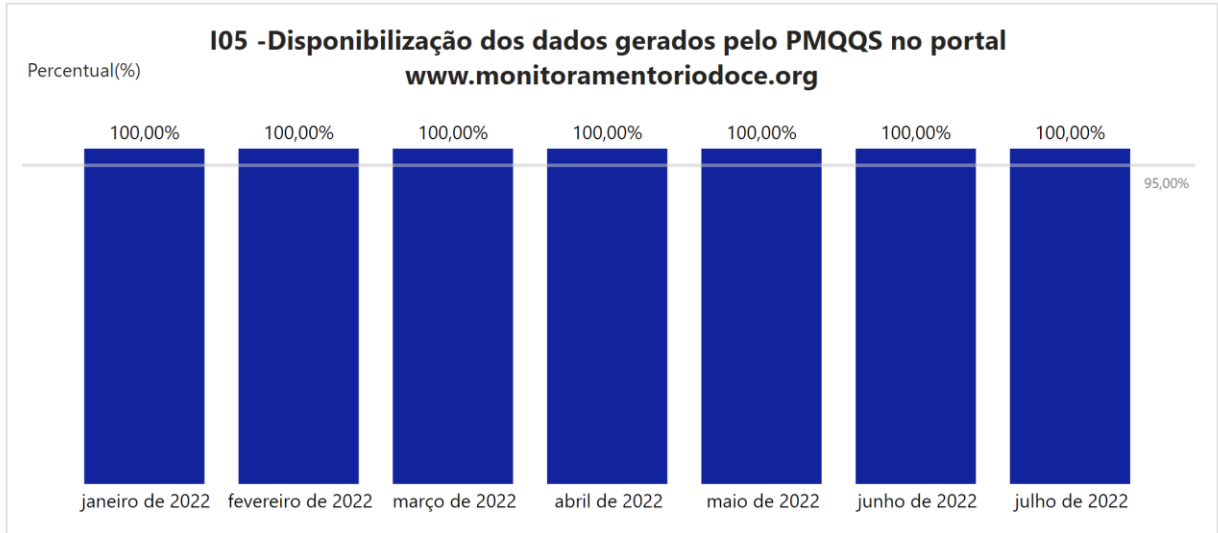


Gráfico 5: I05 -Disponibilização dos dados gerados pelo PMQQS no portal www.monitoramentorioce.org - Frequência Mensal

PG039 Unidades de Conservação

Eixo Terra e Água
























Objetivo

- Avaliar os impactos nas Unidades de Conservação diretamente e/ ou potencialmente afetadas pelo rompimento da barragem de Fundão;
- Implementar ações de reparação e mitigação que se façam necessárias, para os danos causados pelo rompimento da barragem de Fundão que forem identificados nos resultados dos estudos de avaliações de impacto;
- Custear e viabilizar a implementação das ações referentes à consolidação do Parque Estadual do Rio Doce e o Refúgio de Vida Silvestre de Santa Cruz, adotando conceitos, diretrizes e mecanismos definidos na Nota Técnica nº 18/2018/CTBio/DIBIO/ICMBio, planos de trabalho e acordos de cooperação celebrados com os órgãos gestores; e
- Viabilizar a elaboração e implementação do Plano de Manejo, bem como construir a sede da Área de Proteção Ambiental na foz do rio Doce, a ser criada pelo poder público.

Status de Cláusulas e Deliberações






Cláusula	181	Caput	Em andamento
Cláusula	182	Caput	Em andamento
Deliberação	114	2	Concluída Internamente
Deliberação	138	2	Concluída Internamente
Deliberação	218	3	Concluída Internamente
Deliberação	218	4	Concluída Internamente
Deliberação	221	1	Concluída Internamente
Deliberação	283	3	Concluída Internamente
Deliberação	318	3	Concluída Internamente
Deliberação	36	n/a	Concluída Internamente
Deliberação	472	3	Em andamento
Deliberação	472	5	Concluída Internamente
Deliberação	535	5	Concluída Internamente
Deliberação	535	6	Planejada
Deliberação	584	2	Reprogramada
Deliberação	596	1	Planejada
Deliberação	596	2	Em andamento

Entregas do ano de 2022

jan/22		Conclusão da Execução do Repasse referente ao Ano II - Consolidação PERD
fev/22		Protocolo do Relatório Preliminar AIA REBIO Comboios
mar/22		Protocolo do Relatório Final AIA PERD
abr/22		Realização da Reunião Devolutiva AIA REBIO Comboios
abr/22		Finalização da contratação edital da equipe técnica e administrativa do Refúgio de Vida Silvestre de Santa Cruz
mai/22		Protocolo do Relatório Preliminar AIA Grupo 3 e 4 - FBDS
mai/22		Protocolo do Relatório Final AIA REBIO Comboios
jul/22		Realização da Reunião Devolutiva AIA Grupo 3 e 4 - FBDS
set/22		Protocolo Plano de ação de reparação PERD
out/22		Realizar Reunião Devolutiva REVIS Santa Cruz
out/22		Protocolar Plano de ação de reparação Rebio Comboios
nov/22		Protocolo do Relatório Preliminar AIA Grupo 1 - FBDS
nov/22		Protocolo do Relatório Preliminar de Avaliação de Impactos Grupo 6
nov/22		Protocolo do Relatório Final AIA REVIS Santa Cruz
nov/22		Protocolo do Relatório Preliminar de Avaliação de Impactos Grupo Bahia
nov/22		Protocolo do Relatório Preliminar de Avaliação de Impactos Grupo 5
nov/22		Protocolo do Relatório Preliminar de Avaliação de Impactos Grupo Costeiras 1 e 2 OUTRAS UCS
nov/22		Realização da Reunião Devolutiva Grupo 2
nov/22		Realização da Reunião Devolutiva AIA Grupo 1 - FBDS
nov/22		Realização da Reunião Devolutiva Grupo 6
dez/22		Realização da Reunião Devolutiva Grupo Bahia
dez/22		Realização da Reunião Devolutiva Grupo 5
dez/22		Realização da Reunião Devolutiva Grupo Costeiras 1 e 2 OUTRAS UCS

 Concluído
  Planejado
  Reprogramado

Entregas do ano de 2022

- dez/22  Protocolo do Relatório Final AIA Grupo 1
- dez/22  Protocolar Plano de ação de reparação APA Costas das Algas e REVIS
- dez/22  Protocolo do Relatório Final de Avaliação de Impactos Grupo 2
- dez/22  Protocolo do Relatório Final de Avaliação de Impactos Grupo 6
- dez/22  Protocolo do Relatório Final de Avaliação de Impactos Grupo Costeiras 1 e 2 OUTRAS UCS

Grandes números do programa

O programa não possui grandes números.

Fatos relevantes do mês

Em 30/09/2022, foi feito o protocolo do Relatório de AIA - Avaliação de Impacto Ambiental do Grupo 2.

Em 19/09/2022, foi feito o protocolo do Relatório Final dos Grupos 3 e 4 de UCs – Unidades de Conservação

Em 16/09/2022, foi feito o protocolo do Plano de Ação do PERD – Parque Estadual do Rio Doce.

Em 12/09/2022, foi feito o Relatório da Oficina de Elaboração dos Planos de Manejo do Refúgio de Vida Silvestre de Santa Cruz e Área de Proteção Ambiental Costa das Algas - Etapa do Plano de Consolidação do Refúgio de Vida Silvestre de Santa Cruz.

Em 02/09/2022, foi feito o protocolo de Avaliação de Impacto Ambiental APA Costa das Algas e REVIS Santa Cruz

Indicadores

I01 – Quantidade de UCs com avaliação concluída

Percentual(%)

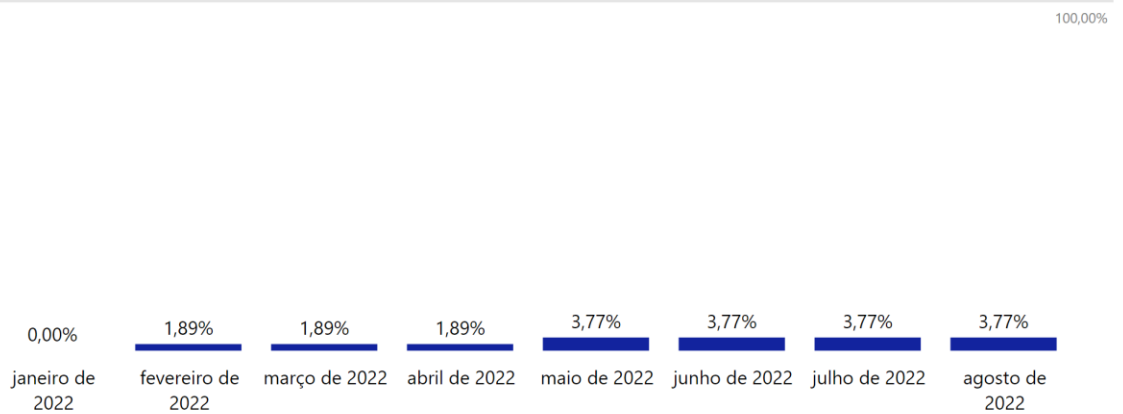


Gráfico 1: I01 – Quantidade de UCs com avaliação concluída - Frequência Mensal

I04 - Execução das ações para consolidação do Refúgio de Vida Silvestre de Santa Cruz (REVIS)

Percentual(%)



Gráfico 2: I04 - Execução das ações para consolidação do Refúgio de Vida Silvestre de Santa Cruz (REVIS) - Frequência Semestral

Nota: Os resultados do indicador I04 estão em fase de consolidação de acordo com o novo critério de medição.

Indicadores

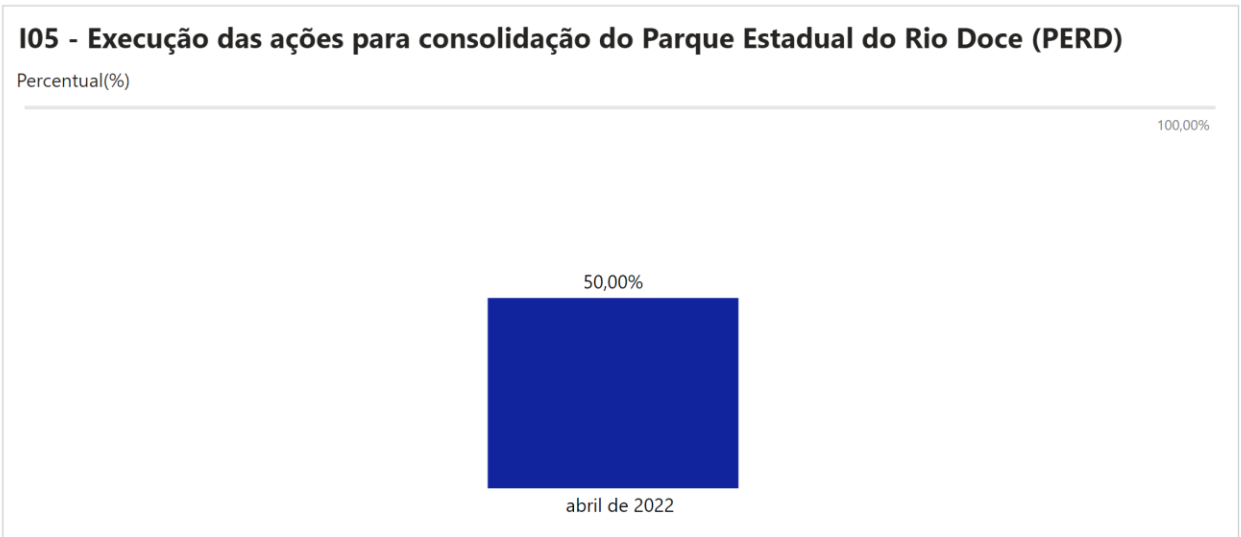


Gráfico 3: I05 - Execução das ações para consolidação do Parque Estadual do Rio Doce (PERD) - Frequência Mensal

PG040 Programa de Fomento ao CAR e PRA

Eixo Terra e Água


Objetivo




Prestar suporte e apoio técnico para o cadastramento dos imóveis rurais no CAR, além de fomentar a elaboração e a implementação dos respectivos PRA's conforme previsto na Cláusula 183 do TTAC.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	183	Caput	Em andamento
Deliberação	28	n/a	Concluída Internamente

Entregas do ano de 2022

julho de 2022  Retificação e validação dos cadastros das propriedades objeto do PRA Piloto no Espírito Santo

 Concluído  Planejado  Reprogramado

Grandes números do programa

593 imóveis rurais elegíveis ao Fomento do CAR. Deste total, 63 (10,6%) imóveis declinaram e 529 (89,2%) aderiram à proposta do Programa por meio da assinatura dos termos de autorização de uso e coleta de dados, os demais ainda dependem de retorno sobre a adesão. Dos aderidos, 390 CAR já foram retificados ou elaborados pela Fundação Renova.

Fatos relevantes do mês

Realização de treinamento em parceria com o IEF para elaboração dos PRA's do PG40.

Finalização das ratificações do CAR nas propriedades aderidas ao PG40, nos municípios Naque, Belo Oriente, Periquito e Alpercata.

Elaboração dos Projetos Simplificados de Regularização Ambiental (PSRA) em atendimento ao PRA MG, via SEI, iniciado em Mariana e Barra Longa.

Indicadores

I01 – Percentual de CAR elaborados, retificados e/ou ratificados pela Fundação Renova

Percentual(%)

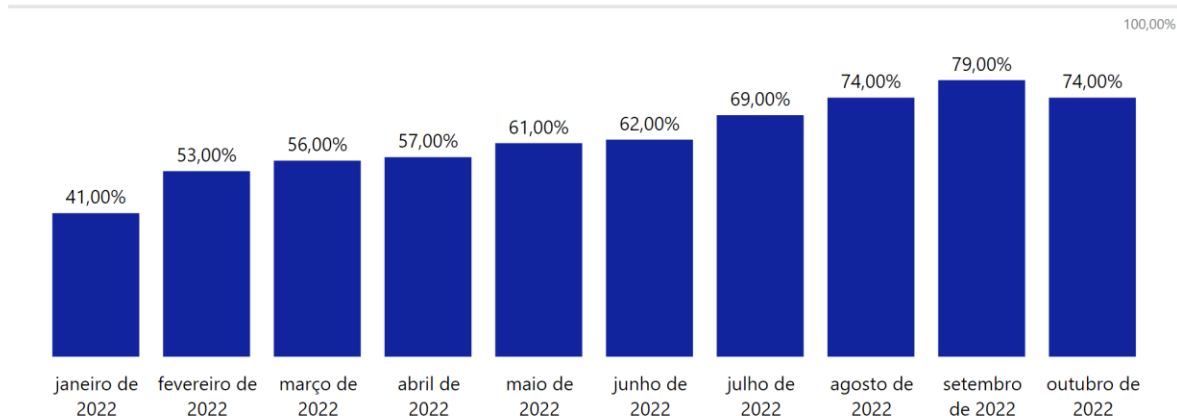


Gráfico 1: I01 – Percentual de CAR elaborados, retificados e/ou ratificados pela Fundação Renova - Frequência Mensal

Resultado do indicador ajustado em conformidade com os grandes números, considerando a variação mensal do número de aderidos ao programa.

Tabela 1. Indicadores que não iniciaram a medição. Fonte: Definição do Programa.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDADE DE MEDIDA
102	Percentual de Projetos de Restauração de Áreas Degradadas e Alteradas (PRADAs) elaborados em relação aos imóveis que aderiram ao programa	Quantidade de PRADAs elaborados / Quantidade de imóveis que aderiram ao programa	%
103	Percentual de Termos de Compromissos assinados pelos proprietários/ posseiros com o órgão gestor do CAR/PRA em relação aos imóveis que aderiram ao programa	Quantidade de Termos de Compromisso assinados / Quantidade de imóveis que aderiram ao programa	%

PG042 Ressarcimento dos Gastos Públicos Extraordinários

Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivo

Ressarcir os compromitentes do TTAC e os municípios impactados, que compreendem sua área de abrangência, pelos gastos públicos extraordinários decorrentes do evento, através da comprovação por meio de documentos oficiais, observada a política de compliance da Fundação, conforme cláusulas 141 a 143 do TTAC.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	141	Caput	Concluída Internamente
Cláusula	142	Caput	Concluída Internamente
Cláusula	143	§único	Em andamento
Deliberação	171	2	Concluída Internamente
Deliberação	180	3	Concluída Internamente
Deliberação	20	n/a	Concluída Internamente
Deliberação	208	6	Concluída Internamente
Deliberação	208	8	Concluída Internamente
Deliberação	254	2	Concluída Internamente
Deliberação	291	2	Concluída Internamente
Deliberação	428	1	Concluída Internamente
Deliberação	49	caput (ação 1)	Concluída Internamente
Deliberação	49	caput (ação 2)	Em andamento
Deliberação	69	n/a	Concluída Internamente
Deliberação	78	n/a	Concluída Internamente
Deliberação	85	3	Concluída Internamente

Entregas do ano de 2022

- dezembro de 2022 ● Demais pagamentos referentes a Deliberação 428 - Cláusula 143 - ES - Concluído
- dezembro de 2022 ● Demais pagamentos referentes a Deliberação 428 - Cláusula 143 - MG - Concluído

● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Grandes números do programa

- Até o momento foram ressarcidas 40 **Prefeituras** e 19 **Órgãos Compromitentes**;
- Os ressarcimentos somam **R\$ 53,97 milhões** pagos para às **Prefeituras** e **R\$ 29,95 milhões** pagos aos **Órgãos Compromitentes**.
- No âmbito da cláusula 143 do TTAC, foram ressarcidos um valor total de **R\$ 654,7 Mil**, referente a 2 **órgãos comprometentes** e 1 **município** (ressarcimento dos aluguéis sociais de Linhares).

Notas

Nome do dado	Resultado	Observações
Valor Ressarcido (cláusula 143)	655	Processo de Ressarcimento ao Gabinete Militar do Governador de Minas Gerais foi concluído em 11/10/2022, no valor de R\$ 109.470,91 (cento e nove mil, quatrocentos e setenta reais e noventa e um centavos), mediante assinatura de Termo de Quitação, que confere plena quitação desse órgão no âmbito da cláusula 143 do TTAC e do Programa de Ressarcimento de Gastos Públicos Extraordinários, PG42.

Fatos relevantes do mês

Conclusão do ressarcimento de gastos públicos extraordinários ao Gabinete Militar (no âmbito da Cláusula 143 do TTAC).

Indicadores

I01 – % de ressarcimento aos compromitentes (cláusula 141)

Percentual(%)

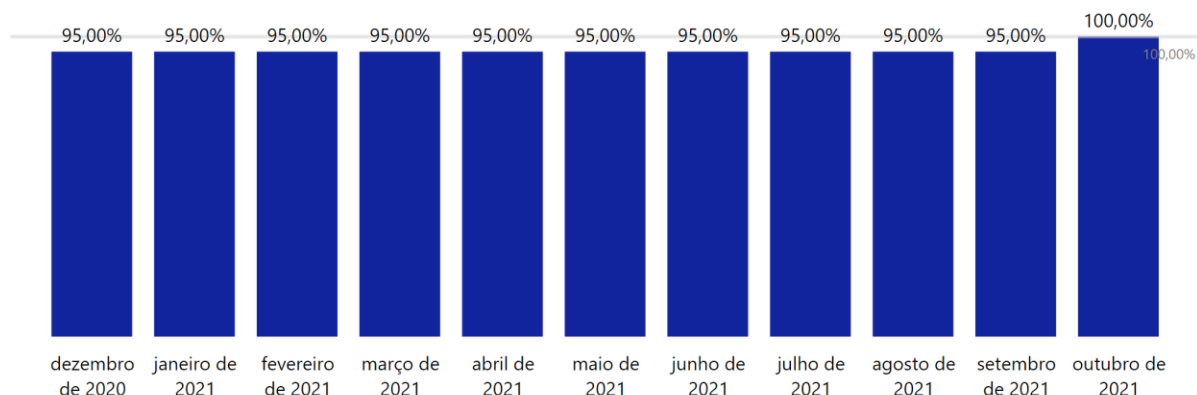


Gráfico 1: I01 – % de ressarcimento aos compromitentes (cláusula 141) - Frequência Mensal

I02 – % de ressarcimento às prefeituras

Percentual(%)




Gráfico 2: I02 – % de ressarcimento às prefeituras - Frequência Mensal

Indicadores

I03 – % de ressarcimento aos Compromitentes (cláusula 143)

Percentual(%)

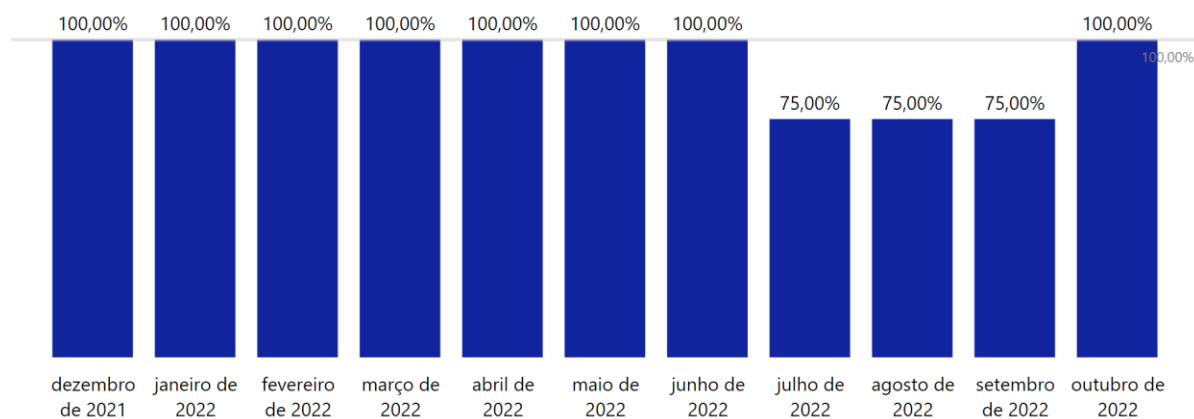


Gráfico 2: I03 – % de ressarcimento aos Compromitentes (cláusula 143) - Frequência Mensal

Glossário

- I. IMPACTADOS: as pessoas físicas ou jurídicas, e respectivas comunidades, que tenham sido diretamente afetadas pelo rompimento da barragem de Fundão nos termos das alíneas abaixo e do TTAC:
- a. perda de cônjuge, companheiro, familiares até o segundo grau, por óbito ou por desaparecimento;
 - b. perda, por óbito ou por desaparecimento, de familiares com graus de parentesco diversos ou de pessoas com as quais coabitavam e/ou mantinham relação de dependência econômica;
 - c. perda comprovada pelo proprietário de bens móveis ou imóveis ou perda da posse de bem imóvel;
 - d. perda da capacidade produtiva ou da viabilidade de uso de bem imóvel ou de parcela dele;
 - e. perda comprovada de áreas de exercício da atividade pesqueira e dos recursos pesqueiros e extrativos, inviabilizando a atividade extrativa ou produtiva;
 - f. perda de fontes de renda, de trabalho ou de autossustentância das quais dependam economicamente, em virtude da ruptura do vínculo com áreas atingidas;
 - g. prejuízos comprovados às atividades produtivas locais, com inviabilização de estabelecimento ou das atividades econômicas;
 - h. inviabilização do acesso ou de atividade de manejo dos recursos naturais e pesqueiros, incluindo as terras de domínio público e uso coletivo, afetando a renda e a subsistência e o modo de vida de populações;

i. danos à saúde física ou mental; e

j. destruição ou interferência em modos de vida comunitários ou nas condições de reprodução dos processos socioculturais e cosmológicos de populações ribeirinhas, estuarinas, tradicionais e povos indígenas.

II. **INDIRETAMENTE IMPACTADOS:** as pessoas físicas e jurídicas, presentes ou futuras, que não se enquadrem nos incisos anteriores, que residam ou venham a residir na **ÁREA DE ABRANGÊNCIA** e que sofram limitação no exercício dos seus direitos fundamentais em decorrência das consequências ambientais ou econômicas, diretas ou indiretas, presentes ou futuras, do rompimento da barragem de Fundão, que serão contemplados com acesso à informação e a participação nas discussões comunitárias, bem como poderão ter acesso aos equipamentos públicos resultantes dos PROGRAMAS.

III. **ÁREA AMBIENTAL 1:** as áreas abrangidas pela deposição de rejeitos nas calhas e margens dos rios Gualaxo do Norte, Carmo e Doce, considerando os respectivos trechos de seus formadores e afluentes, bem como as regiões estuarinas, costeiras e marinha na porção impactada pelo rompimento da barragem de Fundão.

IV. **ÁREA AMBIENTAL 2:** os municípios banhados pelo Rio Doce e pelos trechos impactados dos rios Gualaxo do Norte e Carmo, a saber: Mariana, Barra Longa, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado, Sem-Peixe, Rio Casca, São Pedro dos Ferros, São Domingos do Prata, São José do Goiabal, Raul Soares, Dionísio, Córrego Novo, Pingo d'Água, Marliéria, Bom Jesus do Galho, Timóteo, Caratinga, Ipatinga, Santana do Paraíso, Ipaba, Belo Oriente, Bugre, Iapu, Naque, Periquito, Sobrália, Fernandes Tourinho, Alpercata, Governador Valadares, Tumiritinga, Galileia, Conselheiro Pena, Resplendor, Itueta, Aimorés, Baixo Guandu, Colatina, Marilândia e Linhares.

V. ÁREA DE ABRANGÊNCIA SOCIOECÔNÔMICA: localidades e comunidades adjacentes à calha dos rios Doce, Carmo e Gualaxo do Norte e Córrego Santarém e a áreas estuarinas, costeira e marinha impactadas.

VI. MUNICÍPIOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA SOCIOECÔNÔMICA: Mariana, Barra Longa, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado, Rio Casca, Sem-Peixe, São Pedro dos Ferros, São Domingos do Prata, São José do Goiabal, Raul Soares, Dionísio, Córrego Novo, Pingo-D'Água, Marliéria, Bom Jesus do Galho, Timóteo, Caratinga, Ipatinga, Santana do Paraíso, Ipaba, Belo Oriente, Bugre, Iapu, Naque, Periquito, Sobrália, Fernandes Tourinho, Alpercata, Governador Valadares, Tumiritinga, Galiléia, Conselheiro Pena, Resplendor, Itueta e Aimorés

VII. MUNICÍPIOS E LOCALIDADES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA SOCIOECÔNÔMICA: Baixo Guandu, Colatina, Barra do Riacho em Aracruz, Marilândia e Linhares, além das áreas estuarinas, costeira e marinha impactadas.

VIII. PROGRAMAS SOCIOECONÔMICOS: conjunto de medidas e de ações a serem executadas de acordo com um plano tecnicamente fundamentado, necessárias à reparação, mitigação, compensação e indenização pelos danos socioeconômicos decorrentes do rompimento da barragem de Fundão, fiscalizadas e supervisionadas pelo PODER PÚBLICO, nos termos do TTAC.

IX. PROGRAMAS SOCIOAMBIENTAIS: conjunto de medidas e de ações a serem executadas de acordo com um plano tecnicamente fundamentado, necessárias à reparação e compensação pelos danos socioambientais decorrentes do rompimento da barragem de Fundão, fiscalizadas e supervisionadas pelo PODER PÚBLICO, nos termos do TTAC.

X. PROGRAMAS: são os PROGRAMAS SOCIOAMBIENTAIS e os PROGRAMAS SOCIOECONÔMICOS quando referidos em conjunto.

XI. **PROJETOS SOCIOAMBIENTAIS:** são as ações e medidas aprovadas pela FUNDAÇÃO, nos termos do TTAC, para a implementação de determinados PROGRAMAS SOCIOAMBIENTAIS.

XII. **PROJETOS SOCIOECONÔMICOS:** são as ações e medidas aprovadas pela FUNDAÇÃO, nos termos do TTAC, para a implementação de determinados PROGRAMAS SOCIOECONÔMICOS.

XIII. **PROJETOS:** são os PROJETOS SOCIOAMBIENTAIS e os PROJETOS SOCIOECONÔMICOS quando referidos em conjunto.

XIV. **PODER PÚBLICO:** órgãos e entidades públicos integrantes ou vinculados aos COMPROMITENTES e que, em razão de suas atribuições institucionais, tenham competência legal para regulamentar e/ou fiscalizar ações relacionadas a um determinado PROGRAMA.

XV. **ÓRGÃOS AMBIENTAIS:** Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama); Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio); Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Seama-ES); Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf); Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad-MG); Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Espírito Santo (Iema-ES); Instituto Estadual de Florestas (IEF-MG); Fundação Estadual de Meio Ambiente (Feam-MG).

XVI. **ÓRGÃOS DE GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS:** Agência Nacional de Águas (ANA); Agência de Gestão de Recursos Hídricos do Espírito Santo (AGERH-ES); e Instituto de Gestão das Águas de Minas (Igam-MG).

XVII. **PROGRAMAS REPARATÓRIOS:** compreendem medidas e ações de cunho reparatório que têm por objetivo mitigar, remediar e/ou reparar impactos socioambientais e socioeconômicos advindos do rompimento da barragem de Fundão.

XVIII. PROGRAMAS COMPENSATÓRIOS: compreendem medidas e ações que visam a compensar impactos não mitigáveis ou não reparáveis advindos do rompimento da barragem de Fundão, por meio da melhoria das condições socioambientais e socioeconômicas das áreas impactadas, cuja reparação não seja possível ou viável, nos termos dos PROGRAMAS.

XIX. FUNDAÇÃO: fundação de direito privado, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei, a ser instituída pela SAMARCO e pelas ACIONISTAS com o objetivo de elaborar e executar todas as medidas previstas pelos PROGRAMAS SOCIOAMBIENTAIS e PROGRAMAS SOCIOECONÔMICOS.

XX. EXPERT: pessoa física ou jurídica, ou grupo de pessoas físicas ou jurídicas, legalmente habilitadas e contratadas pela FUNDAÇÃO RENOVA para gestão, avaliação, elaboração e/ou implantação dos PROGRAMAS e/ou PROJETOS, total ou parcialmente.

XXI. SITUAÇÃO ANTERIOR: situação socioambiental e socioeconômica imediatamente anterior a 05/11/2015.



XXII. PRADA: Projeto de Restauração de Áreas Degradadas e Alteradas.

XXIII. Ação para itens cláusulas do TTAC e deliberações são as ações a serem cumpridas pela Fundação Renova, os status reportados no presente relatório são descritas a seguir:

- a. Concluída internamente, o item foi concluído pela Fundação Renova mas ainda deverá ser validado pelo CIF ou já foi declarado seu descumprimento;
- b. Em andamento, itens cujo atendimento já foi iniciado ou que possuem uma obrigação recorrente;

- c. Encerrado, item concluído e aprovado oficialmente pelo CIF;
- d. Judicializado, não houve consenso entre Fundação Renova e CIF sobre o atendimento ao item, que passa a ser acompanhado através das decisões na 12º Vara;
- e. Pendente, a conclusão do item não depende somente da Fundação Renova, mas de outros fatores externos;
- f. Planejada, itens que estão no prazo, porém o seu atendimento ainda não foi iniciado;
- g. Reprogramado, item não foi concluído no prazo e precisou ser replanejado;

Taxa de acidentes registrados

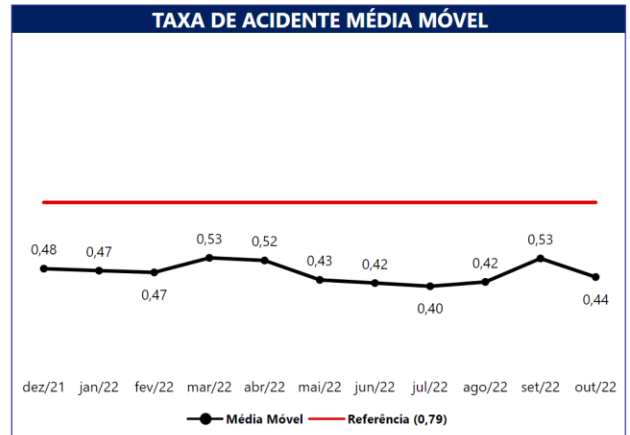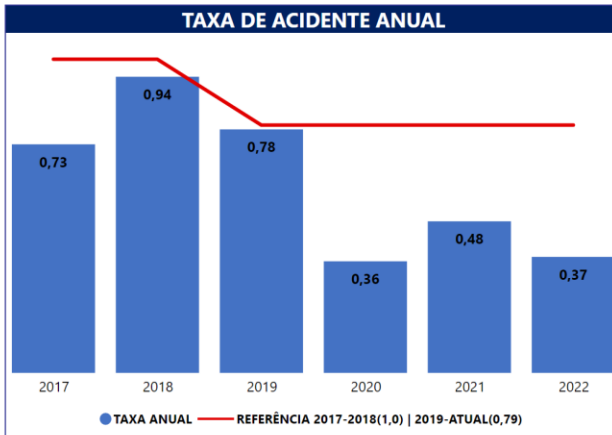

(Número de acidentes registrados x 1.000.000/horas trabalhadas)

* Acidentes registrados = acidentes com afastamento mais acidentes sem afastamento.

Como ler o gráfico

Coluna cor azul: taxa de acidentes acumulada no ano. Toma-se o número de acidentes acumulados no ano, multiplica-se por um milhão e divide-se pelo número de horas trabalhadas no ano. Coluna cor verde: representa a taxa de acidentes referente ao mês. Toma-se o número de acidentes ocorridos no mês, multiplica-se por um milhão e divide-se pelo número de horas trabalhadas no mês.

Linha vermelha: valor de referência 1. Esse valor foi adotado devido ao pouco tempo de trabalho da Fundação Renova. É o valor mínimo para uma empresa. A média nacional para essa referência, por exemplo, é 7.

Ponto preto: esse valor corresponde à média dos últimos doze meses. Caso o número de acidentes continue o mesmo no período e as horas trabalhadas aumentem, esse valor pode cair.

Gestão Econômica*

PG	Programas	Anual Total				Anual Acumulado					
		Orçamento	Realizado	Variação	%	Orçamento	Realizado	Variação	%		
PG13	TURISMO CULTURA LAZER E ESPORTE	17,2	6,7	-	10,5	-61%	13,5	6,73	-	6,8	-50%
PG15	INOVAÇÃO	4,0	2,5	-	1,5	-38%	3,3	2,48	-	0,8	-25%
PG18	DIVERSIFICAÇÃO ECONOMIA REGIONAL	21,3	20,4	-	0,9	-4%	19,0	20,40		1,4	7%
PG20	CONTRATAÇÃO LOCAL	5,7	5,4	-	0,3	-5%	4,7	5,42		0,7	16%
PG26	RECUPERAÇÃO DE APPs	97,3	71,9	-	25,5	-26%	59,9	71,87		11,95	20%
PG27	RECUPERAÇÃO DE NASCENTES	25,0	13,1	-	11,9	-48%	16,6	13,09	-	3,53	-21%
PG29	ESTRUTURA TRIAGEM	9,3	4,2	-	5,2	-55%	5,5	4,15	-	1,33	-24%
PG31	SANEAMENTO BÁSICO	45,0	24,0	-	21,0	-47%	31,9	24,02	-	7,87	-25%
PG32	SISTEMAS DE ABASTECIMENTO ÁGUA	77,3	49,1	-	28,2	-37%	53,5	49,1	-	4,4	-8%
PG33	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	22,4	11,1	-	11,4	-51%	15,0	11,06	-	3,94	-26%
PG34	EMERGÊNCIA AMBIENTAL	5,7	3,5	-	2,2	-38%	3,6	3,52	-	0,1	-1%
PG35	INFORMAÇÃO PARA A POPULAÇÃO	4,4	0,8	-	3,6	-83%	3,0	0,76	-	2,2	-74%
PG36	COMUNICAÇÃO NACIONAL INTERNACIONAL	2,1	1,7	-	0,4	-21%	1,8	1,68	-	0,1	-4%
PG39	CONSOLIDAÇÃO UCS	10,7	8,2	-	2,4	-23%	9,5	8,23	-	1,3	-13%
PG40	IMPLANTAÇÃO CAR E PRAS	1,9	0,9	-	1,0	-52%	1,3	0,91	-	0,4	-31%
PG43	MEDIDAS COMPENSATÓRIAS	41,0	1,5	-	39,5	-96%	15,8	1,54	-	14,29	-90%
PG97	PROJETOS COMP - SALDO A ALOCAR	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	0%
Total Compensatórios		390,5	225,0	-	165,5	-42%	257,8	225,0	-	32,8	-13%
PG00	MEDIDAS MITIGATÓRIAS EMERGENCIAIS	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	0%
PG01	CADASTRO	60,0	25,2	-	34,8	-58%	42,9	25,25	-	17,6	-41%
PG02	PIM - INDENIZAÇÃO ATINGIDOS	5.569,4	2.946,2	-	2.623,2	-47%	3.886,2	2.946,2	-	940,0	-24%
PG03	POVOS INDÍGENAS	119,7	55,1	-	64,6	-54%	82,4	55,1	-	27,3	-33%
PG04	POVOS TRADICIONAIS	44,5	5,7	-	38,8	-87%	43,3	5,7	-	37,6	-87%
PG05	PROTEÇÃO SOCIAL	15,2	9,9	-	5,2	-34%	10,5	9,95	-	0,5	-5%
PG06	PARTICIPAÇÃO E DIÁLOGO	99,2	78,7	-	20,5	-21%	85,4	78,73	-	6,68	-8%
PG07	ASSISTÊNCIA AOS ANIMAIS	9,8	6,9	-	2,9	-30%	7,9	6,87	-	1,01	-13%
PG08	REASSENTAMENTO	1.556,1	1.088,8	-	467,3	-30%	1.197,7	1.088,8	-	108,9	-9,1%
PG09	UHE CANDONGA	590,0	436,9	-	153,1	-26%	451,2	436,9	-	14,3	-3%
PG10	INFRAESTRUTURA IMPACTADA	102,9	64,4	-	38,5	-37%	84,2	64,43	-	19,76	-23%
PG11	RECUPERAÇÃO ESCOLAS	7,4	6,0	-	1,4	-19%	5,8	6,01		0,2	4%
PG12	MEMÓRIA HISTÓRICA	9,4	9,6		0,1	1%	7,1	9,56		2,4	34%
PG13	TURISMO CULTURA LAZER E ESPORTE	2,8	2,9		0,1	3%	2,1	2,87		0,7	34%
PG14	SAÚDE	6,1	8,4		2,3	38%	4,8	8,40		3,6	73%
PG16	PESCA	23,2	16,9	-	6,3	-27%	18,5	16,91	-	1,6	-9%
PG17	ATIVIDADE AGROPECUÁRIA	100,0	51,7	-	48,3	-48%	53,3	51,7	-	1,6	-3%
PG19	RECUPERAÇÃO NEGÓCIOS	9,9	6,6	-	3,3	-33%	7,6	6,58	-	1,0	-13%
PG21	AFE - AUXÍLIO FINANCEIRO	108,0	537,9		429,8	398%	79,0	537,9		458,9	581%
PG23	MANEJO DE REJEITOS	158,6	95,4	-	63,1	-40%	126,5	95,4	-	31,0	-25%
PG24	CONTENÇÃO DE REJEITOS	2,9	3,6		0,7	23%	2,5	3,63		1,1	45%
PG25	RECUPERAÇÃO ÁREA AMBIENTAL 1	26,3	18,9	-	7,3	-28%	20,9	18,94	-	1,9	-9%
PG28	BIODIVERSIDADE	107,6	81,3	-	26,3	-24%	100,4	81,25	-	19,1	-19%
PG30	FAUNA E FLORA TERRESTRE	39,2	22,7	-	16,5	-42%	27,6	22,70	-	4,9	-18%
PG32	SISTEMAS DE ABASTECIMENTO ÁGUA	169,1	95,8	-	73,3	-43%	126,4	95,8	-	30,7	-24%
PG37	GESTÃO RISCOS AMBIENTAIS	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	0%
PG38	MONITORAMENTO ÁGUA	39,6	30,7	-	9,0	-23%	32,0	30,67	-	1,4	-4%
PG39	CONSOLIDAÇÃO UCS	4,0	2,6	-	1,4	-36%	3,1	2,58	-	0,5	-17%
PG41	GESTÃO DOS PROGRAMAS	337,9	249,4	-	88,6	-26%	277,9	249,39	-	28,5	-10%
PG42	GASTOS PÚBLICOS EXTRAORDINÁRIOS	-	0,1		0,1	#DIV/0!	-	0,11		0,1	#DIV/0!
PG99	CONTINGÊNCIA	64,8	-	-	64,8	-100%	31,1	-	-	31,1	-100%
Total Reparatórios		9.383,6	5.958,3	-	3.425,3	-37%	6.818,3	5.958,3	-	860,0	-13%
Total Programas		9.774,1	6.183,2	-	3.590,8	-37%	7.076,1	6.183,2	-	892,9	-13%
ADM	DESPESAS GESTÃO ADMINISTRATIVAS	192,8	123,6	-	69,2	-36%	156,26	123,59	-	32,7	-21%
CG	CUSTEIO SISTEMA DE GOVERNANÇA	23,5	6,4	-	17,1	-73%	12,9	6,38	-	6,6	-51%
Total Despesas Administrativas		216,3	130,0	-	86,3	-40%	169,2	130,0	-	39,2	-23%
Total Geral		9.990,4	6.313,2	-	3.677,2	-37%	7.245,3	6.313,2	-	932,1	-13%

PG	Programas	Mensal			Justificativas da variação anual acumulada
		Orçamento	Realizado	Variação	
PG13	TURISMO CULTURA LAZER E ESPORTE	-	-	- 0%	<p>Postergação (Edital Doce Execução - R\$ 5 MM):</p> <p>2MM - Prestação de contas de terceiros referentes aos projetos cancelados/desistentes;</p> <p>2MM - Projetos com atraso na prestação de contas ou que a baixa contábil ainda não foi realizada;</p> <p>1MM - Projetos com prestação de contas reprovadas (serão encaminhados à esfera judicial) (Incentivo à Leitura - 0,7M): Atraso no processo de contratação por conta de resultado da APRO e baixa contábil não realizada no mês de referência.</p> <p>(Torneio de Pesca - 0,4M): Mudança de estratégia de fomento às iniciativas do território.</p> <p>Desenvolvimento de parceria com a organização local acarretando o desenvolvimento das ações com data posterior ao planejado</p> <p>(Gestão Edital Doce - 0,6MM): Saldo de despesas reembolsáveis que não será utilizado pelo motivo do contrato ter sido executado de forma remota e Gerenciamento da 2ª Edição do Edital Doce iniciado após o período planejado.</p> <p>Plano de Ação:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Apoiar os proponentes que já finalizaram as atividades a realizar a prestação de contas e encerramento do projeto com a Fundação. - Otimizar o prazo de entregas até dezembro/22 - Agilizar o processo de formalização das parcerias após divulgação dos projetos aprovados na 2ª Edição. Curva do avanço físico aprimorada no draft20.
PG15	INOVAÇÃO	-	-	- 0%	<p>Postergação:</p> <p>(R\$ 0,7 M) Chamada 09/2018: Atraso prestações de contas dos projetos vinculados a FAPEMIG para baixas de adiantamento da 1ª parcela dos projetos e execução dos convênios abaixo do planejado (<80%).</p> <p>Plano de Ação: Liberar 2ª parcela dos convênios balizada pela execução da 1ª parcela- Prazo: 11/22; Elaborar e Submeter APRO para realização dos Aditivos de Prazo aos convênios conforme necessidade - Prazo: 11/22; Realizar de aditivo de prazo aos convênios - Prazo: 12/2022.</p> <p>(R\$ 0,1 M) Edital Tecnologias Inovadoras: Não teve início.</p> <p>Plano de Ação: Projeto postergado para 2024. Alterado Draft 20. Conduzir processo de contratação em paralelo ao aguardo da deliberação do projeto - Concluído; Apresentar projeto e NT emitida pela CTEI em outras CTs conforme indicação do CIF - Prazo: 11/2022.</p>
PG18	DIVERSIFICAÇÃO ECONOMIA REGIONAL	-	-	- 0%	<p>Postergação:</p> <p>(R\$ 5,0 MM) Fundo Diversifica Mariana: Não foi realizado o repasse do Fundo Diversifica Mariana. APRO aprovada, porém com recomendações.</p> <p>Plano de ação: Acompanhar assinatura do contrato de repasse pela FR e BDMG. Prazo: 23/12/2022.</p> <p>Antecipação:</p> <p>+ R\$ 6,5 MM Distrito Empresarial: Repasse em parcela única e não em 2x conforme previsto anteriormente.</p> <p>Plano de Ação: N/A.</p> <p>Antecipação:</p> <p>+ R\$ 0,5 M Empresa especializada RH: Contrato CPHO. Referente à execução da alta demanda de capacitações "Como se preparar para o mercado de trabalho" do projeto Recoloca Rio Doce.</p> <p>+ R\$ 0,2 M Desenvolvimento de Fornecedores: Referente a antecipação das ações do Projeto +Gestão para cumprimento da meta do painel estratégico 2022.</p>
PG20	CONTRATAÇÃO LOCAL	-	-	- 0%	<p>+ R\$ 0,2 M Qualificação Profissional: referente aos contratos SENAI MG e ES (antecipação das capacitações projetadas para o ano de 2023).</p> <p>Postergação:</p> <p>(R\$ 0,2 M) Estudos e Mapeamento: atraso no início do Mapeamento Mão de obra Mariana (Deliberação CIF).</p> <p>Plano de Ação: Correção Draft 20.</p>
PG26	RECUPERAÇÃO DE APPs	-	-	- 0%	<p>+R\$ 11,95MM - Processo de aceleração sendo implementado através de adiantamento das mobilizações. Priorização do processo de mobilização e engajamento de produtores rurais, validação de áreas, elaboração de projetos, estaqueamento e Cercamento. Início de novos contratos em setembro, com medição das mobilizações das contratadas.</p> <p>Plano de Ação: Efetivar as contratações necessárias para o ciclo (16 lotes em 2 editais). Contratação de 1 lote exclusivo para execução de cercamento. Reajustes nos valores dos contratos com atividades de cercamento. Reforçar junto aos fornecedores contratados para plano de ataque para aumento da produção referente as atividades de Validação de Áreas dos Produtores Rurais, Elaboração de Projetos, Estaqueamento, Instalação de Cercamento, Preparo de Solo e Manutenção das áreas.</p>
PG27	RECUPERAÇÃO DE NASCENTES	-	-	- 0%	<p>Postergação: (R\$ 3,53MM) - Priorização do PG26 em relação ao PG27. E não definição das nascentes do CBHdoce quanto as nascentes do Piracicaba, D03 - Santo Antônio, D04 - Caratinga.</p> <p>Plano de ação: Reforçar junto aos fornecedores contratados para plano de ataque as atividades do programa 27 para aumento da produção referente as atividades de Validação de Áreas dos Produtores Rurais, Elaboração de Projetos, Estaqueamento, Instalação de Cercamento, Preparo de Solo e Manutenção das áreas.</p>
PG29	ESTRUTURA TRIAGEM	-	-	- 0%	<p>Postergação: Menor medição dos projetos de Engenharia. Cronograma atualizado está defasado em comparação ao Draft 19.</p> <p>Plano de Ação: Atuação junto a Engenharia para liberação e aprovação dos documentos no SAP e medição dos serviços realizados.</p>
PG31	SANEAMENTO BÁSICO	-	-	- 0%	<p>Postergação (R\$7,87MM): Os municípios não apresentaram as medições conforme previsto em cronograma/orgamento, e consequentemente, o repasse do recurso não foi realizado.</p> <p>Plano de Ação: Realizar reuniões periódicas com os municípios para alinhamento dos processos, entendimento dos atrasos, orientações e reprogramação das entregas definidas em cronograma.</p>
PG32	SISTEMAS DE ABASTECIMENTO ÁGUA	-	-	- 0%	<p>Postergação: Adutora-GV - A curva de desembolso dos pacotes não alcançou o Planejado até o presente momento.</p> <p>Plano de Ação: Adutora-GV : Todos Pacotes contratados e com serviços em andamento, atuando na recuperação (expectativa de recuperação com a conclusão da montagem da estrutura metálica da captação).</p>

PG	Programas	Mensal			Justificativas da variação anual acumulada
		Orçamento	Realizado	Variação	
PG33	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	-	-	- 0%	<p>Postergação (R\$ 3,39MM): referente ao atraso no pagamento de bolsas para cursistas, professores e tutores pela UFMG/UFOP (R\$ 3,3MM); provisionamentos no Interface (R\$ 0,09MM).</p> <p>Plano de Ação: monitoramento da execução dos contratos para que não ocorram atrasos nas medições.</p> <p>Economia (R\$ 0,55M): Referente a economia real no Projeto Liderança Jovens.</p> <p>Plano de Ação: Não se aplica.</p>
PG34	EMERGÊNCIA AMBIENTAL	-	-	- 0%	<p>(-R\$0,1MM): Postergação da implementação dos projetos de Sistema de Proteção e Combate à Incêndio (SPCI) do Escola Segura, em decorrência da pandemia.</p> <p>Plano de Ação: Desembolso ajustado no Draft20.</p> <p>Postergação: (R\$ 2,2 MM)</p> <ul style="list-style-type: none"> - CIT Mariana - Em fase de re-negociação da parceria com a Prefeitura Municipal para instalação do equipamento no Terminal Turístico. - CIT GV - Projeto executivo finalizado, formalização da parceria com a PMGV realizada, aguardando orçamentação do projeto e início da contratação de obras para instalação do equipamento. - CIT Linhares - Termo de Parceria em processo de finalização de assinatura pelo ICMBio. <p>* Implantado os pontos de acesso a Plataforma Interativa em todos as três localidades.</p> <p>Plano de Ação: O Programa está ampliando os pontos de acesso para mitigar o atraso na instalação dos CITs e melhorar ambiência com CT-PDCS. Devido aos atrasos decorrentes da não formalização da parceria com os entes, os orçamentos serão reprogramados no Draft 20.</p>
PG35	INFORMAÇÃO PARA A POPULAÇÃO	-	-	- 0%	<p>Economia: R\$ 0,1 MM: Processo concorrencial do fee mensal negociado abaixo do orçamento previsto.</p> <p>Plano de ação: revisão da estimativa no Draft20</p>
PG36	COMUNICAÇÃO NACIONAL INTERNACIONAL	-	-	- 0%	<p>Compensatório (cláusula 182)</p> <p>Postergação: Atraso no recebimento dos termos de referência, impossibilitaram as contratações previstas no período e, consequentemente, geraram a postergação de atividades/medições do RVS.</p> <p>Plano de Ação: Executar as contratações referentes aos termos recebidos.</p>
PG39	CONSOLIDAÇÃO UCS	-	-	- 0%	<p>+R\$ 0,07MM - Avanço nas atividades de elaboração do CAR, como reflexo do Plano de Aceleração da Retomada (PAR) a jusante, com antecipação das entregas; Neste diagrama estão apropriados indevidamente alguns contratos de ATER, então o avanço no orçamento também se deve à aceleração das atividades devido ao PAR; Confecção de materiais didáticos, eventos e outros relacionados ao ACT IDAF/IEF, avançando nas entregas dos ACT's.</p> <p>Plano de ação: N/A</p>
PG40	IMPLANTAÇÃO CAR E PRAS	-	-	- 0%	<p>(R\$ 0,18MM) - Gerenciamento execução a menor.</p> <p>Plano de ação: Replanejamento.</p> <p>EXTERNO/(ORGÃO GOVERNAMENTAL)</p> <p>(R\$ 0,08MM) - Atraso na elaboração dos PRA's devido indefinições quanto à realização do PRA via SEI em MG, conforme ACT-IEF; e indefinições acerca a elaboração dos projetos no ES a partir da publicação do marco legal e sua operacionalização com o IDAF.</p> <p>Plano de ação: Acompanhar a execução da Consominas na elaboração dos PRA's em MG; iniciar a elaboração dos PRA's no ES assim que publicado o marco legal.</p> <p>(R\$ 0,22MM) - Atraso na contratação de consultoria para o marco legal em atendimento ao ACT-IDAF, devido necessidade de revisão dos valores previstos e necessidade de APRO.</p> <p>Plano de ação: Finalizar contratação e iniciar as atividades com a consultoria para definição do marco legal.</p>
PG43	MEDIDAS COMPENSATÓRIAS	-	-	- 0%	<p>Postergação: (R\$10,1 MM) Repasse SAA Degredo – protocolado na 12ªvara, aguardando homologação e apresentação do projeto pela Prefeitura de Linhares. O repasse será reprogramado para 2023.</p> <p>(R\$4,0 MM) perícia AECOM Agenda Integrada: suspensa desde out-21 pela 12ª vara. Aguardando decisão judicial determinando a retomada de novos pagamentos</p> <p>Plano de Ação: Acompanhar com o Jurídico a negociação e homologação dos acordos em andamento e status da perícia.</p> <p>(R\$0,19MM) outros desvios pulverizados em várias linhas.</p>
PG97	PROJETOS COMP - SALDO A ALOCAR	-	-	- 0%	
Total Compensatórios		-	-	- #DIV/0!	

PG	Programas	Mensal				Justificativas da variação anual acumulada
		Orçamento	Realizado	Varição	%	
PG00	MEDIDAS MITIGATÓRIAS EMERGENCIAIS	-	-	-	0%	
PG01	CADASTRO	-	-	-	0%	<p>Postergação: (R\$ 17,5MM) - Retomar o processo de cadastro com nova metodologia (gravação) em novembro 2022. Nova curva replanejada com expectativa de atingir 54k em fevereiro 2023, considerando que a previsão original era dezembro de 2022. Valores de contingência reservados para Perícia. Postergados para 2024.</p> <p>Plano de Ação: Adequação do formato do cadastro de acordo com a nova determinação judicial.</p> <p>Aba recursal Novel: pagamentos previstos referente a aba recursal não foram executados, devido as pendências de entrega de laudos por parte dos peritos.</p> <p>Dano Agua Novel: reflexo da paralisação de Governador Valadares em cumprimento a decisão judicial.</p> <p>DG com laudos: indenização dos laudos fase 1 remanescentes que ainda não foram executados.</p> <p>Outros: demais frentes de indenizações não executadas como: Novel Danos Gerais, SPA.</p> <p>Postergação: (R\$ 0,8 MM) - Fornecimento de Água - Krenak A assinatura do aditivo com a Copasa ocorreu somente em outubro, o que comprometeu o desembolso desse contrato em 2 meses.</p> <p>Plano de Ação: Regularizar as medições em atraso.</p> <p>Economia: (R\$ 1,4 MM) - Alimentação animal Resplendor Reajuste contratual abaixo do previsto.</p> <p>Plano de Ação: Adequar o orçamento no próximo Draft.</p> <p>Postergação: (R\$ 4,8 MM) - Manutenção de estradas Resplendor Os contratos dessa DR não possuem uma média regular, pois estão associados às condições climáticas, que interferem na degradação das vias e, conseqüentemente, demandam maior ou menor uso de agregados, a depender do período.</p> <p>Plano de Ação: Acompanhar as medições dos contratos junto ao ponto focal.</p>
PG02	PIM - INDENIZAÇÃO ATINGIDOS	-	-	-	0%	<p>Postergação: (R\$ 21,9 MM) SAA e Fundo Retomada Economica - TG e Comboios Atraso no cronograma devido a paralisação das atividades do PBA em virtude do conflito gerado pela decisão judicial do retorno do pagamento ASE.</p> <p>Plano de Ação: Construir de mesa de negociação judicial com os indígenas sobre assuntos relacionados ao ASE e criar ambiência para retomar as atividades de detalhamento do PBAI. Sobre o Fundo de Retomada Econômica, houve o pagamento da 2ª parcela para os Guaranis. Há previsão de pagamento da próxima parcela até dezembro/22 para os demais.</p> <p>Antecipação: +R\$ 4,5 MM ASE - TG e Comboios Retomada do pagamento do ASE para TG e Comboios, conforme decisão judicial de outubro/22, onde foi deliberado desembolso retroativo a janeiro/22.</p> <p>Plano de Ação: Organizar fluxo para operacionalizar os pagamentos retroativo e mensais; incluir os valores para 2023 no Draft 20; acompanhar as prestações de contas das associações.</p>
PG03	POVOS INDÍGENAS	-	-	-	0%	<p>Postergação: (R\$ 23,4 MM) - Plano Basico Ambiental Degredo Não houve homologação do Plano Básico Ambiental Quilombola (PBAQ). Portanto, o repasse financeiro não foi realizado.</p> <p>Plano de Ação: Monitorar junto ao jurídico a homologação da 4ª Vara.</p> <p>Postergação: (R\$ 12,2 MM) - Indenização Coletiva Danos Materiais Não houve homologação do Plano Básico Ambiental Quilombola (PBAQ). Portanto, o repasse financeiro não foi realizado.</p> <p>Plano de Ação: Monitorar junto ao jurídico a homologação da 4ª Vara.</p>
PG04	POVOS TRADICIONAIS	-	-	-	0%	<p>Postergação: (R\$ 0,5 M) - Demais Municípios Atraso na pactuação e conseqüentemente na prestação de contas dos municípios não aderentes; atraso em prestação de contas de planos municipais em execução; não utilização do valor integral repassado, com possível negociação de remanejamento de valores com os municípios/entidades; realização de capacitação online gerando economia com logística.</p> <p>Plano de Ação: Demais Municípios: Negociar com municípios e entidades remanejamento de valores e repasse integral dos valores remanescentes com baixa contábil até dez/22; acompanhar sistematicamente o processo de prestação de contas; implementar plano via judicial com municípios não aderentes, com audiência de conciliação prevista para out/22.</p>
PG05	PROTEÇÃO SOCIAL	-	-	-	0%	<p>Antecipação: R\$ 3,0 MM - Assessorias técnicas: R\$ 12,0 MM referente ao saldo bloqueado na ACP Mariana; e (R\$ 9 MM) Aguardando lançamentos Aedas, Rosa Fortini e Asperqd.</p> <p>Plano de ação: Acompanhar as decisões judiciais dos contratos Aedas e Asperqd.</p> <p>Postergação: (R\$ 1,3 MM) - Canais de Relacionamento: Ampliação da capacidade de atendimento do 0800 em atendimento a decisão judicial, revisão dos gastos relativos as infraestruturas dos CIAs.</p> <p>Plano de Ação: revisão da redistribuição do pilar junto ao Draft 20 Solicitação de reclassificação dos gastos dos CIAs vinculando aos contratos de prestação de serviço nos corretos DRs.</p> <p>Postergação: (R\$ 9,0 MM) - Diálogo: Execução a menor decorrente da reprogramação necessária do programa destacando principalmente a realização dos fóruns de prestação de contas, implantação da plataforma interativa e serviços especializados de diálogo social (desmobilização contrato antigo e mobilização do novo).</p> <p>Plano de Ação: Revisão das entregas/atividades do programa de forma a garantir melhor aderência orçamentária e adequação no orçamento Draft 20.</p> <p>Economia: R\$ 0,3 MM - Comunicação: Os materiais impressos estavam sendo distribuídos apenas em versão digital, Contratos sob demandas não executados.</p> <p>Plano de Ação: Retorno da distribuição do material impresso e de atividades presenciais, revisão orçamentaria realizada no draft 20 aprovado garantido melhor aderencia, Plano de ação do PG06 sendo implantado no 2º semestre, campanha de territórios sendo realizada.</p> <p>Antecipação: R\$ 0,3 MM - Vim Ver: Em 2022 tivemos um aumento significativo da demanda por visitas do Vimver, fazendo que o realizado superasse o orçado.</p> <p>Plano de Ação: Revisar as demandas de modo a garantir uma melhor aderência orçamentária. (R\$ 1,0 MM) Lançamento contábil do contrato 4900000394 parcialmente incorreto no DR do PG08 (alimentação animal); ii. Não utilização de verba contratual sob demanda; e iii. postergação de custos com manutenções estruturais nas fazendas destinada ao abrigo temporário de animais.</p> <p>Plano de Ação: 1. Reclassificação contábil dos valores lançados incorretamente; 2. Monitoramento de saldo contratual das atividades previstas em caráter "sob demanda";</p>
PG06	PARTICIPAÇÃO E DIÁLOGO	-	-	-	0%	
PG07	ASSISTÊNCIA AOS ANIMAIS	-	-	-	0%	

PG	Programas	Mensal			%	Justificativas da variação anual acumulada
		Orçamento	Realizado	Variação		
PG08	REASSENTAMENTO	-	-	-	0%	<p>Postergação (R\$ 108,9 MM) (R\$ 30,4 MM) Novas Moradias Paracatu. Menor Performance das contratadas; (R\$ 27,9 MM) Contingência não utilizada; (R\$ 23,9 MM) Infraestrutura remanescente Bento: Baixa performance VINA; (R\$ 18,0 MM) Equip. Públicos Paracatu. Menor performance das contratadas; (R\$ 8,7 MM) Outros: Menores valores com acesso a Camargos, acesso a</p> <p>Plano de Ação: Gestão junto às Contratadas e Plano de Ação para recuperação (Plano de Aceleração em implantação) e adequação da curva de desembolso no Draft20.</p>
PG09	UHE CANDONGA	-	-	-	0%	<p>Postergação: (R\$ 14,3MM) - Desembolsos a menor na recuperação da UHE; baixa execução nas Condicionantes; Drenagem, Infraestrutura das Pilhas e Empilhamento.</p> <p>Plano de Ação: Aceleração da execução do projeto no último quadrimestre do ano.</p>
PG10	INFRAESTRUTURA IMPACTADA	-	-	-	0%	<p>Postergação: (19,76MM) O atraso nos processos de contratação impactou os escopos: Manutenção de Vias, Manutenção de Edificações, Pontes e Campos de Futebol. Valores do escopo de repasse para Pref. de Barra Longa, aguardam conclusão judicial para efetivação (4,5MM). Ajustes e reclassificações estão sendo realizados entre os DRs do próprio programa e escopos executados para outros PGs a fim de corrigir as distorções (utilização do contrato guarda-chuva RBAR para diversos escopos).</p> <p>Plano de Ação: Planejamento sendo feito em conjunto com contratadas para mitigação dos atrasos. Acerto de lançamentos entre DR's. Acompanhamento dos processos, buscando melhoria e otimização para maior assertividade.</p>
PG11	RECUPERAÇÃO ESCOLAS	-	-	-	0%	<p>Adiantamento: R\$0,2 MM: Psicopedagógico Institucional: Estão sendo realizadas mais oficinas com os alunos do que o previsto inicialmente.</p> <p>Plano de ação: N/A- Desvio no limite aceitável.</p>
PG12	MEMÓRIA HISTÓRICA	-	-	-	0%	<p>Adiantamento: R\$ 2,4 MM - Valor referente à provisão de recursos realizada em setembro pela Infra para pagamento do pleito referente ao contrato da Hexágono no PG 12. Esse valor foi dado entrada nesse mês porém sua previsão de desembolso será até dezembro.</p>
PG13	TURISMO CULTURA LAZER E ESPORTE	-	-	-	0%	<p>Antecipação R\$ 0,7 MM: Execução + início das ações de promoção dos polos turísticos, e do projeto de fomento ao empreendedorismo inicialmente previstas para o segundo semestre de 2022.</p> <p>Plano de Ação: N/A. Será mantida a antecipação das ações de promoção e fomento ao empreendedorismo.</p>
PG14	SAÚDE	-	-	-	0%	<p>Antecipação: +R\$ 4,2 MM Plano Mariana: Desvio referente a prestação de contas de todos os repasses para contratação de RH já efetuados para Mariana, não previstos no orçamento de 2022. Repasses em cumprimento da ACP.</p> <p>Plano de ação: reprogramar no Draft 20</p> <p>Economia: (R\$ 0,7 MM) -R\$ 0,5 MM Programa de Capacitação dos Municípios: Mudança na modalidade de capacitação, de ensino presencial para ensino à distância.</p> <p>Plano de ação: reprogramar no Draft 20</p> <p>-R\$ 0,2 MM Medição de repasse realizada abaixo dos valores planejados. Os valores orçados para a suplementação de mão de obra foram realizados de acordo com os valores da empresa Contexto. Os valores praticados pelo município de Barra Longa são menores, gerando economia.</p> <p>Plano de ação: reprogramar no Draft 20</p>
PG16	PESCA	-	-	-	0%	<p>Principais desvios Postergação: (R\$ 1,0 M) ATER ES e MG: Atraso no início da execução devido a paralisação do processo de contratação em função das condições impostas pela CT-EI.</p> <p>Plano de Ação: Reprogramar valor no Draft 20 (concluída).</p> <p>(R\$ 0,6 M) Cultivando para Pescar: Atraso nas medições anteriores devido as inconsistências nas documentações.</p> <p>Plano de Ação: Regularizar pendências junto aos parceiros.</p>

		Mensal				Justificativas da variação anual acumulada
PG	Programas	Orçamento	Realizado	Variação	%	
						<p>Ações da Infra (0,76 MM) - Em análise de pecúnia judicialmente. Execução da proteção de taludes abaixo do previsto. Plano de ação: Reavaliar as curvas de desembolso no Draft20.</p> <p>(R\$ 0,66 MM) - Renova Rebanho: Contrato sob demanda. Com a seca intensa reduziu o número de animais aptos fisiologicamente aptos para iniciar os procedimentos. Desembolsos previstos acima do executado; o contrato foi convertido para 49 por ser utilizado sob demanda. Plano de ação: A conversão do contrato para 49 é mais adequado ao atual escopo do projeto.</p> <p>(R\$ 0,60 MM) - Sem demanda no período; Quanto ao licenciamento, com a paralisação das obras de infra complexas seguem sem demandas. Plano de ação: Foram realizados revisões neste orçamento no MOP Draft 20, prevendo custeios, ou, remanejamento dos valores.</p> <p>(R\$ 1,88 MM) - Atraso na implantação dos Projetos PTIP (reparação a jusante) devido atraso na elaboração dos projetos por baixa performance das empresas de Assistência Técnica e atraso na validação dos projetos; atraso na contratação da Seculo XXI, que irá substituir o CES nas atividades de reestruturação produtiva no ARD. Plano de ação: Mobilizar e iniciar as atividades com a Seculo XXI; Implantar o Programa PAR 2 visando acelerar as atividades a jusante..</p> <p>(R\$ 0,65 MM) - Orçamento previsto para parceria com o WRI e as PU's para implantação junto aos produtores. Mediante o declínio da instituição WRI para continuidade das atividades de Unidades Demonstrativas, a estratégia de atendimento está sendo revista e deverá ser validada junto à Câmara Técnica. Nestas condições, as atividades foram postergadas e serão replanejadas após definições. Plano de ação: Rever a estratégia de atendimento e validar junto à Câmara Técnica.</p> <p>(R\$ 0,59 MM) - Replanejamento das atividades de recursos hídricos, em função de revisão das demandas PASEA e perfuração de poços. Em andamento PU's de distribuição hídrica, adequação hidráulica, fornecimento de bebedouros e serão iniciados testes de bombeamento; Monitoramento da qualidade do leite: Evasão de produtores do projeto e planejado acima do previsto. Parceria FUNDACAO ARTHUR BERNARDES: Projeto Tecnossolos replanejado. Plano de ação: Realizar abertura e medição de novas PU's para distribuição hídrica, adequação hidráulica, fornecimento de bebedouros e testes de bombeamento. Monitoramento do Leite: N/A.</p> <p>(R\$ 0,86 MM) - Desembolso Restauro Florestal PG25 Barra Longa (AMBIENCIA) menor que o previsto, baixa produtividade. (-) 0,72MM; Desembolso Restauro Florestal Mariana (ERG) menor que o previsto (-) 0,12MM; Desembolso Insumos Cerca e Restauro PU's (GARAVINI) menor que o previsto (-) 0,05MM; Desembolso Restauro Florestal Pacote 2 (STCP) maior que o previsto (+) 0,19MM; Ambiência: previsto maior que o executado; ERG: foi feita uma previsão no Draft, mas as medições começaram a entrar uma % (90/10) no PG17 apenas nesta última; Garavini: previsto maior que o executado; STCP: foi feita uma previsão no Draft, mas as medições começaram a entrar uma % (80/20) no PG17 apenas nesta última, mas de forma errada, lançaram 240mil no PG17 e 3mil no PG25, sendo que era pra ser 80% PG25 e 20% PG17. Plano de ação: N/A</p> <p>+R\$ 2,72MM - SANEAMENTO: Aceleração das atividades por alta performance, executando além do previsto (antecipação do orçamento). SILAGEM I: Houve necessidade de aditivo de aluguéis de pastagens em função do impacto na reestruturação produtiva. Houve também o retorno do fornecimento de alimentação animal a um produtor mediante decisão judicial (sendo que outros 2 seguem em análise). ATER II: Avanço nas atividades de ATER e elaboração de projetos a jusante, como reflexo do Plano de Aceleração da Retomada. Foram feitos aditivos nos contratos para reajuste dos preços. Os Diagramas de Rede antes apropriados indevidos foram ajustados. Plano de ação: Alimentação animal (Território I): Priorizar as operações nas áreas produtivas de pastagem.</p> <p>+R\$ 1,67MM - ACP = Continuação no fornecimento de silagem no território 2 (Médio e Baixo Doce) devido atraso na reparação das áreas impactadas; Houve no período aumento nos custos de silagem acima dos índices de correção. Parceria= Prestação de Assistência Técnica coletiva no ES. Desembolsos e prestação de contas trimestrais. Plano de ação: Silagem II: Avançar com as atividades de recuperação das áreas (Plano de Saída de Silagem) e buscar aprovação da proposta de pecúnia aos produtores; Postergação: (R\$ 0,55 M) Reposição de Insumos e Equipamentos Reassentamento: Atraso na entrega da infraestrutura. Plano de Ação: Monitorar processos PUs já abertos. Prazo: 12/12/22. (R\$ 0,24 M) Marketplace: Mudança de estratégia do programa, postergado para 2023. (R\$ 0,22 M) Planejamento de Negócios: Atraso de 1 mês na mobilização da equipe para prestação do serviço. (R\$ 0,25 M) Projeto de Capacitação Reassentamento: Mudança de estratégia (Contrato para Capacitação + Planejamento de Negócios) que implica em GMUD de remanejamento de custo. Plano de Ação: Aprovação da GMUD - Prazo: 30/11/22; Abertura de nova SR - Prazo: 01/12/22. Antecipação: +R\$ 0,29 M Ganho de Competitividade + Reposições de Insumos e Equip. ARD: Oportunidade de antecipação das entregas a Foz do Rio Doce e ARD. Antecipação:</p>
PG17	ATIVIDADE AGROPECUÁRIA	-	-	-	0%	
PG19	RECUPERAÇÃO NEGÓCIOS	-	-	-	0%	
PG21	AFE - AUXÍLIO FINANCEIRO	-	-	-	0%	Houve o reestabelecimento de mais de 7000 AFEs em cumprimento a decisão judicial da 4ª vara federal, com pagamentos retroativos para esses casos.

		Mensal				Justificativas da variação anual acumulada
PG	Programas	Orçamento	Realizado	Variação	%	
						+R\$ 0,81MM - Infra Mariana - Execução acima do previsto por performance do fornecedor. Plano de ação: N/A
						(R\$ 2,52MM) - Contratação dos transectos que foi prevista para iniciar em agosto de 2022 e devido a mudanças de estratégias do programa a mesma foi adiada. Necessidade de revisão de relatórios entregues pelos fornecedores além da conclusão com atraso da campanha de monitoramento 2 devido as chuvas e atrasos na migração dos colaboradores da gerenciadora anterior para o contrato atual e redução de mobilizações previstas inicialmente devido a postergação de atividades. Plano de ação: 1 - Controlar junto a compras o andamento do processo a fim de garantir o cumprimento dos prazos previstos no cronograma; 2 - Atuar junto ao fornecedor para cumprimento dos prazos de revisão e emissão de documentos.
						(R\$ 0,15MM) - Atraso de resposta pela CT-GRSA sobre os planos de trabalho protocolados. Nova previsão de retorno 2023. Plano de ação: Acompanhar junto ao jurídico as tratativas quanto ao tema.
						(R\$ 0,56MM) - Contratos com serviços de consultoria e análises que ocorrem sob demanda. Até o momento, execução menor que o previsto.. Plano de ação: N/A
PG23	MANEJO DE REJEITOS	-	-	-	0%	+R\$ 1,00MM - Executado acima do previsto devido a performance do fornecedor. (Inovesa). Quintais: Execução da demanda mapeada na contingência do Draft 19, visando dar definitividade aos quintais urbanos de Barra Longa sem a necessidade de Remoção do Rejeito. Plano de ação: N/A
						(R\$ 0,11MM) - O repasse para compra de equipamento (-R\$465.966,00) foi realizado em 2021, mas não houve a prestação de contas, sendo necessário o débito em fevereiro de 2022. Isso ocorreu, pois a compra era internacional e o prazo de importação ocasionou atraso. Além disso, houveram repasses acima do previsto devido a atrasos nos repasses referentes as bolsas. Plano de ação: Atuar junto ao parceiro para que as prestações de contas ocorram conforme cronograma.
						(R\$ 0,56MM) - Mudança na estratégia de execução da demanda. Os serviços serão executados em contratos vigentes. Plano de ação: Transferir valor a contratar do DR para novas demandas.
						Ação Judicializada/Prazo Judicial (R\$ 29,0 MM) - Gestão da Gerencia de Infraestrutura: Falta de decisão judicial impactando ações do Barramento. Plano de ação: Atuar junto ao jurídico para tentar definir as ações do barramento.
PG24	CONTENÇÃO DE REJEITOS	-	-	-	0%	Antecipação: R\$ 1,1 MM Serviços de auditoria e consultoria realizados para definição do descomissionamento do Dique S4. Plano de Ação: Programa encerrado. CIF 555.
						(R\$ 1,07 MM) - Desembolso menor que o previsto, baixa produtividade das contratadas e PU's Restauro (STCP e ERG) que estavam em processo de repactuação de preços em Suprimentos. Plano de ação: Replanejar e monitorar as atividades de execução de passivos e manutenções.
						(R\$ 0,80 MM) - Gasto com serviços de gerenciamento abaixo do previsto. Plano de ação: Revisar a previsão no Draft20 (Economia).
						(R\$ 0,53 MM) - Novo contrato Alocação de mão de obra (BIOKRATOS) em mobilização e Inventário Florestal (AMBIPAR) não iniciado no prazo previsto (atrasos nas contratações) e Previsão de pleito Cercamento (Século XXI) não aprovado. Plano de ação: Replanejar e monitorar as atividades de execução de alocação de mão de obra e inventário florestal, e retirar previsão Pleito no novo Draft.
PG25	RECUPERAÇÃO ÁREA AMBIENTAL 1	-	-	-	0%	(R\$ 0,14 MM) - Desembolso Conv. Recup. ecológica área ambiental 1 (SOCIEDADE DE INVESTIGACOES) menor que o previsto. Plano de ação: N/A. Parceria finalizada.
						+R\$ 0,29 MM - Desembolsos de serviço gestão qualidade do AR (ECOSOFT) e Análises (FUNDACAO ARTHUR BERNARDES) não são escopo PG25 e foram lançados no PG25, sendo o serviço do PG23 e PG17 respectivamente. Suprimentos. Plano de ação: N/A. Remanejar saldos pedidos para os respectivos PGs.
						+R\$ 0,32 MM - Aumento da produtividade das empresas de Restauro e Cerca (ERG, Ambiência, Século XXI e PU's). Plano de ação: N/A
						Postergação: (R\$10,14MM): Postergação de desembolso dos projetos FAPEMIG por atraso nas prestações de contas. Plano de Ação: Regularizar pendências na prestação de contas do ciclo I (R\$5,82MM): Atividades do Monitoramento Anexo I não iniciadas com atraso devido a não obtenção de autorização para coleta, que impediu o início das coletas do período seco. Plano de Ação: Promover liberação de próximo desembolso ACT FEST/UFES. (R\$0,44MM): Atraso na prestação de contas do Convênio SIF/UFV. Plano de Ação: Regularizar pendências na prestação de contas (R\$0,39MM): Pleito da Biodiversitas em negociação devido a cobrança divergente do planejado. Plano de Ação: Encerrar contrato (R\$2,34MM): Reprogramação de contrato sob demanda e outros projetos. Plano de Ação: Adequar cronograma conforme novo planejamento; Antecipar consumo de recurso dentro da parceria
PG28	BIODIVERSIDADE	-	-	-	0%	

PG	Programas	Mensal			%	Justificativas da variação anual acumulada
		Orçamento	Realizado	Variação		
PG30	FAUNA E FLORA TERRESTRE	-	-	-	0%	<p>Postergação: Atraso na contratação do aditivo de Flora (Elo) não havendo execução do início da campanha seca prevista para junho impactando na previsão mensal de desembolso do DRAFT 19. Não execução de análises laboratoriais.</p> <p>O atraso na contratação de monitoramento terrestre de 2 anos previsto para julho/22 e só teve a primeira medição em setembro/22.</p> <p>Atraso no início do processo de contratação da Parceria de Comunicação dos Programas da Biodiversidade.</p> <p>Plano de Ação: Atuar junto as contratadas para cumprimento dos prazos e entrega dos produtos e boletins de medição.</p>
PG32	SISTEMAS DE ABASTECIMENTO ÁGUA	-	-	-	0%	<p>Postergação: (35,1MM) A curva de desembolso dos pacotes não alcançou o Planejado até o presente momento.</p> <p>Plano de Ação: Adutora-GV : Todos Pacotes contratados e com serviços em andamento, atuando na recuperação (desvio acumulado até Julho/22 era -35%, tendo variado para -24% no acumulado até agosto/22, se aproximando do planejado).</p> <p>Plano de Ação: Plano de Ação: Adutora-GV : Todos Pacotes contratados e com serviços em andamento, atuando na recuperação (desvio acumulado até Julho/22 era -35%, tendo variado para -24% no acumulado até agosto/22, se aproximando do planejado). Infra-GV: Processo de contratação concluído. contratada em processo de mobilização com previsão de início das atividades para 05/09.</p>
PG37	GESTÃO RISCOS AMBIENTAIS	-	-	-	0%	
PG38	MONITORAMENTO ÁGUA	-	-	-	0%	<p>(-R\$1,4MM): Serviços sob demanda orçados, com baixa execução e/ou sem necessidade de execução no período: Execução do monitoramento sob demanda, abaixo do previsto; Consultoria para estudo Coloides, pendente retorno da CT-SHQA; PMQQS é previsto execução de monitoramento semanal e manutenção corretivas das estações automáticas durante o período chuvoso (outubro a março).</p> <p>Plano de Ação: Não se aplica.</p>
PG39	CONSOLIDAÇÃO UCs	-	-	-	0%	<p>Reparatório (cláusula 181)</p> <p>Postergação:</p> <p>Entregas de produtos, consecutivas e concomitantes, que dependem da análise do mesmo grupo de especialistas, assim como da contribuição de atores externos</p> <p>Plano de Ação: Alterar a estratégia de dedicação dos especialistas nos produtos e aumento da equipe</p>
PG41	GESTÃO DOS PROGRAMAS	-	-	-	0%	<p>Postergação: Dificuldade de agendamento para desenvolvimento das atividades nas escolas no período pós pandemia. Atraso na seleção da consultora FUNBIO para iniciar a parte executiva do projeto.</p> <p>Plano de Ação: Acompanhar junto a parceira para garantir as entregas</p> <p>Postergação:</p> <p>(R\$9,8MM): Despesas Finalísticas executando a menor, sendo (R\$0,1MM) em Despesas com pessoal; (R\$8,0MM) com Serviços Contratados; (R\$1,5MM) com Despesas de Viagens e (R\$0,3MM) em Despesas Diversas</p> <p>(R\$2,4MM): Serviços de TI (SGS e contratos sob demanda)</p> <p>(R\$1,7MM): Serviços de Auditoria (EY) e Aluguel de veículos</p> <p>(R\$1,0MM): Painel Rio Doce</p> <p>(R\$0,5MM): Variações em vários DRs</p> <p>Economia:</p> <p>Valores ajustados no Draft20</p> <p>(R\$9,4MM): contratos sob demanda temporários (Periodical e Prestar)</p> <p>(R\$3,7MM): Suspensão de contratos de Tacógrafo Monitoramento de Velocidades</p>
PG42	GASTOS PÚBLICOS EXTRAORDINÁRIOS	-	-	-	0%	+ 0,1 M Pagamento Gabinete Militar MG (Deliberação 428).
PG99	CONTINGÊNCIA	-	-	-	0%	
Total Reparatórios		-	-	-	-	#DIV/0!
Total Programas		-	-	-	-	#DIV/0!
ADM	DESPESAS GESTÃO ADMINISTRATIVAS	-	-	-	0%	<p>Postergação:(R\$31,3MM): Serviços contratados: (R\$22MM) serviços de comunicação e comunicação institucional; consultoria jurídica e perícia (R\$4,4MM); serviços TI (R\$2,2MM) e outros contratos sob demanda (R\$2,7MM).</p> <p>(R\$0,3MM): Despesas com pessoal: treinamentos/workshops.</p> <p>(R\$0,14MM): Despesas com aluguéis e outros.</p> <p>(R\$0,7 MM): Ativo Fixo, postergação de compra de equipamentos.</p> <p>Economia:</p> <p>(R\$0,2MM): Despesas de viagens.</p> <p>Postergação:</p> <p>(R\$ 4,8 M) CTS;</p> <p>(R\$ 1,4 M) Custeio Atingidos;</p> <p>(R\$ 0,4 M) CIF.</p>
CG	CUSTEIO SISTEMA DE GOVERNANÇA	-	-	-	0%	
Total Despesas Administrativas		-	-	-	-	#DIV/0!
Total Geral		-	-	-	-	#DIV/0!
