

FUNDAÇÃO  
**renova**

**RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES**

Março/2023

## Sumário

<b>Apresentação .....</b>	<b><u>5</u></b>
<b>PG001 Levantamento e Cadastro dos Impactados .....</b>	<b><u>6</u></b>
<b>PG002 Ressarcimento e Indenização dos Impactados .....</b>	<b><u>14</u></b>
<b>PG003 Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida dos Povos Indígenas .....</b>	<b><u>20</u></b>
<b>PG004 Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida de Outros Povos e Comunidades Tradicionais .....</b>	<b><u>28</u></b>
<b>PG005 Programa de Proteção Social .....</b>	<b><u>36</u></b>
<b>PG006 Comunicação, Participação, Diálogo e Controle Social .....</b>	<b><u>46</u></b>
<b>PG007 Programa de Assistência aos Animais .....</b>	<b><u>88</u></b>
<b>PG008 Reconstrução de Vilas .....</b>	<b><u>98</u></b>
<b>PG009 Recuperação do Reservatório da UHE Risoleta Neves .....</b>	<b><u>113</u></b>
<b>PG010 Programa de recuperação das demais comunidades e infraestruturas impactadas entre Fundão e Candonga .....</b>	<b><u>126</u></b>
<b>PG011 Recuperação das Escolas Impactadas e Fortalecimento da Educação Pública na Bacia do Rio Doce .....</b>	<b><u>135</u></b>
<b>PG012 Programa de Memória Histórica, Cultural e Artística .....</b>	<b><u>145</u></b>
<b>PG013 Programa de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer .....</b>	<b><u>150</u></b>

<b>PG014 Programa de Apoio à Saúde Física e Mental da População Impactada .....</b>	<b><u>159</u></b>
<b>PG015 Promoção da Inovação .....</b>	<b><u>166</u></b>
<b>PG016 Retomada das Atividades Aquícolas e Pesqueiras .....</b>	<b><u>173</u></b>
<b>PG017 Retomada das Atividades Agropecuárias .....</b>	<b><u>181</u></b>
<b>PG018 Desenvolvimento e Diversificação Econômica .....</b>	<b><u>193</u></b>
<b>PG019 Recuperação de Micro e Pequenos Negócios .....</b>	<b><u>202</u></b>
<b>PG020 Estímulo à Contratação Local .....</b>	<b><u>209</u></b>
<b>PG021 Auxílio Financeiro Emergencial .....</b>	<b><u>219</u></b>
<b>PG023 Manejo de Rejeitos .....</b>	<b><u>225</u></b>
<b>PG025 Programa de Recuperação da Área Ambiental 1 .....</b>	<b><u>234</u></b>
<b>PG026 Programa de Recuperação de Áreas de Preservação Permanente (APPs) e Recargas Hídricas .....</b>	<b><u>241</u></b>
<b>PG027 Programa de Recuperação de Nascentes .....</b>	<b><u>248</u></b>
<b>PG028 Conservação da Biodiversidade .....</b>	<b><u>256</u></b>
<b>PG029 Recuperação da Fauna Silvestre .....</b>	<b><u>263</u></b>
<b>PG030 Fauna e Flora terrestre .....</b>	<b><u>269</u></b>
<b>PG031 Coleta e Tratamento de Esgoto e Destinação de Resíduos Sólidos .....</b>	<b><u>275</u></b>
<b>PG032 Melhoria dos Sistemas de Abastecimento de Água .....</b>	<b><u>287</u></b>

<b>PG033 Programa de Educação para Revitalização da Bacia do Rio Doce (Educação Ambiental) .....</b>	<b><u>295</u></b>
<b>PG034 Preparação para Emergências Ambientais .....</b>	<b><u>301</u></b>
<b>PG035 Programa de Informação para a População .....</b>	<b><u>309</u></b>
<b>PG036 Comunicação Nacional e Internacional .....</b>	<b><u>317</u></b>
<b>PG038 Monitoramento da Bacia do Rio Doce .....</b>	<b><u>325</u></b>
<b>PG039 Unidades de Conservação .....</b>	<b><u>335</u></b>
<b>PG040 Programa de Fomento ao CAR e PRA .....</b>	<b><u>341</u></b>
<b>PG042 Ressarcimento dos Gastos Públicos Extraordinários .....</b>	<b><u>348</u></b>
<b>Glossário .....</b>	<b><u>355</u></b>
<b>Gestão Econômica* .....</b>	<b><u>362</u></b>

## Apresentação

O presente documento cumpre com a CLÁUSULA 192 do TERMO DE TRANSAÇÃO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TTAC), que determina a elaboração de relatório mensal sobre o andamento de todos os PROGRAMAS – SOCIOAMBIENTAIS e SOCIOECONÔMICOS desenvolvidos e executados pela FUNDAÇÃO RENOVA – e envio do documento ao COMITÊ INTERFEDERATIVO (CIF), sempre no décimo dia útil de cada mês. Os programas têm como objetivo recuperar o meio ambiente e as condições socioeconômicas da área de abrangência impactada pelo rompimento da barragem de Fundão, em novembro de 2015, de forma a restaurar a situação anterior ao rompimento, como está disposto na CLÁUSULA 05, INCISO I do referido termo.

## **PG001 Levantamento e Cadastro dos Impactados**

### **Eixo Pessoas e Comunidade**

#### **Objetivo**

Levantar informações quanto às perdas materiais e das atividades econômicas impactadas através da realização do cadastro individualizado de pessoas físicas e jurídicas (apenas micro e pequenas empresas) e famílias diretamente atingidas pelo rompimento da barragem de Fundão na área de abrangência socioeconômica do TTAC. As informações levantadas pelo cadastro serão utilizadas para a realização de estudos e avaliações socioeconômicas voltados para apoiar a implementação de ações de reparação e compensação dos impactos socioeconômicos. Esse programa abrange as cláusulas 19 a 30 do TTAC.

## Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	19	Caput	Judicializada
Cláusula	20	Caput	Judicializada
Cláusula	22	Caput	Em andamento
Cláusula	25	Caput	Em andamento
Cláusula	26	Caput	Em andamento
Cláusula	28	Caput	Em andamento
Deliberação	127	1.2 e 2	Judicializada
Deliberação	127	1.3	Concluída Internamente
Deliberação	141	1	Judicializada
Deliberação	141	2	Concluída Internamente
Deliberação	141	3	Concluída Internamente
Deliberação	141	5	Concluída Internamente
Deliberação	19	n/a	Concluída Internamente
Deliberação	234	3	Concluída Internamente
Deliberação	251	1	Concluída Internamente
Deliberação	277	único	Judicializada
Deliberação	346	2	Concluída Internamente
Deliberação	58	2	Judicializada
Deliberação	58	3	Judicializada
Deliberação	71	n/a	Concluída Internamente
Deliberação	93	2	Concluída Internamente
Deliberação	93	3	Concluída Internamente
Deliberação	93	4	Concluída Internamente
Deliberação	93	6	Concluída Internamente

## **Entregas do ano de 2023**

Em cumprimento à decisão judicial da 4ª Vara Federal, as manifestações de solicitação de cadastro registradas entre 2017 e 2021 deverão ser atendidas conforme cronograma específico. Desta forma, é previsto concluir em 2024 o cadastramento das solicitações de cadastro de 2020 à 2021.

## **Grandes números do programa**

- 176.852,00 solicitações de cadastro, desde o início do programa até o momento;
- 35.317,00 cadastros enviados ao CIF, correspondente a 30.821,00 famílias e 99.553,00 pessoas, desde o início do programa até o momento.

## Fatos relevantes do mês

Atendimento a 5.729 solicitantes no mês de Março/23

## Indicadores

### I01 – Taxa de Atendimento aos Manifestantes

Meta Global:100%  
Percentual %

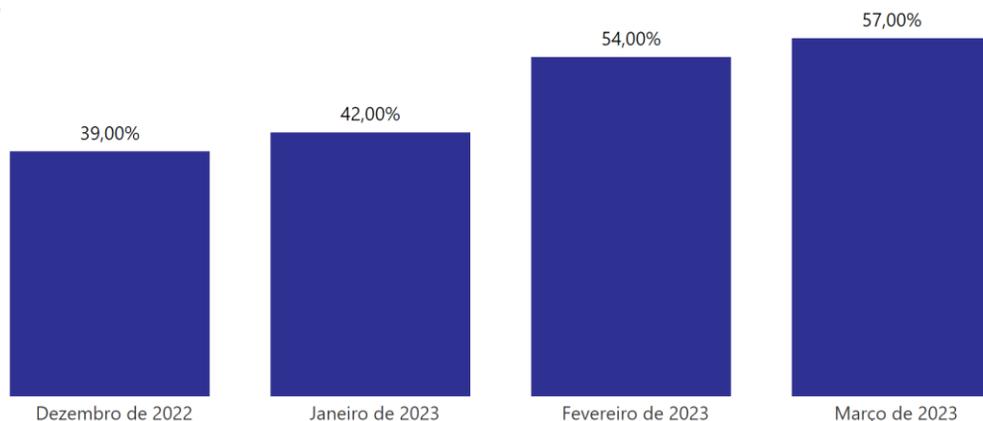


Gráfico 1: I01 – Taxa de Atendimento aos Manifestantes - Frequência Mensal

### I02 – Taxa de Atendimento ao Cadastro Emergencial

Meta Global:100%  
Percentual %




Gráfico 2: I02 – Taxa de Atendimento ao Cadastro Emergencial - Frequência Mensal

## Indicadores

### I04 – Taxa de solicitantes de cadastro não localizados

Meta Global:100%

Percentual %

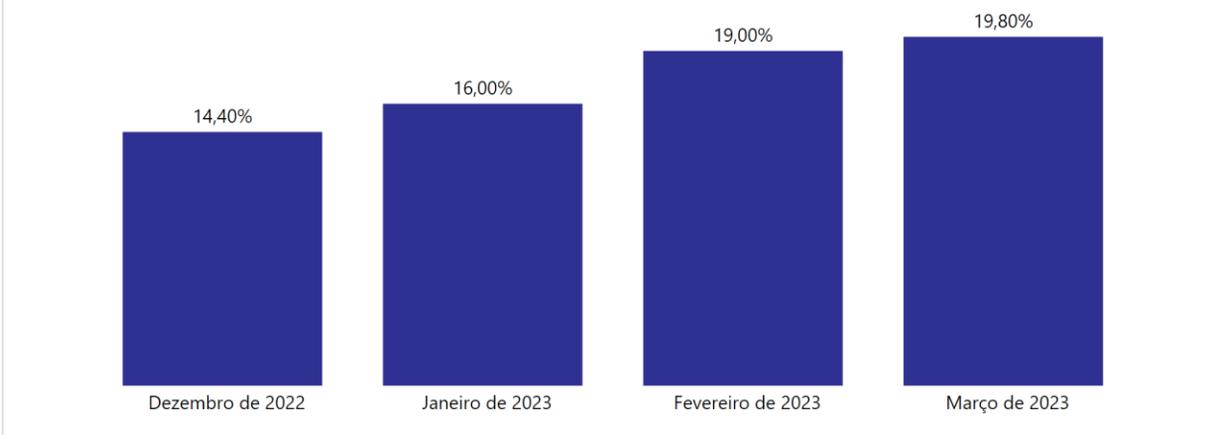


Gráfico 3: I04 – Taxa de solicitantes de cadastro não localizados - Frequência Mensal

## Indicadores de Acompanhamento

### Cadastro Mariana - Fase 1

Meta Global: 1.175

Número de entrevistas

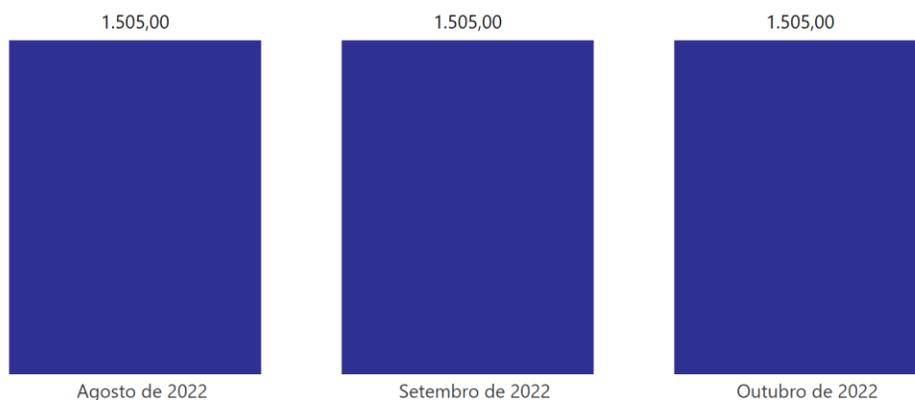


Gráfico 4: Cadastro Mariana - Fase 1 - Frequência Mensal

### Cadastro Mariana - Fase 2

Meta Global: 770

Número de vistorias

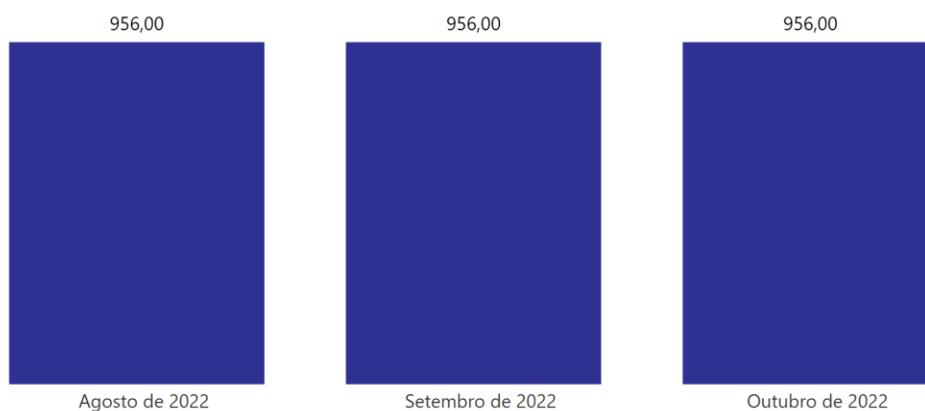


Gráfico 5: Cadastro Mariana - Fase 2 - Frequência Mensal

## **PG002 Ressarcimento e Indenização dos Impactados**

### **Eixo Pessoas e Comunidade**

#### **Objetivo**

Ressarcir pessoas físicas ou jurídica (neste último caso, apenas micro e pequenas empresas) que tenham sofrido danos materiais, lucro cessante e/ou morais, bem como perdas referentes às suas atividades econômicas, em consequência direta do rompimento da barragem de Fundão, de forma justa, célere, simples, transparente e sem a burocracia e os ônus de uma ação judicial. Cláusulas 31 a 38 do Termo de Transação e Ajustamento de Conduta - TTAC.

## Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	38	Caput(ação 1)	Judicializada
Cláusula	38	Caput(ação 2)	Judicializada
Deliberação	111	3-a (ação 1)	Judicializada
Deliberação	111	3-a (ação 2)	Judicializada
Deliberação	111	3-b (ação 1)	Judicializada
Deliberação	111	3-b (ação 2)	Judicializada
Deliberação	118	2	Judicializada
Deliberação	119	10	Concluída Internamente
Deliberação	119	2	Concluída Internamente
Deliberação	119	5-a	Judicializada
Deliberação	119	5-b	Judicializada
Deliberação	181	5	Em Andamento
Deliberação	181	6	Judicializada
Deliberação	181	7	Judicializada
Deliberação	181	8	Em Andamento
Deliberação	182	1	Concluída Internamente
Deliberação	182	3	Judicializada
Deliberação	211	2	Judicializada
Deliberação	236	único	Concluída Internamente
Deliberação	469	2	Concluída Internamente

### **Entregas do ano de 2023**

A Fundação Renova entende que o Planejamento deste Programa tem sido determinado por decisões judiciais (a exemplo da decisão de 30/11/2021), e, em função disso, não é possível precisar o Planejamento 2023 em sede administrativa.

## Grandes números do programa

- **Para Dano Água**

Até o momento foram atendidas 320.179,00 pessoas, sendo que 270.372,00 aceitaram propostas. Destas, 264.988,00 propostas já foram pagas (98.01% das propostas aceitas). Os pagamentos somam 305.346.374,70 .70.

- **Para Dano Gerais**

10.857,00 núcleos familiares cadastrados aceitaram as propostas de indenização, sendo que 10.805,00 já foram pagos ( 99.52% dos casos). Os pagamentos de Danos Gerais somam R\$ 1.932.384.267,03 .

- **Para a campanha de Mariana**

Até o momento foi realizado o pagamento de 819,00 indenizações, o que representa 98.79% do total das 829,00 propostas aceitas.

## Indicadores

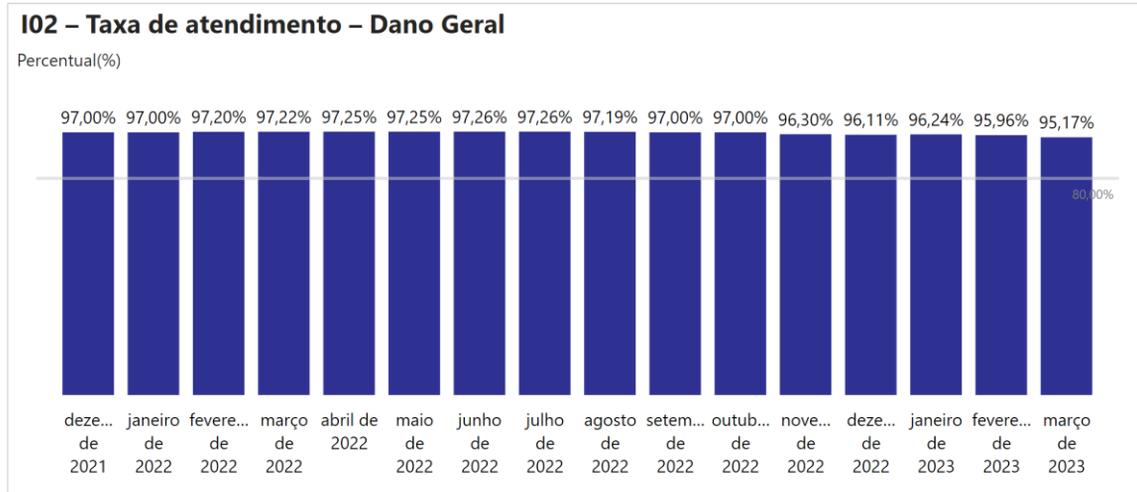


Gráfico 1: I02 – Taxa de atendimento – Dano Geral - Frequência Mensal

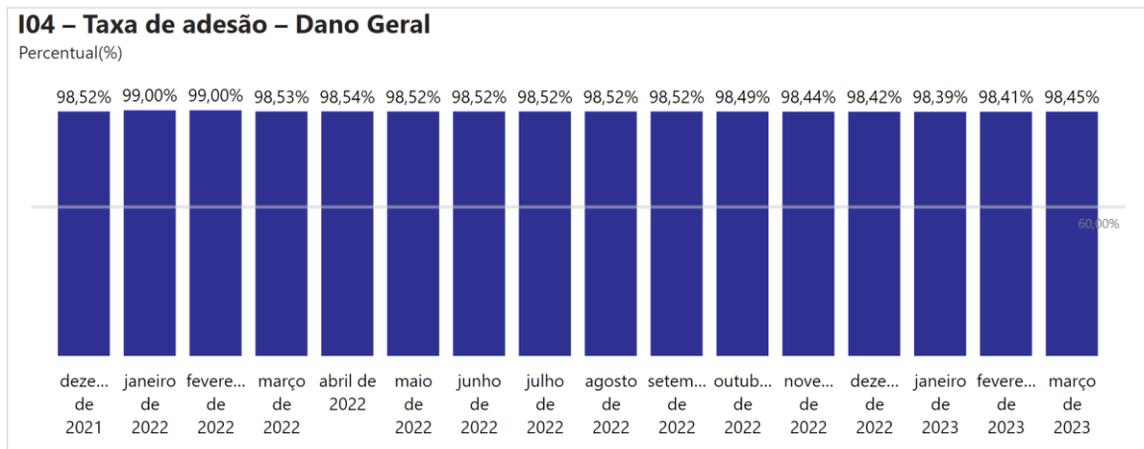


Gráfico 2: I04 – Taxa de adesão – Dano Geral - Frequência Mensal

## Indicadores

### I06 – Taxa de pagamentos realizados – Dano Geral

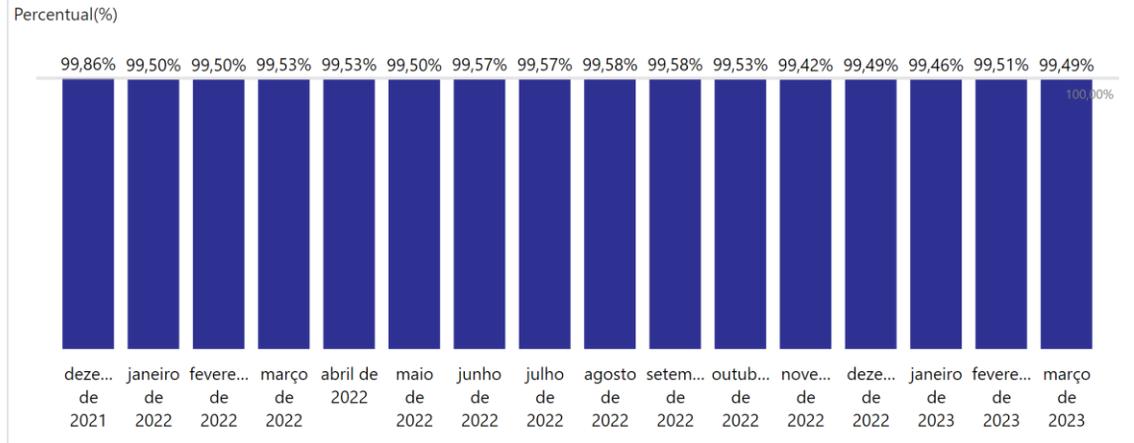


Gráfico 3: I06 – Taxa de pagamentos realizados – Dano Geral - Frequência Mensal

## **PG003 Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida dos ...**

### **Eixo Pessoas e Comunidade**

#### **Objetivo**

Implementar as ações mitigatórias, reparatórias e compensatórias para povos indígenas Tupiniquim, Guarani e Krenak em acordo com os impactos identificados conforme cláusulas 39 a 45 do Termo de Transação e Ajustamento de Conduta - TTAC.

## Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	39	Caput	Em andamento
Cláusula	43	§1º	Em andamento
Cláusula	43	Inc I	Em andamento
Cláusula	43	Inc II	Em andamento
Cláusula	43	Inc III	Concluída Internamente
Cláusula	43	Inc IV	Em andamento
Cláusula	43	Inc V	Em andamento
Cláusula	44	Inc I (ação 1)	Concluída Internamente
Cláusula	44	Inc I (ação 2)	Concluída Internamente
Cláusula	44	Inc II	Em andamento
Cláusula	44	Inc III e §3º	Concluída Internamente
Cláusula	44	Inc IV	Em andamento
Cláusula	44	Inc V	Em andamento
Deliberação	201	2	Concluída Internamente
Deliberação	206	1	Em andamento
Deliberação	227	2	Concluída Internamente
Deliberação	299	único	Concluída Internamente
Deliberação	335	2	Concluída Internamente
Deliberação	335	3	Concluída Internamente
Deliberação	360	1 e 1.1	Concluída Internamente
Deliberação	445	1.1	Em andamento
Deliberação	445	2.1	Concluída Internamente
Deliberação	445	2.2	Concluída Internamente
Deliberação	445	2.3	Concluída Internamente
Deliberação	445	2.4	Concluída Internamente
Deliberação	445	2.5	Concluída Internamente

## Entregas do ano de 2023

- setembro de 2023 ● Concluir as Ações Transitórias - Aldeia Boapy Pindó
- setembro de 2023 ● Finalizar o Fundo de Apoio às iniciativas comunitárias da Aldeia - Boapy Pindó
- setembro de 2023 ● Finalizar o Fundo de Apoio às iniciativas comunitárias de Comboios
- dezembro de 2023 ● Concluir as Ações Emergenciais - Aldeia - Boapy Pindó
- dezembro de 2023 ● Concluir as Ações Emergenciais - Comboios
- dezembro de 2023 ● Concluir as Ações Emergenciais - Tupiniquim Guarani

● Concluído    ● Planejado    ● Reprogramado

## Grandes números do programa

- 600 pessoas abastecidas com água mineral Povos Indígenas de Resplendor (total de 93.000 litros).
- 142 pontos de abastecimento de água mineral Povos Indígenas de Resplendor;
- 174 pontos de abastecimento de água potável Povos Indígenas de Resplendor (total de 4887 m<sup>3</sup>).
- 65 pontos de abastecimento de água bruta Povos Indígenas de Resplendor (total de 1240 m<sup>3</sup>).

## Fatos relevantes do mês

### Tupiniquim - Guarani

A Fundação Renova pagou no mês corrente, através de transferência eletrônica, um total de R\$3.550.803,08 para as associações indígenas ( ASSOCIAÇÃO INDIGENA GUARANI MB; ASSOCIAÇÃO INDIGENA TUPINIKIN DE IRAJÁ; ASSOCIAÇÃO INDIGENA TUPINIKIN DE AREAL; ASSOCIAÇÃO INDIGENA TUPINIKIN AITG; ASSOCIAÇÃO TUPINIKIN GUARANY D ATUGUAA ; ASSOCIAÇÃO INDIGENA TUPINIKIN PAU BRASIL), registradas sob os números de CNPJ (10.300.205/0001-46; 15.829.241/0001-15; 19.266.784/0001-22; 02.551.517/0001-02; 34.444.555/0001-44; e 09.569.165/0001-53 respectivamente), para ser distribuído pelas Associações Indígenas às 1.347 famílias indígenas das terras Tupiniquim – Guarani. As 1.347 famílias indígenas estão distribuídas nas 7 associações conforme segue: 55 famílias da ASSOCIAÇÃO INDIGENA GUARANI AIG, 279 famílias da ASSOCIAÇÃO INDIGENA TUPINIKIN PAU BRASIL, 165 famílias da ASSOCIAÇÃO INDIGENA TUPINIKIN DE IRAJÁ, 56 famílias ASSOCIAÇÃO INDIGENA TUPINIKIN DE AREAL, 718 famílias da ASSOCIAÇÃO INDIGENA TUPINIKIN AITG, 19 famílias da ASSOCIAÇÃO TUPINIKIN GUARANY CAIEIRAS VELHAS e 81 famílias da ASSOCIAÇÃO TUPINIKIN GUARANY AMARELOS. O total de R\$3.550.803,08 compreende o pagamento mensal do mês de fevereiro por família de R\$ 1.302,00, acrescido de 20% sobre o valor de 1 salário-mínimo por dependente, adicionado o valor de uma cesta básica do DIEESE/ES, 5% de taxas administrativas para as Associações.

A auditoria independente realizou entrevistas com os associados que recebem ASE como uma das etapas do processo de auditoria.

## Comboios

No mês de março foi inicializado a perfuração do poço na aldeia de Córrego do Ouro. A ação tem por objetivo realizar o teste de vazão e análise da qualidade da água para continuidade da elaboração do Projeto Básico do Sistema de Abastecimento de Água da TI de Comboios.

Distribuição de água mineral para a Comunidade de Comboios – 34600 litros distribuídos nos dias 23 de fevereiro, 02,09 e 16 de março de 2023 (total de 1730 galões de 20 litros).

A Fundação Renova pagou no mês corrente, através de transferência bancária à Associação Indígena Tupiniquim de Comboios inscrita no CNPJ 02.536.221/0001-04, o total de R\$1.375.305,89, referente ao pagamento de auxílio subsistência emergencial dos meses de novembro para 293 titulares da Comunidade Indígena de Comboios, esse valor, compreende o pagamento de 2,5 salários-mínimos mensal por família, acrescido de 20% sobre o valor de 1 salário-mínimo por dependente, mais o valor de uma cesta básica e 5% de taxa administrativa para as Associação.

## Resplendor

A Fundação Renova pagou no mês corrente, através de transferência eletrônica, um total de R\$ 1.605.366,00 das associações indígenas (UATU; ATORÃN; BAKÃN; BURUM ERERRÉ-AIBE; KRENAK; NÁKNENUK; NAKRERRÉ; e BURUM TAKRUK), registradas sob os números de CNPJ (08.882.323/0001-80; 07.864.625/0001-40; 30.862.050/0001-49; 23.675.495/0001-54; 03.640.055/0001-54; 07.918.506/0001-23; 12.078.678/0001-76 e 20.076203/0001-79 respectivamente), para ser distribuído pelas Associações Indígenas às 137 famílias indígenas da terra de Resplendor. As 137 famílias indígenas estão distribuídas nas 8 associações conforme segue: 31 famílias da Associação Indígena ATORÃN, 10 famílias da Associação Indígena BAKÃN, 17 famílias da Associação Indígena BURUM ERERRE, 20 famílias da Associação Indígena KRENAK, 12 famílias da Associação Indígena NAKNENUK, 10 famílias da Associação Indígena NAKRERRE, 12 famílias da Associação Indígena TAKRUK e 25 famílias da Associação Indígena UATU. O total de R\$ 1.605.366,00, compreende o pagamento mensal de 9 salários mínimos no valor de R\$ 1.302,00 para cada uma das 137 famílias.

## Indicadores

Os indicadores do Programa estão em revisão.

## **PG0004 Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida de Outros Povos e Comunidades Tradicionais**

### **Eixo Pessoas e Comunidades**

#### **Objetivo**

Implantar as ações mitigatórias, reparatórias e compensatórias para povos e comunidades tradicionais em acordo com os impactos identificados conforme Cláusulas 46 a 53 do Termo de Transação e Ajustamento de Conduta - TTAC.

## Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	46	§1º	Concluída Internamente
Cláusula	46	§2º	Concluída Internamente
Cláusula	46	§3º	Concluída Internamente
Cláusula	46	Caput	Concluída Internamente
Cláusula	50	Caput	Em andamento
Deliberação	280	1	Concluída Internamente
Deliberação	281	1	Concluída Internamente
Deliberação	298	1	Concluída Internamente
Deliberação	329	1	Concluída Internamente
Deliberação	430	1	Concluída Internamente
Deliberação	494	1	Concluída Internamente
Deliberação	356	1; 1.1 e 1.2	Concluída Internamente
Deliberação	256	2	Concluída Internamente
Deliberação	298	2	Concluída Internamente
Deliberação	430	2	Concluída Internamente
Deliberação	494	2	Concluída Internamente
Deliberação	256	3	Concluída Internamente
Deliberação	281	3	Concluída Internamente
Deliberação	423	3	Concluída Internamente
Deliberação	281	4	Concluída Internamente
Deliberação	423	4	Concluída Internamente
Deliberação	280	4 (ação 1)	Concluída Internamente
Deliberação	280	4 (ação 2)	Concluída Internamente
Deliberação	355	1	Em andamento
Deliberação	300	1	Judicializada
Deliberação	300	2	Judicializada
Deliberação	333	2	Judicializada
Deliberação	493	2	Judicializada
Deliberação	493	3	Judicializada
Deliberação	501	3	Judicializada

Deliberação	154	1	Concluída Internamente
Deliberação	155	2	Concluída Internamente
Deliberação	161	1	Concluída Internamente
Deliberação	161	2	Concluída Internamente
Deliberação	161	3	Concluída Internamente
Deliberação	202	1	Concluída Internamente
Deliberação	202	2c	Concluída Internamente
Deliberação	202	3	Concluída Internamente
Deliberação	202	4	Concluída Internamente
Deliberação	202	5	Concluída Internamente
Deliberação	256	1	Concluída Internamente

## Entregas do ano de 2023

- abril de 2023 ● Submissão da versão final da revisão do Programa de Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida de Outros Povos e Comunidades Tradicionais à diretoria da Fundação Renova (Degredo)
- abril de 2023 ● Deliberação da aprovação do documento de definição do Programa de Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida de Outros Povos e Comunidades Tradicionais
- abril de 2023 ● Envio da versão final da revisão do Programa de Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida de Outros Povos e Comunidades Tradicionais à CT-IPCT
- abril de 2023 ● Envio da versão final da revisão do Programa de Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida de Outros Povos e Comunidades Tradicionais ao CIF

## **Grandes números do programa**

O programa não possui grandes números.

## **Fatos relevantes do mês**

### **Quilombolas**

Reuniões nos 8 aglomerados da comunidade quilombola de Degredo (troncos) para comunicar o processo do PBAQ e decisão judicial.

Reunião com SAAE para aprovação do projeto do SAA.

Implementação do projeto "Capacitação de lideranças quilombolas" (em fase de produção).

4ª oficina com GT/CT-IPCT para elaboração conjunta do documento de definição do PG04.

## Fiscadores

Não houve fatos relevantes.

## **Indicadores**

Os indicadores do programa estão em revisão

## **PG005 Programa de Proteção Social**

### **Eixo Pessoas e Comunidades**

#### **Objetivo**

Desenvolver e executar ações para promover a proteção social, por meio de ações socioassistenciais, incluindo ações socioculturais e apoio psicossocial, desenvolvendo o acompanhamento às famílias e aos indivíduos impactados pelo EVENTO, priorizando os IMPACTADOS com deslocamento físico, e considerando os agravos das vulnerabilidades decorrentes do evento, segundo a CLÁUSULA 54 e demais cláusulas do TTAC.

## Status de Cláusulas e Deliberações


Cláusula	54	Caput	Em andamento
Deliberação	180	1	Concluída Internamente
Deliberação	192	2	Concluída Internamente
Deliberação	278	1.1	Concluída Internamente
Deliberação	278	1.2	Concluída Internamente
Deliberação	278	1.3	Concluída Internamente
Deliberação	307	1	Concluída Internamente
Deliberação	307	2a	Concluída Internamente
Deliberação	330	único	Concluída Internamente
Deliberação	332	único	Concluída Internamente
Deliberação	422	2	Concluída Internamente
Deliberação	533	4	Judicializada

## Entregas do ano de 2023



● Concluído
 ● Planejado
 ● Reprogramado

## Entregas do ano de 2023

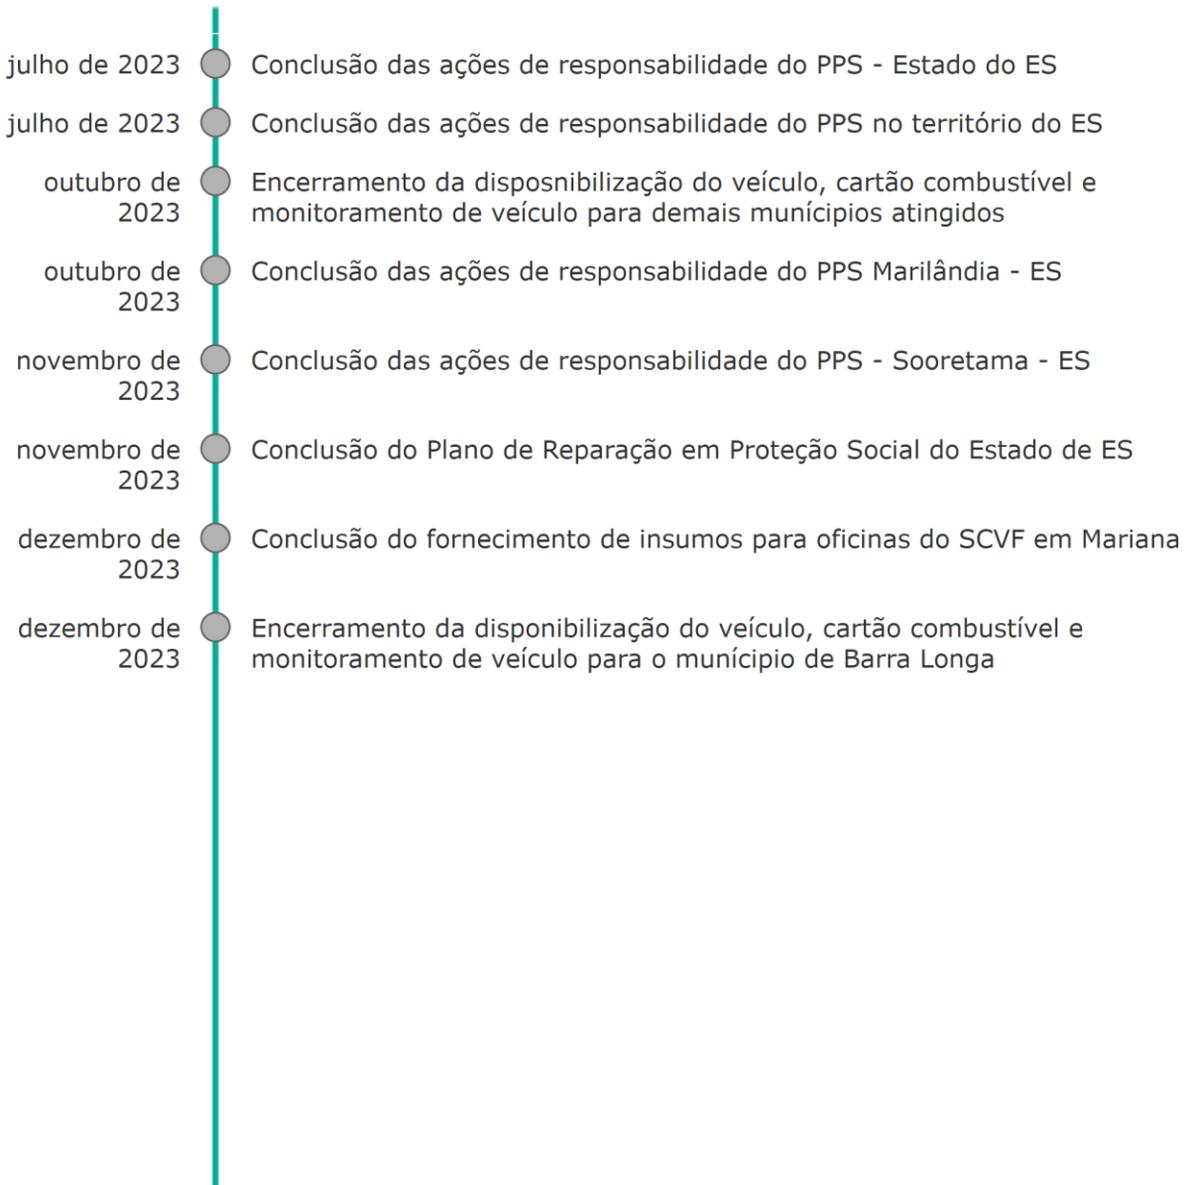

● Concluído
 ● Planejado
 ● Reprogramado

## Grandes números do programa

- Disponibilização de recursos para a suplementação de 146.00 profissionais (assistentes sociais, psicólogos, motoristas e oficinairos) em 13 municípios atingidos e no Estado do Espírito Santo, para promover a proteção social, por meio de ações socioassistenciais, incluindo ações socioculturais e apoio psicossocial, desenvolvendo o acompanhamento às famílias e aos indivíduos atingidos pelo rompimento, priorizando as famílias com deslocamento físico;
- Repasse financeiro de R\$ 23,541,387.15 , além, da contratação dos profissionais, compra de equipamentos e insumos no demais municípios da Calha, conforme previsto nos termos pactuados, para realização de atividades coletivas com o objetivo de fortalecer vínculos familiares e comunitários das famílias antigidas;
- Disponibilização de 23.00 veículos com cartão combustível, para transporte das equipes profissionais suplementadas, garantido acesso às famílias e comunidades atingidas;
- 23,370.00 famílias cadastradas pela Fundação a serem beneficiadas por meio dos Planos de Proteção Social implementados pelos municípios atingidos com o apoio da Fundação Renova,

## **Fatos relevantes do mês**

Reuniões do COMAPPS (Comissão de acompanhamento das ações do plano de reparação em proteção social) e de prestação de contas com a participação dos atingidos nos seguintes municípios: Linhares, Colatina, Sooretama, Baixo Guandu, Aracruz, Aimorés, Bom Jesus do Galho, Pingo D'Água, Belo Oriente, Ipatinga.

Conclusão dos repasses financeiros com baixa contábil do plano de reparação em proteção social nos seguintes municípios: Aimorés, Aracruz, Barra Longa, Belo Oriente, Fernandes Tourinho, Pingo D'Água, Rio Casca e São José do Goiabal.

Aprovação do plano de reparação em proteção social pelo município de Galileia.

Repasso financeiro para execução das atividades previstas no plano de reparação em proteção social no município de Santa Cruz do Escalvado.

## Indicadores

### I01 - % de Municípios/Estados aderentes com recursos repassados/disponibilizados pela Fundação Renova para implementação do plano de reparação em proteção social

Meta Global: 100%  
Percentual(%)



Gráfico 1: I01 - % de Municípios/Estados aderentes com recursos repassados/disponibilizados pela Fundação Renova para implementação do plano de reparação em proteção social - Frequência Anual

### I02 – % Ofertar vagas pela Fundação Renova para os técnicos contratados para suplementar o RH pelos municípios/estados atingidos

Meta Global: 100%  
Percentual(%)




Gráfico 2: I02 – % Ofertar vagas pela Fundação Renova para os técnicos contratados para suplementar o RH pelos municípios/estados atingidos - Frequência Semestral

## Indicadores

### I03 - % Oferta pela Fundação Renova para pelo menos dois técnicos de cada CRAS e dois técnicos de cada CREAS dos municípios/estados atingidos

Meta Global: 100%  
Percentual(%)

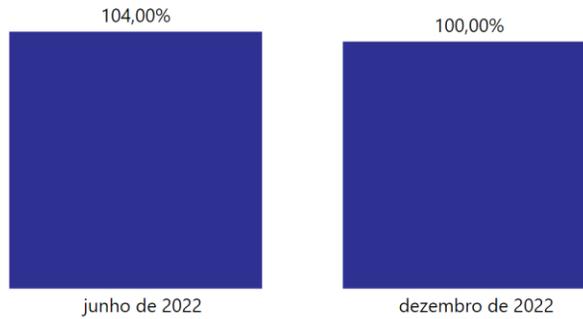


Gráfico 3: I03 - % Oferta pela Fundação Renova para pelo menos dois técnicos de cada CRAS e dois técnicos de cada CREAS dos municípios/estados atingidos - Frequência Semestral

### I04 – % Oferta de pelo menos duas vagas pela Fundação Renova para técnicos do órgão gestor dos municípios/estados atingidos

Meta Global: 100%  
Percentual(%)




Gráfico 4: I04 – % Oferta de pelo menos duas vagas pela Fundação Renova para técnicos do órgão gestor dos municípios/estados atingidos - Frequência Semestral

## Indicadores

### I05 – % de indivíduos vulneráveis elegíveis às políticas da Fundação Renova identificados e encaminhados para priorização junto aos programas aos quais têm direito

Meta Global: 100%  
Percentual(%)




Gráfico 5: I05 – % de indivíduos vulneráveis elegíveis às políticas da Fundação Renova identificados e encaminhados para priorização junto aos programas aos quais têm direito - Frequência Semestral

### I06 – % de indivíduos vulneráveis elegíveis com a rota de reparação concluída pelos programas da Fundação Renova

Meta Global: 100%  
Percentual(%)

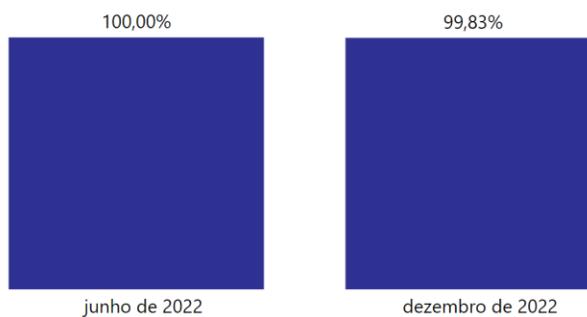


Gráfico 6: I06 – % de indivíduos vulneráveis elegíveis com a rota de reparação concluída pelos programas da Fundação Renova - Frequência Semestral

## Indicadores

**I07 – % de famílias com deslocamento físico que tenham anuído ao acompanhamento social até a entrega das residências concluídas ou retorno às suas residências de origem ou entrega da solução reparatória acordada (Mariana, Barra Longa, Sooretama e Linhares)**

Meta Global: 100%  
Percentual(%)




Gráfico 7: I07 – % de famílias com deslocamento físico que tenham anuído ao acompanhamento social até a entrega das residências concluídas ou retorno às suas residências de origem ou entrega da solução reparatória acordada (Mariana, Barra Longa, Sooretama e Linhares) - Frequência Semestral

## **PG006 Comunicação, Participação, Diálogo e Controle Social**

### **Eixo Pessoas e Comunidades**

#### **Objetivos**

- (i) Assegurar canais de interação, diálogo e relacionamento contínuo com a população atingida e demais públicos interessados, zelando sempre pela transparência e integridade, junto a todos os grupos e territórios.
- (ii) Garantir acesso à informação ampla, transparente, acessível e contínua a todos os atingidos e interessados, de modo a favorecer a participação esclarecida da sociedade nos processos de reparação e compensação.
- (iii) Assegurar os processos de participação social e garantir espaços de diálogos em todos os programas, projetos e ações de reparação e compensação executados pela Fundação Renova no que tange à promoção de participação social e comunicação no desenvolvimento e implementação dos projetos socioeconômicos e socioambientais previstos no TTAC e deliberações do CIF.
- (iv) Assegurar os processos de participação social e garantir espaços de diálogos em todos os programas, projetos e ações de reparação e compensação.

## Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	59	Caput	Em andamento
Cláusula	63	§único	Em andamento
Cláusula	63	Caput	Em andamento
Cláusula	68	Caput	Encerrada
Cláusula	71	Caput	Em andamento
Cláusula	72	Caput	Em andamento
Deliberação	105	1.1	Concluída Internamente
Deliberação	105	1.2	Concluída Internamente
Deliberação	105	1.3	Concluída Internamente
Deliberação	105	1.4	Concluída Internamente
Deliberação	105	1.6	Concluída Internamente
Deliberação	140	1	Concluída Internamente
Deliberação	228	2	Concluída Internamente
Deliberação	230	1	Concluída Internamente
Deliberação	506	2	Concluída Internamente
Deliberação	506	2.2	Concluída Internamente
Deliberação	506	3	Concluída Internamente
Deliberação	506	4	Concluída Internamente
Deliberação	506	5	Concluída Internamente
Deliberação	506	6	Concluída Internamente

## Entregas do ano de 2023

outubro de 2023		Publicação de relatórios trimestrais de atividades com dados estatísticos em 2023.
dezembro de 2023		Acolhimento de solicitações e ofícios junto aos públicos em 2023.
dezembro de 2023		Acompanhamento das tratativas e devolutivas (intermediárias e finais) aos públicos em 2023.
dezembro de 2023		Acompanhamento do Controle Social nos Programas, Projetos e Ações de Reparação e Compensação executados pela Fundação Renova em 2023.
dezembro de 2023		Articulação com programas para obtenção de informações e atualização do FAQ em 2023.
dezembro de 2023		Atualização de informações sobre a tratativa e conclusão das solicitações no SGS e em controle de ofícios em 2023.
dezembro de 2023		Divulgação da ouvidoria nos canais institucionais em 2023.
dezembro de 2023		Encaminhamentos das solicitações aos pontos focais dos programas em 2023.
dezembro de 2023		Execução da Análise de Contexto em 2023: Compreensão, Reconhecimento e Aproximação.
dezembro de 2023		Garantir em 2023 a periodicidade e assertividade dos canais permanentes de comunicação com a sociedade atingida: Momento da Reparação nas Rádios do trecho; boletins mensais e murais dos CIA's.
dezembro de 2023		Identificar oportunidades e executar as melhores formas de repasse de conteúdos para aumentar conhecimento da sociedade sobre as entregas dos programas em 2023.
dezembro de 2023		Manutenção do mecanismo para monitoramento das ações de reparação e recebimento de denúncias e reclamações das comunidades impactadas em 2023.
dezembro de 2023		Monitoramento dos índices de satisfação com a Ouvidoria em 2023.
dezembro de 2023		Prover a Participação Social nos Programas, Projetos e Ações de Reparação e Compensação executadas pela Fundação Renova em 2023.
dezembro de 2023		Registro e classificação das solicitações no SGS e em controle de ofícios em 2023.

 Concluído     Planejado     Reprogramado

## DIÁLOGO

### Grandes números do pilar

INDICADOR MÊS	fev/2023	mar/2023	ACUMULADO
Diálogo: Reuniões Realizadas – Outras Localidades (Mês)	0	0	11
Diálogo: Reuniões Realizadas – Espírito Santo (Mês)	7	43	1.269
Diálogo: Reuniões Realizadas – Minas Gerais (Mês)	29	31	3.997
Diálogo: Total de Participantes em Reuniões (Acumulado)	-	-	136.286

## Fatos relevantes do mês

Em Baixo Rio Doce, foram realizadas ações para apresentação do Projeto Doce Vivo para turmas de estudantes de Ensino Fundamental de 1º a 9º ano, nas instituições EMEIEF Aladia Trindade Paiva e EM Prof. Elza Ewald de Oliveira em Baixo Guandu (ES). Foi realizada reunião para apresentação das ações de Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER) para produtores rurais e reunião com Pescadores Profissionais da Colônia Z12 de Baixo Guandu (MG) para levantamento de informações referentes às atividades aquícolas e pesqueiras em Baixo Guandu (MG).

Em Mariana, foi realizada agenda para esclarecimento de dúvidas e acolhimento de pleitos sobre impacto de obras no distrito de Antônio Pereira. Foram realizados também fóruns de prestação de contas no território. Dois deles para fiscalização de obras do Reassentamento Coletivo de Paracatu de Baixo para discussão de assuntos da reparação. Grupos de Trabalho de Paracatu de Baixo para discussão sobre o Reassentamento Coletivo e demais pautas da reparação. E reunião para apresentação de resultados do processo de acompanhamento e resgate arqueológico realizado na Ponte Manoel de Souza (Santa Rita Durão/MG).

No Alto Rio Doce, foi realizado em Barra Longa (MG) encontro para apresentação do documentário da Corporação Musical São José. Em Santa Cruz do Escalvado (MG), aconteceu roda de conversa com moradores do município para alinhamento sobre as ações do Plano de Reparação de Referências Culturais.

No Médio Rio Doce ações foram realizadas em Resplendor (MG), Itueta (MG), Aimorés (MG) e Tumiritinga (MG) para produtores rurais elegíveis à Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER), apresentando aos novos elegíveis o programa e apresentação e termo de aceite/recusa. Em Governador Valadares (MG) foi realizada reunião com produtores rurais para esclarecimentos sobre a Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER) e reunião com pescadores e pescadoras da Colônia de Z-19 do Leste Mineiro sobre a informação dos processos de reparação da Fundação Renova. Encontro com grupo de pescadores para apresentação da proposta do curso de “Capacitação para Condutores de Turismo de Pesca Esportiva” em Resplendor (MG). Agenda com moradores de Belo Oriente (MG), sobre o Comitê Municipal de Avaliação do Programa de Proteção Social da Fundação, conforme previsto no Plano Municipal de Reparação em Proteção Social, pactuado no município. Em Periquito (MG) aconteceu reunião com Associação de Pescadores e Ilheiros de Pedra Corrida (Periquito/MG), para apresentação e validação do Plano de Trabalho do projeto de tanques suspensos, junto ao Programa de Retomada das Atividades Aquícolas e Pesqueiras (PG016). Em Aimorés (MG), foi realizada reunião com pescadoras e pescadores ACOBAMA sobre informações das ações de Ressarcimento e Indenização da Fundação Renova.

No território da Calha do Rio Doce, destaca-se reuniões com produtores rurais de São José do Goiabal (MG), Rio Casca (MG), Revés de Belém (MG), Ilha Doce (Caratinga/MG), Ipaba do Paraíso (Santana do Paraíso/MG), Ipaba (MG), Bugre (MG), e Ipatinga (MG), com o objetivo de esclarecer sobre a elegibilidade e adesão à ATER, do Programa de Retomada das Atividades Agropecuárias. Em Pingo D’Água (MG) aconteceu agenda para repasse de informações sobre ações de reparação em Proteção Social e escolha dos membros para formação do Comitê Municipal de Acompanhamento do Programa de Proteção Social (COMAPPS). Encontro com lideranças e moradores de Macuco (Timóteo/MG) para esclarecimento de dúvidas sobre o Sistema Indenizatório Simplificado (SIS) e etapas do cadastro integrado, no município de Timóteo (MG). Ocorreu também Fórum de Prestação de Contas – Resulta, junto a atingidos de Revés de Belém para apresentação de ações desenvolvidas pela Fundação Renova no âmbito do Programa de Proteção Social para apresentação dos resultados do Sistema Indenizatório Simplificado (SIS) em Bom Jesus do Galho (MG).

## Fatos relevantes do mês

No Espírito Santo, apresentação do Projeto Doce Vivo, para estudantes de Ensino Fundamental entre 1º e 9º ano da Escola Professora Cely Rocha em Maria Ortiz (Colatina/ES); da Escola Família Agrícola em Marilândia (ES); na Escola José Baião em Barbados em Colatina (ES); nas EMEF Orozimbo Leite; EEEFM Nossa Senhora da Conceição; EMEF Prefeito Roberto Calmon em Linhares (ES). Destaca-se agendas para apresentação das ações de Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER), para comunidades de Povoação, Regência, Entre Rios, Areal e Linhares (ES), no município de Linhares (ES) e para produtores rurais de Maria Ortiz, Itapina e Maria das Graças em Colatina (ES). Encontro com pescadores da Associação de Pescadores e Assemelhados de Povoação para levantamento de informações referentes às atividades aquícolas pesqueiras; Reunião com lideranças de Povoação para apresentação dos processos indenizatórios da Fundação Renova; Reunião com moradores da Av. Beira Rio para repasse de informações sobre a adequação da estrutura de segurança no local, para atendimentos à legislação; Reunião com diretoria da AMOR e lideranças da comunidade de Regência (Linhares/ES) para repasse de informações sobre processos indenizatórios da Fundação Renova e Reunião com a Associação de Comerciantes de Povoação (Linhares/ES) e feirantes para alinhamentos sobre a Feira Comunitária em Linhares (ES). Destaca-se em Colatina (ES), a 2ª Reunião com Pescadores Profissionais de Maria Ortiz para levantamento de informações referentes às atividades aquícolas e pesqueiras. Em Aracruz (MG) destaque para Reunião com Associação de Cultivadores de Algas da Orla de Aracruz – ACAOA para apresentação da proposta de Capacitação de Turismo de Pesca Esportiva; Reunião com Grupo de Pescadores de Barra do Riacho, para apresentação da proposta de Capacitação de Turismo e Pesca Esportiva e Reunião com Colônia Z-07 e Associação de Pescadores de Barra do Riacho, para repasse de informações sobre os processos indenizatórios da Fundação Renova.

## Indicadores

### I03 - Pilar diálogo - Média mensal de espaços de diálogo coletivo nos territórios

Percentual(%)

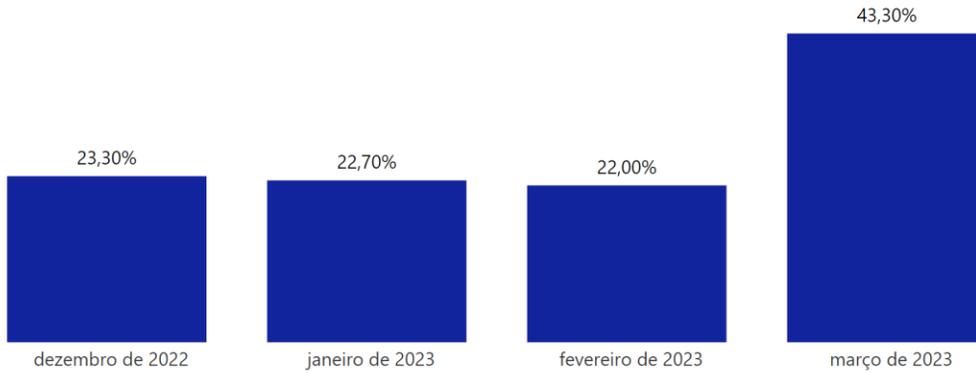


Gráfico 1: I03 - Pilar diálogo - Média mensal de espaços de diálogo coletivo nos territórios - Frequência Mensal

### I01 - Pilar diálogo - Apresentação dialógica dos programas nos territórios

Percentual(%)

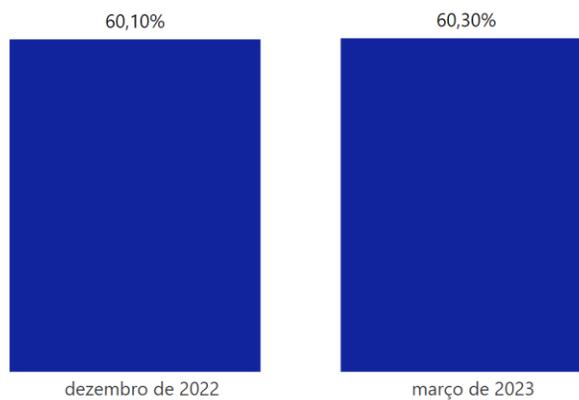


Gráfico 2: I01 - Pilar diálogo - Apresentação dialógica dos programas nos territórios- Frequência Trimestral

## Indicadores

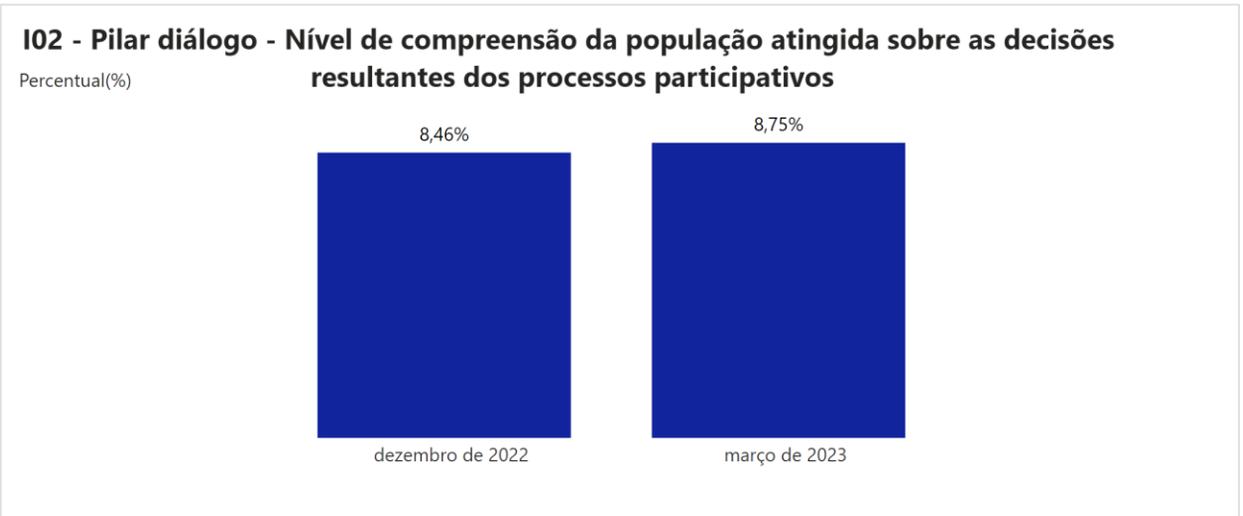


Gráfico 3: I02 - Pilar diálogo - Nível de compreensão da população atingida sobre as decisões resultantes dos processos participativos - Frequência Trimestral




Gráfico 4: I04 - Pilar diálogo - Disponibilidade de informações sobre as tratativas dos encaminhamentos definidos em Diálogos Coletivos - Frequência Semestral

## Indicadores

### I05 - Pilar diálogo - Compreensão dos atingidos em relação às informações sobre o andamento dos encaminhamentos definidos em diálogos coletivos

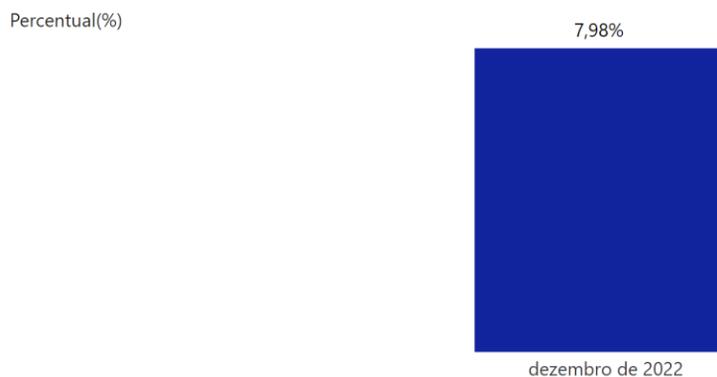


Gráfico 5: I05 - Pilar diálogo - Compreensão dos atingidos em relação às informações sobre o andamento dos encaminhamentos definidos em diálogos coletivos - Frequência Semestral

### I06 - Pilar diálogo - Avaliação dos espaços de participação e controle social




Gráfico 6: I06 - Pilar diálogo - Avaliação dos espaços de participação e controle social - Frequência Semestral

## Indicadores

### I08 - Pilar diálogo - Percepção de efetividade dos espaços de participação e controle social

Percentual(%)




Gráfico 7: I08 - Pilar diálogo - Percepção de efetividade dos espaços de participação e controle social - Frequência Anual

### I07 - Pilar diálogo - Satisfação com a transparência das ações da Fundação Renova

Percentual(%)




Gráfico 8: I07 - Pilar diálogo - Satisfação com a transparência das ações da Fundação Renova - Frequência Anual

## Indicadores



Gráfico 9: I10 - Pilar de Diálogo - Satisfação Com o Processo De Construção Coletiva Dos Encaminhamentos Em Diálogos Coletivos - Frequência Mensal

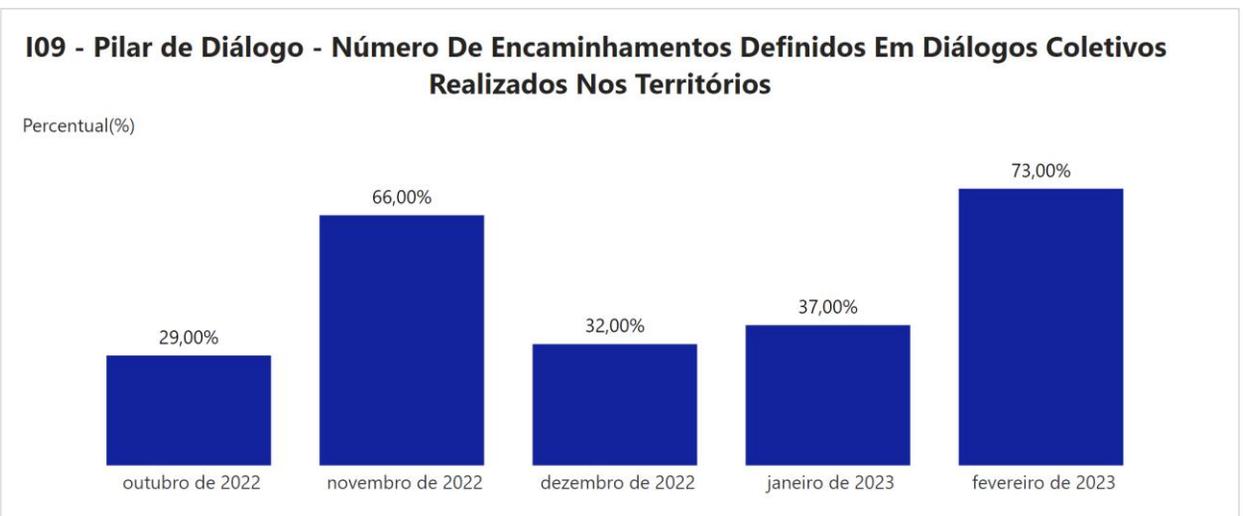


Gráfico 10: I09 - Pilar de Diálogo - Número De Encaminhamentos Definidos Em Diálogos Coletivos Realizados Nos Territórios - Frequência Trimestral

## OUVIDORIA

### Grandes números do pilar

Tabela 2. Manifestações recebidas - Acumulado.

<b>MANIFESTAÇÕES RECEBIDAS ACUMULADO</b>	<b>MANIFESTAÇÕES RECEBIDAS MÉDIA MENSAL ACUMULADA</b>
<b>16.454,00</b>	<b>184,88</b>

Tabela 3. Manifestações recebidas.

<b>MÊS/ANO</b>	<b>REALIZADO MENSAL</b>	<b>MÉDIA ACUMULADA ANUAL</b>
janeiro de 2023	138	206,67
fevereiro de 2023	249	
março de 2023	233	
		-
		-
		-

## Fatos relevantes do mês

Não houve fatos relevantes neste mês.

## Indicadores

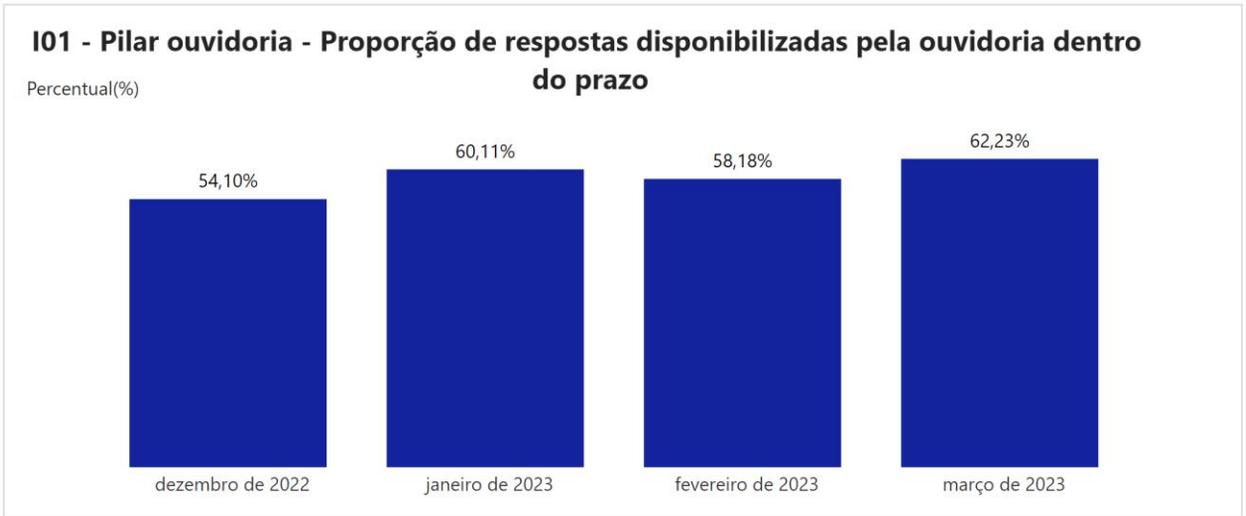


Gráfico 9: I01 - Pilar ouvidoria - Proporção de respostas disponibilizadas pela ouvidoria dentro do prazo - Frequência Mensal

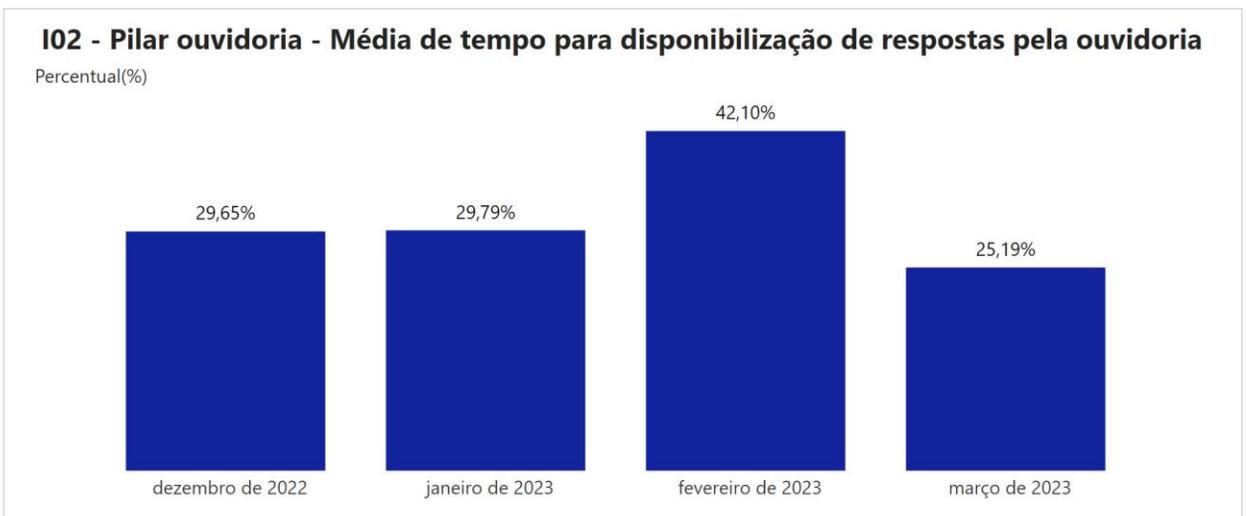


Gráfico 10: I02 - Pilar ouvidoria - Média de tempo para disponibilização de respostas pela ouvidoria - Frequência Mensal

## Indicadores

### I03 - Pilar ouvidoria - Avaliação do atendimento pela ouvidoria

Percentual(%)

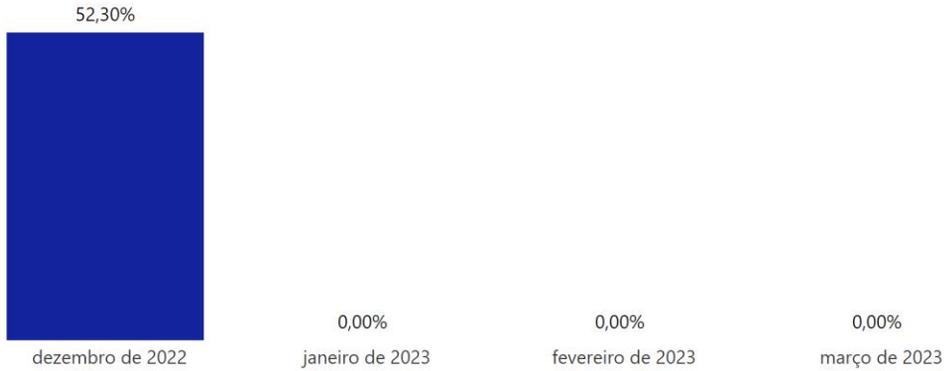


Gráfico 11: I03 - Pilar ouvidoria - Avaliação do atendimento pela ouvidoria - Frequência Mensal

Apesar de na definição do programa esse indicador constar com medições mensais, as pesquisas serão realizadas semestralmente. O programa está providenciando a formalização dessa informação com CTPDCS e CIF.

## CANAIS DE RELACIONAMENTO

### Grandes números do pilar

Tabela 4. Grandes Números.

Grande Número	fev/2023	mar/2023
Canais: Número total de pessoas registradas no SGS (que fizeram contato com os Canais)	331.724	335.215
Canais: Número total de manifestações	1.357.389	1.397.160
Canais: Número de manifestações respondidas	1.298.613	1.344.129
Canais: Número de manifestações registradas pelos Centros de Informação e Atendimento (CIAs)	175.151	184.569
Canais: Número de manifestações registradas pelo Portal do Usuário	96.878	101.898
Canais: Número de manifestações registradas pelo Fale Conosco	14.875	14.920
Canais: Número de manifestações registradas pelo 0800	1.003.475	1.027.484
Canais: Número de manifestações encaminhadas à Ouvidoria no mês	16	15
Canais: Número de manifestações em tratamento	58.776	53.031
Canais: Número de manifestações classificadas como Outros (Abordagem presencial, E-mail, Eventos, Fórum, Mobilização, Ofício, Ouvidoria, Redes Sociais, Reunião de Diálogo, Telefone)	67.010	68.289

## Pesquisa de Opinião 0800




Gráfico 11: Pesquisas de Satisfação 0800 - Q2

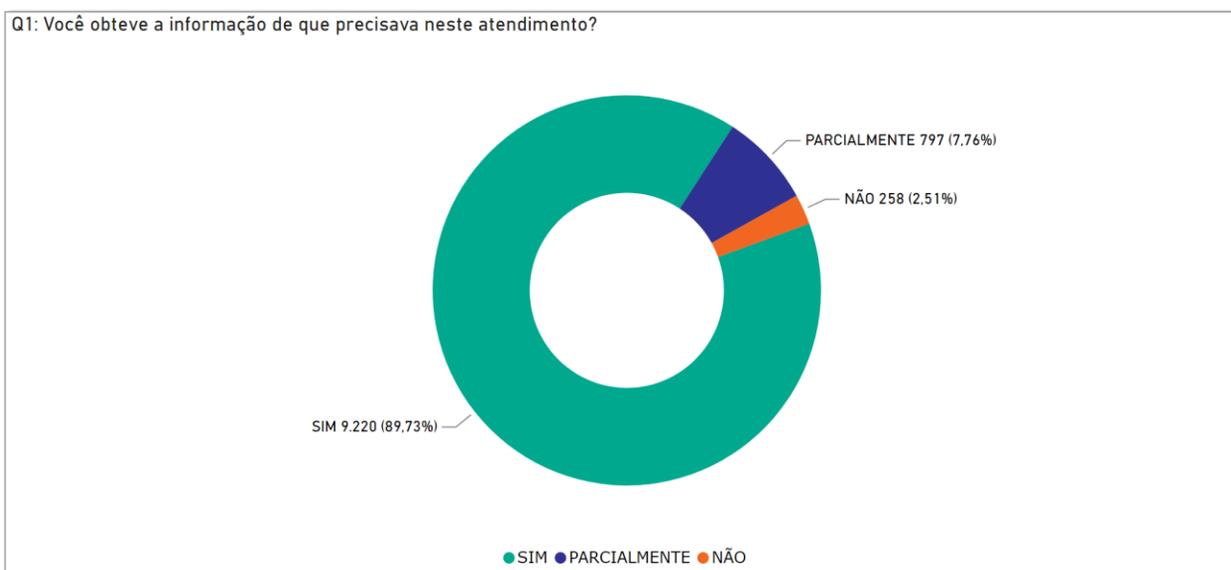


Gráfico 12: Pesquisas de Satisfação 0800 - Q1

## Pesquisa de Opinião 0800

Q3: Como você avalia o atendimento que acabou de receber? Q1 = Sim




Gráfico 13: Pesquisas de Satisfação 0800 - Q3 , Q1 = Sim.

Q3: Como você avalia o atendimento que acabou de receber? Q1 = Parcialmente




Gráfico 14: Pesquisas de Satisfação 0800 - Q3, Q1= Parcialmente.

## Pesquisa CIAs

Como você avalia o profissional que lhe atendeu hoje?




Gráfico 15: Como você avalia o profissional que lhe atendeu hoje? - Frequência Mensal

Em relação às informações recebidas neste atendimento, você ficou?




Gráfico 16: Em relação às informações recebidas neste atendimento, você ficou? - Frequência Mensal


Você recebeu a informação que solicitou neste atendimento?



Legenda ● SIM ● EM PARTES ● NÃO

Gráfico 17: Você recebeu a informação que solicitou neste atendimento? - Frequência Mensal

Avalie o Conforto e qualidade do espaço



Legenda ● ÓTIMO ● BOM ● REGULAR ● PÉSSIMO ● RUIIM

Gráfico 18: Avalie o Conforto e qualidade do espaço - Frequência Mensal

## Fatos relevantes do mês

Ao longo do mês de março, destaque para a realização de 22 CIAs Móveis: Na comunidade de São Tomé do Rio Doce (Tumiritinga/MG) e Patrimônio da Lagoa (Linhares/ES) em 01/03; na comunidade de Regência (Linhares/ES) em 02/03 e na comunidade Macuco (Timóteo/MG) em 07/03. No município de São José do Goiabal (MG) e na comunidade de Bebedouro (Linhares/MG) em 08/03. Em Rio Casca(MG) e Revés do Belém (Bom Jesus do Galho/MG) em 09/03. Na comunidade de Barra do Riacho (Aracruz/ES) e Ipabinha (Santana do Riacho/MG) em 14/03; e na comunidade Vila Krenak (Resplendor/MG) em 15/03. Nas comunidades do Guaxe (Linhares/ES) e São Lourenço (Bugre/MG) em 16/03; em Mascarenhas (Baixo Guandu/ES) e Ilha do Rio Doce (Caratinga/MG) em 21/03. Em Maria Ortiz (Colatina/ES) e Ipatinga (MG) em 22/03. Em Itueta (MG), Lagoa do Batista (Marilândia/ES) e Ipaba (MG) em 23/03. Em Povoação (Linhares/ES) e por fim, em Regência (Linhares/ES). Durante as ações realizadas foram atendidos diversos públicos das comunidades e regiões vizinhas, essas ações contaram com acolhimento, registro de manifestações e esclarecimento de dúvidas relacionadas ao processo de reparação.

Continuidade do trabalho de acolhimento e esclarecimento de dúvidas nos Centros de Informação e Atendimento; monitoramento, pelos atendentes CIAs, de manifestações registradas que estão pendentes de respostas intermediárias ou finais.

Participação de atendentes CIAs no Encontro para repasse de informações e esclarecimento de dúvidas sobre o sobre PG035 realizado em 03/03. Além disso, aconteceu também o Plano de desenvolvimento do atendente em duas etapas; a 1º Etapa: O rompimento da barragem de Fundão e o Institucional Renova aconteceu nos dias 14 e 15/03; e a 2º Etapa: Cadastro aconteceu nos dias 21, 22 e 28/03.

## Indicadores

### I01 - Pilar canais - Taxa de manifestações reincidentes

Percentual(%)

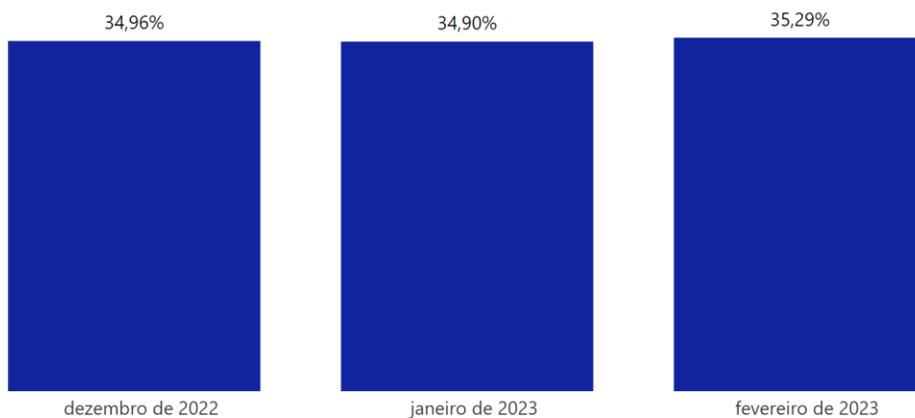


Gráfico 19:I01 - Pilar canais - Taxa de manifestações reincidentes - Frequência Mensal

### I02 - Pilar canais - Proporção de manifestações respondidas

Percentual(%)




Gráfico 20: I02 - Pilar canais - Proporção de manifestações respondidas - Frequência Mensal

## Indicadores

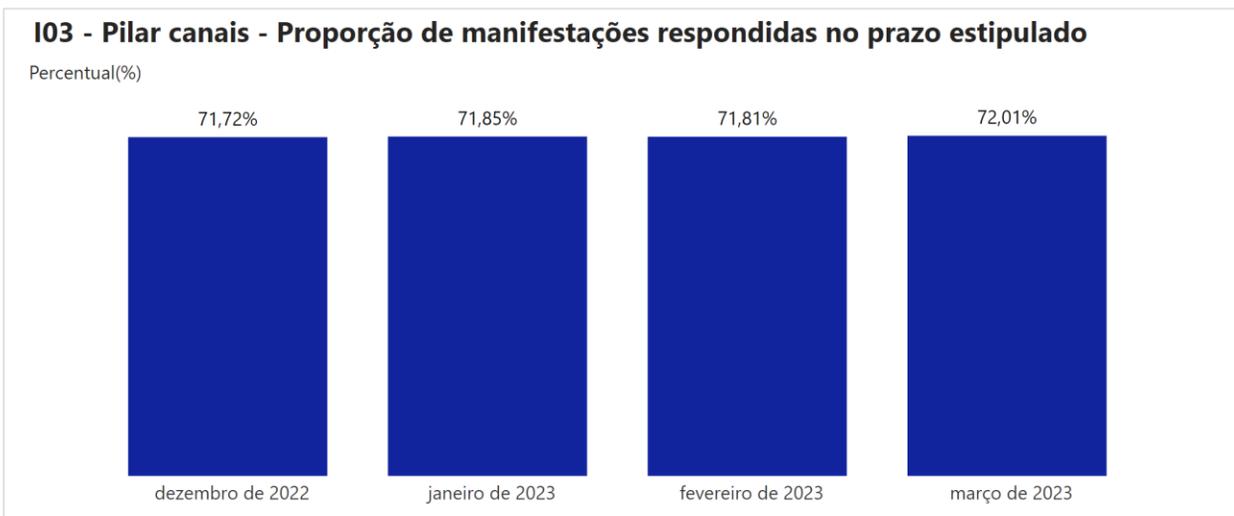


Gráfico 21: I03 - Pilar canais - Proporção de manifestações respondidas no prazo estipulado - Frequência Mensal




Gráfico 22: I04 - Pilar canais - Avaliação do atendimento pelos usuários das cias - Frequência Mensal

## Indicadores




Gráfico 24: I06 - Pilar canais - Satisfação com a resolução das solicitações - Frequência Mensal




Gráfico 23: I05 - Pilar canais - Avaliação do atendimento pelos usuários da central 0800 e fale conosco - Frequência Mensal

## Indicadores

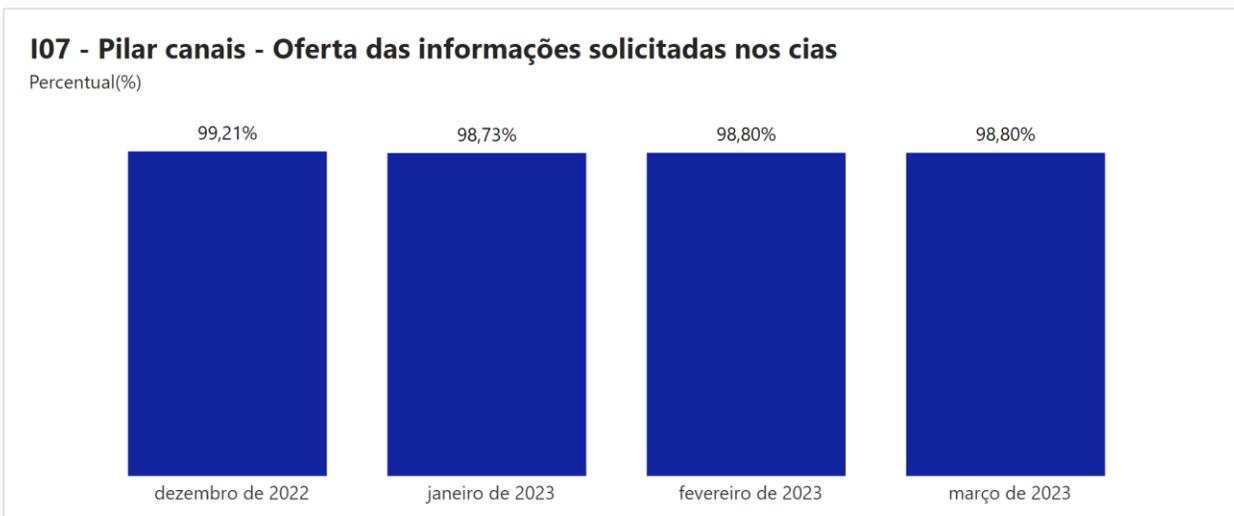


Gráfico 25: I07 - Pilar canais - Oferta das informações solicitadas nos cias - Frequência Mensal

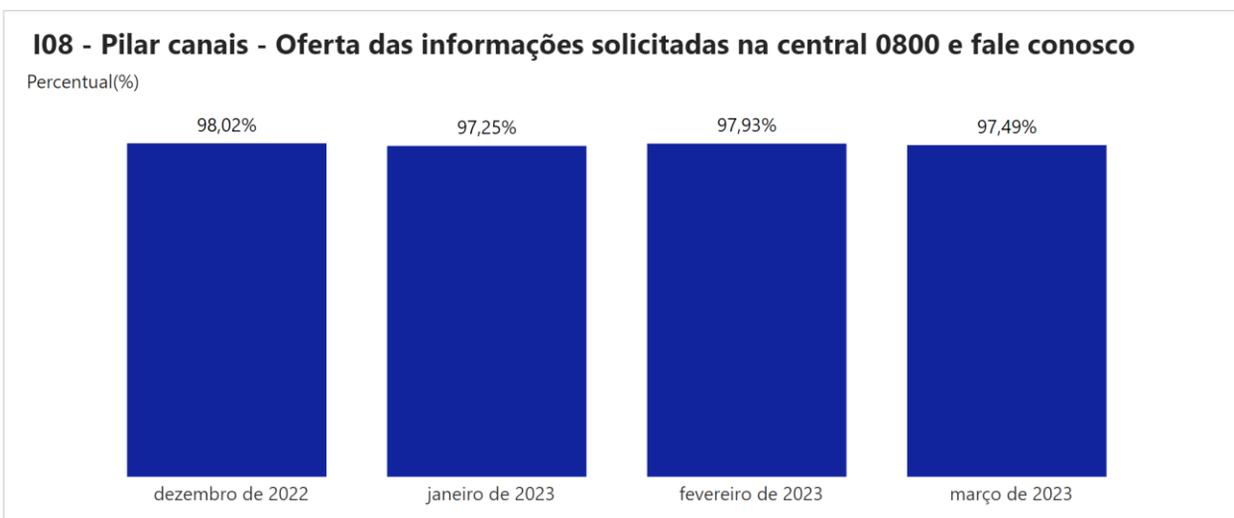


Gráfico 26: I08 - Pilar canais - Oferta das informações solicitadas na central 0800 e fale conosco - Frequência Mensal

## Indicadores

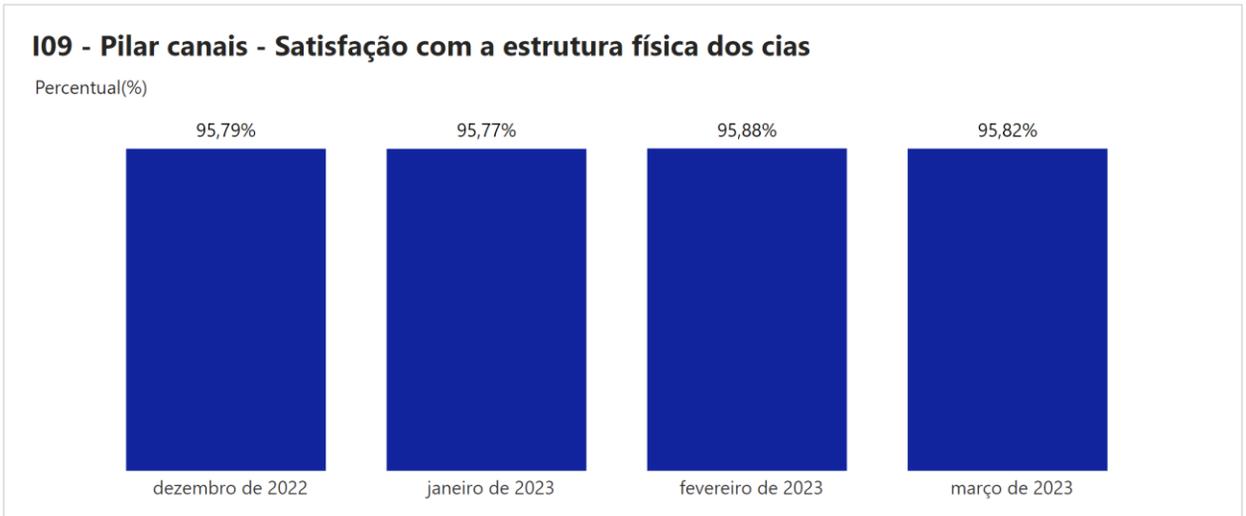


Gráfico 27: I09 - Pilar canais - Satisfação com a estrutura física dos cias - Frequência Mensal

## COMUNICAÇÃO

### Grandes números do pilar

#### 1º Semestre de 2022


DADO	jan	fev	mar	Acumulado no ano
Áudios produzidos	1	0	1	<b>2</b>
Carros de som produzidos	0	0	1	<b>1</b>
Cartazes produzidos	0	0	0	<b>0</b>
Cartilhas produzidos	1	0	0	<b>1</b>
E-mails de Marketing produzidos	0	0	0	<b>0</b>
Informes do Reassentamento produzidos	2	2	2	<b>6</b>
Jornais da Comunidade produzidos	31	25	23	<b>79</b>
matérias - Jornal Mural CIA - produzidos	44	12	56	<b>112</b>
Mídias Sociais produzidas	0	0	1	<b>1</b>
Newsletter produzidos	3	1	1	<b>5</b>
Outros itens produzidos	2	3	1	<b>6</b>
Panfletos produzidos	0	0	1	<b>1</b>
Pílulas de whatsapp produzidos	32	17	22	<b>71</b>
Rádios produzidos	32	15	35	<b>82</b>
Vídeos produzidos	8	6	5	<b>19</b>

# COMUNICAÇÃO

## Grandes números do pilar

Publicações por Território


Canais ● Áudio ● Carro de som ● Informe do Reassentamento ● Jornal da Comunidade ● Matéria – Jornal Mural CIA ● Mídia Social ● Newsletter ● Outros ● Panfleto ● Pílula ● Rádio ● Vídeo

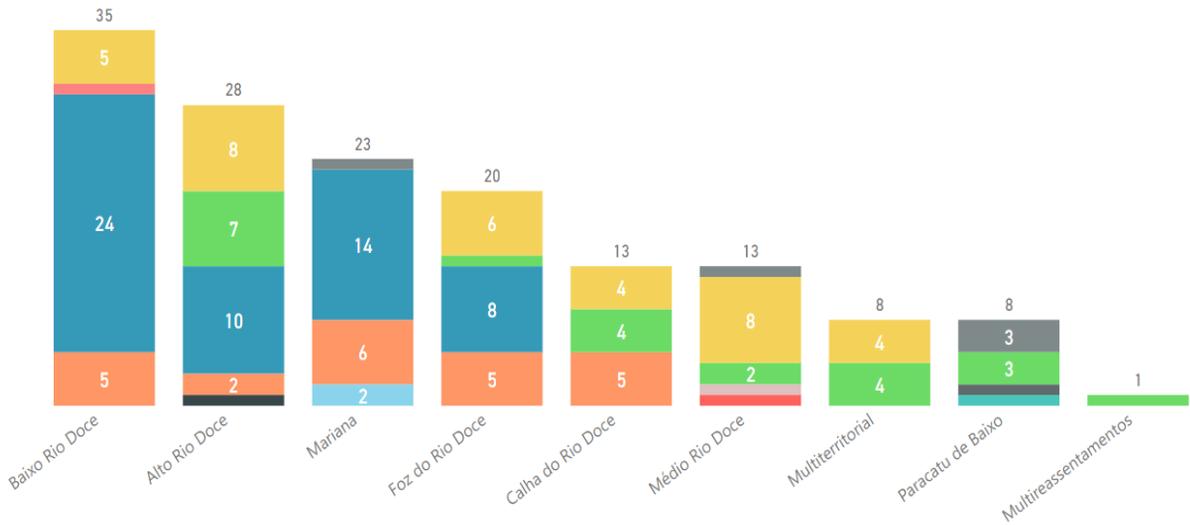

Observação: os números apresentados nas colunas dos reassentamentos de Bento Rodrigues, Gesteira e Paracatu de Baixo não são contabilizados na coluna do território de Mariana.

Principais Temas Veiculados

Canais ● Áudio ● Carro de som ● Informe do Reassentamento ● Jornal da Comunidade ● Matéria – Jornal Mural CIA ● Mídia Social ● Newsletter ● Outros ● Panfleto ● Pílula ● Rádio ● Vídeo

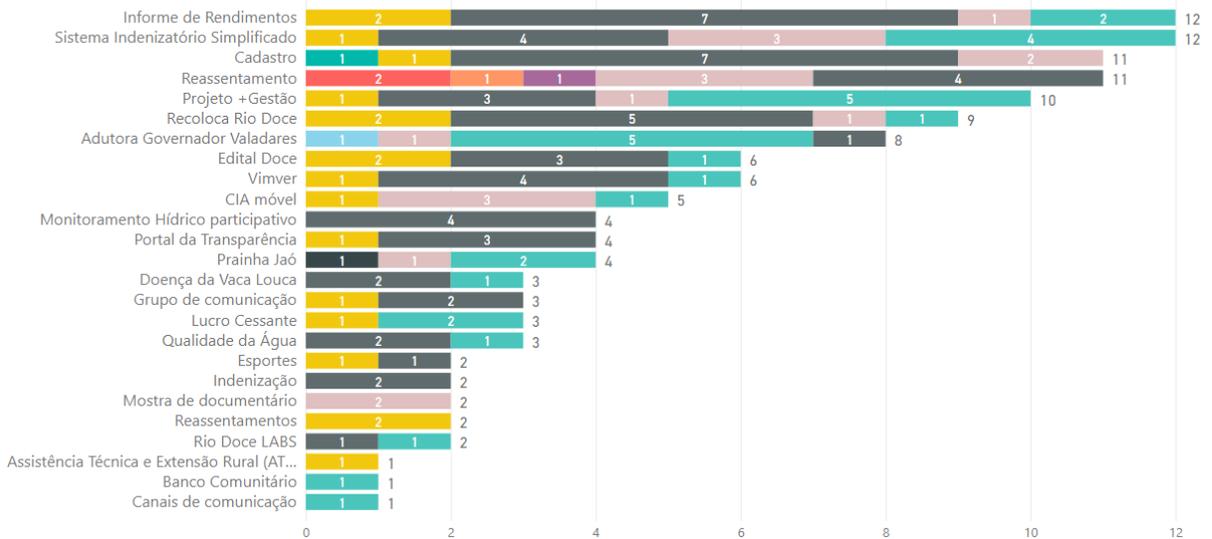

## Fatos relevantes do mês

### Territórios

#### Alto Rio Doce

Produção de matéria para atualização do mural do Centro de Informações e Atendimento de Barra Longa explicando o que é e como é o trabalho do grupo de Comunicação do Alto.

Produção de matéria para atualização do mural do Centro de Informações e Atendimento de Rio Doce explicando o que é e como é o trabalho do grupo de Comunicação do Alto.

Produção de pílula de WhatsApp convidando para o Vimver Barra Longa, vivência criada com um roteiro exclusivo para os moradores do município acompanharem a evolução da reparação no território.

Produção de programa de rádio (Momento da Reparação) convidando para o Vimver Barra Longa.

#### Baixo Rio Doce

Produção de matéria para mural do CIA de Aimorés sobre a ida do grupo de comunicação do Baixo, Alto e Mariana no VimVer da Foz

Produção de matéria para mural do CIA de Aimorés sobre o portal da transparência

Produção de matéria para mural do CIA de Baixo Guandu sobre a ida do grupo de comunicação do Baixo, Alto e Mariana no VimVer da Foz

Produção de programa de rádio (Momento da Reparação) informando sobre as matérias que saíram no boletim Repara Cidadão, como ele é produzido junto com a comunidade e onde as pessoas podem acessar o conteúdo no site.

## Fatos relevantes do mês

### Territórios

#### Baixo Rio Doce

Produção de matéria para a 9ª edição do boletim do território Baixo, Repara Cidadão, sobre o portal da transparência da Renova.

Produção de matéria para a 9ª edição do boletim do território Baixo, Repara Cidadão, sobre o VimVer que o grupo de comunicação do Baixo participou na Foz, juntamente com os grupos de Mariana, Alto e Foz.

Produção de matéria para mural do CIA de Baixo Guandu sobre o portal da transparência

Produção de matéria para mural do CIA de Colatina sobre a ida do grupo de comunicação do Baixo, Alto e Mariana no VimVer da Foz

Produção de matéria para mural do CIA de Resplendor sobre a ida do grupo de comunicação do Baixo, Alto e Mariana no VimVer da Foz

Produção de matéria para mural do CIA de Resplendor sobre o portal da transparência

#### Calha do Rio Doce

Produção de pílula de WhatsApp convidando moradores de Ipaba do Paraíso, em Santana do Paraíso, para CIA Móvel no dia 14/03.

Produção de pílula de WhatsApp convidando moradores do Macuco, em Timóteo, para CIA Móvel e reunião sobre a temática de indenização, no dia 07/03.

Produção de programa de rádio divulgando os destaques da edição do boletim Vozes do Território.

Publicação de matéria na 9ª edição do boletim Vozes do Território sobre o atendimento do CIA Móvel na Calha em 2023.

## Fatos relevantes do mês

### Imprensa

Recoloca Rio Doce tem 198 vagas de emprego para os Vales do Aço, Rio Doce e Mucuri.

Recoloca Rio Doce tem 186 vagas de emprego para os Vales do Aço, Rio Doce e Mucuri.

Projeto para fortalecimento de pequenas e médias empresas será lançado em Timóteo.

Projeto para fortalecimento de pequenas e médias empresas será lançado em Colatina.

Plataforma Recoloca Rio Doce tem mais de 900 vagas de emprego para Mariana e região.

Plataforma Recoloca Rio Doce tem mais de 600 vagas de emprego para Mariana e região.

Plataforma Recoloca Rio Doce tem mais de 330 vagas de emprego para Mariana e região.

Plataforma Recoloca Rio Doce tem mais de 300 vagas de emprego para Mariana e região.

Plataforma Recoloca Rio Doce está com vagas de emprego em municípios capixabas.

Nova adutora de Governador Valadares é inaugurada e começa a funcionar em fase de teste.

Moradores de Linhares têm até o dia 2 de abril para aderir ao Sistema Indenizatório Simplificado.

Fundação Renova inaugura as obras de revitalização da Prainha do Jaó em Tumiritinga.

Fundação Renova e Prefeitura de Mariana assinam plano de ação para a entrega de Paracatu de Baixo.

Cartilha com orientações para Declaração de Imposto de Renda de atingidos está disponível.

## Fatos relevantes do mês

### Suporte aos Programas

#### **Suporte ao PG001 Levantamento e Cadastro dos Impactados**

Publicação de matéria na 9ª edição do boletim Vozes do Território sobre o cadastro integrado que está sendo realizado pela Fundação Renova.

Produção de pílula de WhatsApp sobre o início do atendimento do cadastro em Barra Longa para quem solicitou cadastramento até 31/12/2021.

Produção de pílula de WhatsApp sobre o início do atendimento do cadastro em Barra Longa para quem solicitou cadastramento até 31/12/2021, com errata sobre data final para agendamento das entrevistas.

## Fatos relevantes do mês

### Suporte aos Programas

#### **Suporte ao PG001 Levantamento e Cadastro dos Impactados**

Produção de arquivo de áudio para WhatsApp sobre o início do atendimento do cadastro em Barra Longa para quem solicitou cadastramento até 31/12/2021.

Produção de matéria para o Jornal Mural do CIA de Mariana sobre cadastramento em Mariana

#### **Suporte ao PG002 Ressarcimento e Indenização dos Impactados**

Produção de pílula de WhatsApp comunicando que o informe de rendimentos para Declaração do Imposto de Renda já está disponível.

Produção de programa de rádio (Momento da Reparação) com informações sobre o Sistema Indenizatório Simplificado na região.

Produção de programa de rádio (Momento da Reparação) comunicando que o informe de rendimentos para Declaração do Imposto de Renda já está disponível.

Produção de programa de rádio (Momento da Reparação) informando que o pagamento dos lucros cessantes referente a 2022 já está sendo realizado pela Fundação Renova.

Publicação de matéria na edição 28 do Voz da Comunidade sobre declaração de Imposto de Renda

## Fatos relevantes do mês

### Suporte aos Programas

#### **Suporte ao PG002 Ressarcimento e Indenização dos Impactados**

Produção de programa de rádio informando que o pagamento os valores das indenizações pelo Sistema Indenizatório Simplificado estão sendo pagos com correção monetária.

Produção de programa de rádio (Momento da Reparação) informando que é possível corrigir o endereço do dano preenchido no Sistema Indenizatório Simplificado.

Produção de pílula de WhatsApp informando que o prazo de Adesão ao Sistema Indenizatório Simplificado em Linhares termina no dia 02/04.

Produção de pílula de WhatsApp informando que o pagamento os valores das indenizações pelo Sistema Indenizatório Simplificado estão sendo pagos com correção monetária.

Produção de pílula de WhatsApp informando que é possível corrigir o endereço do dano preenchido no Sistema Indenizatório Simplificado.

Produção de matéria para mural do CIA de Resplendor sobre a disponibilização do Informe de Rendimento para os atingidos

Produção de matéria para mural do CIA de Resplendor informando como corrigir o endereço do dano no sistema indenizatório simplificado

Produção de matéria para mural do CIA de Colatina sobre a disponibilização do Informe de Rendimento para os atingidos

Produção de matéria para mural do CIA de Colatina informando como corrigir o endereço do dano no sistema indenizatório simplificado

## Fatos relevantes do mês

### Suporte aos Programas

#### **Suporte ao PG002 Ressarcimento e Indenização dos Impactados**

Produção de matéria para a 9ª edição do boletim do território Baixo, Repara Cidadão, sobre como corrigir o endereço do dano no sistema indenizatório simplificado.

Produção de matéria para atualização do mural do Centro de Informações e Atendimento de Barra Longa sobre o processo de cadastro no território.

Produção de matéria para atualização do mural do Centro de Informações e Atendimento de Barra Longa sobre o recebimento do Informe de Rendimentos para a declaração de imposto de renda 2023.

Produção de matéria para atualização do mural do Centro de Informações e Atendimento de Linhares sobre a decisão da justiça de obrigatoriedade do pagamento de correção monetária também para os atingidos que foram pagos sem correção.

Produção de matéria para mural do CIA de Aimorés informando como corrigir o endereço do dano no sistema indenizatório simplificado

Produção de matéria para mural do CIA de Aimorés sobre a disponibilização do Informe de Rendimento para os atingidos

Produção de matéria para mural do CIA de Baixo Gaundu informando como corrigir o endereço do dano no sistema indenizatório simplificado

Produção de matéria para mural do CIA de Baixo Guandu sobre a disponibilização do Informe de Rendimento para os atingidos

Produção de matéria para o mural do CIA Linhares sobre a disponibilização do informa de rendimentos para a declaração do Imposto de Renda 2023.

## Fatos relevantes do mês

### Suporte aos Programas

#### **Suporte ao PG002 Ressarcimento e Indenização dos Impactados**

Produção de matéria para a edição de março do Jornal Voz da Foz sobre a disponibilização do informe de rendimentos para a declaração do imposto de renda 2023.

Produção de matéria para a edição de março do Jornal Voz da Foz sobre o pagamento do lucro cessante.

Produção de matéria para atualização do mural do Centro de Informações e Atendimento de Linhares sobre a possibilidade de corrigir o endereço do dano preenchido no Sistema Indenizatório Simplificado (Novel).

Produção de matéria para atualização do mural do Centro de Informações e Atendimento de Rio Doce sobre o recebimento do Informe de Rendimentos para a declaração de imposto de renda 2023.

#### **Suporte ao PG005 Programa de Proteção Social**

Produção de matéria para a 9ª edição do boletim do território Baixo, Repara Cidadão, sobre como funciona o programa de proteção social no território.

#### **Suporte ao PG008 Reconstrução de Vilas - Bento Rodrigues**

Informativo digital mensal com os avanços do processo de reassentamento para as famílias de Bento Rodrigues, em formato de vídeo.

Informativo digital mensal com os avanços do processo de reassentamento para as famílias de Bento Rodrigues.

Publicação de matéria na edição 28 do Voz da Comunidade sobre marco da Estrada Real em Bento Rodrigues

Vídeo mensal com imagens dos avanços físicos do novo distrito de Bento Rodrigues.

## Fatos relevantes do mês

### Suporte aos Programas

#### **Suporte ao PG008 Reconstrução de Vilas - Paracatu**

Produção de audiozap para reforço ao convite às famílias de Paracatu de Baixo para participarem da cerimônia de assinatura do termo de compromisso para a entrega de paracatu de Baixo, realizado em 24/03/2023.

Produção de fotos e vídeo em looping para exibição na cerimônia de assinatura do termo de compromisso para a entrega de paracatu de Baixo, realizado em 24/03/2023.

Produção de pílula convite de reforço para as famílias de Paracatu de Baixo participarem da cerimônia de assinatura do termo de compromisso para a entrega de paracatu de Baixo, realizado em 24/03/2023.

Produção de pílula convite para as famílias de Paracatu de Baixo participarem da cerimônia de assinatura do termo de compromisso para a entrega de paracatu de Baixo, realizado em 24/03/2023.

Produção de pílula de WhatsApp em atendimento à condicionante do reassentamento com o tema: Dia Nacional de conservação do solo.

Produção do vídeo em 1 minuto com os principais avanços das obras e ações realizadas no mês, com as famílias de Paracatu de Baixo.

Produção e distribuição da edição 49 do Informe de Paracatu de Baixo, informativo mensal orientado às famílias de Paracatu de Baixo.

Produção e distribuição do vídeo intraodutório sobre a edição número 49 do Informe de Paracatu de Baixo, informativo mensal direcionado para as famílias de Paracatu de Baixo.

Publicação de matéria na edição 28 do Voz da Comunidade sobre Memórias Afetivas e Reencontros de Paracatu de Baixo

## Fatos relevantes do mês

### Suporte aos Programas

#### **Suporte ao PG010 Recuperação das Demais Comunidades e Infraestruturas Impactadas**

Produção de pílula de Whatsapp para divulgação do evento de entrega da revitalização da Prainha do Jaó, em Tumiritinga/MG.

Produção de programa de rádio para divulgação do evento de entrega da revitalização da Prainha do Jaó, em Tumiritinga/MG.

Produção de programa de rádio para repercussão do evento de entrega da revitalização da Prainha do Jaó, em Tumiritinga/MG.

Produção de spot de carro de som para divulgação do evento de entrega da revitalização da Prainha do Jaó, em Tumiritinga/MG.

#### **Suporte ao PG012 Memória Histórica, Cultural e Artística**

Produção de cartaz para o Jornal Mural do CIA de Mariana sobre Encontro de Bonecos em Mariana

Produção de matéria para o Jornal Mural do CIA de Mariana sobre calendário das manifestações culturais

Produção de matéria para o Jornal Mural do CIA de Mariana sobre melhorias na biblioteca Pública de Mariana

Produção de matéria para o Jornal Mural do CIA de Mariana sobre Mostra Internacional de Mariana

## Fatos relevantes do mês

### Suporte aos Programas

#### **Suporte ao PG012 Memória Histórica, Cultural e Artística**

Produção de matéria para a edição 30 do boletim Terra da Gente contando sobre o Caminho de São José, as festas tradicionais de santos nas comunidades e como são apoiadas pela Fundação Renova.

Produção de pílula de WhatsApp convidando para a mostra de documentário das bandas civis de Barra Longa. A primeira foi sobre a Corporação Musical São José.

Produção de pílula de WhatsApp convidando para a mostra de documentário das bandas civis de Barra Longa. A segunda foi sobre a Corporação Musical Nossa Senhora do Carmo.

Produção de programa de rádio (Momento da Reparação) comunicando sobre a realização da Copa de Futsal RS no município de Rio Doce.

Publicação de matéria na edição 28 do Voz da Comunidade sobre calendário das manifestações culturais

#### **Suporte ao PG013 Turismo, Cultura, Esporte e Lazer**

Produção de matéria para a edição 30 do boletim Terra da Gente sobre um dos projetos selecionados no território pelo Edital Doce.

Produção de matéria para a edição de março do Jornal Voz da Foz sobre o projeto Mar de Tartarugas, em Povoação, apoiado pela segunda edição do Edital Doce.

Produção de matéria para o Jornal Mural do CIA de Mariana sobre Torneio Show de Bola

Publicação de matéria na edição 28 do Voz da Comunidade sobre torneio Show de Bola

## Fatos relevantes do mês

### Suporte aos Programas

#### **Suporte ao PG015 Promoção à Inovação**

Produção de matéria para o programa de rádio Momento da Reparação sobre os diagnósticos socioeconômicos produzidos para os bancos comunitários de Povoação e de Regência.

Produção de programa de rádio sobre o resultado do projeto Rio Doce Labs em Ipatinga.

#### **Suporte ao PG016 Retomada das Atividades Aquícolas e Pesqueiras**

Produção de matéria para atualização do mural do Centro de Informações e Atendimento de Linhares sobre o curso de condutor de turismo de pesca.

#### **Suporte ao PG017 Retomada das Atividades Agropecuárias**

Produção de matéria para atualização do mural do Centro de Informações e Atendimento de Barra Longa com explicações didáticas sobre a doença da Vaca Louca.

Produção de matéria para atualização do mural do Centro de Informações e Atendimento de Rio Doce com explicações didáticas sobre a doença da Vaca Louca.

Produção de pílula de WhatsApp convidando os produtores rurais de Barra Longa para o curso sobre nutrição e qualidade do leite.

Produção de programa de rádio (Momento da Reparação) com informações importantes a respeito da doença da vaca louca, cuidados, transmissão etc.

Produção de programa de rádio (Momento da Reparação) convidando para o curso sobre nutrição e qualidade de leite.

Publicação de matéria na 9ª edição do boletim Vozes do Território sobre o apoio a produtores rurais ds ATER.

Publicação de matéria na 9ª edição do boletim Vozes do Território sobre o Rota do Mutum, de Ipaba, projeto apoiado pelo Edital Doce.

## Indicadores




Gráfico 28: I01 - Pilar comunicação - Nível de acesso da população a informações sobre os programas atuantes no território - Frequência Anual




Gráfico 29: I02 - Pilar comunicação - Grau de compreensão dos atingidos sobre os programas executados pela Fundação Renova no território - Frequência Anual

## Indicadores

### I03 - Pilar comunicação - Conhecimento das ações de comunicação com o território

Pontos




Gráfico 30: I03 - Pilar comunicação - Conhecimento das ações de comunicação com o território - Frequência Anual

### I04 - Pilar comunicação - Percepção de qualidade da comunicação com o território

Pontos

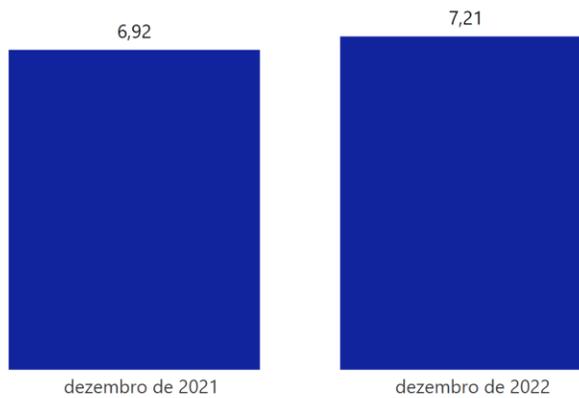


Gráfico 31: I04 - Pilar comunicação - Percepção de qualidade da comunicação com o território - Frequência Anual

## **PG007 Programa de Assistência aos Animais**

### **Eixo Terra e Água**

#### **Objetivo**

Assistência aos animais domésticos extraviados e desalojados pelo evento de rompimento da barragem de Fundão, na região de Mariana e Barra Longa, na forma prevista nas cláusulas 73 à 75 do TTAC.

## Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	73	Caput	Em andamento
Cláusula	74	a	Encerrada
Cláusula	74	b	Encerrada
Cláusula	74	c	Em andamento
Cláusula	74	d	Em andamento
Cláusula	74	e	Encerrada
Cláusula	74	f	Em andamento
Cláusula	74	g	Em andamento
Deliberação	226	2	Em andamento
Deliberação	328	1	Em andamento
Deliberação	328	2	Concluída Internamente
Deliberação	328	3	Em andamento
Deliberação	563	4	Em andamento

## Entregas do ano de 2023

- 26/12/2023 ● Deliberação 328, item 1: Projeto de geração de trabalho e renda a partir do Programa de Assistência aos Animais. Item 1) A Fundação Renova proceda a coleta e análise de amostras dos animais produtivos recolhidos na CATA-2, para verificação de substâncias
- 29/12/2023 ● Deliberação 563, item 3: A Câmara Técnica deverá reunir-se com a Fundação Renova para discutir e definir o escopo do projeto de diagnóstico

## **Grandes números do programa**

- 1,333 registros de prontuários de atendimentos internos, sendo 162 adoções, 467 devoluções, 200 óbitos, 13 extravios, 30 registros de dados insuficientes de destinação e 461 animais sob a guarda temporária da Fundação Renova;
- Atualmente existem 351 bovinos, 65 equinos, 23 caninos, 18 Suínos, 4 muas sob a guarda temporária da Fundação Renova nos Centros de Acolhimento Temporário de Animais 1 e 2;
- No âmbito de atendimentos externos do programa, foram registrados 1,878 prontuários médicos para animais atendidos nas propriedades de origem ou em situação de moradia temporária.

## Fatos relevantes do mês

Não houve fatos relevantes no mês.

## Indicadores

### I01 - Porcentagem de conformidade em bem-estar animal nos Centros de Acolhimento Temporário de Animais (CATA 1 e 2)

Meta Global: 80%  
Percentual(%)

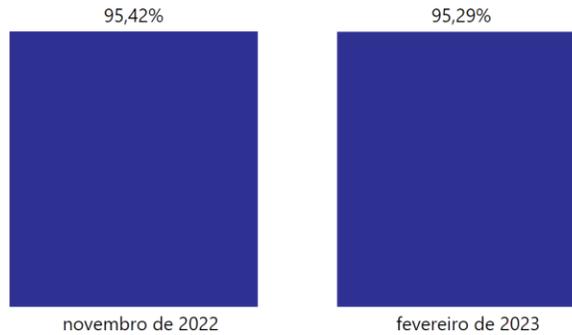


Gráfico 1:I01 - Porcentagem de conformidade em bem-estar animal nos Centros de Acolhimento Temporário de Animais (CATA 1 e 2) - Frequência Trimestral

Os resultados apontados nos gráficos a seguir são referentes à aferição do indicador de conformidade em bem-estar animal no período da estação de verão (fevereiro de 2023).

O cronograma 2023 de reporte de resultados deste indicador tem como base o período intermediário de cada estação climática (verão, outono, inverno e primavera), e deverá seguir a seguinte previsão de atualização em relatório:

- Outono de 2023: Relatório de junho de 2023 (ref. maio/23);
- Inverno de 2023: Relatório de setembro de 2023 (ref. agosto/23);
- Primavera de 2023: Relatório de dezembro de 2023 (ref. novembro/23).

## Indicadores de Acompanhamento

O resultado por espécie para o indicador Porcentagem de conformidade em bem-estar animal nos CATA 1 e 2 está apresentado a seguir:

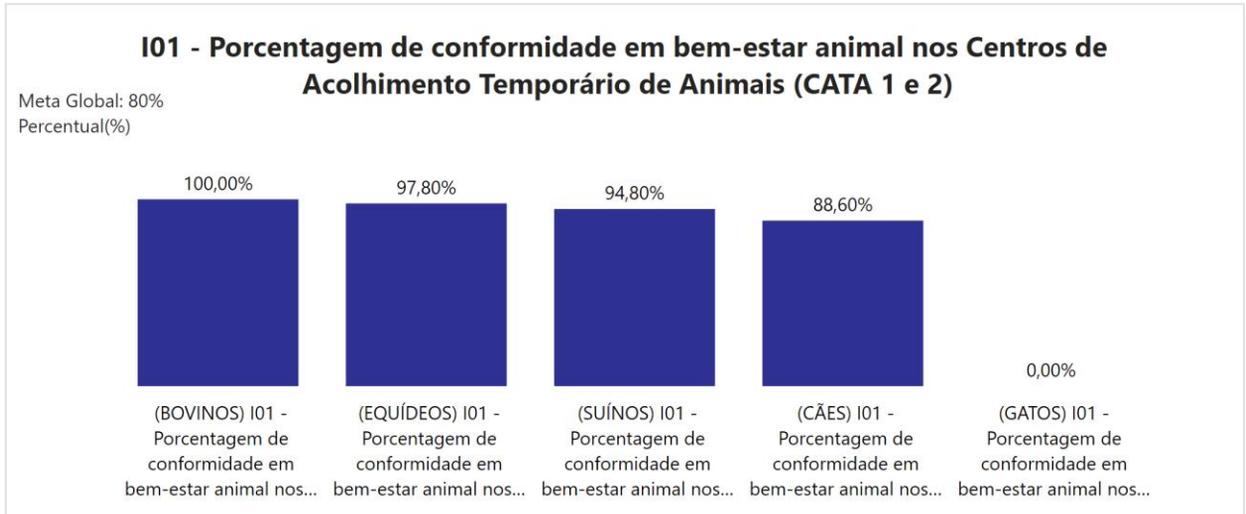


Gráfico 2: I01 - Porcentagem de conformidade em bem-estar animal nos Centros de Acolhimento Temporário de Animais (CATA 1 e 2) - Frequência Trimestral

Os desvios apresentados em relação à meta não são significativos do ponto de vista de atendimento aos quesitos mínimos de bem-estar animal. A metodologia utilizada prevê um padrão no escalonamento dos diferentes graus, de modo que ações possam ser tomadas prioritariamente em formato preventivo.

GRAU DE BEM-ESTAR	REFERÊNCIA EM %
Muito Alto	≥ 90%
Alto	≥ 80%
Regular	≥ 60%
Baixo	≥ 30%
Muito Baixo	≤ 29%

Quadro 1: Percentuais de referência para os 5 graus de bem-estar

## Indicadores

### I02 - Porcentagem de animais em processos adotivos finalizados

Meta Global: 100%  
Percentual(%)




Gráfico 3: I02 - Porcentagem de animais em processos adotivos finalizados - Frequência Bimestral

No bimestre de janeiro e fevereiro de 2023 houve uma ocorrência de finalização de adoção, alterando o valor identificado no mês anterior para 98,7%.

## Indicadores

### I03 - Porcentagem de animais sob guarda temporária restituídos na fase de reassentamento

Meta Global: 100%

Percentual(%)



Gráfico 4: I03 - Porcentagem de animais sob guarda temporária restituídos na fase de reassentamento- Frequência Bimestral

No bimestre de janeiro e fevereiro de 2023 não houve ocorrências de novas restituições definitivas de animais. A variação entre os dois últimos bimestres se deu em função de novos registros de animais sob guarda da Fundação Renova provenientes do fluxo de entradas e saídas (nascimentos, recolhimentos, restituições, óbitos e/ou extravios), conforme previsto no indicador.

## Indicadores

### I04 - Porcentagem de finalização dos acompanhamentos pós-ocupação

Meta Global: 100%  
Percentual(%)




Gráfico 5: I04 - Porcentagem de finalização dos acompanhamentos pós-ocupação - Frequência Bimestral

No bimestre de janeiro e fevereiro de 2023 não houve ocorrências de novas restituições definitivas de animais.

O planejamento 2023 de reporte de resultados para os indicadores I02, I03 e I04 deverá seguir a previsão de atualização em relatório conforme descrito a abaixo:

- Bimestre março/abril: Relatório de maio de 2023 (ref. abril/23);
- Bimestre maio/junho: Relatório de julho de 2023 (ref. junho/23);
- Bimestre julho/agosto: Relatório de setembro de 2023 (ref. agosto/23);
- Bimestre setembro/outubro: Relatório de novembro de 2023 (ref. outubro/23).

## **PG008 Reconstrução de Vilas**

### **Eixo Reconstrução e Infraestrutura**

#### **Objetivo**

Reconstrução, recuperação e realocação das famílias que sofreram deslocamento físicos e/ou econômicos das localidades de Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo, Gesteira e famílias impactadas residentes na área rural às margens do Rio Gualaxo do Norte com projetos específicos por localidade. Após a conclusão da reconstrução e do reassentamento será realizado o monitoramento dos reassentamentos com abrangência dos programas sociais nas localidades por até 36 meses.

## Projeto Reconstrução de Vilas

### Status Cláusulas e Deliberações

Cláusula	76	Caput	Judicializada
Deliberação	257	1	Concluída Internamente
Deliberação	96	2	Concluída Internamente
Deliberação	96	4	Concluída Internamente

## **Projeto Reconstrução de Bento Rodrigues**

### **Entregas do ano de 2023**

Excepcionalmente esse mês não será reportada a timeline referente ao programa, pois as datas estão em atualização. No próximo ciclo os dados serão reportados.

## **Projeto Reconstrução de Bento Rodrigues**

### **Grandes números do projeto**

#### **Social:**

- 188 famílias atendidas (com novos núcleos);
- 196 atendimentos com termos de opção ao reassentamento assinados (TOR);
- 18 atendimentos para bens de uso coletivo;
- 200 atendimentos para casas;
- 33 atendimentos para lotes vagos;
- 2 bens coletivos interrompidos;
- 13 construções de edificações (casa, comércio e misto) interrompidas;
- 6 estruturações de lotes vagos interrompidos.

#### **Pecúnia:**

- 21 termos de aceite - Pecúnia – assinados.

#### **Obras:**

- 39 construções de edificações (casa, comércio e misto) com obras iniciadas;
- 123 edificações (casa, comércio e misto) concluídas (com TERP);
- 3 construções de bens coletivos com obras iniciadas;
- 7 construções de bens coletivos concluídas (com TERP);
- 5 estruturações de lotes vagos com obras iniciadas;
- 15 estruturações de lotes vagos com obras concluídas (com TERP);
- 102 habite se para edificações (casas, comércios e mistos) obtidos.

## **Projeto Reconstrução de Paracatu de Baixo**

### **Entregas do ano de 2023**

Excepcionalmente esse mês não será reportada a timeline referente ao programa, pois as datas estão em atualização. No próximo ciclo os dados serão reportados.

## **Projeto Reconstrução de Paracatu de Baixo**

### **Grandes números do projeto**

#### **Social:**

- 72 famílias atendidas (com novos núcleos);
- 69 atendimentos com termos de opção ao reassentamento assinados (TOR);
- 14 atendimentos para bens de uso coletivo;
- 63 atendimentos para casas;
- 4 atendimentos para lotes vagos;
- 0 bens coletivos interrompidos;
- 6 construções edificações (casa, comércio e misto) interrompidas;
- .....
- 2 estruturações de lotes vagos interrompidos;
- 0 Sítios interrompidos;
- 16 Total de atendimentos para sítios.

#### **Pecúnia:**

- 7 termos de aceite - Pecúnia – assinados.

#### **Obras:**

- 15 construções de edificações (casa, comércio e misto) com obras iniciadas;
- 38 edificações (casa, comércio e misto) concluídas (com TERP);
- 11 construções de bens coletivos com obras iniciadas;
- 0 construções de bens coletivos concluídas (com TERP);

## **Projeto Reconstrução de Paracatu de Baixo**

### **Grandes números do projeto**

- 0 estruturações de lotes vagos com obras iniciadas;
- 2 estruturações de lotes vagos com obras concluídas (com TERP);
- 34 habite se para edificações (casas, comércios e mistos) obtidos;
- 1 Sítios com obra iniciada;
- 7 Sítios com Obras Concluídas (Com TERP) .

## **Projeto Reconstrução de Paracatu de Baixo**

### **Fatos relevantes do mês**

Finalização de obra do ID60.

Finalização de obra do ID37.

Finalização de obra do ID33.

Finalização de obra do ID25.

## **Projeto Reconstrução de Gesteira**

### **Entregas do ano de 2023**

Devido a judicialização do Reassentamento de Gesteira, não há entregas previstas.

## **Projeto de reconstrução de Gesteira**

### **Grandes números do projeto**

#### **Social:**

37 famílias atendidas;

31 famílias com acordos homologados;

24 edificações adquiridas;

6 pagamentos de acordos (sem aquisição de imóvel);

1 edificações em aquisição.

## **Projeto Reassentamento Familiar e Reconstruções**

### **Entregas do ano de 2023**

Excepcionalmente esse mês não será reportada a timeline referente ao programa, pois as datas estão em atualização. No próximo ciclo os dados serão reportados.

## **Projeto Reassentamento Familiar e Reconstruções**

### **Grandes números do projeto**

#### **Social:**

- 106 famílias atendidas (com novos núcleos);
- 3 construções edificações (casa, comércio e misto) interrompidas;
- 2 estruturações de lotes vagos interrompidos;
- 13 famílias atendidas na modalidade reconstrução;
- 94 imóveis adquiridos.

#### **Pecúnia:**

- 134 termos de aceite - Pecúnia – assinados.

#### **Obras:**

- 0 reconstruções de edificações com obras iniciadas;
- 0 reconstruções de edificações com obras interrompidas;
- 15 reconstruções de edificações com obras concluídas;
- 16 edificações da modalidade de reconstrução;
- 13 edificações (casa nova e reforma) com obras iniciadas;
- 32 edificações (casa nova e reforma) com obras concluídas (com TERP, TRR e autogestão);
- 0 estruturações de lotes vagos com obras iniciadas;
- 3 estruturações de lotes vagos com obras concluídas (com TERP, TRR e autogestão);
- 18 habite se para edificações (casa, reforma, comércio e misto) obtidos.

## **Projeto Reassentamento Familiar e Reconstruções**

### **Grandes números do projeto**

#### **Repasse de verba:**

Reassentamento Familiar: Repasse de Verba (Autogestão, APRO30 e Repasse para Reforma) 37 .

#### **Moradia Temporaria:**

265 atendimentos temporários disponibilizados (compensação financeira, aluguel e hotel) .

## Projeto Reassentamento Familiar e Reconstruções

### Grandes números do projeto - Notas

#### Notas

Nome do dado	Resultado	Observações
Total de atendimentos em moradias temporárias (compensação financeira, aluguel e hotel)	265	O número informado em jan.23 foi 266, o correto é 278.  O número informado em fev.23 foi 262, o correto é 272.

## **Projeto Reassentamento Familiar e Reconstruções**

### **Fatos relevantes do mês**

Homologação ID87.

## **PG009 Recuperação do Reservatório da UHE Risoleta Neves**

### **Eixo Terra e Água**


#### **Objetivo**

Restabelecimento das condições de operação da Usina Hidrelétrica Risoleta Neves por meio da implantação de ações de desassoreamento na área de alagamento da hidrelétrica e de reparo de infraestrutura.

## Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	79	Caput	Judicializado
Cláusula	150	§3º	Judicializado
Deliberação	30	N/A	Concluído internamente
Deliberação	80	2.1	Judicializado
Deliberação	80	2.2	Concluído internamente
Deliberação	80	4.1	Concluído internamente
Deliberação	80	4.2	Concluído internamente
Deliberação	225	2	Judicializado
Deliberação	286	3	Concluído internamente

## Timeline de Entregas do Programa

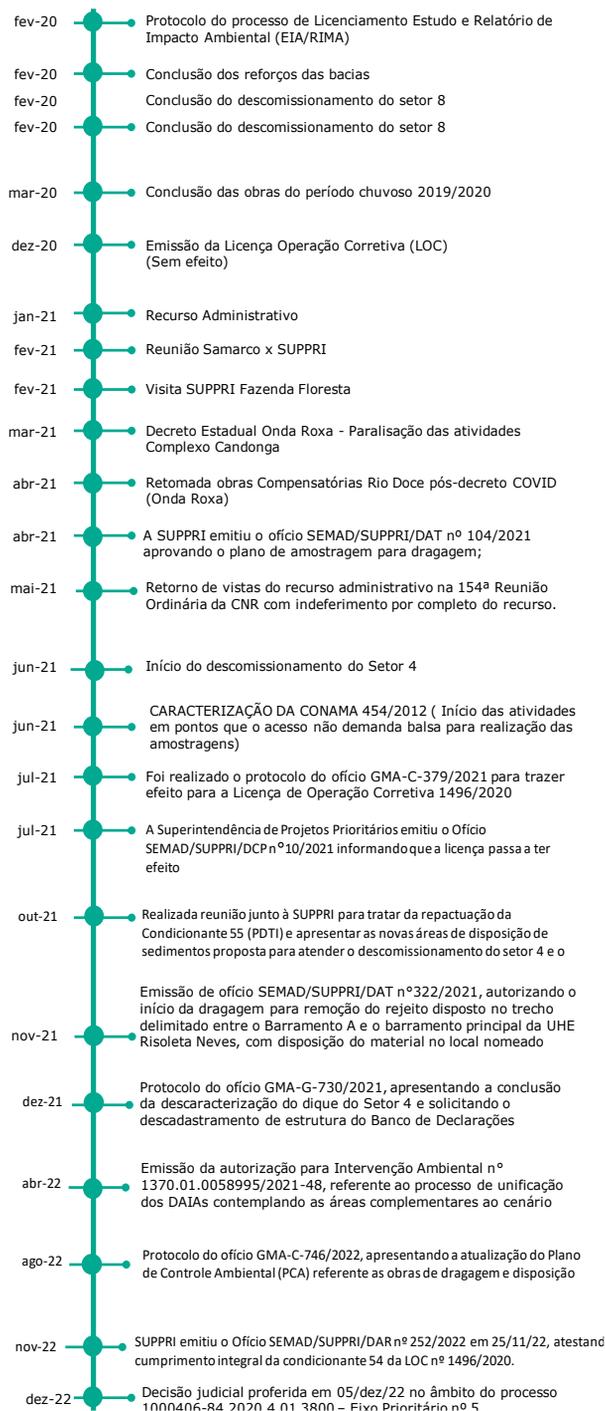

## Grandes números

- **1ª fase** – período emergencial 959 mil m<sup>3</sup> de material foram bombeados do reservatório da Usina Risoleta Neves para as áreas de disposição.
- **2ª fase** – Em cumprimento da LOC 1496/2020, após analisados resultados da cond. 38 (caracterização dos sedimentos conforme CONAMA 454/2012), foi autorizada pela SUPPRI a retomada na remoção dos sedimentos nas proximidades do barramento principal, considerando as informações conhecidas e descritas no EIA/RIMA, visando num primeiro momento a retomada da UHE Risoleta Neves.

Até a data de 25/12/2022:

- O volume de sedimentos removidos do reservatório foi de **505.837 m<sup>3</sup>**.
- Na obra de reforço do barramento principal da UHE Risoleta Neves, foram executados **19.600 m<sup>3</sup>** de concreto distribuídos entre os blocos BME1, BME2, BME3, BME4, BME5, BME6, BMD1, BMD3, BMD4, BMD5, BMD6 e BML.

## FATOS RELEVANTES DO MÊS

Disposição de Sedimentos Provenientes do Reservatório da UHE (área dos 400m)

- Descaracterização das estruturas de disposição temporária



*Figura 1 – Remoção de sedimentos da estrutura ADP8 / AAS1 para área de contrapilamento*



*Figura 2 – Remoção de sedimentos setor 5 para bacia 2*

## Plano de Chuvas 2022/2023



*Figura 3 - Enrocamento - Bacia 4*



*Figura 4 - Sump argamassado - ASS1*



*Figura 5 - Canal argamassado*



*Figura 6 - Adequação de acesso - Contrapilhamento*



*Figura 7 - Remoção de solo - DP1*



*Figura 8 - Aterro sump - Bacia 1*

•Atividades de Limpeza das UGs:

**Status atual:**

As atividades de limpeza da tomada d’água e da saída d’água foram concluídas.

Em relação ao canal de fuga, as atividades foram interrompidas em virtude do volume de chuvas. Ao término do período chuvoso 2022/23 será realizada nova batimetria para avaliar a necessidade de prosseguir com a atividade.

•Atividades de Reabilitação das UGs

Status do Comissionamento das Unidades de Geração 05/04/2023

<b>Unidade de Geração Geral</b>	<b>80%</b>	<b>100%</b>	<b>2%</b>
<b>Comissionamento sem água</b>	<b>UG1</b>	<b>UG2</b>	<b>UG3</b>
Pré-requisitos	100%	100%	0%
Comissionamento a Seco	100%	100%	0%
Sistemas Auxiliares da Turbina	100%	100%	0%
Sistema de Resfriamento	100%	100%	0%
Ensaio no Gerador	100%	100%	100%
Regulador de Velocidade	97%	100%	0%
Distribuidor e Rotor	88%	100%	0%
Regulador de Tensão	100%	100%	0%
Proteção	100%	100%	0%
SDSC - Controle	0%	100%	0%
Comporta Tomada d’água	100%	100%	100%
<b>Comissionamento com água</b>	<b>UG1</b>	<b>UG2</b>	<b>UG3</b>
Ensaio de Trip	100%	100%	0%
Ensaio prévio aos Dinâmicos	100%	100%	0%
Ensaio Sistema de Resfriamento com	100%	100%	0%
Giro Mecânico	94%	100%	5%
Sincronismo	0%	100%	0%
Rejeição de Carga	0%	100%	0%
Desmontagem / Inspeção de Mancal e	100%	100%	0%
Montagem do Mancal e Vedação do Eixo	100%	100%	0%
Ensaio em Carga	0%	100%	0%
Gateway ONS		100%	

Tabela 1 – Estágios de comissionamento das UGs

## ➤ **MONITORAMENTO DAS ESTRUTURAS**

**Nota:** As informações apresentadas não coincidem necessariamente com o mês de referência do reporte em função dos prazos necessários ao tratamento dos dados.

### ✓ **Destaques:**

- Os levantamentos batimétricos dos barramentos metálicos permaneceram sem evolução. As análises de estabilidade considerando as estruturas submersas estão em andamento pela projetista.
- O monitoramento dos piezômetros e medidores de nível d'água do Setor 11 não apresentou variações significativas no período.
- O monitoramento dos deslocamentos na Fazenda Floresta permaneceu sem pontos de destaque.
- Não foram observadas novas anomalias que pudessem caracterizar processos de instabilização nas estruturas de Candonga no período.

## ➤ **MONITORAMENTO AMBIENTAL**

**Nota:** Informações de monitoramento e fotos apresentadas referem-se ao período da campanha, o qual não adere completamente ao mês de referência do reporte em função dos prazos necessários ao tratamento dos dados. As imagens visam representar os locais quando da realização das amostragens.

### ✓ **Monitoramento de Efluentes – Bacia 2**

- Ponto seco, haja vista que não havia efluente chegando à bacia 2.

### ✓ **Monitoramento de Efluentes – Bacia 1**

- Entrada: Bombeamento realizado nos dias 02, 03 e 04/02. Sem desvios.
- Saída: Ponto seco, haja vista que não havia bombeamento ou vertimento por gravidade da Bacia 1 para o Doce.

### ✓ **Monitoramento Hídrico Superficial (Qualidade da água superficial)**

Conforme mencionado no relatório anterior:

#### Conclusões / considerações:

- O ponto de monitoramento Córrego Micaela Montante, proposto nos planos de monitoramento dos estudos de licenciamento localiza-se dentro da Área Diretamente Afetada (ADA). Por conceito esse ponto poderá sofrer impactos provenientes do empreendimento e a qualidade deve ser garantida à jusante da ADA (que se finda no Dique Micaela).
- Especificamente no que tange aos parâmetros Ferro, Manganês e Alumínio, Candonga está localizada a menos de 5 km do cinturão do grupo Dom Silvério, composto por rochas ultramáficas, o que reforça fortemente o indicativo de que os índices encontrados no monitoramento refletem o background da região.
- Os estudos de valores de referência concluirão sobre essas hipóteses.

- Síntese conclusiva – Córrego Micaela:
  - Desvios de Manganês nos pontos de montante e jusante. O manganês se configura como background da região.
  
- Síntese conclusiva – Córrego dos Borges
  - Desvios de Alumínio dissolvido, Cor Verdadeira e Manganês no ponto de montante e Manganês a jusante. Não há atividades do projeto na vertente do córrego dos Borges e os desvios já foram visualizados no ponto de montante, em local sem possibilidade de interferência pelo empreendimento.
  
- Síntese conclusiva – Rio de Peixe:
  - Desvios de Alumínio dissolvido (montante e jusante), cor verdadeira (jusante), manganês (montante e jusante). Não há drenagens do empreendimento direcionadas para o rio de Peixe e portanto os desvios não guardam nexo causal com o empreendimento.
  
- Síntese conclusiva – Ponto de Monitoramento Fazenda Jerônimo
  - Não houve desvio no período. Este monitoramento é feito em área brejosa estagnada. Foi proposto na atualização do PCA a retirada deste da relação de pontos de monitoramento devido à interferência de áreas de terceiros entre a disposição passada e a área brejosa supracitada.
  
- ✓ **Monitoramento Atmosférico**
  - Sem registros. Caso venham a ocorrer eventos que ultrapassem o limite permitido, será realizada análise de causa do incidente. Nestes casos, a Samarco irá comunicar a investigação do incidente via ofício à SUPRAM à FEAM/GESAR e também acusará o evento no relatório CIF.

## Monitoramento Subterrâneo



Figura 9 - Localização Nascente 2



Figura 10 - Nascente 2

### **Conclusões / considerações finais**

- A Nascente 2 apresentou desvios Ferro e Manganês no período no monitoramento.

**Nota:** Os estudos em desenvolvimento avaliarão os valores de referência para se confirmar ou refutar a hipótese de background.

#### ✓ **Monitoramento futuro: Instalação dos Poços de Monitoramento**

- Foram perfurados os 4 poços de monitoramento na Fazenda Fervedouro. (FER-PM-PROP-01, FER-PM-PROP-02, FER-PM-PROP-03 e FER-PM-PROP-04); e dois poços de monitoramento na Fazenda Floresta (FLOR-PM-PROP-04 e LOR-PM-PROP-05). Em fevereiro foram iniciadas as atividades de desenvolvimento dos poços de monitoramento na Fazenda Fervedouro. O status das atividades se mantém, em andamento as atividades de desenvolvimento dos poços de monitoramento.

#### ✓ **Monitoramento de Ruídos e Vibração**

- Não foram identificados registros de ocorrências de desvios dos níveis de ruído e vibração nas comunidades monitoradas (rurais: Viana, Gerônimo, Florestinha, Pedra do Escalvado, Marimbondão, Funil, Buraco, área rural de Rio Doce e área rural de Santa Cruz do Escalvado). Predominantemente residenciais: Santana do Deserto, Tapera, Sede Rio Doce, Pontal, Novo Soberbo e Porto Plácido).

## Indicadores

Os indicadores do PG009 que foram implementados e estão em medição, encontram-se apresentados nos gráficos a seguir:

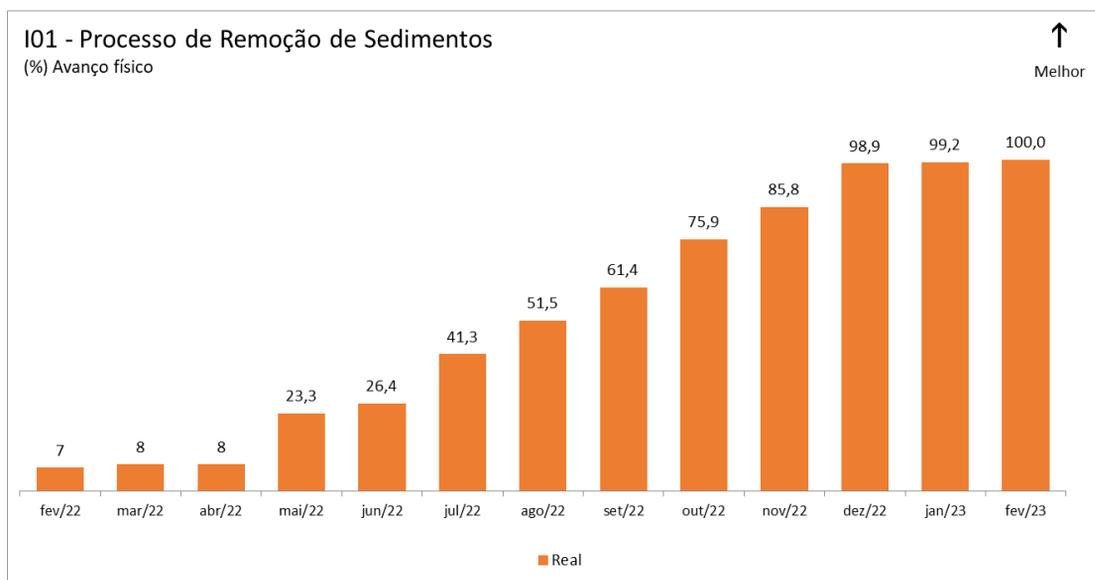


Gráfico 1 - Avanço físico do processo de remoção de sedimentos. Gráfico Acumulado.

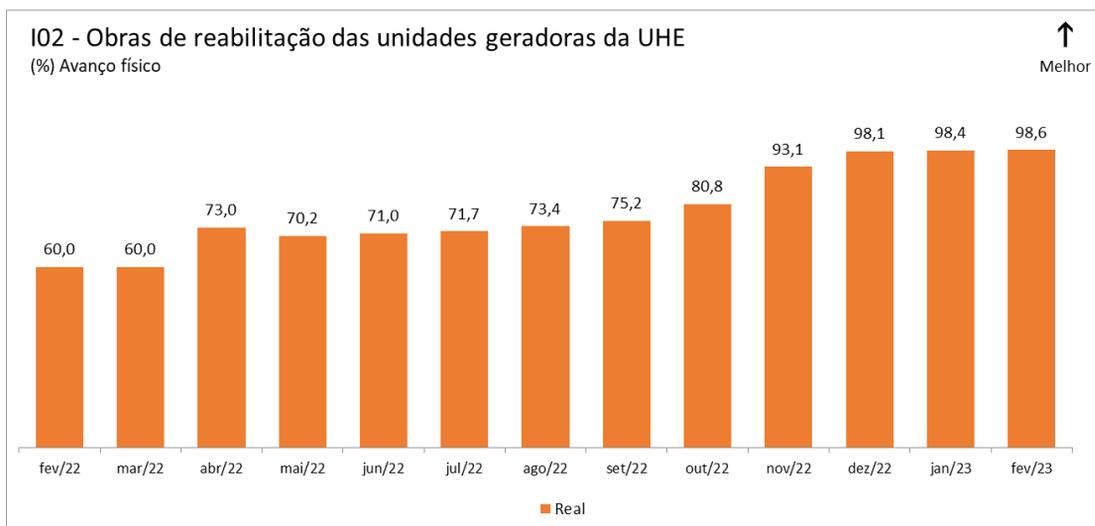


Gráfico 2 - Obras de reabilitação das unidades geradoras da UHE. Gráfico Acumulado.

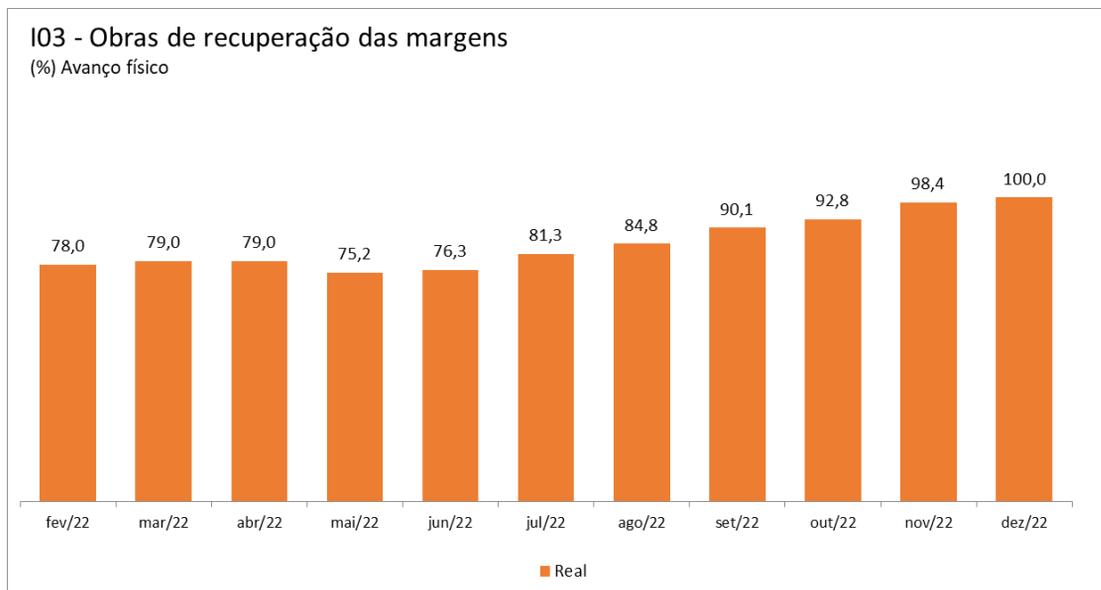


Gráfico 3 - Avanço físico as obras de recuperação das margens. Gráfico Acumulado.

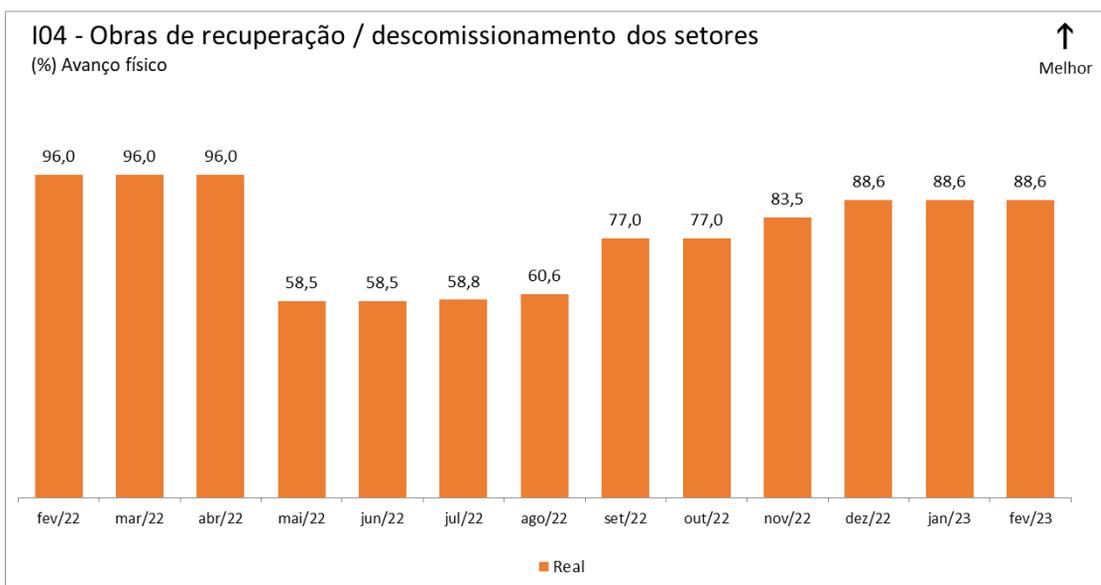


Gráfico 4 - Avanço físico obras de descaracterização/descomissionamento dos setores

**Nota:** A partir do mês de maio/22, os indicadores apresentados são compatíveis com o Cronograma-Cenário de Retomada da UHE, no qual estão contempladas todas as atividades necessárias para que sejam atingidas as condições operacionais da UHE, tendo em vista que a LOC 1496/2020 autorizou prioritariamente todas as atividades previstas para retomada da usina.

## **PG010 Programa de recuperação das demais comunidades e infraestruturas impactadas entre Fundão e Candonga**

### **Eixo Reconstrução e Infraestrutura**

#### **Objetivo**

Executar as atividades de recuperação e reconstrução das infraestruturas danificadas pelo evento tais como: reestabelecimentos de acessos, limpeza e retirada de resíduos nas estruturas impactadas, entulho e detritos decorrentes do evento de rompimento da barragem de Fundão, demolição de estruturas comprometidas remanescentes e consequente limpeza, reconstrução de pontes, reconstrução ou reforma de cercas, currais e paiol, drenagem, reconstrução ou reforma de igrejas e outros templos religiosos, reconstrução ou reforma de campos de futebol e espaços de prática esportiva de acesso público, reconstrução ou reforma de centros comunitários, praças e locais públicos de lazer, reconstrução ou reforma de poços artesianos e pinguelas, recuperação ou reforma das vias de acessos impactadas pelo evento, contenções de taludes e encostas para acessos, reconstrução ou reforma das unidades habitacionais impactadas, reconstrução e recuperação das estruturas de educação e saúde impactadas. Cláusulas: 82 a 88.

## Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	82	§2º	Judicializada
Cláusula	82	§3º	Judicializada
Cláusula	82	Caput	Judicializada
Cláusula	84	a	Em andamento
Cláusula	84	b	Em andamento
Cláusula	84	c	Em andamento
Cláusula	84	d	Em andamento
Cláusula	84	e	Em andamento
Cláusula	84	f	Em andamento
Cláusula	84	g	Em andamento
Cláusula	84	h	Em andamento
Cláusula	84	i	Em andamento
Cláusula	84	j	Em andamento
Cláusula	84	k	Em andamento
Cláusula	84	l	Em andamento
Cláusula	84	m	Judicializada
Cláusula	84	n	Em andamento
Cláusula	84	o	Em andamento
Cláusula	84	p	Em andamento
Cláusula	84	q	Em andamento
Cláusula	84	r	Em andamento
Cláusula	84	s	Em andamento
Cláusula	87	Caput	Em andamento
Cláusula	88	Caput	Judicializada

Deliberação	127	1.1	Concluída Internamente
Deliberação	127	1.4	Concluída Internamente
Deliberação	127	1.5	Concluída Internamente
Deliberação	127	1.6	Concluída Internamente
Deliberação	190	1	Concluída Internamente
Deliberação	190	2	Judicializada
Deliberação	191	1	Concluída Internamente
Deliberação	207	1	Judicializada
Deliberação	207	2	Judicializada
Deliberação	217	2	Em andamento
Deliberação	217	3	Em andamento
Deliberação	217	4	Concluída Internamente
Deliberação	23	2	Em andamento
Deliberação	24	2	Em andamento

## Entregas do ano de 2023

março de 2023	●	Reconstrução de Pontes - Entrega da Obra (Ponte e Passarela Santa Rita)
março de 2023	●	Reconstrução de Pontes - Entrega da Obra (Nova Ponte Bento Rodrigues)
junho de 2023	●	Reconstrução de Estruturas de Apoio - Entrega da Obra (Curral)
novembro de 2023	●	Reconstrução de Campos de Futebol - Entrega da Obra (Campo de Futebol Ponte do Gama)
dezembro de 2023	●	PF0153 - Conclusão da Reconstrução de Pontes (Barra Longa)
dezembro de 2023	●	PF0153 - Conclusão da Reconstrução de Pontes em Mariana e Barra Longa
dezembro de 2023	●	PF0038 - Reconstrução de Estruturas de Apoio Concluído
dezembro de 2023	●	Reconstrução de Estruturas de Apoio - Entrega da Obra (Chiqueiro)
dezembro de 2023	●	Reconstrução de Estruturas de Apoio - Entrega da Obra (Curral)
dezembro de 2023	●	Reconstrução de Estruturas de Apoio - Entrega da Obra (Depósito)
dezembro de 2023	●	Reconstrução de Estruturas de Apoio - Entrega da Obra (Galinheiro)
dezembro de 2023	●	Reconstrução de Estruturas de Apoio - Entrega da Obra (Viveiro de peixe)

● Concluído      ● Planejado      ● Reprogramado

## **Grandes Números do Programa**

Geral Infraestrutura e Reconstrução: 1.843,00 obras concluídas (projetos e processos), sendo que, desse total, pode-se citar alguns exemplos:

- 1.035,00 obras correspondem a manutenção/recuperação de acessos e cercamento que totalizam: 2.317 Km de manutenções realizadas, 142,20 Km de acessos recuperados e 214 Km de cercamentos de propriedades rurais executadas;
- 109 obras correspondem a residências e propriedades recuperadas;
- 16 obras correspondem a casas reconstruídas;
- 28 obras correspondem a comércios reformados;
- 189 obras correspondem a quintais e lotes reformados.

### **Barra Longa:**

- 105 obras correspondem a residências e propriedades recuperadas;
- 9 obras correspondem a residências e propriedades recuperadas;
- 27 obras correspondem a comércios reformados;
- 189 obras correspondem a quintais e lotes reformados.

**Mariana:**

- 4 obras correspondem a residências e propriedades recuperadas;
- 7 obras correspondem a casas reconstruídas;
- 1 obras correspondem a comércios reformados;
- 0 obras correspondem a quintais e lotes reformados;

**Termos de entrega para Morádias e Comércio:**

**Morádias Barra Longa:**

- Concluído com termo: 83
- Concluído sem termo: 6
- Paralisado: 3
- Pendente: 147
- Total: 239

**Comércio Barra Longa:**

- Concluído com termo: 17
- Concluído sem termo: 5
- Paralisado: 1
- Pendente: 4
- Total: 27

## Fatos relevantes do mês

Mariana:

- Assinatura do termo de entrega de obras da ponte Bento Rodrigues;
- Assinatura do termo de entrega de obras da ponte e passarela Santa Rita;

Mariana:

- Conclusão da concretagem do piso da quadra;
- Conclusão de 83% do vestiário;
- Conclusão de 82% da arena;
- Instalação de 88% da grama no campo;
- Visita técnica virtual - Processo concorrencial Campo de Pedras.

## Indicadores

### I01 – Obras entregues – Diagnóstico total

Meta Global: 100%  
Percentual(%)

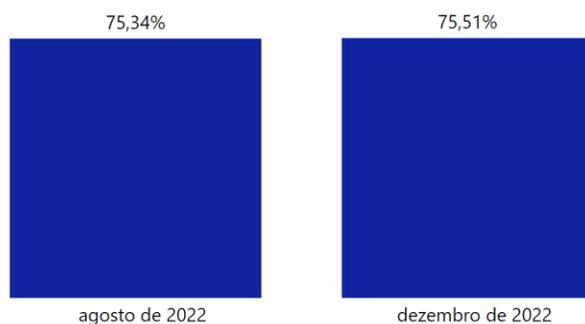


Gráfico 1: I01 – Obras entregues – Diagnóstico total - Frequência Quadrimestral

### I02 – Obras entregues – Temporal

Meta Global: 100%  
Percentual(%)

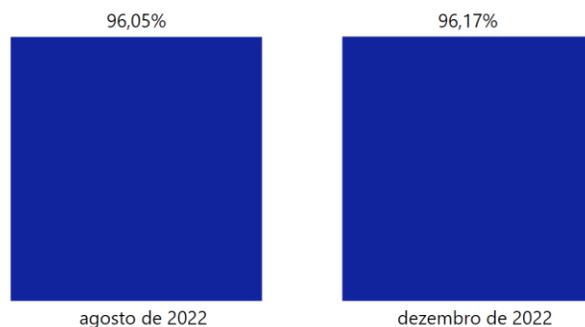


Gráfico 2: I02 – Obras entregues – Temporal - Frequência Quadrimestral

## Indicadores

### I03 – Termos de aceite oficiais de obras entregues – Diagnóstico total

Meta Global: 100%  
Percentual(%)




Gráfico 3: I03 – Termos de aceite oficiais de obras entregues – Diagnóstico total - Frequência Quadrimestral

### I04 – Termos de aceite oficiais de obras entregues – Temporal

Meta Global: 100%  
Percentual(%)

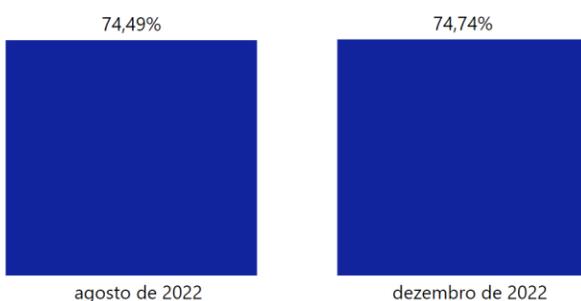


Gráfico 4: I04 – Termos de aceite oficiais de obras entregues – Temporal - Frequência Quadrimestral

## **PG011 Recuperação das escolas impactadas e reintegração da comunidade escolar**

### **Eixo Pessoas e Comunidades**

#### **Objetivo**

Reparar os danos causados às comunidades escolares atingidas de Fundão até Candonga, nas dimensões impactadas, por meio da reconstrução das condições materiais, estruturais, pedagógicas, institucionais, psicopedagógicas e sócio comunitárias, observadas as características anteriores ao rompimento da barragem para que o poder público possa garantir a manutenção do direito à educação, de acordo com as determinações do TTAC (cláusulas 89 a 94).

## Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	89	Caput	Em andamento
Cláusula	91	Caput	Em andamento
Cláusula	92	Caput	Em andamento
Cláusula	93	Caput	Em andamento
Deliberação	183	2	Concluída Internamente
Deliberação	183	3	Concluída Internamente
Deliberação	238	1	Concluída Internamente
Deliberação	390	3	Concluída Internamente
Deliberação	508	2	Em andamento
Deliberação	587	2	Concluída Internamente

## Entregas do ano de 2023

dezembro de 2023	●	Conclusão do ciclo 3 do projeto psicopedagógico institucional de Barra Longa
dezembro de 2023	●	Conclusão do ciclo 3 do projeto psicopedagógico institucional de Mariana
dezembro de 2023	●	Conclusão do Transporte Escolar para os alunos da Escola Temporária de Paracatu de Baixo
dezembro de 2023	●	Cumprimento do calendário anual de eventos do projeto arte,cultura, sociabilidade e produção de saberes para escolas e alunos impactados de Barra Longa (2023)
dezembro de 2023	●	Cumprimento do calendário anual de eventos do projeto arte,cultura, sociabilidade e produção de saberes para escolas e alunos impactados de Mariana (2023)
dezembro de 2023	●	Finalização da manutenção predial - Escola Temporária Paracatu de Baixo
dezembro de 2023	●	Finalização da operação da Escola Temporária de Paracatu de Baixo/MG
dezembro de 2023	●	Finalização da reposição de materiais e equipamentos - Escola Temporária Paracatu de Baixo
dezembro de 2023	●	Fornecimento do Transporte Escolar para os alunos da Escola de Bento Rodrigues em 2023

● Concluído      ● Planejado      ● Reprogramado

## **Grandes números do programa**

O programa não possui grandes números

## Fatos relevantes do mês

Não houve progressos neste mês

## Indicadores

### I01 - Atendimento às solicitações de reposição de equipamentos e materiais das escolas temporárias de Mariana e Barra Longa

Meta Global: 100%  
Percentual(%)

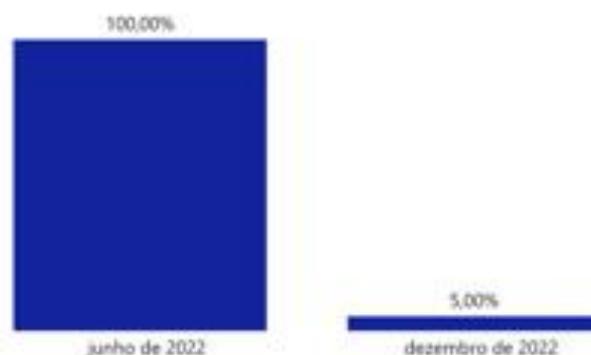


Gráfico 1: I01 - Atendimento às solicitações de reposição de equipamentos e materiais das escolas temporárias de Mariana e Barra Longa - Frequência Semestral

### I02 - Cumprimento do Plano de Manutenção e demandas de manutenção predial das escolas temporárias

Meta Global: 100%  
Percentual(%)

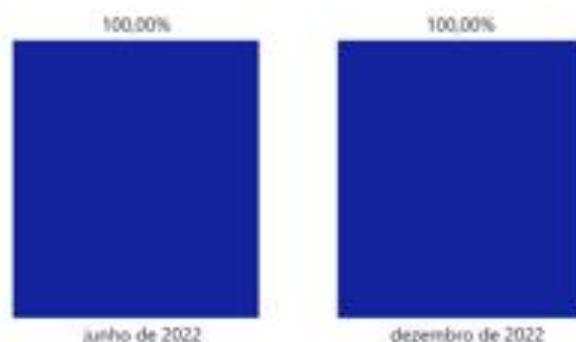


Gráfico 2: I02 - Cumprimento do Plano de Manutenção e demandas de manutenção predial das escolas temporárias - Frequência Semestral

## Indicadores

### I03 - Disponibilidade de vagas para transporte de estudantes

Meta Global: 100%  
Percentual(%)



Gráfico 3: I03 - Disponibilidade de vagas para transporte de estudantes - Frequência Anual

### I04 - Atendimento das demandas sobre transporte escolar aderentes ao escopo

Meta Global: 100%  
Percentual(%)




Gráfico 4: I04 - Atendimento das demandas sobre transporte escolar aderentes ao escopo - Frequência Anual

## Indicadores

### I05 - Cumprimento das atividades de convivência das comunidades atingidas

Meta Global: 100%  
Percentual(%)

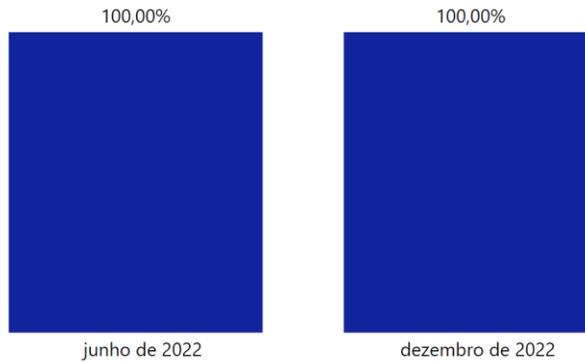


Gráfico 5: I05 - Cumprimento das atividades de convivência das comunidades atingidas - Frequência Semestral

### I06 - Satisfação do público alvo com as ações realizadas

Meta Global: 75  
Pontos

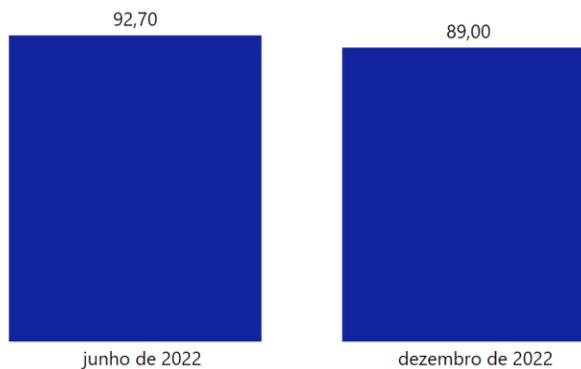


Gráfico 6: I06 - Satisfação do público alvo com as ações realizadas - Frequência Anual

## Indicadores

### I07 - Atendimento ao público alvo

Meta Global: 100%  
Percentual(%)



Gráfico 7: I07 - Atendimento ao público alvo - Frequência Semestral

Indicador I07 nunca medido por ser redundante com o I05, retirado da definição do PG conforme aprovação do CIP, deliberação 674/2023.

### I12 - Verificação de realização de atendimento pelo projeto de apoio psicopedagógico clínico

Meta Global: 100%  
Percentual(%)



Gráfico 8: I12 - Verificação de realização de atendimento pelo projeto de apoio psicopedagógico clínico - Frequência Anual

Indicador concluído conforme aprovação do CIP, deliberação 674/2023.

## Indicadores

### I13 - Escolas atendidas pelo apoio psicopedagógico institucional

Meta Global: 100%

Percentual(%)




Gráfico 9: I13 - Escolas atendidas pelo apoio psicopedagógico institucional - Frequência Anual

Nota: Dados referentes ao ano de 2022.

## **PG012 Programa de Memória Histórica, Cultural e Artística**

### **Eixo Pessoas e Comunidades**

#### **Objetivo**

Garantir, em parceria com a comunidade e poder público, a reparação, restauração, preservação, fortalecimento e restituição do patrimônio cultural histórico e artístico dos territórios impactados, assegurando suas condições de existência, realização e reprodução autônoma, e criando espaços de sociabilidade, convivência e fortalecimento de vínculos comunitários.

## Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	95	Caput	Em andamento
Cláusula	96	Caput	Em andamento
Cláusula	97	Caput	Em andamento
Cláusula	98	a	Em andamento
Cláusula	98	b	Em andamento
Cláusula	98	c	Em andamento
Cláusula	98	d	Em andamento
Cláusula	99	Caput	Em andamento
Deliberação	349	2	Concluída Internamente
Deliberação	547	2	Concluída Internamente
Deliberação	547	3	Em andamento

## Entregas do ano de 2023

- dezembro de 2023 ● Conclusão das atividades do Calendário 2023 das ações do Projeto Escola Aberta (Ações de Educação Patrimonial, Formação Artística, Esporte e Lazer)
- dezembro de 2023 ● Apoio aos projetos do Edital Doce- Modalidade 3 para 2023
- dezembro de 2023 ● Conclusão da implementação de Centros de Memória nas comunidades
- dezembro de 2023 ● Realização da Exposição Virtual

● Concluído      ● Planejado      ● Reprogramado

## Fatos relevantes do mês

Não houve progressos neste mês

## **Indicadores**

Revisão dos indicadores do Programa de Preservação da Memória Histórica, Cultural e Artística (PG12) em processo de aprovação pelo CIF (Deliberação CIF nº 547, de 22 de outubro de 2021).

## **PG013 Turismo, Cultura, Esporte e Lazer**

### **Eixo Pessoas e Comunidade**

#### **Objetivo**

Promover ações nas áreas de turismo, cultura, esporte e lazer, visando contribuir para a melhoria da qualidade de vida nos municípios atingidos e fomentar o desenvolvimento turístico dos polos definidos.

## Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	101	Caput	Concluída Internamente
Cláusula	102	Caput	Concluída Internamente
Cláusula	103	Caput	Em andamento
Cláusula	104	a	Em andamento
Cláusula	104	b	Concluída Internamente
Cláusula	104	c	Em andamento
Cláusula	104	d	Em andamento
Cláusula	104	e	Em andamento
Cláusula	104	f	Em andamento
Cláusula	104	g	Em andamento
Deliberação	239	1c	Concluída Internamente
Deliberação	239	5	Concluída Internamente
Deliberação	287	3	Concluída Internamente
Deliberação	287	4	Concluída Internamente
Deliberação	321	2	Em andamento
Deliberação	321	3	Concluída Internamente
Deliberação	377	3.2	Concluída Internamente
Deliberação	377	4	Concluída Internamente
Deliberação	377	5	Concluída Internamente
Deliberação	454	2	Concluída Internamente
Deliberação	454	3	Concluída Internamente
Deliberação	462	3	Concluída Internamente
Deliberação	652	2	Em andamento
Deliberação	652	3	Em andamento
Deliberação	652	4	Em andamento
Deliberação	652	5	Em andamento
Deliberação	653	1	Em andamento

Deliberação	239	1a	Concluída Internamente
Deliberação	239	1b	Concluída Internamente
Deliberação	239	3	Concluída Internamente
Deliberação	239	4	Concluída Internamente
Deliberação	377	3.1	Concluída Internamente
Deliberação	653	2	Em andamento

## Entregas do ano de 2023

- maio de 2023 ● Lançamento do Edital Doce 3ª Edição
- dezembro de 2023 ● Conclusão do projeto de Incentivo à Leitura
- dezembro de 2023 ● Conclusão das missões e formações para o ano de 2023
- dezembro de 2023 ● Realização da 2ª edição do Torneio de Pesca Esportiva em MG e ES
- dezembro de 2023 ● Realizar etapa de capacitação da 2ª edição em MG e ES

● Concluído      ● Planejado      ● Reprogramado

## **Grandes números do programa**

O programa não possui grandes números

## Fatos relevantes do mês

Continuidade das entregas parciais dos itens de modernização da etapa 3 do Projeto de Incentivo à Leitura

Execução do evento central do projeto "Primeiro Passeio ciclístico do PERD" e workshop de arte e educação do projeto "Lugar de Encontros e Encantos" (Reparação do Lazer)

Fomento e Apoio da Associação de Pescadores e Amigos do Rio Doce (APARD) na feira de Pesca & Cia Trade Show 2023

## Indicadores

### I01 – Disponibilização de ferramentas para a Institucionalização do Turismo no Município

Meta Global: 100%  
Percentual(%)



Gráfico 1: I01 – Disponibilização de ferramentas para a Institucionalização do Turismo no Município - Frequência Anual

### I04 – Índice de Iniciativas realizadas a partir da formação em fortalecimento organizacional

Meta Global: 100%  
Percentual(%)



Gráfico 2: I04 – Índice de Iniciativas realizadas a partir da formação em fortalecimento organizacional - Frequência Anual

## Indicadores

### I04.1 – Índice de conclusão do Processo formativo em relação ao número de selecionados

Meta Global: 100%  
Percentual(%)



Gráfico 3: I04.1 – Índice de conclusão do Processo formativo em relação ao número de selecionados - Frequência Anual

### I05 – Percentual de implementação do plano de empreendedorismo Turístico

Meta Global: 100%  
Percentual(%)




Gráfico 4: I05 – Percentual de implementação do plano de empreendedorismo Turístico - Frequência Anual

## Indicadores

### I07.1 – Percentual de Servidores que concluíram a formação em relação ao número de indicados

Meta Global: 80%  
Percentual(%)

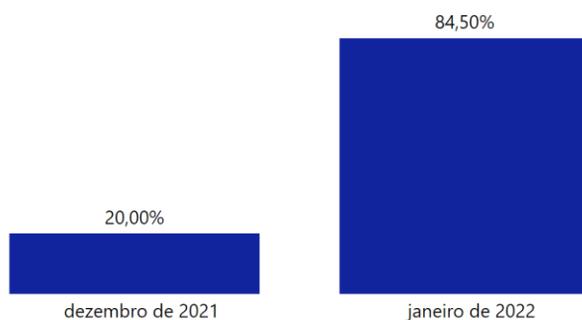


Gráfico 5: I07.1 – Percentual de Servidores que concluíram a formação em relação ao número de indicados - Frequência Anual

### I08 – Percentual de capacitação dos gestores em relação ao número de inscritos

Meta Global: 70%  
Percentual(%)



Gráfico 6: I08 – Percentual de capacitação dos gestores em relação ao número de inscritos - Frequência Anual

A ficha de indicadores do PG13 passou por revisão e atualização no indicador I07.1, sendo atualizado o resultado final do indicador e realizado novo report para atualização do mesmo.

## **PG014 Programa de Apoio à Saúde Física e Mental da População Impactada**

### **Eixo pessoas e Comunidades**

#### **Objetivos**

Prestar apoio técnico à elaboração e implantação de estudos, dos protocolos de monitoramento da saúde da população exposta aos efeitos do rompimento e elaboração de programa para prestar apoio técnico para o atendimento às prefeituras de municípios atingidos na execução dos planos de ação de saúde ou das ações de saúde já pactuadas em função dos efeitos decorrentes do rompimento – conforme cláusulas 106, 107 e 111 do TTAC.\*

\* A Fundação Renova ajuizou, em 17/01/2022, Incidente de Divergência que visa à declaração de nulidade da Deliberação do Comitê Interfederativo ("CIF") nº 551/2021, que aprovou a definição do Programa de Apoio à Saúde Física e Mental da População Impactada (PG-14).

A Fundação Renova demonstrou que a definição de escopo aprovada na Deliberação CIF nº 551 está em manifesto desacordo com o Termo de Transação e de Ajustamento de Conduta celebrado em 02/03/2016 ("TTAC") e com deliberações prévias do próprio CIF. Várias de suas disposições carecem de fundamentos técnicos, pois não foram disponibilizadas informações essenciais para a execução do Programa (como avaliação de risco e correlações decorrentes do rompimento da barragem de Fundão, prazos, orçamentos e monitoramento de indicadores) ou dos seus subprogramas.

## Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	106	Caput	Em andamento
Cláusula	107	Caput	Judicializada
Cláusula	108	Caput	Em andamento
Cláusula	111	Caput	Judicializada
Deliberação	386	3	Concluída Internamente
Deliberação	416	3	Judicializada
Deliberação	416	4	Judicializada
Deliberação	435	1	Judicializada
Deliberação	436	1	Judicializada
Deliberação	452	2	Judicializada
Deliberação	487	7	Judicializada
Deliberação	492	1a, 1b,1c	Judicializada
Deliberação	504	2	Judicializada
Deliberação	504	3	Judicializada
Deliberação	504	4	Judicializada
Deliberação	598	1	Judicializada
Deliberação	599	1	Judicializada
Deliberação	611	3	Em andamento
Deliberação	611	4	Concluída Internamente
Deliberação	620	2	Judicializada
Deliberação	621	1	Judicializada
Deliberação	622	1	Judicializada
Deliberação	624	1	Judicializada
Deliberação	73	1	Em andamento

Deliberação	106	3	Concluída Internamente
Deliberação	130	4	Concluída Internamente
Deliberação	189	1	Concluída Internamente
Deliberação	189	2	Concluída Internamente
Deliberação	197	1 e 2	Concluída Internamente
Deliberação	219	4	Concluída Internamente
Deliberação	220	2	Concluída Internamente
Deliberação	220	3	Concluída Internamente
Deliberação	252	2	Concluída Internamente
Deliberação	264	4	Concluída Internamente
Deliberação	266	2	Concluída Internamente
Deliberação	434	1	Judicializada
Deliberação	650	1, 2	Status Desconhecido

## Entregas do ano de 2023

- 
- janeiro de 2023 ● Acompanhamento do plano de Mariana – 5º Repasse financeiro para contratação de RH
  - abril de 2023 ● Acompanhamento do plano de Mariana – 6º Repasse financeiro para contratação de RH
  - julho de 2023 ● Acompanhamento do plano de Mariana – 7º Repasse financeiro para contratação de RH
  - outubro de 2023 ● Acompanhamento do plano de Mariana – 8º Repasse financeiro para contratação de RH

● Concluído    ● Planejado    ● Reprogramado

## **Grandes números do programa \***

- 34 profissionais (entre médicos, enfermeiros, assistentes sociais, psicólogos e psiquiatras) atuaram no município de Mariana/MG.

\* Os números serão melhores detalhados, no tópico seguinte.

## Fatos relevantes do mês

### Mariana

Desde o rompimento da Barragem de Fundão, o município de Mariana tem recebido apoio para atendimento à população atingida. A partir da primeira quinzena de janeiro/22, todos os profissionais atuantes pela empresa Contexto foram substituídos por profissionais contratados diretamente pela Prefeitura, com financiamento da Fundação Renova, conforme preconizado no Acordo Judicial homologado pela 2ª Vara Cível. Ao todo, como previsto no Plano de Trabalho, são 34 profissionais de saúde que atuam nos seguintes equipamentos municipais de saúde:

- Espaço Conviver, que presta serviços à população atingida na área de Saúde Mental, oferecendo atendimentos psicológicos e psiquiátricos especializados e acompanhamento psicossocial. O aluguel deste espaço é financiado pela Fundação Renova, que também financiou a compra de móveis e equipamentos para seu funcionamento adequado.
- CAPS e CAPSAD, nos quais os atendimentos são realizados por equipe multiprofissional que atua de forma interdisciplinar e realiza prioritariamente atendimento às pessoas em sofrimento mental, incluindo aquelas com necessidades decorrentes do uso abusivo de álcool e outras drogas, em sua área territorial, seja em situações de crise ou nos processos de reabilitação psicossocial.
- UBS de Bento Rodrigues e Paracatu, onde são oferecidos atendimentos com Nutricionista, Fisioterapeuta, Odontóloga, Médico ESF, Médico Psiquiatra, Enfermeiro e Psicóloga. O objetivo desta Unidade de Saúde é atender até 80% dos problemas de saúde da população atingida, sem que haja a necessidade de encaminhamento para outros serviços, como emergências e hospitais. Nesta UBS, assim como em outras UBS do Município, as famílias atingidas podem ter acesso a ações de promoção, prevenção e tratamento relacionadas a saúde da mulher, da criança, saúde mental, planejamento familiar, prevenção a câncer, pré-natal e cuidado de doenças crônicas como diabetes e hipertensão, fazer curativos, inalações, tomar vacinas, coletar amostras para exames laboratoriais, ter tratamento odontológico, receber medicação básica e ser encaminhado para atendimentos com especialistas.

A Fundação Renova também apoia o município de Mariana com 05 veículos para atendimento à população atingida, visando a reforçar o trabalho nas áreas de atenção primária, atenção especializada, saúde mental, vigilância em saúde, assistência farmacêutica, entre outros.

## Indicadores

Os indicadores do programa estão em revisão

## **PG015 Promoção da Inovação**

### **Eixo pessoas e Comunidades**

#### **Objetivos**

Fomentar e financiar a produção de conhecimento relacionado à recuperação socioeconômica e socioambiental das áreas impactadas pelo rompimento, por meio da criação e fortalecimento de linhas de pesquisa de tecnologias aplicadas, fortalecimento de capital humano e internalização das tecnologias geradas para o processo de reparação, de acordo com as cláusulas 113 a 115 do TTAC.

## Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	113	Caput	Em andamento
Cláusula	114	a	Em andamento
Cláusula	114	b	Em andamento
Deliberação	100	1	Concluída Internamente
Deliberação	126	2	Concluída Internamente
Deliberação	126	3	Concluída Internamente
Deliberação	20	n/a	Concluída Internamente
Deliberação	31	a	Concluída Internamente
Deliberação	338	4	Concluída Internamente

## Entregas do ano de 2023

- dezembro de 2023 ● Encerramento da Execução - Hub de Inovação GV
- dezembro de 2023 ● Finalização da Aplicação da Metodologia e Validação - TRL
- dezembro de 2023 ● Encerramento da Execução - Hub de Inovação Linhares

● Concluído      ● Planejado      ● Reprogramado

## **Grandes números do programa**

O programa não possui grandes números

## Fatos relevantes do mês

Realização dos eventos de abertura e início da execução das atividades do Hub de Inovação Rodadas Médio e Foz (Rio Doce Labs).

## Indicadores

### I01 – Número de projetos de pesquisa e inovação financiados pelo programa

Meta Global: 40

Número




Gráfico 1: I01 – Número de projetos de pesquisa e inovação financiados pelo programa - Frequência Anual

### I02 – Número de bolsas de formação educacional/profissional financiadas

Meta Global: 220

Número




Gráfico 2: I02 – Número de bolsas de formação educacional/profissional financiadas - Frequência Anual

## Indicadores

### I03 – Índice de recurso destinado a pesquisas aportado na formação de pessoas

Meta Global: 100%

Percentual(%)




Gráfico 3: I03 – Índice de recurso destinado a pesquisas aportado na formação de pessoas - Frequência Bianaual

Nota: Valor reportado em Dez/22 alterado de 22,15% para 44,75% de acordo com processo interno do Programa realizado em Mar/2023 para recalco do avanço.

## **PG016 Retomada das Atividades Aquícolas e Pesqueiras**

### **Eixo pessoas e Comunidades**

#### **Objetivo**

Possibilitar a retomada das atividades aquícolas e pesqueiras conforme condições anteriores ao rompimento através da aprendizagem e diálogo com as comunidades pesqueiras atingidas, proporcionando oportunidades de renda e qualificação.

## Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	116	Caput	Em andamento
Cláusula	117	Caput	Em andamento
Cláusula	118	Caput	Em andamento
Cláusula	119	Caput	Em andamento
Cláusula	122	Caput	Judicializada
Cláusula	123	Caput	Em andamento
Deliberação	121	2	Concluída Internamente
Deliberação	20	n/a	Concluída Internamente
Deliberação	480	4	Concluída Internamente
Deliberação	480	5	Concluída Internamente
Deliberação	542	1	Concluída Internamente
Deliberação	542	1.1	Concluída Internamente
Deliberação	542	2	Concluída Internamente
Deliberação	654	3	Em andamento
Deliberação	655	3	Em andamento

## Entregas do ano de 2023



março de 2023	●	Caracterização Socioeconômica da Pesca e Aquicultura e Monitoramento Pesqueiro - Informe Trimestral VIII
maio de 2023	●	Caracterização Socioeconômica da Pesca e Aquicultura e Monitoramento Pesqueiro - Relatório Anual II
junho de 2023	●	Caracterização Socioeconômica da Pesca e Aquicultura e Monitoramento Pesqueiro - Informe Trimestral IX
setembro de 2023	●	Caracterização Socioeconômica da Pesca e Aquicultura e Monitoramento Pesqueiro - Informe Trimestral X
outubro de 2023	●	Caracterização Socioeconômica da Pesca e Aquicultura e Monitoramento Pesqueiro - Relatório Semestral IV
dezembro de 2023	●	Caracterização Socioeconômica da Pesca e Aquicultura e Monitoramento Pesqueiro - Informe Trimestral XI

● Concluído

● Planejado

● Reprogramado

## Grandes números do programa

### Eixo 1 - Processo para contribuir com a superação das limitações e restrições ao exercício da pesca e atividades aquícolas:

- Articulação junto aos Órgãos Públicos e Comunidades
  - **3** Caravanas Devolutivas para apresentação de resultados ambientais nos territórios da Calha e Médio Rio Doce;
  - **246** Participantes das Oficinas Devolutivas nos municípios de Governador Valadares, Rio Casca e Ipatinga.
- Caracterização Socioeconômica da Pesca e Aquicultura e Monitoramento Pesqueiro
  - **15,03 Mil** formulários de coletas de dados primários e de desembarque pesqueiro aplicados, com pescadores e aquicultores;
  - **8** informes trimestrais, **3** semestrais e **1** anual entregues sobre a produção pesqueira e perfil socioeconômico dos pescadores no rio Doce e litoral do ES.

### Eixo 2 - Processo de Estruturação produtiva e alternativas de produção e Geração de Renda:

- Projeto Cultivando para Pescar:
  - **4** comunidades atendidas (Areal, Entre Rios, Regência e Povoação), sendo **170** pessoas beneficiadas;
  - **10** capacitações realizadas, **3** temas abordados (Hidroponia, Piscicultura Superintensiva e Processamento do Pescado);
  - **2** visitas técnicas em **1** Tema abordado (Piscicultura Superintensiva);
  - **187** Materiais Virtuais produzidos e disponibilizados no período de distanciamento social.

## Grandes números do programa

- Fomento e Fortalecimento do Associativismo e Cooperativismo:
  - o **197** beneficiários atendidos nos estados de MG e ES;
  - o **3** municípios beneficiados, Rio Doce e Periquito em MG e Linhares no ES;
  - o **4** associações beneficiadas:
    - 30** ASPERDOCE (Rio Doce)
    - 77** ASPIPEC (Pedra Corrida)
    - 38** APIGUA (Guaxe)
    - 52** APAP (Povoação);
  - o **2** associações formalizadas em MG (ASPIPEC e ASPERDOCE);
  - o **40** capacitações em gestão e rotinas administrativas, funcionalidades e elaboração de plano de negócios, estratégias de vendas e negociação (ASPERDOCE e ASPIPEC);
  - o **4** Planos de negócio entregues.
  
- Mapeamento das potencialidades econômicas na pesca e aquicultura - Diagnóstico Complementar da Cadeia da Pesca e Aquicultura e Estudo de Mercado
  - o **3090** Entrevistas realizadas, para levantamento de dados primários junto a Instituições Governamentais, Instituições de Pesquisa e Ensino e Estabelecimentos Comerciais;
  - o **42** Books municipais com informações da cadeia produtiva da pesca e aquicultura nas comunidades;
  - o **5** Relatórios sobre a atividade pesqueira exercida nos territórios (Foz do Rio Doce, Baixo Rio Doce, Médio Rio Doce, Alto Rio Doce e Calha do Rio Doce) que irão fornecer subsídios para o programa.

## Grandes números do programa

- Projetos da Foz

- o **114** associados beneficiados pela implementação da primeira fase da Micro Estação fotovoltaica na Associação dos Pescadores de Regência (ASPER).

- Projeto de Fortalecimento da Cultura e Atividade Pesqueira

- o **1º** etapa torneio de pesca esportivo realizado em Governador Valadares – MG em parceria com a Associação de Pescadores e Amigos do Rio Doce (APARD), sendo **2** pescadores profissionais beneficiados na capacitação de condutor de turismo de pesca.

- o Capacitação de **63** pescadores beneficiados pelo curso de Condutor de Turismo de Pesca Esportiva sendo:

- o **2** turmas no Distrito de Pedra Corrida – Periquito – MG com um total de **17** participantes;

- o **2** turmas na Colônia de Pescadores Z-12 – Baixo Guandu – ES com um total de **30** participantes;

- o **1** turma na Comunidade Cachoeira Escura – Belo Oriente – MG com um total de **16** participantes.

## Fatos relevantes do mês

Entrega do oitavo Relatório Trimestral da Caracterização Socioeconômica da Pesca e Aquicultura e Monitoramento Pesqueiro referente a produção pesqueira no rio Doce e litoral do Espírito Santo.

## Indicadores

Os indicadores não iniciaram suas medições, encontram-se em revisão na CTEI, onde foi encaminhada nova proposta de indicadores finalísticos.

## **PG017 Retomada das Atividades Agropecuárias**

### **Eixo Terra e Água**

#### **Objetivo**

Reparar os danos socioeconômicos e ambientais aos produtores rurais ao longo da calha do rio Doce em virtude do rompimento da barragem de Fundão, bem como oferecer apoio técnico de modo a viabilizar ao público-alvo o restabelecimento da rotina produtiva em condição pré-existente ao evento. Ainda, para além da reparação propriamente dita, serão fornecidos serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural, que fomentarão a utilização de técnicas produtivas sustentáveis.

## Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	125	a	Judicializada
Cláusula	125	b	Judicializada
Cláusula	125	c	Judicializada
Cláusula	125	d	Judicializada
Cláusula	125	e	Em andamento
Cláusula	125	f	Em andamento
Cláusula	125	g	Judicializada
Cláusula	125	h	Judicializada
Cláusula	125	i	Em andamento
Cláusula	125	j	Judicializada
Deliberação	145	3	Concluída Internamente
Deliberação	20	n/a	Concluída Internamente
Deliberação	263	2	Concluída Internamente
Deliberação	263	3	Concluída Internamente
Deliberação	341	1	Concluída Internamente
Deliberação	343	1.4	Concluída Internamente
Deliberação	354	1 e 2	Concluída Internamente

## Entregas do ano de 2023

- julho de 2023 Conclusão das atividades de Saneamento Rural
- dezembro de 2023 Conclusão da implantação das atividades de Reestruturação Produtivas nas propriedades de Barra Longa, Mariana, Ponte Nova, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado

## Grandes números do programa

### Alto Rio Doce

- 246 propriedades elegíveis ao programa, sendo 49 direcionados ao reassentamento e 197 ao Plano de Adequação Socioeconômica e Ambiental (PASEA), 197 são do PASEA planejados sendo que 196 devolutivas foram realizadas, e a diferença dos 1 refere-se à pendência de CAR ou problema fundiário. Até o presente momento, 162 propriedades aderiram à implantação do PASEA, 34 não aderiram e 0 estão em análise pelo produtor;
- 52.887,1 toneladas acumuladas de silagem entregues para produtores impactado, sendo 0,0 toneladas no mês;
- 23.550,4 horas de Assistência Técnica e Extensão Rural para 140,0 propriedades;
- 461,0 barraginhas realizadas;
- 900 infraestrutura rurais simples e complexas concluídas;
- 238,0 nascentes cercadas e 58,0 nascentes com plantio florestal realizado;
- 2.723,2 hectares de reestruturação produtiva executados.
- Elaborados e implantados os projetados de 79 hortas e 84 pomares, nos municípios de Mariana, Barra Longa, Ponte Nova, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado, no Alto Rio Doce.

## **Médio Rio Doce**

- 8.492 horas individuais de Assistência Técnica e Extensão Social (ATES) no Lote 3 - Tumiritinga/MG (1º Junho, Terra Prometida e Águas da Prata I e II) e Periquito/ MG (Liberdade);
- 15.440 horas coletivas de Assistência Técnica e Extensão Social (ATES) no Lote 3 - Tumiritinga/MG (1º Junho, Terra Prometida e Águas da Prata I e II) e Periquito/ MG (Liberdade);
- 2 feiras de apoio à comercialização de produtos realizada para o Lote 3 - Tumiritinga/MG (1º Junho, Terra Prometida e Águas da Prata I e II) e Periquito/ MG (Liberdade);
- 159 Indicadores de Sustentabilidade em Agroecossistemas (ISA) elaborados para o Lote 3 - Tumiritinga/MG (1º Junho, Terra Prometida e Águas da Prata I e II) e Periquito/ MG (Liberdade);
- 71.578,9 toneladas acumuladas de silagem entregues para produtores impactado, sendo 1.885,8 toneladas no mês;

## Baixo Rio Doce

- 1.000 horas individuais de Assistência Técnica e Extensão Social (ATES) no Lote 4 - Linhares/ES (Assentamento Sezínio Fernandes de Jesus);
- 1.051 horas coletivas de Assistência Técnica e Extensão Social (A) no Lote 4 - Linhares/ES (Assentamento Sezínio Fernandes de Jesus);
- 1 feiras de apoio à comercialização de produtos realizada para o Lote 4 - Linhares/ES (Assentamento Sezínio Fernandes de Jesus);
- 98 Indicadores de Sustentabilidade em Agroecossistemas (ISA) elaborados para o Lote 4 - Linhares/ES (Assentamento Sezínio Fernandes de Jesus);
- 7.919,6 toneladas acumuladas de silagem entregues para produtores impactado, sendo 215,9 toneladas no mês;

## Parcerias

- 59 capacitação técnicas presenciais realizadas pela EMATER - MG;
- 30 capacitação técnicas online realizadas pela EMATER - MG;
- 21,0 Unidades Demonstrativas implantadas em propriedades localizadas no território Alto Rio Doce. Sendo 16,0 Unidades Demonstrativas implantadas em parceria com o World Resources Institute (WRI), Fazenda Ecológica e Centro Internacional de Pesquisa Agroflorestal (ICRAF) e 5,0 Unidade Demonstrativa implantada em parceria com a Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais (EPAMIG).

## Fatos relevantes do mês

### **Médio Rio Doce**

Registrada adesão de 110 produtores ao PG 17 após extensão do prazo de adesão ao Programa.

### **Baixo Rio Doce**

Registrada adesão de 08 produtores ao PG 17 após extensão do prazo de adesão ao Programa.

### **Alto Rio Doce**

Realizada reunião junto à EPAMIG, que apresentou os resultados da análise de dados da primeira e segunda aplicação do ISA (Indicadores de Sustentabilidade em Agroecossistemas) no Alto Rio Doce.

## Indicadores

### I01 – Taxa de reposição de alimentação animal

Percentual(%)




Gráfico 1: I01 – Taxa de reposição de alimentação animal - Frequência Semestral

### I02 – Taxa de Reconstrução de Benfeitorias Impactadas

Meta Global: 100%

Percentual(%)

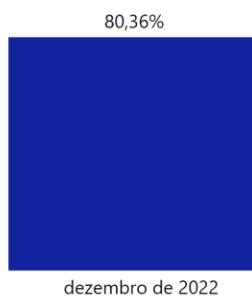


Gráfico 2: I02 – Taxa de Reconstrução de Benfeitorias Impactadas - Frequência Anual

## Indicadores

### I04 – Taxa da evolução do índice de sustentabilidade das propriedades rurais

Percentual(%)



Gráfico 3: I04 – Taxa da evolução do índice de sustentabilidade das propriedades rurais - Frequência Semestral

### I07 – Recomposição e/ou adequação das áreas produtivas impactadas por Unidade de Área

Meta Global: 100%

Percentual(%)




Gráfico 4: I07 – Recomposição e/ou adequação das áreas produtivas impactadas por Unidade de Área - Frequência Anual

## Indicadores

### I08 – Reconstrução e/ou Reforma dos equipamentos danificados

Meta Global: 100%  
Percentual(%)



Gráfico 3: I08 – Reconstrução e/ou Reforma dos equipamentos danificados - Frequência Anual

## Indicadores

Tabela 1. Indicadores que não iniciaram a medição.

INDICADOR	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDADE DE MEDIDA	INÍCIO PREVISTO DE MEDIÇÃO
I05 - Taxa de assistência técnica individual a produtores rurais	I05 - Número total de horas de assistência técnica individual no ano de referência / Número de famílias atendidas participantes do programa e que aderiram a ATER	Horas/ano	junho/2022
I06 - Taxa de assistência técnica coletiva a produtores rurais	I06 - Número total de horas de assistência técnica coletiva no ano de referência / Número de famílias atendidas que aderiram a ATER	Horas	junho/2022

## **PG018 Desenvolvimento e Diversificação Econômica**

### **Eixo pessoas e Comunidades**

#### **Objetivo**

Promover o surgimento de novos negócios e o fortalecimento de negócios existentes, de forma a contribuir para o desenvolvimento econômico dos municípios impactados.

## Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	129	Caput	Em andamento
Cláusula	130	a	Em andamento
Cláusula	130	b	Em andamento
Cláusula	130	c	Concluída Internamente
Cláusula	130	d	Em andamento
Cláusula	130	e	Em andamento
Cláusula	130	f	Em andamento
Deliberação	109	n/a	Concluída Internamente
Deliberação	163	3	Concluída Internamente
Deliberação	20	n/a	Concluída Internamente
Deliberação	343	1.4	Concluída Internamente
Deliberação	463	3	Concluída Internamente
Deliberação	503	2	Concluída Internamente
Deliberação	503	3	Concluída Internamente
Deliberação	589	2	Em andamento

## Entregas do ano de 2023

- fevereiro de 2023 ● Entrega da Casa do Empreendedor para a Prefeitura de Mariana
- abril de 2023 ● Inauguração do Banco Comunitário em Povoação- Linhares ES
- maio de 2023 ● Inauguração da sede do Banco Comunitário em Cachoeira Escura - Belo Oriente MG
- junho de 2023 ● Inauguração do Banco Comunitário em Regência - Linhares ES
- julho de 2023 ● Conclusão do Projeto da Cadeia da Meliponicultura
- julho de 2023 ● Conclusão do projeto agroecológico em assentamentos na bacia do Rio Doce - ES
- outubro de 2023 ● Inauguração da sede do Banco Comunitário em Itueta MG

● Concluído      ● Planejado      ● Reprogramado

## Grandes números do programa

### Fundo Desenvolve Rio Doce

- R\$ 102,30 milhões emprestados para negócio em Minas Gerais e Espírito Santo.
- Em Minas Gerais, R\$ 80,70 milhões foram desembolsados para 1.995,00 contratos e 1.454,00 empresas.
- Em Espírito Santo, R\$ 21,60 milhões foram desembolsados para 573,00 contratos e 525,00 empresas.

### Fundo Diversifica Mariana

- R\$ 55,00 milhões em linhas de crédito

### Fundo Compete Rio Doce

- Em Minas Gerais, R\$ 7,20 milhões foram desembolsados para 225,00 contratos e 127,00 empresas.

## **Fatos relevantes do mês**

Apresentação sobre o Fundo Diversifica realizado na Casa do Empreendedor em Mariana/MG

## Indicadores

### I01 – Promoção de ações de desenvolvimento

Meta Global: 100%  
Percentual(%)

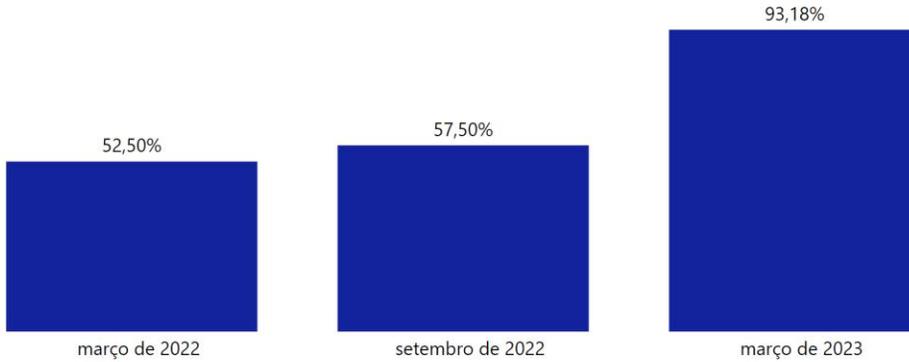


Gráfico 1: I01 – Promoção de ações de desenvolvimento - Frequência Semestral

### I02 – Diversificação Econômica de Mariana - MG

Meta Global: 100%  
Percentual(%)

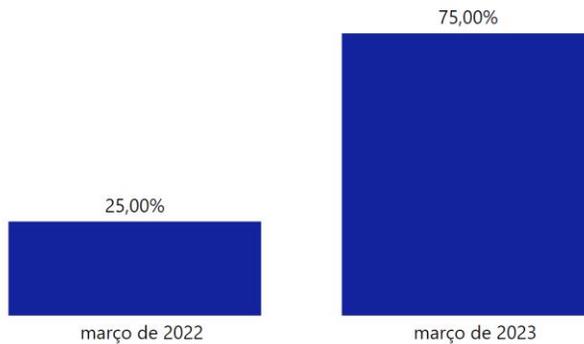


Gráfico 2: I02 – Diversificação Econômica de Mariana - MG - Frequência Anual

## Indicadores

### I03 – Financiamento – Acesso ao Crédito

Meta Global: 7500  
Contratos

7500




Gráfico 3: I03 – Financiamento – Acesso ao Crédito - Frequência Mensal

### I04 - Distribuição dos atendimentos do Eixo 2 – Financiamento nos territórios

Meta Global: 90%  
Percentual(%)




Gráfico 4: I04 - Distribuição dos atendimentos do Eixo 2 – Financiamento nos territórios - Frequência Mensal

## Indicadores

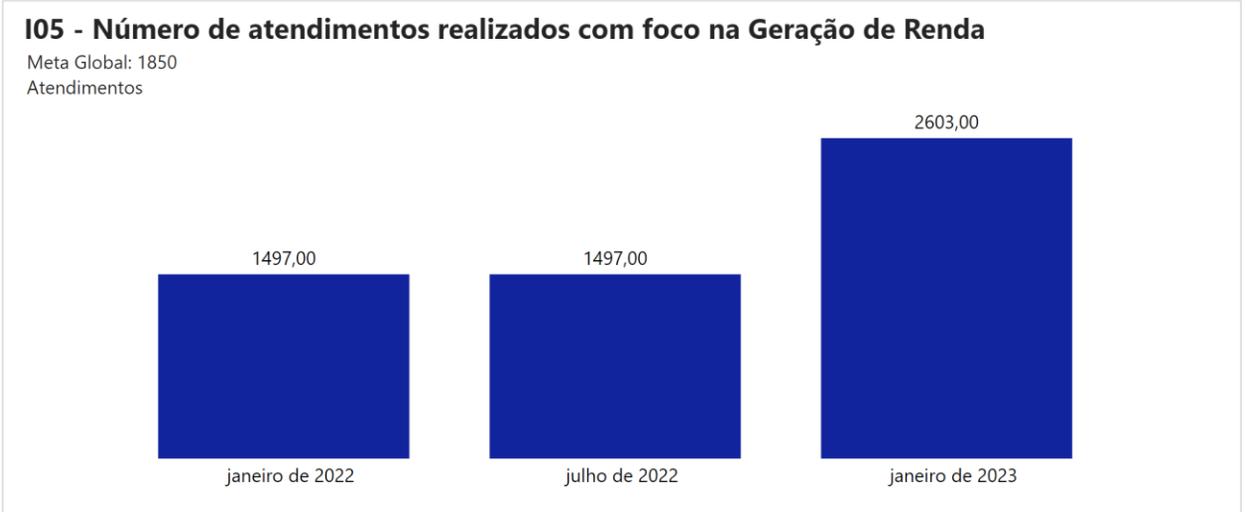


Gráfico 5: I05 - Número de atendimentos realizados com foco na Geração de Renda - Frequência Semestral




Gráfico 6: I06 – Ações de empreendedorismo em Mariana - MG - Frequência Mensal

## Indicadores

### I07 - Número de empreendedores atendidos no PG 18

Meta Global: 7650

Atendimentos

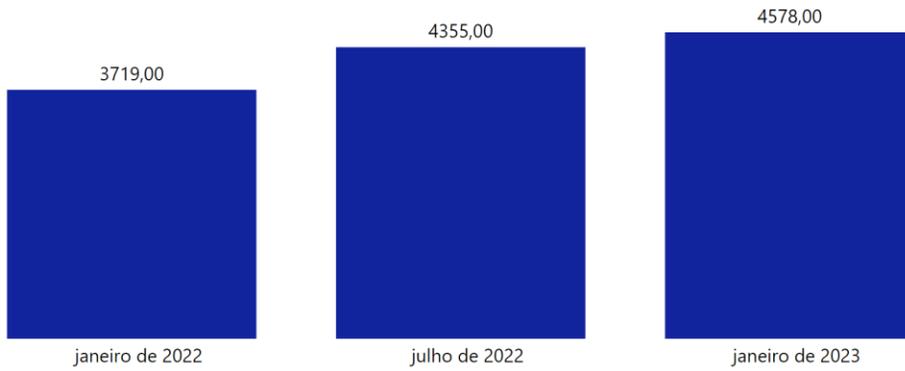


Gráfico 7: I07 - Número de empreendedores atendidos no PG 18 - Frequência Semestral

## **PG019 Programa de Recuperação de Micro e Pequenos Negócios**

### **Eixo Pessoas e Comunidade**

#### **Objetivo**

Elaborar e executar um programa específico para a recuperação de micro e pequenos negócios no setor de comércio, serviços e produtos, localizados de Fundão até Candonga em Minas Gerais, e Regência e Povoação no Espírito Santo, áreas diretamente atingidas pelo EVENTO (Cláusulas 132 a 133 do TTAC).

## Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	132	Caput	Em andamento
Cláusula	133	Caput	Em andamento
Deliberação	20	n/a	Concluída Internamente
Deliberação	342	2	Concluída Internamente

## Entregas do ano de 2023

- maio de 2023 ● Finalização de assessoria técnica para 10 negócios impactados nos Reassentamentos
- setembro de 2023 ● Disponibilização de enxoval de design gráfico e/ou ambiente para 30 negócios.
- setembro de 2023 ● Finalização dos atendimentos de consultoria de design gráfico para 30 negócios atingidos
- novembro de 2023 ● Lançamento da coleção de produtos do projeto de desenvolvimento de grupos produtivos de Regência e Povoação/ES
- dezembro de 2023 ● Reposição de insumos e equipamentos para 5 negócios impactados no Alto Rio Doce

## Grandes números do programa

1136 atendimentos realizados a 460 micro e pequenos negócios, por meio de 792 ações de assessoramento e planejamento de negócios, 17 locações de espaços comerciais, 316 reposições de insumos e equipamentos e 11 reformas e/ou adequação de infraestrutura.

## Fatos relevantes do mês

Validação dos protótipos da coleção de produtos ".....e o que dizem as águas?" - projeto Rio Doce Doce Mar

Cessação de atendimentos para 21 negócios (acumulado de jan/mar)

## Indicadores

### I01 - % de negócios impactados com condições de produção recuperadas

Meta Global: 100%  
Percentual(%)




Gráfico 1: I01 - % de negócios impactados com condições de produção recuperadas - Frequência Semestral

### I02 - % de novos negócios em substituição ao anterior que acessaram consultoria/assessoria especializada

Meta Global: 100%  
Percentual(%)



Gráfico 2: I02 - % de novos negócios em substituição ao anterior que acessaram consultoria/assessoria especializada - Frequência Semestral

## Indicadores

### I03 - % de negócios impactados adequados à novas condições de mercado

Meta Global: 100%  
Percentual(%)




Gráfico 3: I03 - % de negócios impactados adequados à novas condições de mercado - Frequência Semestral

## **PG020 Estímulo à Contratação Local**

### **Eixo Pessoas e Comunidade**

#### **Objetivo**

Estabelecer e executar um processo de desenvolvimento de ações que auxiliem na priorização de contratação local, com ênfase na população atingida, visando capacitar e estimular o uso da força de trabalho e redes de fornecedores locais para as ações que forem desenvolvidas na área de atuação da Fundação Renova, conforme cláusulas 134 a 136 do TTAC.

## Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	134	Caput	Em andamento
Cláusula	135	a	Em andamento
Cláusula	135	b	Em andamento
Cláusula	136	Caput	Em andamento
Deliberação	146	1	Concluída Internamente
Deliberação	20	n/a	Concluída Internamente
Deliberação	352	5	Concluída Internamente
Deliberação	84	n/a	Concluída Internamente

## Entregas do ano de 2023

março de 2023 ● Finalização do 1º Mapeamento do Perfil Profissional de Mariana

● Concluído    ● Planejado    ● Reprogramado

## Entregas do ano de 2023



agosto de 2023	●	Finalização do 2º Estudo de Prospecção de Potenciais Fornecedores
setembro de 2023	●	Conclusão do Recoloca Rio Doce (marco CIF- Planejamento 2023)
novembro de 2023	●	Conclusão das turmas do Projeto +Gestão MG e ES 2023
dezembro de 2023	●	Finalização da Qualificação Profissional 2023
dezembro de 2023	●	Finalização do Eixo-Projeto Qualificação Profissional

● Concluído      ● Planejado      ● Reprogramado

## Grandes Números

### Ações em andamento

- Nos cursos de qualificação presencial foram ofertadas **2 turmas, abertas 60 vagas, 59 pessoas matriculadas, 19 concluintes, 12 reprovadas e 3 evadidos.**

### Ações realizadas

- 10.504 vagas foram abertas nos cursos de qualificação on-line ofertadas pela Fundação Renova, 7.332 **pessoas matriculadas**, 1.566 **concluintes**, 1.218 **reprovadas** e 2.607 **evadidos**. Atividades dos cursos on-line foram encerradas em 27/08/2021.
- **R\$ 3.645.918 de Geração de Renda** para os atingidos, oportunizados pelo poder de compra da Fundação Renova.

## Fatos relevantes do mês

Qualificação Profissional e Preparação para o Mercado de Trabalho:

Conclusão das turmas de capacitação profissional em parceria com o SENAI nos cursos de Aperfeiçoamento em Excelência no Atendimento ao Cliente, formaram 10 pessoas em Barra Longa/MG e Fabricação de Bolos formaram 09 pessoas na comunidade do Degredo em Linhares/ES.

Monitoramento de Contratações Locais:

Realizada a contratação de 294 pessoas pelos fornecedores da Fundação Renova, sendo 180 contratações locais e 114 contratações não locais. Dessas 294 contratações, 234 profissionais são de Minas Gerais, 10 do Espírito Santo e 50 dos demais estados.

Por meio da Plataforma "Recoloca Rio Doce", foram cadastrados 539 currículos e prospectadas 718 vagas de emprego no mês. No acumulado, 10.071 currículos estão cadastrados e 8.754 vagas já foram captadas.

Desenvolvimento de Fornecedor | +Gestão:

Realização de 04 eventos de lançamento do projeto +Gestão, com o objetivo de apresentar o projeto para as médias e pequenas empresas dos municípios de abrangência e abrir as inscrições para a turma de 2023.

O projeto +Gestão é uma iniciativa da área de Contratação e Empreendedorismo Local e tem como foco principal auxiliar o fortalecimento da gestão das pequenas e médias empresas locais, para que se tornem mais competitivas no seu mercado de atuação.

O evento ocorreu de forma presencial nos municípios de Timóteo-MG e Colatina-ES. E de forma remota com transmissão para os municípios da área de abrangência da Fundação Renova em Minas Gerais e no Espírito. "

## Indicadores

### I01 – Utilização da rede local de fornecedores – MG e ES

Meta Global: 70%  
Percentual(%)



Gráfico 1: I01 – Utilização da rede local de fornecedores – MG e ES - Frequência Trimestral

### I02 – Utilização da rede local de fornecedores – 39 Municípios

Meta Global: 30%  
Percentual(%)



Gráfico 2: I02 – Utilização da rede local de fornecedores – 39 Municípios - Frequência Trimestral

## Indicadores

### I03 – Relação de profissionais admitidos em cada região – MG e ES

Meta Global: 70%  
Percentual(%)

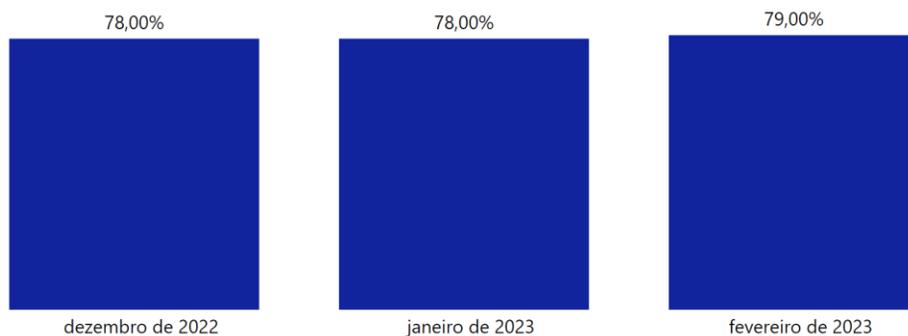


Gráfico 3: I03 – Relação de profissionais admitidos em cada região – MG e ES - Frequência Mensal

### I04 – Relação de profissionais admitidos em cada região – 46 Municípios

Meta Global: 50%  
Percentual(%)

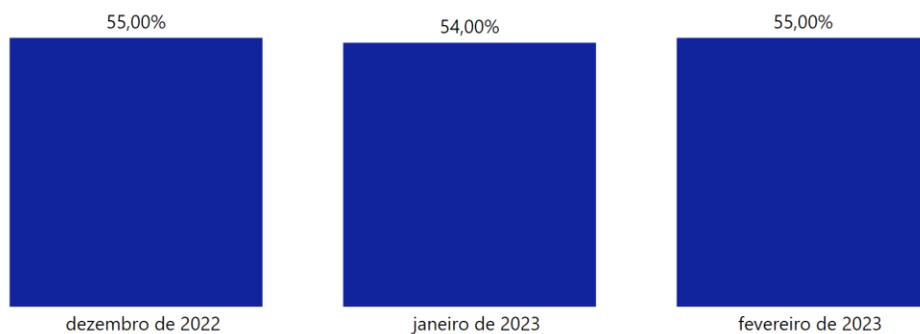


Gráfico 4: I04 – Relação de profissionais admitidos em cada região – 46 Municípios - Frequência Mensal

## Indicadores

### I05 – Quantidade de profissionais que finalizaram os cursos de aperfeiçoamento profissional

Meta Global: 4000  
Quantidade



Gráfico 5: I05 – Quantidade de profissionais que finalizaram os cursos de aperfeiçoamento profissional - Frequência Semestral

### I06 –Número de Empresas Capacitadas

Meta Global: 400  
Quantidade




Gráfico 6: I06 –Número de Empresas Capacitadas - Frequência Anual

## Indicadores

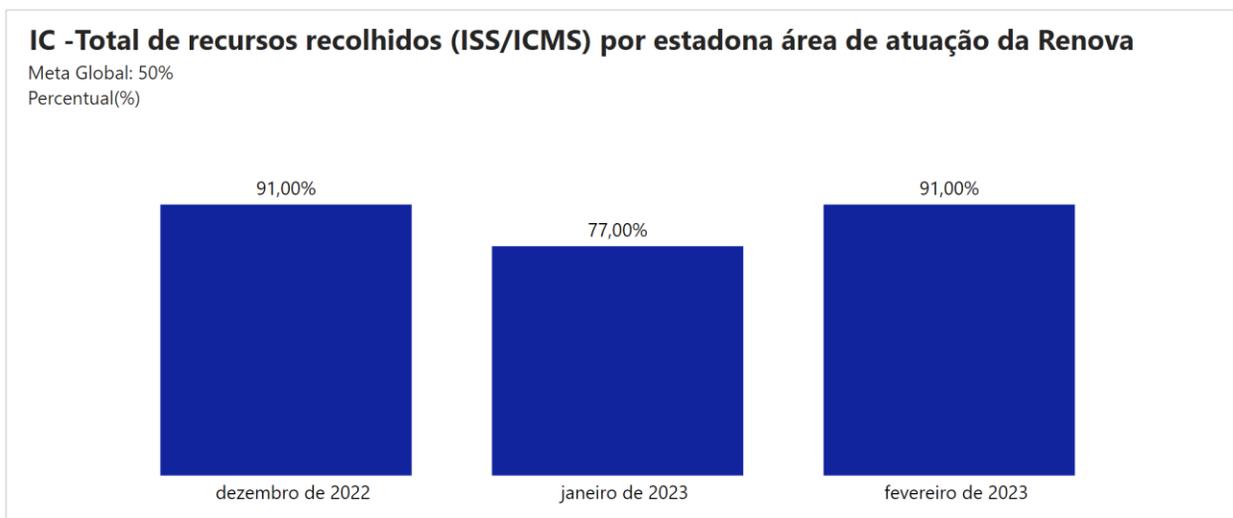


Gráfico 7: IC - Total de recursos recolhidos (ISS/ICMS) por estado na área de atuação da Renova - Frequência Mensal

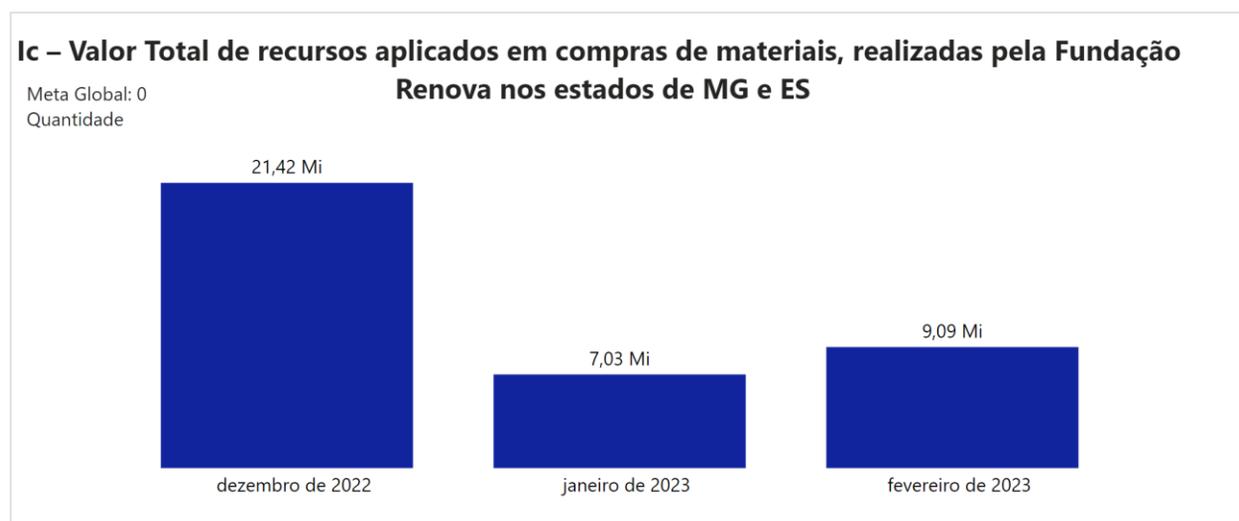


Gráfico 8: Ic – Valor Total de recursos aplicados em compras de materiais, realizadas pela Fundação Renova nos estados de MG e ES - Frequência Semestral

## **PG021 Auxílio Financeiro Emergencial**

### **Eixo Pessoas e Comunidade**

#### **Objetivo**

Fornecer auxílio financeiro emergencial à população impactada que tenha tido comprometimento de sua renda em razão de interrupção comprovada de suas atividades produtivas ou econômicas em decorrência do Rompimento, conforme as Cláusulas de 137 a 140 e 21 a 24 do TTAC.

## Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	137	Caput	Judicializada
Deliberação	111	6	Concluída Internamente
Deliberação	210	único	Concluída Internamente
Deliberação	307	2b	Concluída Internamente
Deliberação	35	n/a	Concluída Internamente
Deliberação	420	3-a	Judicializada
Deliberação	422	2	Concluída Internamente
Deliberação	457	1 e 2	Judicializada
Deliberação	48	n/a	Concluída Internamente
Deliberação	485	1 e 2	Concluída Internamente

## **Entregas do ano de 2023**

A Fundação Renova entende que o Planejamento deste Programa tem sido determinado por decisões judiciais (a exemplo da decisão de 30/11/2021), e, em função disso, não é possível precisar o Planejamento 2023 em sede administrativa.

## **Grandes números do programa**

- Atualmente há 14.315 titulares que recebem auxílio financeiro emergencial. Considerando titulares e dependentes, são 31.967 pessoas assistidas pelo Programa;
- Até o momento foram pagos R\$ 2.381.818.680.

## Fatos relevantes do mês

Exclusão de 39 auxílios

Inclusão de 0 auxílios.

## Indicadores




Gráfico 1: I01 – Adimplência dos pagamentos de auxílio financeiro emergencial - Frequência Trimestral



Gráfico 2: I02 – Percentual de pagamento de Programa de Auxílio Financeiro Emergencial - Frequência Trimestral

## **PG023 Manejo de Rejeitos**

### **Eixo Terra e Água**

#### **Objetivo**

Apresentar diretrizes, conceitos, metodologias, técnicas, critérios e indicadores para tomada de decisão quanto ao manejo dos rejeitos para elaboração e execução de projetos aplicáveis a cada fração territorial nas áreas afetadas pelo rompimento da Barragem de Fundão.

## Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	150	Caput	Concluída Internamente
Cláusula	151	Caput	Judicializada
Cláusula	180	§único	Judicializada
Cláusula	180	Caput	Em andamento
Deliberação	142	2	Concluída Internamente
Deliberação	164	1	Concluída Internamente
Deliberação	165	1	Concluída Internamente
Deliberação	165	2	Concluída Internamente
Deliberação	173	3	Concluída Internamente
Deliberação	180	2	Concluída Internamente
Deliberação	194	2	Em andamento
Deliberação	222	1	Concluída Internamente
Deliberação	222	1.1	Concluída Internamente
Deliberação	222	1.2	Concluída Internamente
Deliberação	222	1.3	Concluída Internamente
Deliberação	222	1.4	Concluída Internamente
Deliberação	222	1.5	Concluída Internamente
Deliberação	222	1.6	Concluída Internamente
Deliberação	222	1.7	Concluída Internamente
Deliberação	245	1	Em andamento
Deliberação	245	1.1	Concluída Internamente
Deliberação	245	1.2	Concluída Internamente
Deliberação	245	1.3	Concluída Internamente
Deliberação	245	1.4	Em andamento
Deliberação	246	2	Concluída Internamente
Deliberação	246	3	Concluída Internamente
Deliberação	261	1.13	Concluída Internamente
Deliberação	261	1.14	Concluída Internamente
Deliberação	261	1.15	Reprogramada

Deliberação	261	1	Em andamento
Deliberação	261	1.1	Concluída Internamente
Deliberação	261	1.10	Em andamento
Deliberação	261	1.11	Em andamento
Deliberação	261	1.12	Em andamento
Deliberação	261	1.16	Concluída Internamente
Deliberação	261	1.17	Concluída Internamente
Deliberação	261	1.18	Concluída Internamente
Deliberação	261	1.19	Concluída Internamente
Deliberação	261	1.2	Concluída Internamente
Deliberação	261	1.3	Concluída Internamente
Deliberação	261	1.4	Concluída Internamente
Deliberação	261	1.5	Concluída Internamente
Deliberação	261	1.7	Concluída Internamente
Deliberação	261	1.8	Judicializada
Deliberação	261	1.9	Em andamento
Deliberação	273	1	Em andamento
Deliberação	273	1.1	Em andamento
Deliberação	273	1.2	Concluída Internamente
Deliberação	273	1.3	Em andamento
Deliberação	273	1.6	Em andamento
Deliberação	323	1	Em andamento
Deliberação	324	2	Concluída Internamente
Deliberação	345	2	Concluída Internamente
Deliberação	358	1	Concluída Internamente
Deliberação	358	2	Concluída Internamente
Deliberação	358	3	Judicializada
Deliberação	362	2	Reprogramada
Deliberação	363	1	Concluída Internamente
Deliberação	364	1	Concluída Internamente
Deliberação	378	5	Concluída Internamente
Deliberação	378	6	Concluída Internamente

Deliberação	273	1.4	Em andamento
Deliberação	273	1.5	Em andamento
Deliberação	273	1.7	Em andamento
Deliberação	284	1	Concluída Internamente
Deliberação	284	2	Concluída Internamente
Deliberação	285	3	Concluída Internamente
Deliberação	285	4	Concluída Internamente
Deliberação	285	5	Concluída Internamente
Deliberação	3	n/a	Concluída Internamente
Deliberação	304	2	Judicializada
Deliberação	384	1	Concluída Internamente
Deliberação	431	2	Concluída Internamente
Deliberação	45	n/a	Concluída Internamente
Deliberação	453	3	Concluída Internamente
Deliberação	488	2	Judicializada
Deliberação	488	4	Judicializada
Deliberação	497	1	Concluída Internamente
Deliberação	497	2	Concluída Internamente
Deliberação	497	3	Concluída Internamente
Deliberação	516	2	Concluída Internamente
Deliberação	516	3	Concluída Internamente
Deliberação	544	2	Concluída Internamente
Deliberação	544	3	Concluída Internamente
Deliberação	590	2	Concluída Internamente
Deliberação	592	2	Concluída Internamente
Deliberação	592	5	Em andamento
Deliberação	618	5	Em andamento
Deliberação	619	1	Em andamento
Deliberação	619	2	Em andamento

Deliberação	630	3	Concluída Internamente
Deliberação	630	4	Em andamento
Deliberação	632	1	Em andamento
Deliberação	633	1	Concluída Internamente
Deliberação	633	2	Concluída Internamente
Deliberação	634	2	Em andamento
Deliberação	86	1-a	Concluída Internamente
Deliberação	86	1-c	Concluída Internamente
Deliberação	86	1-c (ação 1)	Concluída Internamente
Deliberação	86	e	Concluída Internamente
Deliberação	86	f	Concluída Internamente

## Entregas do ano de 2023

- julho de 2023 Conclusão do Monitoramento Ambiental 2022-2023 - 5º Ano Hidrológico
- julho de 2023 Conclusão do Monitoramento de solos, sedimentos e águas superficiais da Cachoeira Camargos em atendimento à Nota Técnica CT-GRSA nº 16/2021

● Concluído      ● Planejado      ● Reprogramado

## **Grandes números do programa**

O programa não possui grandes números

## Fatos relevantes do mês

Relatório de seleção da Áreas Prioritárias para a Renaturalização, NHC, 2023, (FR.2023.0676).

Plano de Monitoramento Ambiental do Projeto Piloto de Recuperação das Lagoas Marginais, Golder, 2023. (Ofício FR.2023.0675).

## **Indicadores**

Conforme estabelecido pela Nota Técnica 12/2018/CTPDCS/CIF e Deliberação CIF nº230, os indicadores do Programa estão em discussão no âmbito da 12ª Vara Cível e Agrária, na Ação Civil Pública (ACP) 69758-91.2018.4.01.3400. Portanto, esse processo encontra-se em andamento.

## **PG025 Recuperação Ambiental Área 1**

### **Eixo Terra e Água**

#### **Objetivo**

Recuperação da área diretamente impactada pelo rompimento da barragem de Fundão (ÁREA AMBIENTAL 1) nos municípios de Mariana, Barra Longa, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado, em atendimento as cláusulas 158, 159 e 160 do TTAC, bem como do distrito de Chopotó, localizado no município de Ponte Nova, que foi parcialmente impactado.

## Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	158	Caput	Encerrada
Cláusula	159	§único	Em andamento
Cláusula	159	Caput	Em andamento
Cláusula	160	Caput	Concluída Internamente
Deliberação	186	2	Concluída Internamente
Deliberação	223	3	Concluída Internamente
Deliberação	249	3	Concluída Internamente
Deliberação	26	n/a	Concluída Internamente
Deliberação	613	2.1	Em andamento
Deliberação	613	2.2	Concluída Internamente
Deliberação	619	1	Em andamento
Deliberação	619	2	Em andamento
Deliberação	66	Ação 1	Concluída Internamente
Deliberação	66	Ação 3	Concluída Internamente

## Entregas do ano de 2023

- dezembro de 2023 ● Finalização da manutenção do restauro florestal em área impactada - Barra Longa- 2023
- dezembro de 2023 ● Finalização da manutenção do restauro florestal em área impactada - Mariana - 2023
- dezembro de 2023 ● Finalização da manutenção do restauro florestal em área impactada - Ponte Nova - 2023
- dezembro de 2023 ● Finalização da manutenção do restauro florestal em área impactada - Rio Doce - 2023
- dezembro de 2023 ● Finalização da manutenção do restauro florestal em área impactada - Santa Cruz do Escalvado- 2023

## **Grandes números do programa**

- 808 hectares de plantio emergencial para controle de erosão;
- 113 afluentes recuperados;
- 542 hectares de restauração florestal implantados e em manutenção.

## **Fatos relevantes do mês**

Envio do Relatório de Respostas aos Itens VII e XIII da Deliberação CIF nº 613 de 16 de setembro de 2022.

As atividades de manutenção da restauração florestal vem sendo desenvolvidas nos municípios atingidos.

## Indicadores

### I08 - Índice de solo exposto – Cenários B e C

Percentual(%)

15,00%

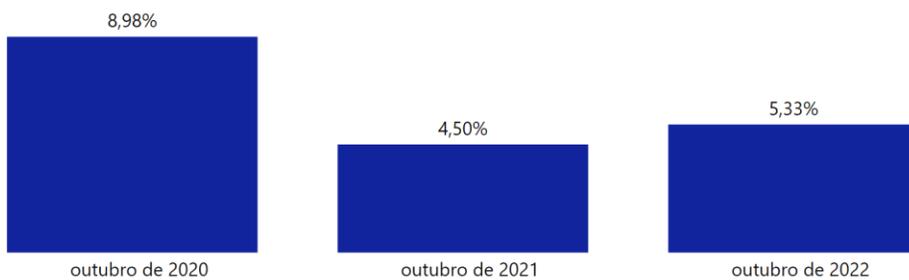


Gráfico 1: I08 - Índice de solo exposto – Cenários B e C - Frequência Bianual

## Indicadores

Tabela 1. Indicadores do programa.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDADE DE MEDIDA
<b>I01</b>	Índice de Cobertura Vegetal	$(\text{Área total com cobertura vegetal herbácea - arbustiva} / \text{Área total passível de revegetação emergencial/inicial}) * 100$	%
<b>I02</b>	Índice de Solo Exposto	$(\text{Área total com solo exposto} / \text{Área total passível de revegetação emergencial/inicial}) * 100$	%
<b>I03</b>	Biomassa Total da Vegetação	$(0,011 * \text{banda } 2 * \text{NDVI2}) + (-0,008 * \text{Banda } 3 * \text{NDVI2})$	t/ha
<b>I04</b>	Índice de Redução de Perda de Solo	$(\text{Perda de solo [t/há]} \text{ nas parcelas de monitoramento tratadas por bioengenharia} / \text{Perda de solo [t/há]} \text{ nas parcelas de monitoramento e controle}) * 100$	%
<b>I05</b>	Diversidade de Espécies Nativas para Cenários A, B e C	$(\text{Diversidade de espécies nativas no sexto ano de intervenção} / \text{diversidade de espécies nativas do ecossistema de referência}) * 100$	%
<b>I06</b>	Densidade Total de Espécies Nativas (Mudas + Regenerantes) – Cenários A, B e C	Número de indivíduos / área amostral	Nº de indivíduos/ha
<b>I07</b>	Controle de Espécies Invasoras – Cenários B e C	$(\text{Área total com espécie invasora} / \text{Total das áreas em recuperação florestal (cenários B e C)}) * 100$	%

## **PG026 Recuperação de Áreas de Preservação Permanente APP**

### **Eixo Terra e Água**

#### **Objetivo**

Promover a recuperação de APPs e áreas de recarga hídrica degradadas do Rio Doce e tributários preferencialmente, mas não se limitando, nas sub-bacias dos rios definidos como fonte superficial de abastecimento alternativo para os municípios e distritos listados nos parágrafos segundo e terceiro da CLÁUSULA 171 deste acordo, conforme as prioridades definidas pelo COMITÊ INTERFEDERATIVO, através da deliberação 196/2018, numa extensão de 40.000 ha em 10 anos.

Este programa será executado diretamente pela Fundação Renova e/ou em cooperação com os governos dos estados de Minas Gerais e Espírito Santo.

## Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	161	Caput	Judicializada
Deliberação	108	2	Concluída Internamente
Deliberação	108	3	Concluída Internamente
Deliberação	11	n/a	Concluída Internamente
Deliberação	133	2	Concluída Internamente
Deliberação	134	2	Concluída Internamente
Deliberação	14	n/a	Concluída Internamente
Deliberação	143	3	Concluída Internamente
Deliberação	143	5	Concluída Internamente
Deliberação	143	6	Concluída Internamente
Deliberação	144	1	Concluída Internamente
Deliberação	196	4	Concluída Internamente
Deliberação	270	4	Em Andamento
Deliberação	343	1.4	Concluída Internamente
Deliberação	44	n/a	Concluída Internamente
Deliberação	490	1	Concluída Internamente
Deliberação	490	2	Concluída Internamente
Deliberação	62	n/a	Concluída Internamente
Deliberação	65	n/a	Concluída Internamente
Deliberação	88	3	Concluída Internamente
Deliberação	89	3	Concluída Internamente
Deliberação	90	3	Concluída Internamente

## Entregas do ano de 2023

fevereiro de 2023	●	Conclusão dos cercamentos/proteção nas propriedades para Sub-bacia Santa Maria do Doce - 23/24
março de 2023	●	Conclusão da mobilização dos produtores rurais para Sub-bacia Guandu - 23/24
março de 2023	●	Conclusão das atividades de engajamento/validação nas propriedades para Sub-bacia Corrente Grande - 22/23
julho de 2023	●	Conclusão das atividades de engajamento/validação nas propriedades para Sub-bacia Assentamentos MG e TI Krenak - 23/24
agosto de 2023	●	Conclusão das atividades de engajamento/validação nas propriedades para Sub-bacia Santa Maria do Doce - 24/25
setembro de 2023	●	Conclusão dos cercamentos/proteção nas propriedades para Sub-bacia Assentamentos, TI Krenak, Uds e Ucs - 23/24
outubro de 2023	●	Conclusão dos cercamentos/proteção nas propriedades para Sub-bacia Manhuaçu - 23/24
outubro de 2023	●	Conclusão da mobilização dos produtores rurais para Sub-bacia Assentamentos, TI Krenak, Uds e Ucs - 24/25
outubro de 2023	●	Conclusão da mobilização dos produtores rurais para Sub-bacia Corrente Grande - 23/24
outubro de 2023	●	Conclusão das atividades de engajamento/validação nas propriedades para Sub-bacia Guandu - 23/24
novembro de 2023	●	Conclusão dos cercamentos/proteção nas propriedades para Sub-bacia Guandu - 23/24
novembro de 2023	●	Conclusão das atividades de engajamento/validação nas propriedades para Sub-bacia Pontões e Lagoas - 24/25
novembro de 2023	●	Conclusão dos cercamentos/proteção nas propriedades para Sub-bacia Santa Maria do Doce - 24/25
novembro de 2023	●	Conclusão das atividades de engajamento/validação nas propriedades para Sub-bacia Corrente Grande - 23/24
dezembro de 2023	●	Conclusão dos cercamentos/proteção nas propriedades para Sub-bacia Guandu - 24/25

● Concluído

● Planejado

● Reprogramado

## Grandes números do programa

- 44.737,88 **hectares** inscritos no edital;
- 29.718 hectares validados.
- 12.184,1 **hectares** com o processo de recuperação iniciada;
- R\$ 1.616.973 pagos de PSA aos produtores rurais.
- 353 **propriedades rurais** parceiras nas ações de recuperação das áreas de preservação permanente (APP) e áreas de recarga hídrica (ARH);

## Fatos relevantes do mês

Treinamento, alinhamento e reciclagem da equipe Progen sobre os PGs 26 e 27, validação de áreas e PIPs\_PGs 26 e 27.

Segunda etapa da Capacitação de Drone para a turma do Baixo Rio Doce. Aula prática e processamento de imagens PGs 26 e 27.

Vistoria em nascentes e alinhamento interno de atividades de monitoramento da qualidade e ecológico (Coimbra e Viçosa - MG) \_PGs 26 e 27.

Reunião de HandOver – Contrato de Monitoramento da Qualidade\_PGs 26 e 27.

Vistoria das atividades de Identificação Botânica das exsicatas coletadas no Inventário Florestal - Herbário SAMES, UFES - São Mateus - ES\_PGs 26 e 27.

Reunião da Rede de Sementes e Midas com a FIEMG PGs 26 e 27.

Reunião da Rede de Sementes com SENAI, articulação para cursos de formação de lideranças com os coletores de sementes\_PGs 26 e 27.

Reunião com SENAI para aplicação de metodologia Lean nos viveiros florestais da Rede\_PGs 26 e 27

Acompanhamento da produção, viveiro ouro verde\_PGs 26 e 27.

Levantamento das biojoias Pataxós\_PGs 26 e 27.

Rede de Sementes e Mudanças: Reciclagem junto aos coletores das Comunidades Quilombolas Distrito de Quilombo, Bom Jardim, São Domingos, Córrego Mestre, Sesmaria, Santa Bárbara, Barra do Santo Antônio e Maritaca\_PGs 26 e 27

Rede de Sementes e Mudanças: VimVer recebendo USP e Universidade de Colombo - USA\_PGs 26 e 27.

Rede de Sementes e Mudanças: Manutenção no sistema de refrigeração da Câmara Fria\_PGs 26 e 27.

Rede de Sementes e Mudanças: preparo e envio de 20Kg de mix de sementes florestais nativas para plantio\_PGs 26 e 27.

Identificação do status das Associações das Comunidades Quilombola Córrego Mestre, Córrego Sesmaria e Maritaca\_PGs 26 e 27.

## Fatos relevantes do mês

Apresentação dos resultados consolidados do Monitoramento Ecológico – Ambipar\_PGs 26 e 27.

Rede de Sementes e Mudas: Reciclagem junto aos coletores (as) dos Assentamentos: 01 de Junho, Ulisses Oliveira, Beija Flor, Boa Esperança, Laje e Irã Aguiar\_PGs 26 e 27.

Treinamento Assentamento Boa Esperança e Beija Flo\_PGs 26 e 27.

Palestra na Escola Estadual Frei Afonso Maria Jordá em Aimorés/MG, sobre os programas de restauração florestal da Fundação Renova e a importância da preservação da água\_PGs 26 e 27.

Revisão da Instrução Técnica do monitoramento de qualidade e aplicação do procedimento em campo afim de testar a metodologia e o processamento dos dados\_PGs 26 e 27.

56ª Reunião Ordinária CT-Flor\_PGs 26 e 27.

Reunião de alinhamento com as equipes GIS, Rede de Sementes e Mudas, Projetos e Monitoramentos.

## Indicadores

Tabela 1. Indicadores que não iniciaram a medição.

INDICADOR	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDADE DE MEDIDA	INÍCIO PREVISTO DE MEDIÇÃO
I00 – APPs e recarga hídricas recuperadas	I00 - Hectare recuperado	ha	janeiro/2024
I01 - Riqueza de espécies	I01 - (riqueza de espécies nativas no sexto ano de intervenção / riqueza de espécies nativas do ecossistema de referência) * 100	%	janeiro/2024
I02 – Densidade de regenerantes	I02 - Número de indivíduos / total de área amostral	Nº indivíduos/ha	janeiro/2024
I03 - Cobertura do dossel	I03 - (total da área amostral com cobertura do dossel / total da área amostral) * 100	%	janeiro/2024

## **PG027 Recuperação de Nascentes**

### **Eixo Terra e Água**

#### **Objetivo**

Promover a recuperação de 5.000 (cinco mil) nascentes, a serem definidas pelo Comitê de Bacia Hidrográfica do Doce (CBH-Doce), iniciando a recuperação de 500 (quinhentas) nascentes por ano, a contar da assinatura do TTAC, em um período máximo de 10 (dez) anos, conforme estabelecido no Plano Integrado de Recursos Hídricos do CBH-Doce, podendo abranger toda área da Bacia do Rio Doce.

Este programa será executado diretamente pela Renova e/ou em cooperação com iniciativas correlatas na bacia do rio Doce.

## Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	163	Caput (ação 1)	Judicializada
Deliberação	135	3	Concluída Internamente
Deliberação	135	4	Concluída Internamente
Deliberação	135	5	Concluída Internamente
Deliberação	490	1	Concluída Internamente
Deliberação	490	2	Concluída Internamente
Deliberação	87	3	Concluída Internamente

## Entregas do ano de 2023

janeiro de 2023		Conclusão da mobilização dos produtores rurais para a sub-bacia de Manhuaçu - 24/25
fevereiro de 2023		Conclusão as atividades de engajamento / validação nas propriedades para a sub-bacia de Corrente Grande - 23/24
fevereiro de 2023		Conclusão dos cercamentos/proteção nas propriedades para a sub-bacia de Suaçuí - 23/24
abril de 2023		Lançamento do Edital de mobilização dos produtores rurais para a sub-bacia de Caratinga - 24/25
abril de 2023		Lançamento do Edital de mobilização dos produtores rurais para a sub-bacia de Guandu - 24/25
abril de 2023		Lançamento do Edital de mobilização dos produtores rurais para a sub-bacia de Manhuaçu - 24/25
abril de 2023		Lançamento do Edital de mobilização dos produtores rurais para a sub-bacia de Piracicaba - 24/25
abril de 2023		Lançamento do Edital de mobilização dos produtores rurais para a sub-bacia de Pontões e Lagoas - 24/25
abril de 2023		Lançamento do Edital de mobilização dos produtores rurais para a sub-bacia de Santo Antônio - 24/25
abril de 2023		Conclusão da mobilização dos produtores rurais para a sub-bacia de Piranga - 19/20
abril de 2023		Conclusão da mobilização dos produtores rurais para a sub-bacia de Piranga - 23/24
abril de 2023		Conclusão dos cercamentos/proteção nas propriedades para a sub-bacia de Pontões e Lagoas - 20/21
maio de 2023		Conclusão da mobilização dos produtores rurais para a sub-bacia de Santo Antônio - 24/25
junho de 2023		Conclusão as atividades de engajamento / validação nas propriedades para a sub-bacia de Piranga - 19/20
junho de 2023		Conclusão as atividades de engajamento / validação nas propriedades para a sub-bacia de Piranga - 23/24

 **Concluído**
 **Planejado**
 **Reprogramado**

## Entregas do ano de 2023

julho de 2023	●	Conclusão da mobilização dos produtores rurais para a sub-bacia de Pontões e Lagoas - 24/25
julho de 2023	●	Conclusão da mobilização dos produtores rurais para a sub-bacia de Piracicaba - 24/25
julho de 2023	●	Conclusão da mobilização dos produtores rurais para a sub-bacia de Suaçuí - 24/25
agosto de 2023	●	Conclusão da mobilização dos produtores rurais para a sub-bacia de Caratinga - 24/25
setembro de 2023	●	Conclusão as atividades de engajamento / validação nas propriedades para a sub-bacia de Suaçuí - 24/25
setembro de 2023	●	Conclusão dos cercamentos/proteção nas propriedades para a sub-bacia de Piranga - 23/24
setembro de 2023	●	Conclusão as atividades de engajamento / validação nas propriedades para a sub-bacia de Piracicaba - 24/25
setembro de 2023	●	Conclusão as atividades de engajamento / validação nas propriedades para a sub-bacia de Santo Antônio - 24/25
setembro de 2023	●	Conclusão dos cercamentos/proteção nas propriedades para a sub-bacia de Corrente Grande - 22/23
setembro de 2023	●	Conclusão dos cercamentos/proteção nas propriedades para a sub-bacia de Piranga - 19/20
novembro de 2023	●	Conclusão as atividades de engajamento / validação nas propriedades para a sub-bacia de Pontões e Lagoas - 23/24
dezembro de 2023	●	Conclusão dos cercamentos/proteção nas propriedades para a sub-bacia de Manhuaçu - 24/25

● Concluído

● Planejado

● Reprogramado

## Grandes números do programa

- 5.450 **nascentes** inscritas no edital;
- 2.726 nascentes validadas;
- 1.754 **nascentes** com o processo de recuperação iniciada;
- R\$ 493.808,35 pagos de PSA aos produtores rurais;
- 556 **propriedades rurais** parceiras nas ações de recuperação das nascentes.

## Fatos relevantes do mês

Treinamento, alinhamento e reciclagem da equipe Progen sobre os PGs 26 e 27, validação de áreas e PIPs\_PGs 26 e 27.

Segunda etapa da Capacitação de Drone para a turma do Baixo Rio Doce. Aula prática e processamento de imagens PGs 26 e 27.

Vistoria em nascentes e alinhamento interno de atividades de monitoramento da qualidade e ecológico (Coimbra e Viçosa - MG) \_PGs 26 e 27.

Reunião de HandOver – Contrato de Monitoramento da Qualidade\_PGs 26 e 27.

Vistoria das atividades de Identificação Botânica das exsicatas coletadas no Inventário Florestal - Herbário SAMES, UFES - São Mateus - ES\_PGs 26 e 27.

Reunião da Rede de Sementes e Midas com a FIEMG PGs 26 e 27.

Reunião da Rede de Sementes com SENAI, articulação para cursos de formação de lideranças com os coletores de sementes\_PGs 26 e 27.

Reunião com SENAI para aplicação de metodologia Lean nos viveiros florestais da Rede\_PGs 26 e 27

Acompanhamento da produção, viveiro ouro verde\_PGs 26 e 27.

Levantamento das biojoias Pataxós\_PGs 26 e 27.

Rede de Sementes e Mudanças: Reciclagem junto aos coletores das Comunidades Quilombolas Distrito de Quilombo, Bom Jardim, São Domingos, Córrego Mestre, Sesmaria, Santa Bárbara, Barra do Santo Antônio e Maritaca\_PGs 26 e 27

Rede de Sementes e Mudanças: VimVer recebendo USP e Universidade de Colombo - USA\_PGs 26 e 27.

Rede de Sementes e Mudanças: Manutenção no sistema de refrigeração da Câmara Fria\_PGs 26 e 27.

Rede de Sementes e Mudanças: preparo e envio de 20Kg de mix de sementes florestais nativas para plantio\_PGs 26 e 27.

Identificação do status das Associações das Comunidades Quilombola Córrego Mestre, Córrego Sesmaria e Maritaca\_PGs 26 e 27.

## Fatos relevantes do mês

Apresentação dos resultados consolidados do Monitoramento Ecológico – Ambipar\_PGs 26 e 27.

Rede de Sementes e Mudas: Reciclagem junto aos coletores (as) dos Assentamentos: 01 de Junho, Ulisses Oliveira, Beija Flor, Boa Esperança, Laje e Irã Aguiar\_PGs 26 e 27.

Treinamento Assentamento Boa Esperança e Beija Flo\_PGs 26 e 27.

Palestra na Escola Estadual Frei Afonso Maria Jordá em Aimorés/MG, sobre os programas de restauração florestal da Fundação Renova e a importância da preservação da água\_PGs 26 e 27.

Revisão da Instrução Técnica do monitoramento de qualidade e aplicação do procedimento em campo afim de testar a metodologia e o processamento dos dados\_PGs 26 e 27.

56ª Reunião Ordinária CT-Flor\_PGs 26 e 27.

Reunião de alinhamento com as equipes GIS, Rede de Sementes e Mudas, Projetos e Monitoramentos.

## Indicadores

Tabela 1. Indicadores que não iniciaram a medição.

INDICADOR	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDADE DE MEDIDA	INÍCIO PREVISTO DE MEDIÇÃO
I00 – Nascentes recuperadas	I00 - Nascente Recuperada	ha	janeiro/2022
I01 - Riqueza de espécies	I01 - (riqueza de espécies nativas no sexto ano de intervenção / riqueza de espécies nativas do ecossistema de referência) * 100	%	janeiro/2022
I02A – Densidade de regenerantes (Plantio Total)	I02 - Número de indivíduos / total de área amostral	Nº indivíduos/ha	janeiro/2022
I02B – Densidade de regenerantes (Condução da regeneração)	I02 - Número de indivíduos / total de área amostral	Nº indivíduos/ha	janeiro/2022
I03 - Cobertura do dossel	I03 - (total da área amostral com cobertura do dossel / total da área amostral) * 100	%	janeiro/2022

### Nota:

- Alteração das datas de Início Previsto de Medição dos Indicadores conforme documento de Definição.

## **PG028 Conservação da Biodiversidade**

### **Eixo Terra e Água**

#### **Objetivo**

Identificar, mensurar e monitorar os impactos agudos e crônicos sobre a biota e ambientes do rio Doce e tributários, da foz, costeiros, estuarinos e marinhos, implementar medidas para a recuperação e conservação desta biota nos ambientes potencialmente impactados pelo rompimento da barragem de Fundão e avaliar a efetividade dessas medidas.

## Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	164	a (ação 1)	Encerrada
Cláusula	164	a (ação 2)	Encerrada
Cláusula	164	a (ação 3)	Encerrada
Cláusula	164	b	Encerrada
Cláusula	164	c (ação 1)	Concluída Internamente
Cláusula	164	c (ação 2)	Em andamento
Cláusula	165	Inc I - a-b	Concluída Internamente
Cláusula	165	Inc II - a	Concluída Internamente
Cláusula	165	Inc II - b	Concluída Internamente
Cláusula	165	Inc III - ES	Em andamento
Cláusula	165	Inc III - MG	Judicializada
Cláusula	166	§1º	Em andamento
Cláusula	166	§2º	Em andamento
Deliberação	102	2	Concluída Internamente
Deliberação	112	2	Concluída Internamente
Deliberação	113	2	Concluída Internamente
Deliberação	148	3	Concluída Internamente
Deliberação	148	4	Concluída Internamente
Deliberação	159	2	Concluída Internamente
Deliberação	159	3	Judicializada
Deliberação	212	3	Concluída Internamente
Deliberação	218	3	Concluída Internamente
Deliberação	218	4	Concluída Internamente
Deliberação	279	2	Concluída Internamente
Deliberação	279	3	Concluída Internamente
Deliberação	282	1	Concluída Internamente
Deliberação	282	2	Concluída Internamente
Deliberação	336	1	Concluída Internamente

Deliberação	337	1	Concluída Internamente
Deliberação	347	1.3	Concluída Internamente
Deliberação	347	1.4	Concluída Internamente
Deliberação	385	3.2	Concluída Internamente
Deliberação	385	3.3	Concluída Internamente
Deliberação	392	1	Concluída Internamente
Deliberação	447	1	Judicializada
Deliberação	450	2	Judicializada
Deliberação	450	5	Concluída Internamente
Deliberação	461	3	Concluída Internamente
Deliberação	578	2	Concluída Internamente
Deliberação	579	1	Concluída Internamente
Deliberação	607	2	Em andamento
Deliberação	607	3	Concluída Internamente
Deliberação	631	2	Concluída Internamente
Deliberação	74	1	Concluída Internamente
Deliberação	79	n/a	Concluída Internamente

## Entregas do ano de 2023

- janeiro de 2023 ● Conclusão da publicação do livro do plano de ação para conservação da biodiversidade aquática
- janeiro de 2023 ● Protocolo do Relatório subprojeto III-A - SIF/UFV
- fevereiro de 2023 ● Protocolo do Relatório Semestral do Monitoramento dos Anexos 1 a 8 - TR4 - Ciclo 4
- março de 2023 ● Conclusão do monitoramento complementar da Biodiversidade Aquática do rio Doce em MG - SIF/UFV
- abril de 2023 ● Conclusão do Ciclo 2 de Monitoramento da Biodiversidade Aquática do Rio Doce em Minas Gerais (Cl. 165)
- junho de 2023 ● Conclusão do Ciclo 4 de Monitoramento da Biodiversidade Aquática do Rio Doce, da foz e ambientes marinhos e estuarinos impactados na Área Ambiental 1, no Espírito Santo
- julho de 2023 ● Monitoria do Plano de Ação - Biodiversidade Aquática - PA - Ano 1 concluído

● Concluído

● Planejado

● Reprogramado

## **Grandes números do programa**

O programa não possui grandes números

## Fatos relevantes do mês

Em 03 de março de 2023 foi protocolado o ofício FR.2023.0517 referente à apresentação do Relatório e dados brutos do Subprojeto V (Estudo da ictiofauna da bacia do Rio doce após o rompimento de rejeito da Samarco, com foco em segurança alimentar: avaliação do estresse oxidativo tecidual) e do Relatório Compilado Final (relatório final do projeto). Esses produtos compõem o projeto “Estudo da Ictiofauna da bacia do rio Doce após o rompimento da barragem de rejeito da Samarco”, como parte do atendimento à Deliberação CIF nº 521 de 05 de agosto de 2021 e à Cláusula 165 do TTAC.

Em 08 de março de 2023 foi protocolado o ofício FR.2023.0544 e anexos referentes à apresentação da VERSÃO ATUALIZADA DO PLANO DE TRABALHO do Programa de Monitoramento da Biodiversidade Aquática – Porção Capixaba do Rio Doce e Região Marinha e Costeira Adjacente (PMBA/FEST); projeto que atende ao inciso III da cláusula 165.

Nos dias 23 e 24 de março de 2023 foi realizado em Belo Horizonte o Workshop de Integração entre as Linhas de Pesquisa FAPEMIG Chamada 10/2018, referentes ao Programa de Monitoramento da Biodiversidade Aquática em Minas Gerais - Cláusula 165.

## Indicadores

### I01 – Execução de campanhas de campo (Cláusulas 165)

Meta Global: 100%  
Percentual(%)

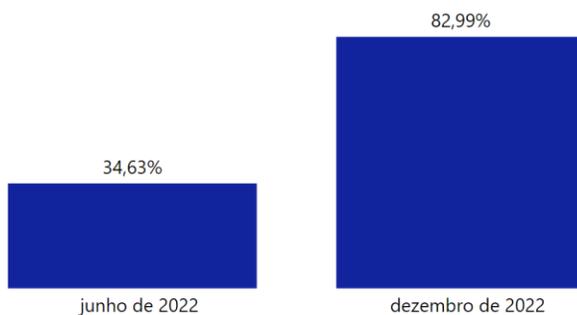


Gráfico 1: I01 – Execução de campanhas de campo (Cláusulas 165) - Frequência Semestral

## **PG029 Programa de Fortalecimento das Estruturas de Triagem e Reabilitação da Fauna Silvestre**

### **Eixo Terra e Água**

#### **Objetivo**

- Efetuar a construção e o aparelhamento de dois Centros de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS), um em Minas Gerais e outro no Espírito Santo; e
- Assegurar recursos para a manutenção operacional desses centros por um período de três anos, contados a partir de sua entrega, de acordo com o Plano de Gestão a ser estabelecido pelo órgão gestor responsável.

## Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	167	Caput	Em andamento
Cláusula	167	§1º	Concluída Internamente
Cláusula	167	§2º	Em andamento
Deliberação	218	3	Concluída Internamente
Deliberação	218	4	Concluída Internamente
Deliberação	478	1	Concluída Internamente
Deliberação	484	1, 2 e 3	Concluída Internamente

## Entregas do ano de 2023

junho de 2023 ● Conclusão do Projeto Executivo do CETRAS ES

● Concluído    ● Planejado    ● Reprogramado

## **Grandes números do programa**

O programa não possui grandes números

## Fatos relevantes do mês

Em 01/03/2023 o Projeto Básico arquitetônico para construção do CETRAS-ES, apresentado para avaliação em outubro/2022, foi aprovado pelo IBAMA/CTBio, conforme Ofício nº 87/2023/SUPES-ES.

## Indicadores

### I05 – Aderência ao cronograma de elaboração de projetos do CETRAS ES

Meta Global: 100%  
Percentual(%)

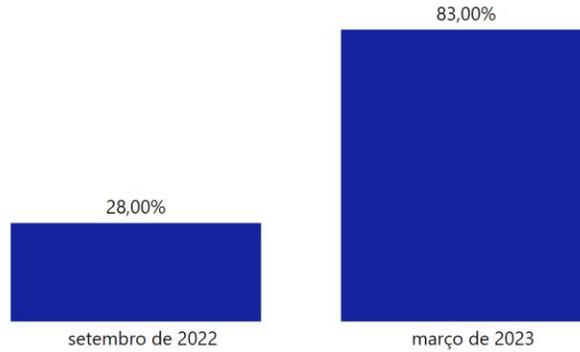


Gráfico 1: I05 – Aderência ao cronograma de elaboração de projetos do CETRAS ES - Frequência Semestral

O percentual de avanço do cronograma planejado para o período escalonado é de 83%. A meta de 100% de aderência ao cronograma foi cumprida.

### I06 – Aderência ao cronograma dos processos de obtenção de licenças e autorizações pertinentes - CETRAS ES

Meta Global: 90%  
Percentual(%)



Gráfico 1: I05 – Aderência ao cronograma de elaboração de projetos do CETRAS ES - Frequência Semestral

## **PG030 Fauna e Flora Terrestre**

### **Eixo Terra e Água**

#### **Objetivo**

- Identificar e caracterizar os impactos do rompimento da barragem de Fundão sobre as espécies da biodiversidade terrestre na área de estudo;
- Apresentar e executar um plano de ação para conservação desta biota conforme resultados dos estudos de impacto;
- Demonstrar/indicar os efeitos da implementação do plano de ação sobre a biodiversidade terrestre.

## Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	168	§1º	Encerrada
Cláusula	168	§2º	Em andamento
Cláusula	168	Caput	Encerrada
Deliberação	132	2	Concluída Internamente
Deliberação	218	3	Concluída Internamente
Deliberação	218	4	Concluída Internamente
Deliberação	419	2	Concluída Internamente
Deliberação	449	3	Concluída Internamente
Deliberação	517	3	Concluída Internamente
Deliberação	91	2	Concluída Internamente
Deliberação	91	3	Concluída Internamente

## Entregas do ano de 2023

janeiro de 2023	●	Protocolo do primeiro relatório semestral do Projeto "Conservação e Manejo de da fauna ameaçadas de extinção na bacia do rio Doce" em parceria com a UFV/CCSS
abril de 2023	●	Protocolo do relatório na CTBio/CIF - Campanha Seca 2022 Fauna
abril de 2023	●	Protocolo do relatório na CTBio/CIF - Campanha Seca 2022 Flora
junho de 2023	●	Protocolo do relatório do workshop na CTBio - Campanha Seca 2022 Fauna
junho de 2023	●	Protocolo do relatório do workshop na CTBio - Campanha Seca 2022 Flora
junho de 2023	●	Conclusão da Publicação "Cidadão Cientista na Bacia do Rio Doce"
julho de 2023	●	Protocolo do relatório semestral 2 do Projeto "Conservação e Manejo de da fauna ameaçadas de extinção na bacia do rio Doce" em parceria com a UFV/CCSS
agosto de 2023	●	Lançamento do primeiro livro de ações para conservação da biodiversidade na Bacia do Rio Doce (Ação 39 do PABT)
agosto de 2023	●	Protocolo na CTBio/CIF do relatório anual de monitoria do PABT
setembro de 2023	●	Protocolo do relatório na CTBio/CIF - Campanha Chuvosa 2022/2023
novembro de 2023	●	Protocolo do relatório do workshop na CTBio - Campanha Chuvosa 2022/2023

● Concluído      ● Planejado      ● Reprogramado

## **Grandes números do programa**

- 10 grupos faunísticos, além da flora terrestre, monitorados na área de estudo;
- 49 ações definidas no Plano de Ação para Conservação da Biodiversidade Terrestre.

## Fatos relevantes do mês

Não houve progressos neste mês

## Indicadores

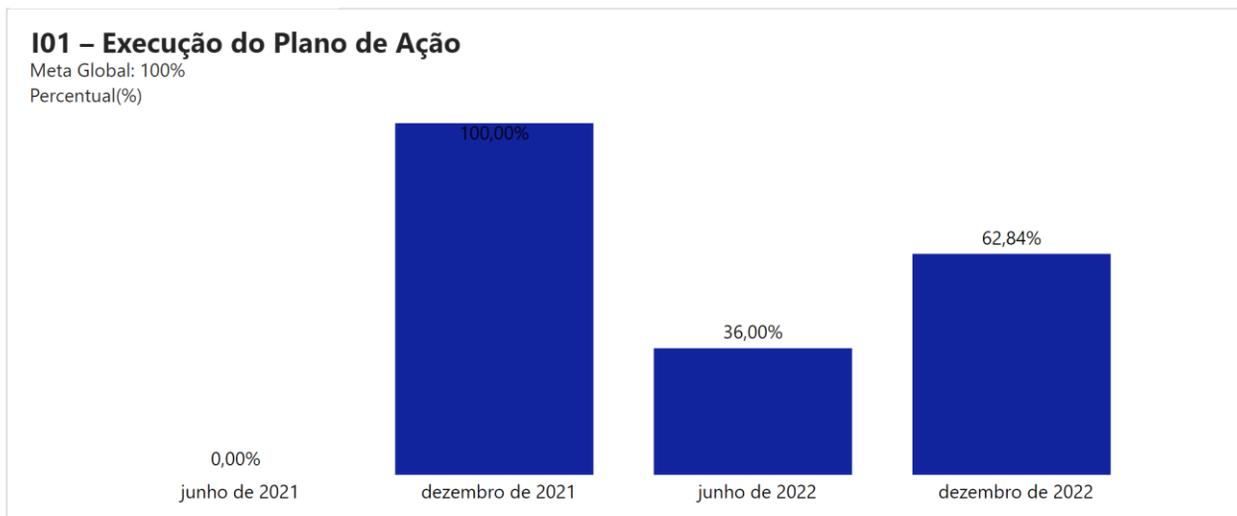


Gráfico 1: I01 – Execução do Plano de Ação - Frequência Sazonal

Em resposta ao questionamento apresentado no relatório de auditoria EY ACP.PG030.03 (Procedimento 4: Verificação de resultados e recálculo do indicador I01 aferido pela Fundação Renova), o respectivo indicador I01 será submetido a GMUD adequando o cálculo do indicador com a definição do programa a partir de 2023.

## **PG031 Coleta e Tratamento de Esgoto e Destinação de Resíduos Sólidos**

### **Eixo Reconstrução e Infraestrutura**

#### **Objetivo**

Objetivo Geral:

O objetivo geral do Programa é contribuir para “acelerar o processo de recuperação da Bacia do Rio Doce, regiões estuarinas, costeiras e marinha, em especial a qualidade e a quantidade de águas nos tributários e assim na calha principal impactada”; em conformidade com o Termo de Transação e de Ajustamento de Conduta (TTAC), por meio da disponibilização de recursos financeiros, no valor de R\$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais), provenientes da Cláusula nº 169 para os 39 municípios da Área Ambiental 2 e R\$ 17.000.000,00 (dezesete milhões de reais), provenientes da Cláusula 232 do TTAC, para atendimento ao pleito do Consórcio Público para o Tratamento e Destinação Final Adequada de Resíduos Sólidos da Região Doce Oeste do Estado do Espírito Santo (CONDOESTE), para ações de esgotamento sanitário e de destinação de resíduos sólidos.

Objetivos Específicos:

- Disponibilizar os recursos financeiros aos municípios para as ações de elaboração ou revisão de planos municipais de saneamento básico; elaboração de projetos de sistema de esgotamento sanitário; implementação de obras de coleta e tratamento de esgotos; erradicação de lixões; implantação de aterros sanitários regionais; implantação, ampliação e melhorias de programas de coleta seletiva, unidades de triagem de recicláveis, unidades de tratamento de orgânicos e estações de transbordo;
- Contratar instituições financeiras públicas para realizar o repasse do recurso financeiro, para o custeio da elaboração das ações de esgotamento sanitário e destinação de resíduos sólidos urbanos;
- Fornecer apoio técnico aos municípios na formulação dos pleitos, na análise da relevância, viabilidade e aderência ao Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) e Plano de Gestão Integrada e Resíduos Sólidos (PGIRS); na elaboração de termos de referência e editais dos processos licitatórios, contratação e acompanhamento da execução das ações estruturantes e estruturais, bem como na prestação de contas físico-financeira das soluções implementadas;
- Fornecer capacitação aos municípios, para subsidiá-los técnica e institucionalmente no andamento dos planos, projetos e obras previstos no programa.

## Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	169	Caput	Em andamento
Cláusula	170	4ª Diretriz	Encerrada
Cláusula	170	Inc I	Encerrada
Cláusula	170	Inc II	Encerrada
Cláusula	170	Inc III	Encerrada
Cláusula	170	Inc IV	Encerrada
Cláusula	170	Inc V	Encerrada
Deliberação	122	n/a	Concluída Internamente
Deliberação	224	5	Concluída Internamente
Deliberação	259	2	Concluída Internamente
Deliberação	259	3	Em andamento
Deliberação	295	1	Concluída Internamente
Deliberação	295	2	Concluída Internamente
Deliberação	635	2	Em andamento
Deliberação	75	4-4.1	Concluída Internamente
Deliberação	75	4-4.2	Concluída Internamente
Deliberação	75	4-4.3	Concluída Internamente

## Entregas do ano de 2023

abril de 2023	● Conclusão do repasse do Pleito MREESCT01
abril de 2023	● Conclusão do repasse do Pleito RIDESOB02
maio de 2023	● Conclusão do repasse do Pleito DIORSAB01
maio de 2023	● Conclusão do repasse do Pleito DIOESCT01
maio de 2023	● Conclusão do repasse do Pleito TIMRSPM03
junho de 2023	● Conclusão do repasse do Pleito SAPRSPM01
julho de 2023	● Conclusão do repasse do Pleito AIMESCT02
agosto de 2023	● Conclusão do repasse do Pleito BALRSPJ01
agosto de 2023	● Conclusão do repasse do Pleito CONESOB01
setembro de 2023	● Conclusão do repasse do Pleito AIMESPJ03
outubro de 2023	● Conclusão do repasse do Pleito TUMESPJ01
outubro de 2023	● Conclusão do repasse do Pleito IPAESOB03
dezembro de 2023	● Conclusão do repasse do Pleito PERRSOB02

### Nota:

Os pleitos a seguir constavam como ações no Planejamento Anual 2023 junto ao CIF, porém foram reprogramados junto aos municípios para concluir em 2024 e por isso não aparecem mais na *time line*.

BALESCT01- Aquisição de terreno para implantação da ETE da sede municipal, BUGESPJ02- Elaboração de projetos de sistema de esgotamento sanitário das localidades de Bugre (sede), São Lourenço, Livramento e São José do Bugre, RASESPJ02- Revisão e elaboração de projetos de engenharia de sistemas de esgotamento sanitário para a Sede do município, DIOESOB03- Implementação de obras de coleta e tratamento de esgotos no distrito de Baixa Verde, NAQESPM01- Revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico.

● Concluído      ● Planejado      ● Reprogramado

## Grandes números do programa

- No mês março 2023 foram repassados R\$2.594.854,84 para ações dos municípios\*;
- No mês março 2023 foram ofertadas 0 oficinas de capacitação para os municípios da Área Ambiental 2;
- No mês março 2023 a equipe técnica realizou 97 visitas e/ou reuniões de apoio técnico aos municípios.

### Notas

Nome do dado	Resultado	Observações
Valores repassados para ações de esgotamento sanitário e resíduos sólidos (mensal)	2.594.854,84	*Repases para ações dos municípios de Córrego Novo, Governador Valadares, Ipaba, Resplendor, Rio Casca, Santana do Paraíso, São Domingos do Prata, Sem Peixe e o Consórcio Condoeste;

## Fatos relevantes do mês

Em março de 2023, foi realizado repasse ao Consórcio Condoeste, no valor de R\$ 179.337,22 referente a implantação da Central de Tratamento de Resíduos – CTR Colatina, incluindo a retirada da linha de transmissão de energia elétrica situada no terreno da CTR Colatina, e o valor de R\$ 63.052,43 referente ao Gerenciamento da obra de implantação da primeira fase do Centro de Tratamento de Resíduos Sólidos Colatina – CTR Colatina;

Em março de 2023, foi realizado repasse ao município de Córrego Novo, no valor de R\$ 73.639,36 referente a implantação de sistema de esgotamento sanitário da sede do município;

Em março de 2023, foi realizado repasse ao município de Governador Valadares, no valor de R\$ 40.429,18, referente a Contratação de assessoria técnica para apoio na obtenção de licenças ambientais - ETE Elvamar;

Em março de 2023, foi realizado repasse ao município de Ipaba, no valor de R\$ 1.459.698,99, referente a implantação de sistema de esgotamento sanitário da sede do município e povoado de Boachá;

Em março de 2023, foi realizado repasse ao município de Resplendor, no valor de R\$ 7.383,30, referente a elaboração de estudo de concepção, viabilidade técnica, econômica, ambiental, projetos básicos e executivos para os distritos de Calixto, Nicolândia, Campo Alegre e Independência;

Em março de 2023, foi realizado repasse ao município de Rio Casca, no valor de R\$ 238.885,92, referente a execução de obras da segunda etapa do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) da sede do município;

Em março de 2023, foi realizado repasse ao município de Santana do Paraíso, no valor de R\$ 14.500,00, referente a revisão do PGIRS;

Em março de 2023, foi realizado repasse ao município de São Domingos do Prata, no valor de R\$ 121.656,92, referente a construção do sistema de esgotamento sanitário da sede do município;

Em março de 2023, foi realizado repasse ao município de Sem Peixe, no valor de R\$ 396.271,52, referente a implantação tratamento de esgotos do Distrito de São Bartolomeu.

## Indicadores de Resultados

### I01 – Percentual do valor repassado total

Meta Global: 100%  
Percentual(%)




Gráfico 1:I01 – Percentual do valor repassado total - Frequência Trimestral

### I02 - Percentual do Valor repassado por município/consórcio

Meta Global: 100%  
Percentual(%)

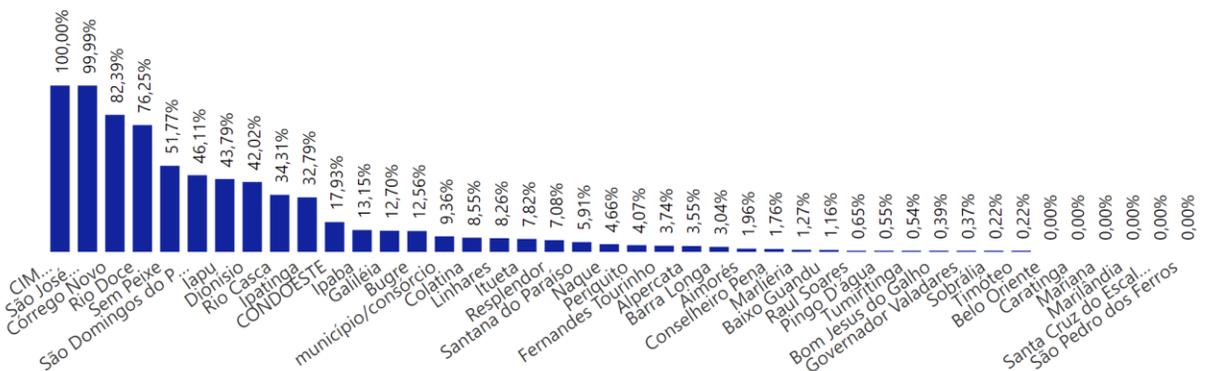


Gráfico 2: I02 - Percentual do Valor repassado por município/consórcio - Frequência Trimestral

Como premissa o valor de correção de IPCA utilizado para o cálculo foi o fechado em dezembro de 2022. Esse valor será a base para as informações referentes ao I02 no ano de 2023.

## Indicadores de Resultados

### I03 – Percentual de Apoio Técnico disponibilizado aos Municípios/ Consórcios

Meta Global: 80%  
Percentual(%)



Gráfico 3: I03 – Percentual de Apoio Técnico disponibilizado aos Municípios/ Consórcios - Frequência Trimestral

### I04 – Percentual de avaliações qualitativas do Apoio Técnico

Meta Global: 80%  
Percentual(%)



Gráfico 4: I04 – Percentual de avaliações qualitativas do Apoio Técnico - Frequência Trimestral

## Indicadores de Resultados

### I05 – Percentual de oficinas de capacitação ofertadas aos municípios/ consórcios

Meta Global: 80%  
Percentual(%)



Gráfico 5: I05 – Percentual de oficinas de capacitação ofertadas aos municípios/ consórcios - Frequência Trimestral

### I06 – Percentual de avaliações qualitativas das oficinas capacitação

Meta Global: 80%  
Percentual(%)



Gráfico 6: I06 – Percentual de avaliações qualitativas das oficinas capacitação - Frequência Trimestral

## Indicadores Físicos e Qualidade da Água

### I07- Percentual de Coleta de Esgoto

Percentual(%)



Gráfico 7: I07- Percentual de Coleta de Esgoto - Frequência Anual

### I08 – Percentual de Tratamento de Esgoto

Percentual(%)




Gráfico 8: I08 – Percentual de Tratamento de Esgoto - Frequência Anual

- Data base 2021. Os dados referentes ao ano de 2022 ainda não foram divulgados pelo Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento SNIS;
- I07 no SNIS havia dados disponíveis de 11 municípios, os demais não foram contabilizados na fórmula;
- I08 no SNIS havia dados disponíveis de 28 municípios, os demais não foram contabilizados na fórmula.

## Indicadores Físicos e Qualidade da Água

### I09 – Percentual de municípios com coleta seletiva

Percentual(%)

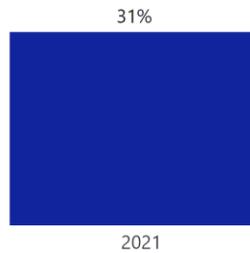


Gráfico 9: I09 – Percentual de municípios com coleta seletiva - Frequência Anual

### I10 - Percentual de municípios com presença de lixões ou aterros controlados

Percentual(%)

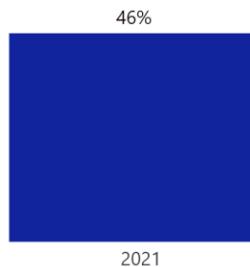


Gráfico 10: I10 - Percentual de municípios com presença de lixões ou aterros controlados - Frequência Anual

- Data base 2021. Os dados referentes ao ano de 2022 ainda não foram divulgados pelo Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento SNIS;
- I09 no SNIS havia dados disponíveis de 35 municípios, os demais não foram contabilizados na fórmula;
- I10 no SNIS havia dados disponíveis de 13 municípios, os demais não foram contabilizados na fórmula.

## Indicadores Físicos e Qualidade da Água

### I11 - Percentual das faixas do Índice de qualidade da água (IQA)

Percentual(%)

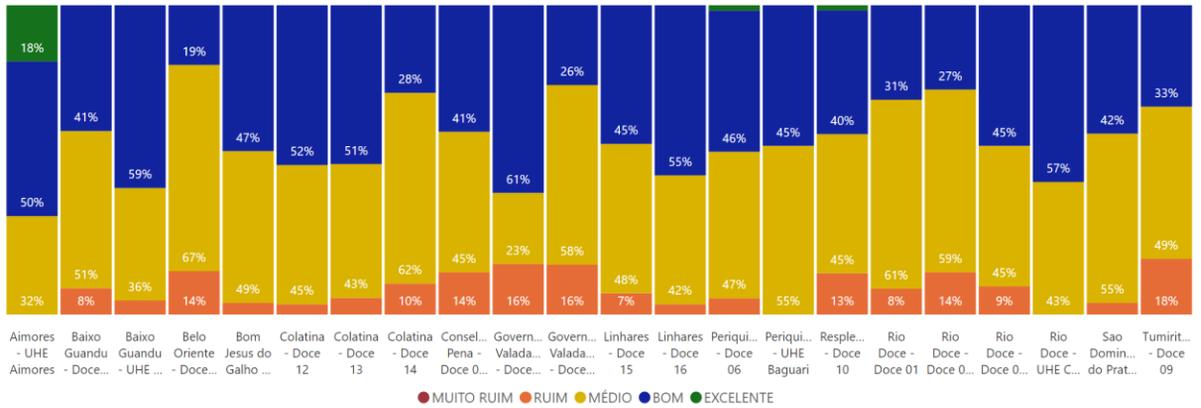


Gráfico 11: I11 - Percentual das faixas do Índice de qualidade da água (IQA)- Frequência Anual

Nota: Dados referentes ao ano de 2022.

### I12 - Percentual das faixas do Índice para Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO)

Percentual(%)

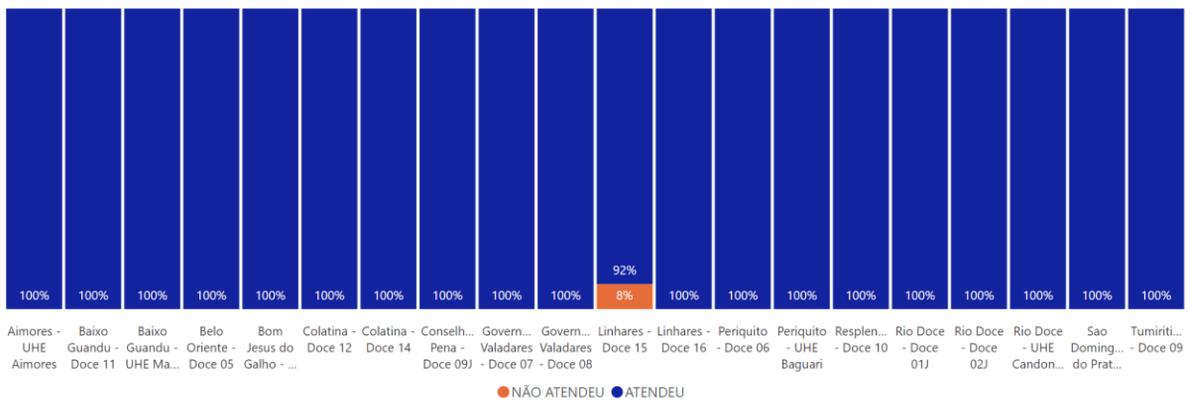


Gráfico 12: I12 - Percentual das faixas do Índice para Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) - Frequência Anual

Nota: Dados referentes ao ano de 2022.

## Indicadores Físicos e Qualidade da Água

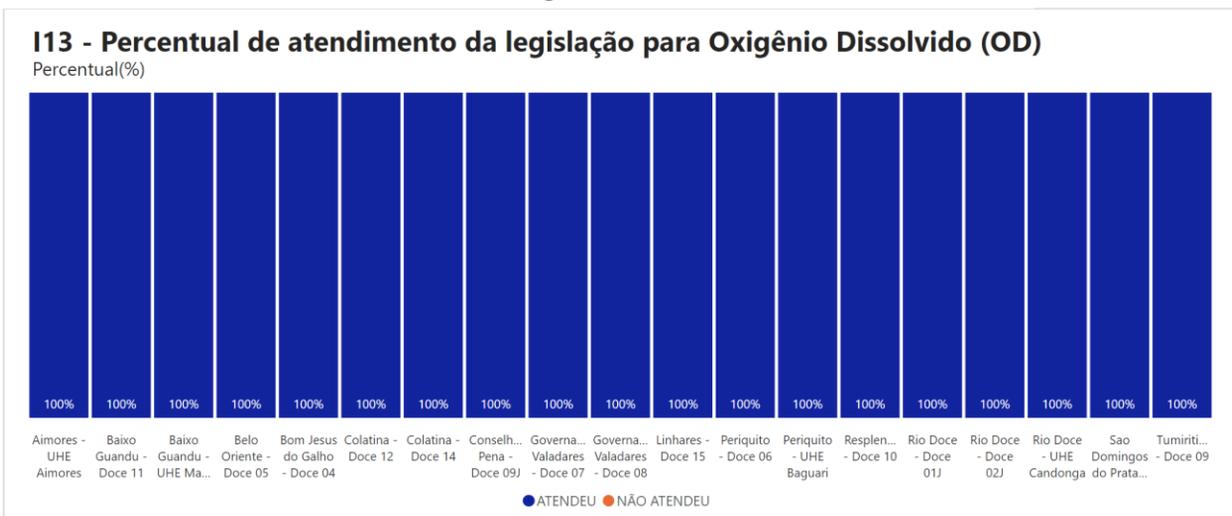


Gráfico 13: I13 - Percentual de atendimento da legislação para Oxigênio Dissolvido (OD) - Frequência Anual

Nota: Dados referentes ao ano de 2022.

## **PG032 Melhoria dos Sistemas de Abastecimento de Água**

### **Eixo Reconstrução e Infraestrutura**

#### **Objetivo**


Promover alternativas de captação e adução de água, visando garantir, em parte, o reestabelecimento do abastecimento de água com a redução de dependência relativa ao rio Doce, e promover melhorias referentes a tratamentos de água para abastecimento público, por meio de medidas de cunhos reparatório e compensatório, em municípios/localidades que tiveram seus sistemas de abastecimento temporariamente inviabilizados.

## Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	171	Caput (obra)	Judicializada
Cláusula	171	Caput (projeto)	Judicializada
Deliberação	10	n/a	Concluída Internamente
Deliberação	107	3.1	Concluída Internamente
Deliberação	107	4	Concluída Internamente
Deliberação	123	2	Concluída Internamente
Deliberação	123	3	Judicializada
Deliberação	124	2	Concluída Internamente
Deliberação	124	4	Concluída Internamente
Deliberação	16	n/a	Judicializada
Deliberação	185	2	Concluída Internamente
Deliberação	185	3	Concluída Internamente
Deliberação	185	4	Judicializada
Deliberação	185	5	Judicializada
Deliberação	185	6	Judicializada
Deliberação	2	1	Em Andamento
Deliberação	258	2	Judicializada
Deliberação	258	4	Concluída Internamente
Deliberação	258	5	Concluída Internamente
Deliberação	308	2	Judicializada
Deliberação	315	1	Concluída Internamente
Deliberação	325	1	Judicializada
Deliberação	33	1	Concluída Internamente
Deliberação	33	i e ii	Em Andamento
Deliberação	378	5	Concluída Internamente
Deliberação	378	6	Concluída Internamente
Deliberação	379	1	Concluída Internamente
Deliberação	379	2	Concluída Internamente
Deliberação	379	3	Concluída Internamente
Deliberação	4	n/a	Judicializada

Deliberação	443	a	Concluída Internamente
Deliberação	76	3	Concluída Internamente
Deliberação	76	4	Concluída Internamente
Deliberação	76	5	Concluída Internamente
Deliberação	98	1	Concluída Internamente

## Entregas do ano de 2023

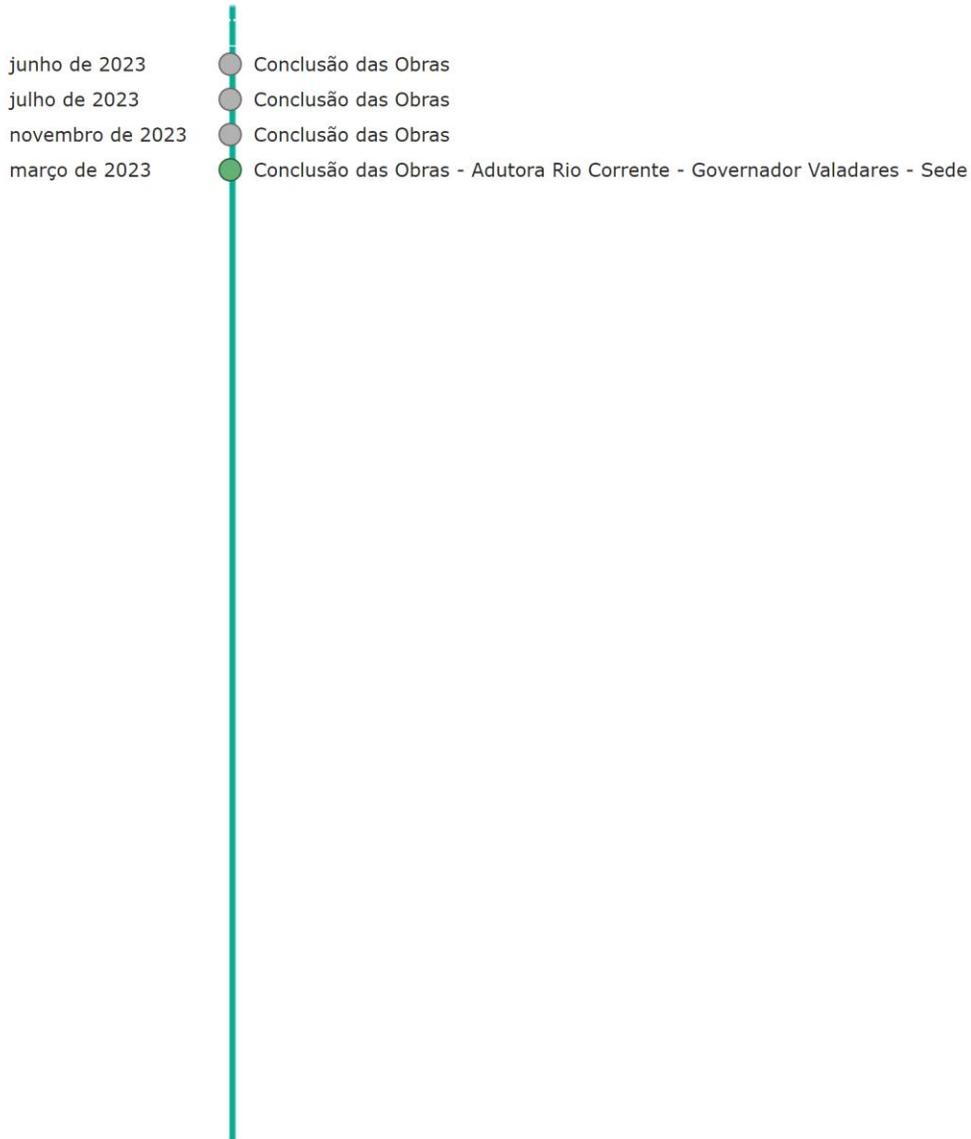

 Concluído       Planejado       Reprogramado

## Grandes números do programa

- 18 sistemas de tratamento de água concluídos, entre Estações de Tratamento de Água (ETAs) convencionais e tratamentos simplificados;
- 19 adutoras concluídas ( entre concluídas e reformadas);

### Notas

Nome do dado	Resultado	Observações
Número de adutoras concluídas (entre concluídas e reformadas)	19	No dia 02/03/2023, foi formalizado a realização das etapas de pré-comissionamento e comissionamento, bem como a formalização da autorização para o início da operação assistida do escopo implantado do sistema de captação alternativa do município de Governador Valadares (Adutora do Rio Corrente Grande). A operação assistida do sistema de captação alternativa terá um prazo de duração de 03 (três) meses a contar dessa data de formalização.

## Fatos relevantes do mês

As ações da Cláusula nº171 do TTAC, que embasam a atuação do Programa 32 - Melhoria dos Sistemas de Abastecimento Público de Água, estão judicializadas desde março de 2020, no contexto do Eixo Prioritário nº 9, da Ação Civil Pública da 12ª Vara Federal Cível e Agrária da Seção Judiciária de Minas Gerais. As tratativas relativas às ações sob controle e supervisão judicial, inclusive as que se referem aos prazos, estão sendo orientadas nesse âmbito.

Em função da judicialização do Programa 32 foram realizadas visitas técnicas pela Perícia da 12ª Vara Federal Cível e Agrária da SJMG, conforme descrito acima.

Nos dias 08 e 09 de março de 2023 a equipe de perícia realizou visita técnica para acompanhamento do andamento das obras em execução pela Fundação Renova e subcontratados, atividades correlatas à Etapa 1.3 – Obras, Comissionamento e Monitoramento do Plano de Trabalho, nas seguintes localidades:

- Pedra Corrida, município de Periquito/MG;
- Sede do município de Governador Valadares/MG;
- Sede do município de Tumiritinga/MG;
- São Tomé do Rio Doce, município de Tumiritinga/MG;
- Sede do município de Galiléia/MG;
- Sede do município de Resplendor/MG;
- Boninsegna, município de Marilândia/ES;
- Sede do município de Baixo Guandu/ES;
- Sede do município de Linhares/ES.

Em 15 de março de 2023, em reunião por videoconferência via Microsoft Teams, a Fundação Renova apresentou para a equipe da perícia a atualização do andamento das obras das localidades visitadas nos dias 08 e 09 de março de 2023.

Em 14 de março de 2023, a COPASA formalizou junto a CTSHQA a discordância quanto a capacidade do sistema de tratamento da captação alternativa de Tumiritinga, e pleiteou a redução de dependência do rio Doce em 100%, de modo a implantar sistema de tratamento para a totalidade da vazão do poço C-04.

Em 10 de março, foi emitido a dispensa de licenciamento ambiental para a ETA de Boninsegna, distrito de Marilândia/ES.

Em 07 de março de 2023, em reunião por videoconferência via Microsoft Teams, a Fundação Renova apresentou para a equipe da perícia a atualização do resumo do status dos projetos e obras das 25 localidades relacionadas no Item 1 da Decisão Judicial (ID 151060877).

## Indicadores

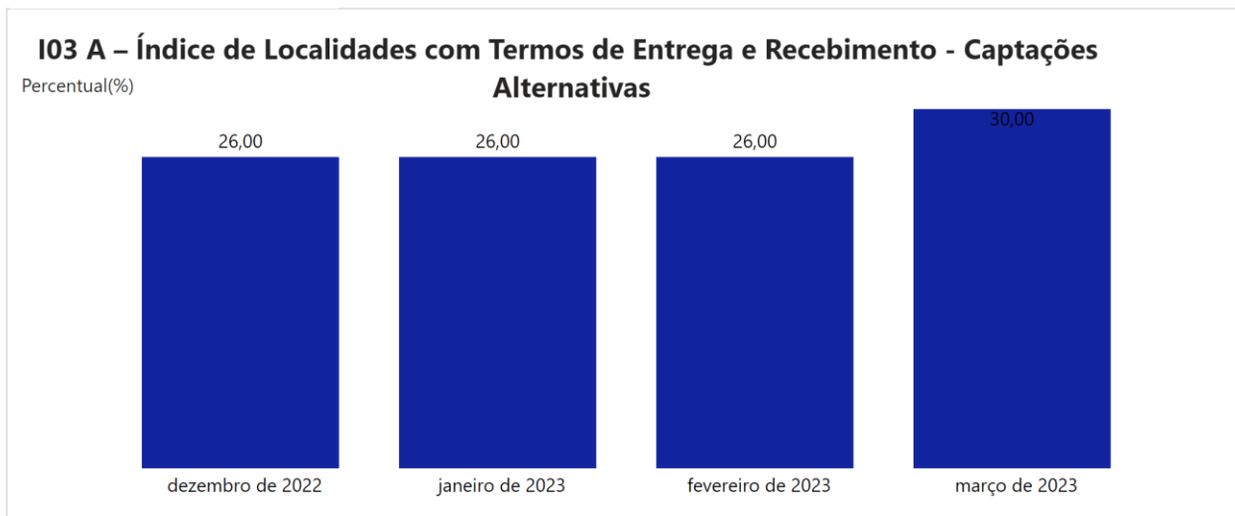


Gráfico 1: I03 A – Índice de Localidades com Termos de Entrega e Recebimento - Captações Alternativas - Frequência Mensal

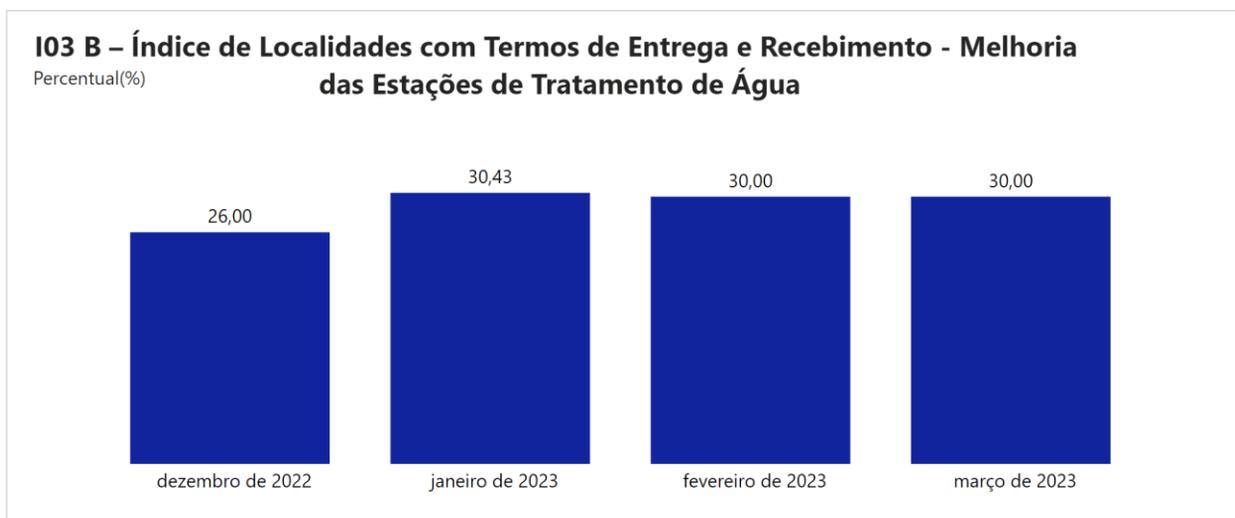


Gráfico 2: I03 B – Índice de Localidades com Termos de Entrega e Recebimento - Melhoria das Estações de Tratamento de Água - Frequência Mensal

## Indicadores

### I04 - Índice de Localidades com Captações Alternativas Concluídas e Aptas a Operar

Meta Global: 100%  
Percentual(%)




Gráfico 3: I04 - Índice de Localidades com Captações Alternativas Concluídas e Aptas a Operar - Frequência Trimestral

### I05 - Índice de Localidades com Melhorias das Estações de Tratamento de Água Concluídas

Meta Global: 100%  
Percentual(%)




Gráfico 4: I05 - Índice de Localidades com Melhorias das Estações de Tratamento de Água Concluídas - Frequência Trimestral

## **PG033 Programa de Educação Ambiental**

### **Eixo Pessoas e Comunidade**

#### **Objetivo**

Implementar processos de educação socioambiental que desenvolvam competências e habilidades para engajar pessoas e coletivos no desenvolvimento de iniciativas para a revitalização dos territórios atingidos.

## Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	172	Caput	Em andamento
Deliberação	136	1	Concluída Internamente
Deliberação	240	1	Concluída Internamente
Deliberação	288	1	Concluída Internamente
Deliberação	288	2	Em andamento
Deliberação	343	1.4	Concluída Internamente
Deliberação	549	2	Em andamento

## Entregas do ano de 2023



 Concluído  Planejado  Reprogramado

## **Grandes números do programa**

O programa não possui grandes números

## Fatos relevantes do mês

Não houve progresso relevante neste mês

## Indicadores

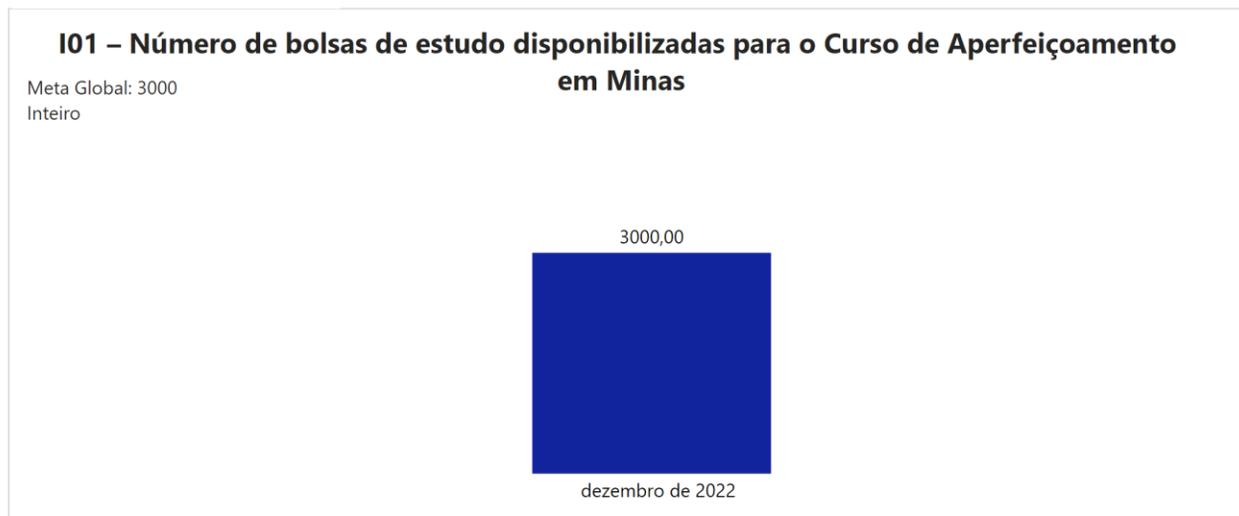


Gráfico 1: I01 – Número de bolsas de estudo disponibilizadas para o Curso de Aperfeiçoamento em Minas - Frequência Semestral




Gráfico 2: I19 – Número de vagas disponibilizadas para a capacitação de Lideranças Jovens - Frequência Anual

## **PG034 Programa de Preparação para Emergências Ambientais**

### **Eixo Pessoas e Comunidade**

#### **Objetivo**

Implantação de ações de incremento às estruturas de apoio para os sistemas de emergências ambientais nos Municípios de Mariana, Barra Longa, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado, de forma integrada com a Defesa Civil, conforme previsto na Cláusula 173 do TTAC, promovendo a ampliação da percepção das comunidades e a autonomia da defesa civil para atuação, gestão e convivência em cenários de riscos e desastres.

## Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	173	§1º	Encerrada
Cláusula	173	§2º	Encerrada
Cláusula	173	Caput (ação 1)	Concluída Internamente
Cláusula	173	Caput (ação 2)	Em andamento
Deliberação	128	2	Concluída Internamente
Deliberação	303	2	Concluída Internamente
Deliberação	357	2	Concluída Internamente
Deliberação	357	3	Concluída Internamente
Deliberação	439	2	Concluída Internamente
Deliberação	623	3	Em andamento

## Entregas do ano de 2023

- dezembro de 2023 ● Conclusão da disponibilização de recursos para agentes das Defesas Cíveis para participar de cursos de curta duração em 2023
- dezembro de 2023 ● Conclusão dos cursos de curta duração
- dezembro de 2023 ● Conclusão dos cursos de Graduação Tecnólogo em Segurança Pública e Tecnólogo em Gestão Pública

## **Grandes números do programa**

O programa não possui grandes números

## Fatos relevantes do mês

Não houve progressos neste mês.

## Indicadores

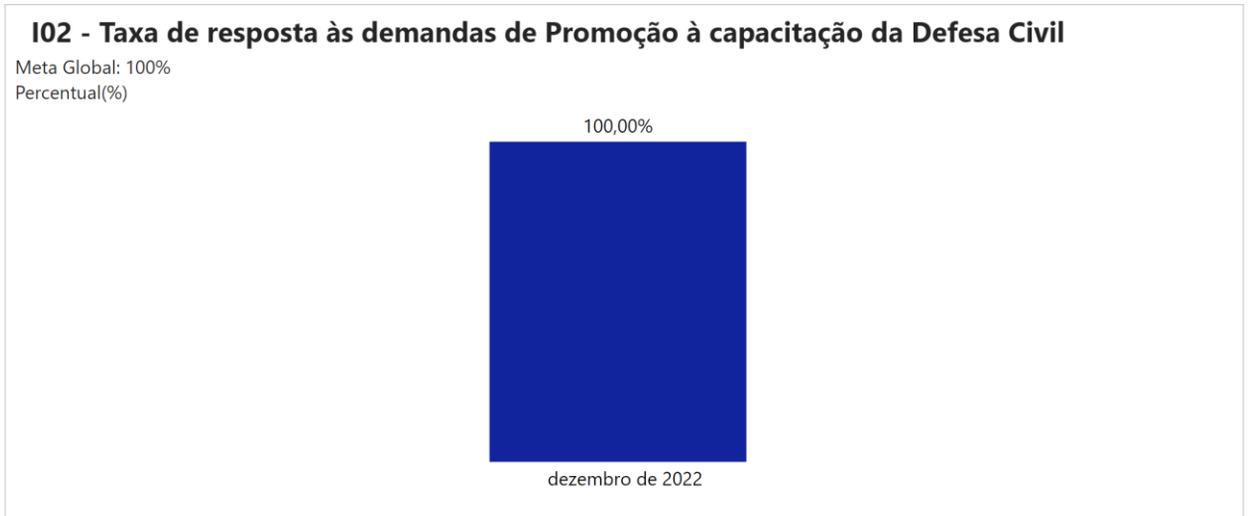


Gráfico 1: I02 - Taxa de resposta às demandas de Promoção à capacitação da Defesa Civil - Frequência Anual

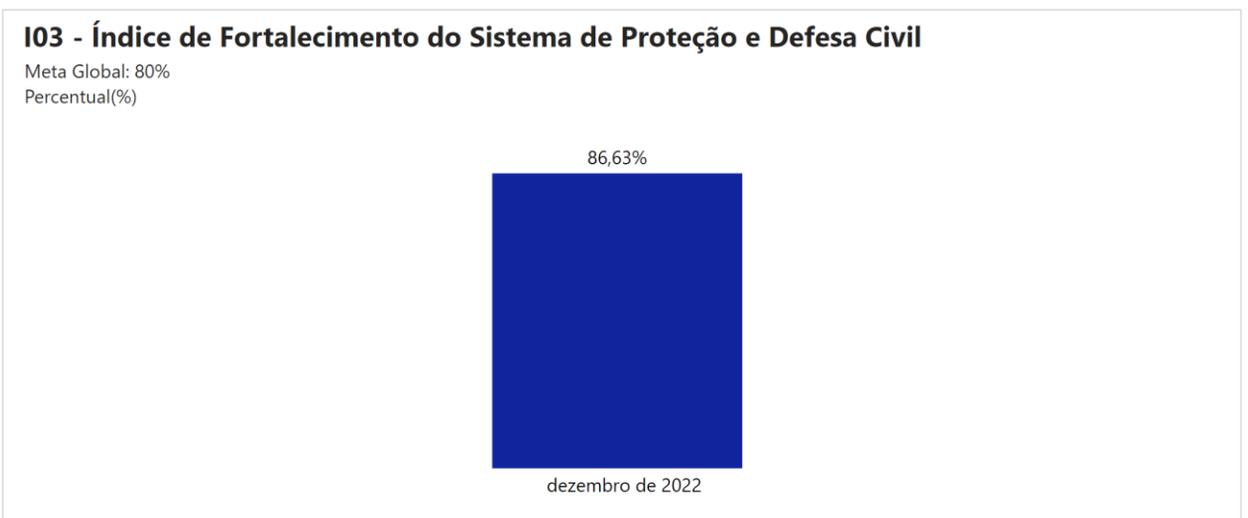


Gráfico 2: I03 - Índice de Fortalecimento do Sistema de Proteção e Defesa Civil - Frequência Anual

## Indicadores




Gráfico 3: I04 - Percentual de cumprimento da implantação de medidas de incremento da estrutura de apoio das defesas civis - Frequência Anual

Os indicadores do programa foram aprovados pelo CIF, porém ainda estão fora do período de medição.

Tabela 1. Indicadores que não iniciaram a medição.

<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	<b>INÍCIO DA MEDIÇÃO</b>
<b>I01</b>	Percentual de indivíduos capacitados (cursos de longa duração)	%	Junho/25

## **PG035 Informação para a População**

### **Eixo Pessoas e Comunidade**

#### **Objetivo**

O Programa de Informação para a População tem como objetivo salvaguardar e disponibilizar, de modo descentralizado e acessível, um acervo de dados e informações sobre o rompimento da barragem de Fundão e seus desdobramentos. O acervo deverá incluir: (i) a memória, o modo de vida e os processos socioeconômicos e socioambientais relacionados às comunidades e municípios atingidos; e (ii) estudos técnicos e ações de reparação e compensação. O acesso por moradores locais, pessoas atingidas, poder público, comunidade acadêmica e outros públicos será promovido por meio de espaços físicos e digitais e estratégias itinerantes que constituem o Centro de Informação Técnica.

## Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	174	§1º	Em andamento
Cláusula	174	Caput	Em andamento
Cláusula	65	Caput	Em andamento
Deliberação	229	3	Concluída Internamente
Deliberação	229	4	Concluída Internamente
Deliberação	229	5	Concluída Internamente
Deliberação	306	2	Concluída Internamente
Deliberação	306	4.1	Concluída Internamente
Deliberação	306	4.2	Concluída Internamente
Deliberação	376	2	Concluída Internamente
Deliberação	437	1- a	Concluída Internamente
Deliberação	437	1- b	Concluída Internamente
Deliberação	437	1- c	Concluída Internamente
Deliberação	437	1- d	Concluída Internamente
Deliberação	437	1- e	Concluída Internamente
Deliberação	437	1- f	Concluída Internamente
Deliberação	437	1- g	Concluída Internamente
Deliberação	437	1- h	Concluída Internamente
Deliberação	437	1- i	Concluída Internamente
Deliberação	437	1- j	Concluída Internamente
Deliberação	437	1- k	Concluída Internamente
Deliberação	437	1- l	Concluída Internamente
Deliberação	500	I	Concluída Internamente
Deliberação	500	II	Concluída Internamente
Deliberação	500	III	Concluída Internamente
Deliberação	500	IV	Concluída Internamente
Deliberação	500	V	Concluída Internamente

## Entregas do ano de 2023

março de 2023		Realização das oficinas do segundo ciclo de Trilhas de Memória
maio de 2023		Realização da mostra de resultados das oficinas do segundo ciclo de Trilhas de Memória
junho de 2023		Publicação do ebook do segundo ciclo dos Webinários Conhecimento em Pauta
junho de 2023		Publicação dos resultados das oficinas do segundo ciclo de Trilhas de Memória
agosto de 2023		Publicação dos resultados da pesquisa com usuários da Plataforma Interativa
outubro de 2023		Realização da mostra de resultados das oficinas do terceiro ciclo de Trilhas de Memória
novembro de 2023		Publicação dos resultados das oficinas do terceiro ciclo de Trilhas de Memória
novembro de 2023		Publicação de relatório de avaliação de eficiência da Plataforma Interativa
dezembro de 2023		Realização da manutenção da Plataforma Interativa em 2023

 Concluído     Planejado     Reprogramado

## Grandes números do programa

<b>Dado</b>	<b>fev/2023</b>	<b>mar/2023</b>	<b>Acumulado 2022</b>	<b>Acumulado Total</b>
Quantidade de acessos à plataforma interativa	7360	22493	50582	84854
Quantidade de atividades de Descentralização e Itinerância	1	2	4	19

## Fatos relevantes do mês

A equipe do PG35 realizou o Trilhas de Memórias, em Barra Longa/MG, no dia 09 de março de 2023. A oficina foi realizada no escritório da H&P, na Rua Venâncio Lino Mol, 44 – Centro. Contou com a participação de 8 pessoas da comunidade. Foram realizadas 3 horas de atividades com o objetivo de registrar as memórias afetivas dos participantes de maneira artística e textual. Os trabalhos resultantes da oficina serão registrados em um livro e disponibilizados no site do CIT para constituírem o acervo da Coleção de “Registros dos territórios atingidos”.

A equipe do PG35 realizou o Trilhas de Memórias, em Regência, distrito de Linhares/ES, no dia 11 de março de 2023. A oficina foi realizada no Centro Ecológico de Regência, na rua Principal, S/N - Regência Augusta. Contou com a participação de pessoas de diversas idades da comunidade, sendo uma oportunidade para o encontro de gerações com trocas de vivências e histórias. Foram apresentadas algumas fotos do acervo do Centro Ecológico onde os participantes puderam (re)conhecer as imagens e produzir registros das suas memórias afetivas de maneira artística e textual. Foram realizadas 7 horas de atividades com a presença de 8 participantes. Os trabalhos resultantes da oficina serão registrados em um livro e disponibilizados no site do CIT para constituírem o acervo da Coleção de “Registros dos territórios atingidos”.

No dia 30 de março de 2023, a equipe técnica do PG35, a equipe do Diálogo e membros da equipe de Relações Institucionais da Fundação Renova realizaram uma reunião com moradores do Bairro de Lourdes, em Governador Valadares. A reunião teve como objetivo apresentar o projeto conceitual do CIT a ser construído ocupando, parcialmente, a praça Getúlio Vargas para tirar dúvidas e prestar esclarecimentos aos presentes. Os moradores foram convidados de porta em porta e foram afixados cartazes em vários pontos comerciais do bairro, conforme evidências anexas.

## Indicadores

### 1. Média móvel mensal de acessos a plataforma interativa

Número Absoluto



Gráfico 1: 1. Média móvel mensal de acessos a plataforma interativa - Frequência Trimestral

### 2. Avaliação da qualidade do conjunto de conteúdos disponibilizados na plataforma interativa

Número Absoluto




Gráfico 2: 2. Avaliação da qualidade do conjunto de conteúdos disponibilizados na plataforma interativa - Frequência Trimestral

Não foram registrados nenhum dado referente à avaliação de qualidade do conjunto de conteúdos da plataforma interativa no último trimestre através dos formulários de pesquisa.

## Indicadores

### 3. Avaliação da usabilidade da plataforma interativa

Número Absoluto

0,00  
março de 2023

Gráfico 3: 3. Avaliação da usabilidade da plataforma interativa - Frequência Trimestral

Não foram registrados nenhum dado referente à avaliação de usabilidade da plataforma interativa no último trimestre através dos formulários de pesquisa.

### 6. Percentual de capilaridade das ações de descentralização e itinerância

Porcentagem %

18,00%  
março de 2023

Gráfico 4: 6. Percentual de capilaridade das ações de descentralização e itinerância - Frequência Trimestral

## Indicadores

### 7. Avaliação do conteúdo das ações de descentralização e itinerância

Número absoluto




Gráfico 5:7. Avaliação do conteúdo das ações de descentralização e itinerância - Frequência Trimestral

## **PG036 Comunicação Nacional e Internacional**

### **Eixo Pessoas e Comunidade**

#### **Objetivo**

- Estabelecer sítio eletrônico em no mínimo dois idiomas, para divulgar as ações e o andamento dos programas desenvolvidos em função do TTAC. (Cláusula 175 conforme anexo I, e Revisão Extraordinária número 3, de 30 de agosto de 2018);
- Comunicar à sociedade, às comunidades atingidas, aos órgãos reguladores e aos diversos públicos relacionados sobre as ações conduzidas pela Fundação Renova, também como forma de contrapor boatos e notícias de teor falso.
- Ampliar o alcance das informações e abrir espaço para discussão e construção coletiva de ideias relacionadas ao processo de reparação e compensação conduzidos pela Fundação Renova.

## Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	175	Caput (ação 1)	Concluída Internamente
Cláusula	175	Caput (ação 2)	Em andamento
Deliberação	506	2.2	Concluída Internamente
Deliberação	530	1	Concluída Internamente

## Entregas do ano de 2023

dezembro de 2023	●	Atualização e manutenção de conteúdo do site, incluindo relatórios e documentos de interesse da sociedade e órgãos de validação em 2023.
dezembro de 2023	●	Atualização e manutenção de conteúdo e informações importantes para as comunidades atingidas e sociedade civil, via Redes Sociais em 2023
dezembro de 2023	●	Atualização mensal das entregas e fatos relevantes dentro das páginas dos programas, reportadas no relatório mensal do CIF (Comitê Interfederativo), hospedados no site, em português e inglês em 2023.

● Concluído      ● Planejado      ● Reprogramado

## Grandes números do Programa

Tabela 1. Grandes Números.

<b>Indicador</b>	<b>fev/2023</b>	<b>mar/2023</b>	<b>Acumulado 2023</b>	<b>Acumulado (2016 - 2023)</b>
Acesso ao Site (mês)	137.735	177.280	401.974	10.414.533
Documentos no site (mês)	11	16	58	628
Notícias Publicadas (mês)	11	12	26	1.061
Vídeos (mês)	15	26	50	792

## Fatos relevantes do mês

Aprovação de revisão 6 do PG 36 pelo CIF. Dentre as principais atualizações destacam-se: ajustes nos parâmetros de indicadores de alcance do Facebook e LinkedIn, além da inclusão da matriz de responsabilidade sobre o Portal da Transparência, que define as responsabilidades de reformulação do Portal, para o programa.

Atualização das entregas e fatos relevantes do mês reportadas pelos demais programas no relatório mensal do CIF (Comitê Interfederativo) e nas páginas dos programas hospedados no site, nas versões em português e inglês.

## Indicadores




Gráfico 1: I01 – Acessos das cidades prioritárias ao site - Frequência Mensal




Gráfico 2: I02 – Visualizações de páginas de serviço - Frequência Mensal

## Indicadores

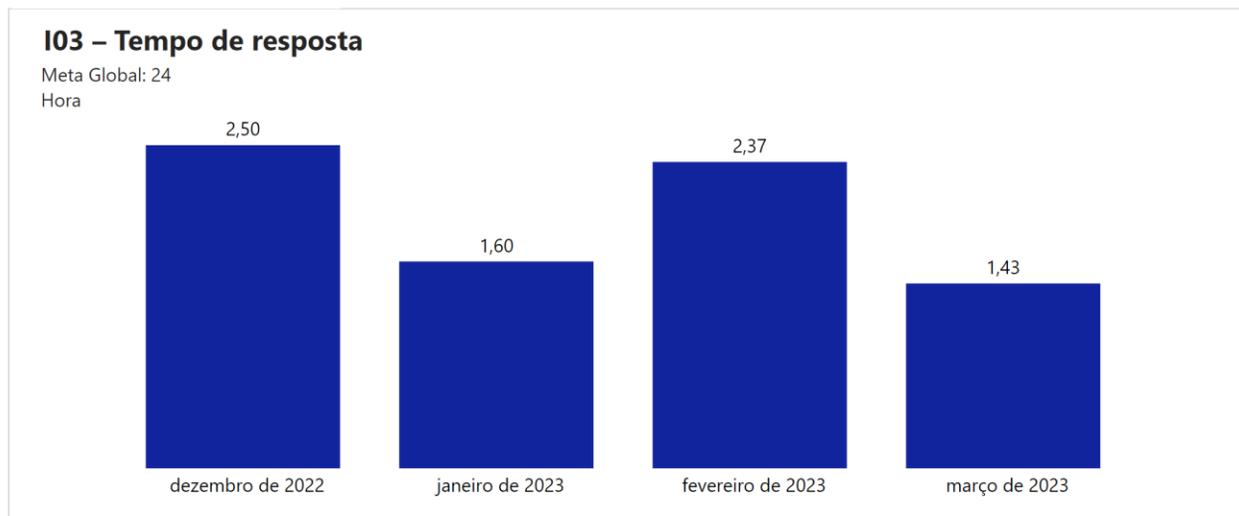


Gráfico 3: I03 – Tempo de resposta - Frequência Mensal




Gráfico 4: I04 – Alcance total no LinkedIn - Frequência Mensal

## Indicadores




Gráfico 5: I05 – Alcance Total no Facebook - Frequência Mensal




Gráfico 6: I06 – Visualizações no Youtube - Frequência Mensal

## **PG038 Monitoramento da Bacia do Rio Doce**

### **Eixo Terra e Água**

#### **Objetivo**

Investigar e monitorar a Bacia do Rio Doce, áreas estuarinas e costeiras (isóbata 10 metros), gerando informações sobre a qualidade da água e sedimentos para subsidiar a tomada de decisão e desenvolvimento dos programas e ações correlatos.

## Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	177	§1º	Encerrada
Cláusula	177	Caput	Em andamento
Cláusula	178	Caput	Em andamento
Deliberação	107	3.1	Concluída Internamente
Deliberação	107	4	Concluída Internamente
Deliberação	129	1	Em andamento
Deliberação	198	1	Em andamento
Deliberação	198	2	Concluída Internamente
Deliberação	198	3	Em andamento
Deliberação	247	1	Concluída Internamente
Deliberação	247	2	Em andamento
Deliberação	265	1	Concluída Internamente
Deliberação	265	2	Concluída Internamente
Deliberação	301	único	Em andamento
Deliberação	310	3.1	Concluída Internamente
Deliberação	310	3.2	Concluída Internamente
Deliberação	313	2	Concluída Internamente
Deliberação	378	5	Concluída Internamente
Deliberação	378	6	Concluída Internamente
Deliberação	381	1	Concluída Internamente
Deliberação	409	2	Concluída Internamente
Deliberação	432	1, 2,3	Concluída Internamente
Deliberação	455	1	Concluída Internamente
Deliberação	458	2	Concluída Internamente
Deliberação	458	3	Concluída Internamente
Deliberação	511	2	Concluída Internamente
Deliberação	511	3	Concluída Internamente
Deliberação	512	1	Concluída Internamente
Deliberação	512	2	Concluída Internamente
Deliberação	512	3	Concluída Internamente

Deliberação	513	1	Concluída Internamente
Deliberação	53	n/a	Concluída Internamente
Deliberação	572	3	Concluída Internamente
Deliberação	572	4	Concluída Internamente
Deliberação	625	2	Concluída Internamente
Deliberação	638	1	Concluída Internamente
Deliberação	76	3	Concluída Internamente
Deliberação	76	4	Concluída Internamente
Deliberação	76	5	Concluída Internamente
Deliberação	95	1	Em andamento
Deliberação	99	2	Concluída Internamente
Deliberação	99	3	Em andamento

## Entregas do ano de 2023

janeiro de 2023	●	Protocolo do 7º Boletim PMQACH (Campanha 45, 46, 47 e 48)
janeiro de 2023	●	Publicação - Boletim das Águas-Rios Set/22
janeiro de 2023	●	Publicação - Boletim Trimestral das Águas - Estuários/Lagoas/Zona Costeira (Jul/Ago/Set 2022)
janeiro de 2023	●	Publicação - Boletim das Águas-Rios Out/22
fevereiro de 2023	●	Publicação - Boletim das Águas-Rios Nov/22
março de 2023	●	Publicação - Boletim das Águas-Rios Dez/22
março de 2023	●	Publicação - Boletim Trimestral das Águas - Estuários/Lagoas/Zona Costeira (Out/Nov/Dez 2022)
março de 2023	●	Protocolo do Relatório Trimestral de QA/QC - Out/22 a Dez/22
abril de 2023	●	Publicação - Boletim das Águas-Rios Jan/23
maio de 2023	●	Protocolo do 8º Boletim PMQACH (Campanha 49, 50, 51 e 52)
maio de 2023	●	Publicação - Boletim das Águas-Rios Fev/23
junho de 2023	●	Publicação - Boletim Trimestral das Águas - Estuários/Lagoas/Zona Costeira (Jan/Fev/Mar 2023)
junho de 2023	●	Publicação - Boletim das Águas-Rios Mar/23
junho de 2023	●	Protocolo do Relatório Trimestral de QA/QC - Jan/23 a Mar/23
julho de 2023	●	Publicação - Boletim das Águas-Rios Abr/23
julho de 2023	●	Implementação da segunda revisão bianual das diretrizes do monitoramento de rios e mar (PMQQS)
agosto de 2023	●	Publicação - Boletim das Águas-Rios Mai/23
setembro de 2023	●	Protocolo do 9º Boletim PMQACH (Campanha 53, 54, 55 e 56)
setembro de 2023	●	Protocolo do Relatório Trimestral de QA/QC - Abr/23 a Jun/23
setembro de 2023	●	Publicação - Boletim Trimestral das Águas - Estuários/Lagoas/Zona Costeira (Abr/Mai/Jun 2022)
setembro de 2023	●	Publicação - Boletim das Águas-Rios Jun/23
outubro de 2023	●	Conclusão da Segunda Revisão Bianual (PMQACH)
outubro de 2023	●	Publicação - Boletim das Águas-Rios Jul/23
novembro de 2023	●	Publicação - Boletim das Águas-Rios Ago/23
dezembro de 2023	●	Publicação - Boletim das Águas-Rios Set/23
dezembro de 2023	●	Publicação - Boletim Trimestral das Águas - Estuários/Lagoas/Zona Costeira (Jul/Ago/Set 2023)
dezembro de 2023	●	Protocolo do Relatório Trimestral de QA/QC - Jul/23 a Set/23
dezembro de 2023	●	Protocolo do relatório do Monitoramento de Água para Consumo Humano (PMQACH) - período de Julho 2022 à Julho 2023

● Concluído      ● Planejado      ● Reprogramado

## Grandes números do programa

Em 2023 está aprovado um orçamento de **R\$ 31.517.144** para ações de continuidade dos programas de monitoramento de água e sedimentos da bacia do Rio Doce e zona costeira e estuarina;

### Plano de Monitoramento Quali-quantitativa Sistemático (PMQQS)

- Atualmente são gerados aproximadamente 1,7 milhão de dados pelo programa de monitoramento. Todos os dados e informações disponíveis em [www.monitoramentoriodoce.org](http://www.monitoramentoriodoce.org);
- 691 **quilômetros** de monitoramento de **rios**, 244 **quilômetros** de monitoramento ao longo da **zona costeira e estuarina**;
- 82 **pontos de monitoramento** distribuídos na bacia do Rio Doce e na zona costeira e estuarina;
- 22 **estações automáticas** formam uma rede de alerta que gera informações em tempo real;
- 103 **parâmetros físicos, químicos e biológicos** são analisados na água e 38 nos sedimentos.

## **Grandes números do programa**

### **Plano de Monitoramento da Qualidade da Água para Consumo Humano (PMQACH)**

- Atualmente são monitorados 89 pontos, sendo 31 com tratamento e 58 sem tratamento em 24 municípios. Os pontos com tratamento são monitorados quinzenalmente no período chuvoso e mensalmente no período seco. Os pontos sem tratamento são monitorados mensalmente.

## Fatos relevantes do mês

Protocolo do ofício FR.2023.0730 e anexos referentes ao Relatório QA/QC Trimestral do PMQQS de outubro a dezembro/22.

Protocolo do ofício FR.2023.0718, referente a realização de novos ajustes no documento de 2ª Revisão Bianual do PMQQS, para atendimento a NTnº99 do GTA-PMQQS.

Protocolo do ofício FR.2023.0503 e anexos referentes aos esclarecimentos solicitados através do Ofício nº 09/2023/CIF/GABIN, que trata do Plano de Ações para Períodos Chuvosos.

## Indicadores

### I01 - Aderência ao plano de coletas e análises laboratoriais

Meta Global: 90%  
Percentual(%)

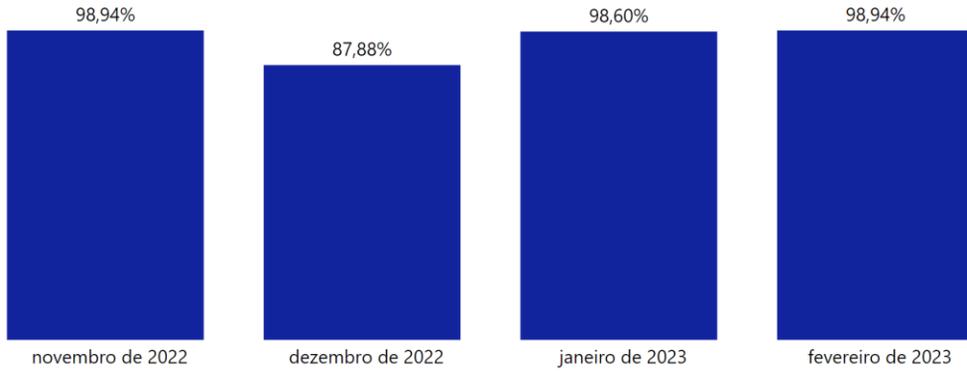


Gráfico 1: I01 - Aderência ao plano de coletas e análises laboratoriais - Frequência Mensal

Não foi possível realizar a coleta em alguns pontos, em dezembro/22, devido às fortes chuvas ocorridas nas regiões de atuação do PMQQS, e a correnteza estava muito forte. Considerou-se a situação insegura para realização das atividades.

### I02 - Disponibilização dos dados quantitativos do monitoramento das estações automáticas

Meta Global: 90%  
Percentual(%)

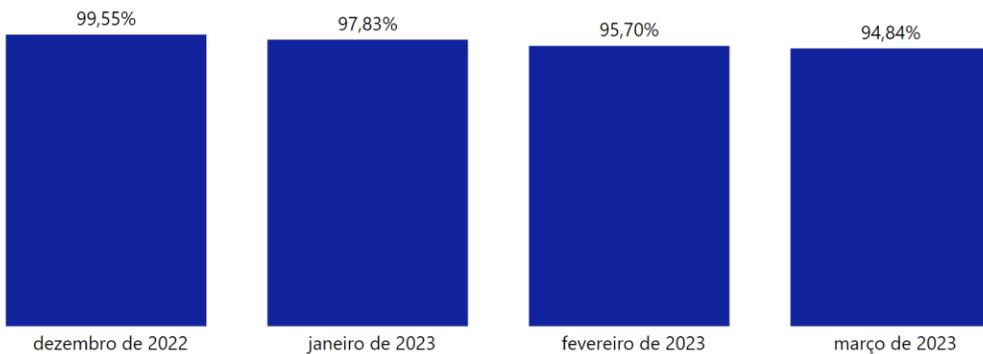


Gráfico 2: I02 - Disponibilização dos dados quantitativos do monitoramento das estações automáticas - Frequência Mensal

## Indicadores

### I03 - Disponibilização dos dados qualitativos do monitoramento das estações automáticas

Meta Global: 80%  
Percentual(%)

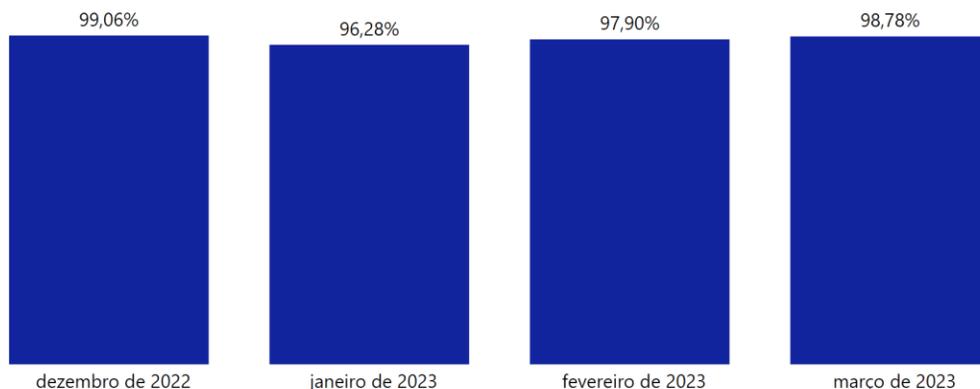


Gráfico 3: I03 - Disponibilização dos dados qualitativos do monitoramento das estações automáticas- Frequência Mensal

### I04 - Percentual de dados validados em função de amostras analisadas passíveis de validação

Meta Global: 90%  
Percentual(%)

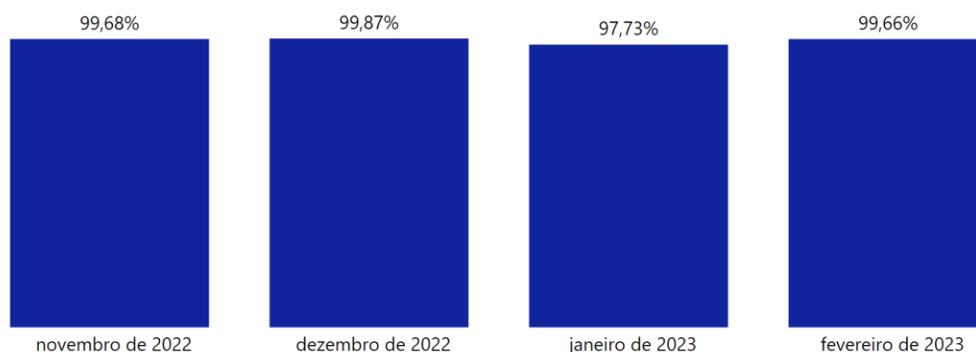


Gráfico 4: I04 - Percentual de dados validados em função de amostras analisadas passíveis de validação - Frequência Mensal

## Indicadores

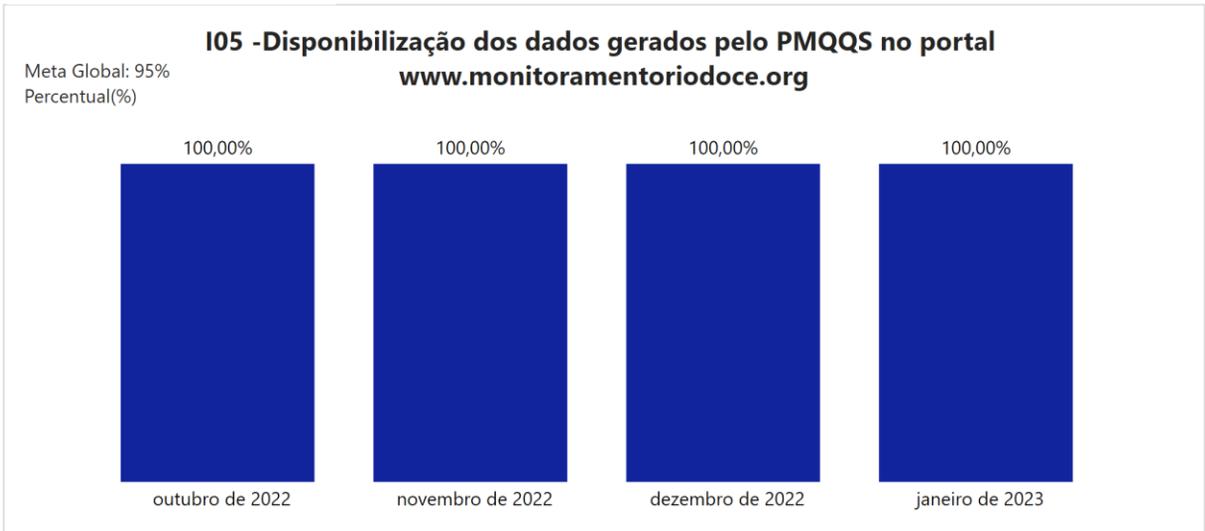


Gráfico 5: I05 -Disponibilização dos dados gerados pelo PMQQS no portal [www.monitoramentorioce.org](http://www.monitoramentorioce.org) - Frequência Mensal

## **PG039 Unidades de Conservação**

### **Eixo Terra e Água**

#### **Objetivo**

- Avaliar os impactos nas Unidades de Conservação diretamente e/ ou potencialmente afetadas pelo rompimento da barragem de Fundão;
- Implementar ações de reparação e mitigação que se façam necessárias, para os danos causados pelo rompimento da barragem de Fundão que forem identificados nos resultados dos estudos de avaliações de impacto;
- Custear e viabilizar a implementação das ações referentes à consolidação do Parque Estadual do Rio Doce e o Refúgio de Vida Silvestre de Santa Cruz, adotando conceitos, diretrizes e mecanismos definidos na Nota Técnica nº 18/2018/CTBio/DIBIO/ICMBio, planos de trabalho e acordos de cooperação celebrados com os órgãos gestores; e
- Viabilizar a elaboração e implementação do Plano de Manejo, bem como construir a sede da Área de Proteção Ambiental na foz do rio Doce, a ser criada pelo poder público.

## Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	181	Caput	Em andamento
Cláusula	182	Caput	Em andamento
Deliberação	114	2	Concluída Internamente
Deliberação	138	2	Concluída Internamente
Deliberação	218	3	Concluída Internamente
Deliberação	218	4	Concluída Internamente
Deliberação	221	1	Concluída Internamente
Deliberação	283	3	Concluída Internamente
Deliberação	318	3	Concluída Internamente
Deliberação	36	n/a	Concluída Internamente
Deliberação	472	3	Em andamento
Deliberação	472	5	Concluída Internamente
Deliberação	535	5	Concluída Internamente
Deliberação	535	6	Em andamento
Deliberação	584	2	Concluída Internamente
Deliberação	596	1	Concluída Internamente
Deliberação	596	2	Concluída Internamente

## Entregas do ano de 2023

fev/23	<span style="color: green;">●</span>	Protocolo do Relatório Final AIA REVIS Santa Cruz
abr/23	<span style="color: red;">●</span>	Realização da Reunião Devolutiva AIA Grupo 1 - FBDS
abr/23	<span style="color: red;">●</span>	Protocolo do Relatório Preliminar de Avaliação de Impactos Grupo Costeiras 1 e 2 OUTRAS UCS
abr/23	<span style="color: red;">●</span>	Protocolo do Relatório Preliminar de Avaliação de Impactos Grupo 5
abr/23	<span style="color: red;">●</span>	Protocolo do Relatório Final de Avaliação de Impactos Grupo 2
mai/23	<span style="color: red;">●</span>	Protocolo do Relatório Final AIA Grupo 1
mai/23	<span style="color: gray;">●</span>	Protocolo do Relatório Preliminar de Avaliação de Impactos Grupo Bahia
mai/23	<span style="color: red;">●</span>	Realização da Reunião Devolutiva Grupo 5
mai/23	<span style="color: gray;">●</span>	Protocolo do Relatório Final de Avaliação de Impactos Grupo 6
jun/23	<span style="color: gray;">●</span>	Realização da Reunião Devolutiva Grupo Costeiras 1 e 2 OUTRAS UCS
jun/23	<span style="color: gray;">●</span>	Protocolo do Relatório Final de Avaliação de Impactos Grupo 5
jun/23	<span style="color: gray;">●</span>	Protocolo do Relatório Final de Avaliação de Impactos Grupo Costeiras 1 e 2 OUTRAS UCS
jul/23	<span style="color: gray;">●</span>	Realização da Reunião Devolutiva Grupo Bahia
jul/23	<span style="color: gray;">●</span>	Protocolo do Relatório Final de Avaliação de Impactos Grupo Bahia
set/23	<span style="color: gray;">●</span>	Plano de Manejo REVIS elaborado - Refúgio de Vida Silvestre de Santa Cruz (REVIS)
set/23	<span style="color: gray;">●</span>	Entrega dos estudos de AIA nas UCs - Deliberação 36/2016 e 179/2018, NT 14/2020 (FBDS)

● Concluído     
 ● Planejado     
 ● Reprogramado

## Fatos relevantes do mês

Realizado 3º desembolso do Acordo firmado com o INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS – IEF para consolidação do Parque Estadual do Rio Doce, no valor de R\$45.065.883,47. Compromisso compensatório da Cláusula 182.

Conclusão da segunda versão do Plano de Manejo do Refúgio de Vida Silvestre de Santa Cruz e da Área de Proteção Ambiental Costa das Algas, compromisso compensatório da cláusula 182.

## Indicadores

### I01 - Quantidade de UCs com avaliação concluída

Meta Global: 100%  
Percentual(%)




Gráfico 1: I01 – Quantidade de UCs com avaliação concluída - Frequência Mensal

Medições dos meses de Maio e Junho de 2022 alteradas, para correção do cálculo, de acordo com o documento de definição em vigor.

### I04 - Execução das ações para consolidação do Refúgio de Vida Silvestre de Santa Cruz (REVIS)

Meta Global: 100%  
Percentual(%)



Gráfico 2: I04 - Execução das ações para consolidação do Refúgio de Vida Silvestre de Santa Cruz (REVIS) - Frequência Semestral

## Indicadores

### I05 - Execução das ações para consolidação do Parque Estadual do Rio Doce (PERD)

Meta Global: 100%  
Percentual(%)




Gráfico 3: I05 - Execução das ações para consolidação do Parque Estadual do Rio Doce (PERD) - Frequência Mensal

## **PG040 CAR e PRAs**

### **Eixo Terra e Água**

#### **Objetivo**

Prestar suporte e apoio técnico para o cadastramento dos imóveis rurais no CAR, além de fomentar a elaboração e a implementação dos respectivos PRA's conforme previsto na Cláusula 183 do TTAC.

## Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	183	Caput	Em andamento
Deliberação	28	n/a	Concluída Internamente

## Entregas do ano de 2023

- fevereiro de 2023 ● Conclusão do Fomento ao Cadastro Ambiental Rural (CAR) do território Baixo Rio Doce
- fevereiro de 2023 ● Conclusão do Fomento ao Cadastro Ambiental Rural (CAR) no território Alto Rio Doce
- junho de 2023 ● Conclusão do Fomento ao Cadastro Ambiental Rural (CAR) no território Médio Rio Doce
- outubro de 2023 ● Conclusão do Fomento ao Programa de Regularização Ambiental (PRA)

● Concluído      ● Planejado      ● Reprogramado

## **Grandes números do programa**

600 imóveis rurais elegíveis ao Formato do CAR. Deste total 64 ( 11% ) imóveis declinaram e 535 ( 89% ) aderiram à proposta do Programa por meio da assinatura dos termos de autorização de uso e coleta de dados. Dos aderidos, 490 CAR já foram retificados ou elaborados pela Fundação Renova.

## **Fatos relevantes do mês**

Treinamento presencial de análise do CAR para servidores do IEF e SEMAD em Minas Gerais.

Oficina do Marco Legal PRA Espírito Santo.

Entrega do manual técnico de procedimento de análise do CAR para Minas Gerais.

## Indicadores

### I01 – Percentual de CAR elaborados, retificados e/ou ratificados pela Fundação Renova

Meta Global: 100%  
Percentual(%)

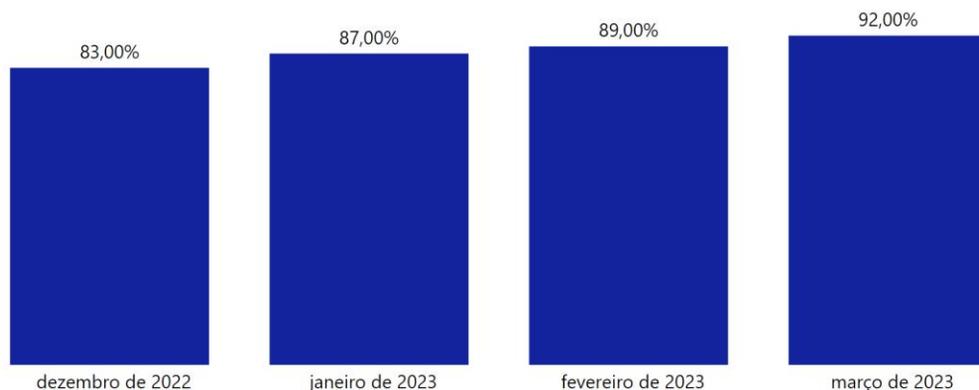


Gráfico 1: I01 – Percentual de CAR elaborados, retificados e/ou ratificados pela Fundação Renova - Frequência Mensal

### I02 – Percentual de PRADAs ou Projetos Simplificados elaborados em relação aos imóveis que aderiram ao programa

Meta Global: 100%  
Percentual(%)

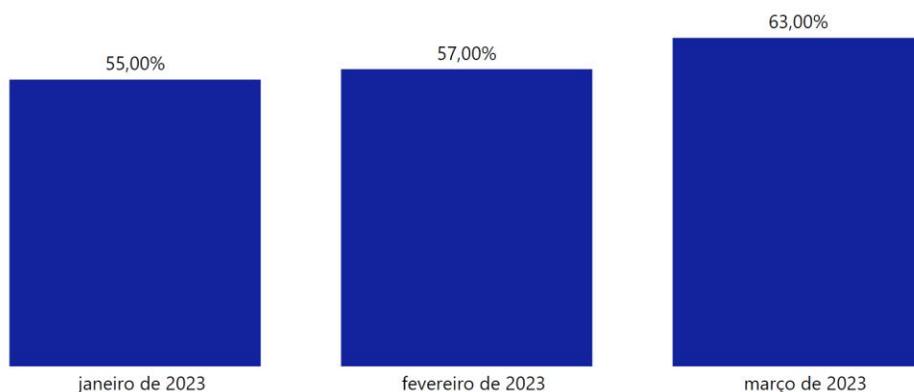


Gráfico 2: I02 – Percentual de PRADAs ou Projetos Simplificados elaborados em relação aos imóveis que aderiram ao programa - Frequência Mensal

## Indicadores

Tabela 1. Indicadores que não iniciaram a medição. Fonte: Definição do Programa.

INDICADOR	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDADE DE MEDIDA	INÍCIO PREVISTO DE MEDIÇÃO
I03 – Percentual de Termos de Compromissos assinados pelos proprietários/posseiros com o órgão gestor do CAR/PRA em relação aos imóveis que aderiram ao Programa	$I03 = \left( \frac{\text{Quantidade de Termos de Compromisso assinados}}{\text{Quantidade de imóveis que aderiram ao programa}} \right) * 100$	%	janeiro/2021

## **PG042 Ressarcimento dos Gastos Públicos Extraordinários**

### **Eixo Pessoas e Comunidade**

#### **Objetivo**

Ressarcir os compromitentes do TTAC e os municípios impactados, que compreendem sua área de abrangência, pelos gastos públicos extraordinários decorrentes do evento, através da comprovação por meio de documentos oficiais, observada a política de compliance da Fundação, conforme cláusulas 141 a 143 do TTAC.

## Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	141	Caput	Concluída Internamente
Cláusula	142	Caput	Concluída Internamente
Cláusula	143	§único	Em andamento
Deliberação	171	2	Concluída Internamente
Deliberação	180	3	Concluída Internamente
Deliberação	20	n/a	Concluída Internamente
Deliberação	208	6	Concluída Internamente
Deliberação	208	8	Concluída Internamente
Deliberação	254	2	Concluída Internamente
Deliberação	291	2	Concluída Internamente
Deliberação	428	1	Concluída Internamente
Deliberação	49	caput (ação 1)	Concluída Internamente
Deliberação	49	caput (ação 2)	Em andamento
Deliberação	69	n/a	Concluída Internamente
Deliberação	78	n/a	Concluída Internamente
Deliberação	85	3	Concluída Internamente

## Entregas do ano de 2023

- agosto de 2023 ● Demais pagamentos referentes a Deliberação 428 - Cláusula 143 - ES - Concluído
- setembro de 2023 ● Demais pagamentos referentes a Deliberação 428 - Cláusula 143 - MG - Concluído

● Concluído    ● Planejado    ● Reprogramado

## Grandes números do programa

- Até o momento foram ressarcidas 40 **Prefeituras** e 19 **Órgãos Compromitentes**;
- Os ressarcimentos somam **R\$ 53,97 milhões** pagos para às **Prefeituras** e **R\$ 29,95 milhões** pagos aos **Orgãos Compromitentes**.
- No âmbito da cláusula 143 do TTAC, foram ressarcidos um valor total de **R\$ 654,7 Mil**, referente a 2 **órgãos comprometentes** e 1 **município** (ressarcimento dos aluguéis sociais de Linhares).

## Fatos relevantes do mês

Aprovação pelo CIF do Encerramento da Cláusula 141 do TTAC, referente ao ressarcimento dos órgãos comprometentes, em reunião no dia 30/03/2023 (Deliberação 670/2023).

## Indicadores

### I01 – % de ressarcimento aos comprometentes (cláusula 141)

Meta Global: 100%

Percentual(%)

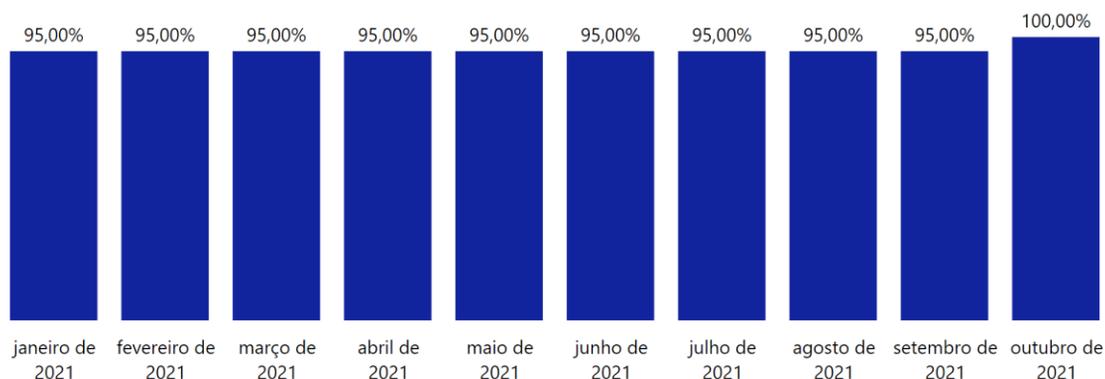


Gráfico 1: I01 – % de ressarcimento aos comprometentes (cláusula 141) - Frequência Mensal

### I02 – % de ressarcimento às prefeituras

Meta Global: 100%

Percentual(%)



Gráfico 2: I02 – % de ressarcimento às prefeituras - Frequência Mensal

## Indicadores

### I03 – % de ressarcimento aos Compromitentes (cláusula 143)

Meta Global: 100%  
Percentual(%)




Gráfico 2: I03 – % de ressarcimento aos Compromitentes (cláusula 143) - Frequência Mensal

## Glossário

- I. IMPACTADOS: as pessoas físicas ou jurídicas, e respectivas comunidades, que tenham sido diretamente afetadas pelo rompimento da barragem de Fundão nos termos das alíneas abaixo e do TTAC:
- a. perda de cônjuge, companheiro, familiares até o segundo grau, por óbito ou por desaparecimento;
  - b. perda, por óbito ou por desaparecimento, de familiares com graus de parentesco diversos ou de pessoas com as quais coabitavam e/ou mantinham relação de dependência econômica;
  - c. perda comprovada pelo proprietário de bens móveis ou imóveis ou perda da posse de bem imóvel;
  - d. perda da capacidade produtiva ou da viabilidade de uso de bem imóvel ou de parcela dele;
  - e. perda comprovada de áreas de exercício da atividade pesqueira e dos recursos pesqueiros e extrativos, inviabilizando a atividade extrativa ou produtiva;
  - f. perda de fontes de renda, de trabalho ou de autossustentância das quais dependam economicamente, em virtude da ruptura do vínculo com áreas atingidas;
  - g. prejuízos comprovados às atividades produtivas locais, com inviabilização de estabelecimento ou das atividades econômicas;
  - h. inviabilização do acesso ou de atividade de manejo dos recursos naturais e pesqueiros, incluindo as terras de domínio público e uso coletivo, afetando a renda e a subsistência e o modo de vida de populações;

i. danos à saúde física ou mental; e

j. destruição ou interferência em modos de vida comunitários ou nas condições de reprodução dos processos socioculturais e cosmológicos de populações ribeirinhas, estuarinas, tradicionais e povos indígenas.

II. **INDIRETAMENTE IMPACTADOS:** as pessoas físicas e jurídicas, presentes ou futuras, que não se enquadrem nos incisos anteriores, que residam ou venham a residir na **ÁREA DE ABRANGÊNCIA** e que sofram limitação no exercício dos seus direitos fundamentais em decorrência das consequências ambientais ou econômicas, diretas ou indiretas, presentes ou futuras, do rompimento da barragem de Fundão, que serão contemplados com acesso à informação e a participação nas discussões comunitárias, bem como poderão ter acesso aos equipamentos públicos resultantes dos PROGRAMAS.

III. **ÁREA AMBIENTAL 1:** as áreas abrangidas pela deposição de rejeitos nas calhas e margens dos rios Gualaxo do Norte, Carmo e Doce, considerando os respectivos trechos de seus formadores e afluentes, bem como as regiões estuarinas, costeiras e marinha na porção impactada pelo rompimento da barragem de Fundão.

IV. **ÁREA AMBIENTAL 2:** os municípios banhados pelo Rio Doce e pelos trechos impactados dos rios Gualaxo do Norte e Carmo, a saber: Mariana, Barra Longa, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado, Sem-Peixe, Rio Casca, São Pedro dos Ferros, São Domingos do Prata, São José do Goiabal, Raul Soares, Dionísio, Córrego Novo, Pingo d'Água, Marliéria, Bom Jesus do Galho, Timóteo, Caratinga, Ipatinga, Santana do Paraíso, Ipaba, Belo Oriente, Bugre, Iapu, Naque, Periquito, Sobrália, Fernandes Tourinho, Alpercata, Governador Valadares, Tumiritinga, Galileia, Conselheiro Pena, Resplendor, Itueta, Aimorés, Baixo Guandu, Colatina, Marilândia e Linhares.

V. ÁREA DE ABRANGÊNCIA SOCIOECÔNÔMICA: localidades e comunidades adjacentes à calha dos rios Doce, Carmo e Gualaxo do Norte e Córrego Santarém e a áreas estuarinas, costeira e marinha impactadas.

VI. MUNICÍPIOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA SOCIOECÔNÔMICA: Mariana, Barra Longa, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado, Rio Casca, Sem-Peixe, São Pedro dos Ferros, São Domingos do Prata, São José do Goiabal, Raul Soares, Dionísio, Córrego Novo, Pingo-D'Água, Marliéria, Bom Jesus do Galho, Timóteo, Caratinga, Ipatinga, Santana do Paraíso, Ipaba, Belo Oriente, Bugre, Iapu, Naque, Periquito, Sobrália, Fernandes Tourinho, Alpercata, Governador Valadares, Tumiritinga, Galiléia, Conselheiro Pena, Resplendor, Itueta e Aimorés

VII. MUNICÍPIOS E LOCALIDADES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA SOCIOECÔNÔMICA: Baixo Guandu, Colatina, Barra do Riacho em Aracruz, Marilândia e Linhares, além das áreas estuarinas, costeira e marinha impactadas.

VIII. PROGRAMAS SOCIOECONÔMICOS: conjunto de medidas e de ações a serem executadas de acordo com um plano tecnicamente fundamentado, necessárias à reparação, mitigação, compensação e indenização pelos danos socioeconômicos decorrentes do rompimento da barragem de Fundão, fiscalizadas e supervisionadas pelo PODER PÚBLICO, nos termos do TTAC.

IX. PROGRAMAS SOCIOAMBIENTAIS: conjunto de medidas e de ações a serem executadas de acordo com um plano tecnicamente fundamentado, necessárias à reparação e compensação pelos danos socioambientais decorrentes do rompimento da barragem de Fundão, fiscalizadas e supervisionadas pelo PODER PÚBLICO, nos termos do TTAC.

X. PROGRAMAS: são os PROGRAMAS SOCIOAMBIENTAIS e os PROGRAMAS SOCIOECONÔMICOS quando referidos em conjunto.

XI. **PROJETOS SOCIOAMBIENTAIS:** são as ações e medidas aprovadas pela FUNDAÇÃO, nos termos do TTAC, para a implementação de determinados PROGRAMAS SOCIOAMBIENTAIS.

XII. **PROJETOS SOCIOECONÔMICOS:** são as ações e medidas aprovadas pela FUNDAÇÃO, nos termos do TTAC, para a implementação de determinados PROGRAMAS SOCIOECONÔMICOS.

XIII. **PROJETOS:** são os PROJETOS SOCIOAMBIENTAIS e os PROJETOS SOCIOECONÔMICOS quando referidos em conjunto.

XIV. **PODER PÚBLICO:** órgãos e entidades públicos integrantes ou vinculados aos COMPROMITENTES e que, em razão de suas atribuições institucionais, tenham competência legal para regulamentar e/ou fiscalizar ações relacionadas a um determinado PROGRAMA.

XV. **ÓRGÃOS AMBIENTAIS:** Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama); Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio); Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Seama-ES); Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf); Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad-MG); Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Espírito Santo (Iema-ES); Instituto Estadual de Florestas (IEF-MG); Fundação Estadual de Meio Ambiente (Feam-MG).

XVI. **ÓRGÃOS DE GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS:** Agência Nacional de Águas (ANA); Agência de Gestão de Recursos Hídricos do Espírito Santo (AGERH-ES); e Instituto de Gestão das Águas de Minas (Igam-MG).

XVII. **PROGRAMAS REPARATÓRIOS:** compreendem medidas e ações de cunho reparatório que têm por objetivo mitigar, remediar e/ou reparar impactos socioambientais e socioeconômicos advindos do rompimento da barragem de Fundão.

XVIII. PROGRAMAS COMPENSATÓRIOS: compreendem medidas e ações que visam a compensar impactos não mitigáveis ou não reparáveis advindos do rompimento da barragem de Fundão, por meio da melhoria das condições socioambientais e socioeconômicas das áreas impactadas, cuja reparação não seja possível ou viável, nos termos dos PROGRAMAS.

XIX. FUNDAÇÃO: fundação de direito privado, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei, a ser instituída pela SAMARCO e pelas ACIONISTAS com o objetivo de elaborar e executar todas as medidas previstas pelos PROGRAMAS SOCIOAMBIENTAIS e PROGRAMAS SOCIOECONÔMICOS.

XX. EXPERT: pessoa física ou jurídica, ou grupo de pessoas físicas ou jurídicas, legalmente habilitadas e contratadas pela FUNDAÇÃO RENOVA para gestão, avaliação, elaboração e/ou implantação dos PROGRAMAS e/ou PROJETOS, total ou parcialmente.

XXI. SITUAÇÃO ANTERIOR: situação socioambiental e socioeconômica imediatamente anterior a 05/11/2015.



XXII. PRADA: Projeto de Restauração de Áreas Degradadas e Alteradas.

XXIII. Ação para itens cláusulas do TTAC e deliberações são as ações a serem cumpridas pela Fundação Renova, os status reportados no presente relatório são descritas a seguir:

- a. Concluída internamente, o item foi concluído pela Fundação Renova mas ainda deverá ser validado pelo CIF ou já foi declarado seu descumprimento;
- b. Em andamento, itens cujo atendimento já foi iniciado ou que possuem uma obrigação recorrente;

- c. Encerrado, item concluído e aprovado oficialmente pelo CIF;
- d. Judicializado, não houve consenso entre Fundação Renova e CIF sobre o atendimento ao item, que passa a ser acompanhado através das decisões na 12º Vara;
- e. Pendente, a conclusão do item não depende somente da Fundação Renova, mas de outros fatores externos;
- f. Planejada, itens que estão no prazo, porém o seu atendimento ainda não foi iniciado;
- g. Reprogramado, item não foi concluído no prazo e precisou ser replanejado;

## Taxa de acidentes registrados

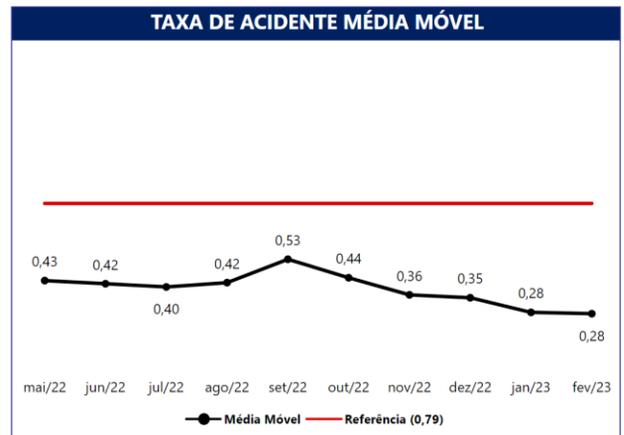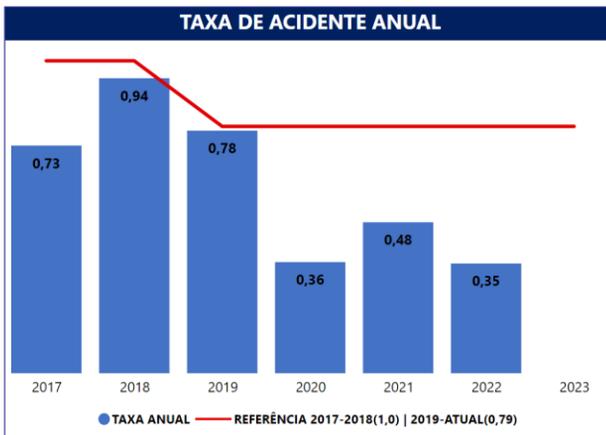

(Número de acidentes registrados x 1.000.000/horas trabalhadas)

\* Acidentes registrados = acidentes com afastamento mais acidentes sem afastamento.

### Como ler o gráfico

Coluna cor azul: taxa de acidentes acumulada no ano. Toma-se o número de acidentes acumulados no ano, multiplica-se por um milhão e divide-se pelo número de horas trabalhadas no ano. Coluna cor verde: representa a taxa de acidentes referente ao mês. Toma-se o número de acidentes ocorridos no mês, multiplica-se por um milhão e divide-se pelo número de horas trabalhadas no mês.

Linha vermelha: valor de referência 1. Esse valor foi adotado devido ao pouco tempo de trabalho da Fundação Renova. É o valor mínimo para uma empresa. A média nacional para essa referência, por exemplo, é 7.

Ponto preto: esse valor corresponde à média dos últimos doze meses. Caso o número de acidentes continue o mesmo no período e as horas trabalhadas aumentem, esse valor pode cair.

## Gestão Econômica\*

PG	Programas	Anual Total				Anual Acumulado			
		Orçamento	Realizado	Variação	%	Orçamento	Realizado	Variação	%
PG13	TURISMO CULTURA LAZER E ESPORTE	16,0	2,1	-13,9	-87,0%	2,2	2,1	-0,1	-3,5%
PG15	INOVAÇÃO	5,4	1,2	-4,2	-77,4%	1,3	1,2	-0,1	-6,5%
PG18	DIVERSIFICAÇÃO ECONOMIA REGIONAL	4,0	1,9	-2,1	-51,9%	1,1	1,9	0,9	83,8%
PG20	CONTRATAÇÃO LOCAL	4,1	1,1	-3,0	-73,9%	0,8	1,1	0,2	28,4%
PG26	RECUPERAÇÃO DE APPs	232,9	36,7	-196,2	-84,2%	53,2	36,7	-16,5	-31,0%
PG27	RECUPERAÇÃO DE NASCENTES	40,0	8,6	-31,4	-78,5%	7,4	8,6	1,2	15,9%
PG29	ESTRUTURA TRIAGEM	4,1	2,0	-2,1	-51,8%	1,7	2,0	0,3	14,6%
PG31	SANEAMENTO BÁSICO	58,7	7,6	-51,1	-87,1%	17,7	7,6	-10,1	-57,0%
PG32	SISTEMAS DE ABASTECIMENTO ÁGUA	13,4	18,3	4,9	36,8%	8,2	18,3	10,1	123,3%
PG33	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	25,2	0,7	-24,5	-97,1%	9,1	0,7	-8,4	-92,1%
PG34	EMERGÊNCIA AMBIENTAL	4,4	1,0	-3,4	-77,5%	0,7	1,0	0,2	33,5%
PG35	INFORMAÇÃO PARA A POPULAÇÃO	12,9	0,0	-12,9	-99,7%	3,4	0,0	-3,4	-98,8%
PG36	COMUNICAÇÃO NACIONAL INTERNACIONAL	2,7	0,5	-2,1	-80,7%	0,6	0,5	-0,1	-16,3%
PG39	CONSOLIDAÇÃO UCs	58,1	45,7	-12,4	-21,3%	40,7	45,7	5,1	12,5%
PG40	IMPLANTAÇÃO CAR E PRAS	4,1	0,9	-3,3	-79,5%	1,4	0,9	-0,6	-39,4%
PG43	MEDIDAS COMPENSATÓRIAS	123,2	0,1	-123,1	-99,9%	10,2	0,1	-10,1	-99,1%
PG97	PROJETOS COMP - SALDO A ALOCAR	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0%
Total Compensatórios		609,3	128,4	-480,8	-78,9%	159,7	128,4	-31,3	-19,6%
PG00	MEDIDAS MITIGATÓRIAS EMERGENCIAIS	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0%
PG01	CADASTRO	85,7	14,7	-71,0	-82,8%	12,9	14,7	1,9	14,5%
PG02	PIM - INDENIZAÇÃO ATINGIDOS	3228,7	248,8	-2979,9	-92,3%	1089,4	248,8	-840,6	-77,2%
PG03	POVOS INDÍGENAS	227,3	28,5	-198,8	-87,4%	52,2	28,5	-23,7	-45,3%
PG04	POVOS TRADICIONAIS	3,2	0,7	-2,5	-78,1%	0,4	0,7	0,3	85,1%
PG05	PROTEÇÃO SOCIAL	27,3	10,3	-17,0	-62,2%	4,1	10,3	6,2	150,5%
PG06	PARTICIPAÇÃO E DIÁLOGO	75,5	14,1	-61,4	-81,3%	18,4	14,1	-4,3	-23,5%
PG07	ASSISTÊNCIA AOS ANIMAIS	14,0	1,8	-12,3	-87,4%	4,2	1,8	-2,5	-58,2%
PG08	REASSENTAMENTO	1642,6	280,9	-1361,7	-82,9%	441,0	280,9	-160,1	-36,3%
PG09	UHE CANDONGA	262,9	59,7	-203,2	-77,3%	92,2	59,7	-32,6	-35,3%
PG10	INFRAESTRUTURA IMPACTADA	118,9	18,1	-100,8	-84,8%	28,5	18,1	-10,4	-36,5%
PG11	RECUPERAÇÃO ESCOLAS	10,1	1,4	-8,6	-85,6%	1,7	1,4	-0,3	-16,4%
PG12	MEMÓRIA HISTÓRICA	16,6	1,7	-14,8	-89,6%	2,6	1,7	-0,8	-32,8%
PG13	TURISMO CULTURA LAZER E ESPORTE	6,6	0,9	-5,7	-86,1%	0,8	0,9	0,1	17,1%
PG14	SAÚDE	6,6	1,7	-4,9	-73,9%	1,7	1,7	0,0	1,1%
PG16	PESCA	20,1	3,6	-16,5	-82,3%	4,7	3,6	-1,2	-24,7%
PG17	ATIVIDADE AGROPECUÁRIA	88,2	22,9	-65,4	-74,1%	20,4	22,9	2,5	12,1%
PG19	RECUPERAÇÃO NEGÓCIOS	13,7	2,1	-11,5	-84,4%	2,1	2,1	0,0	0,4%
PG21	AFE - AUXÍLIO FINANCEIRO	445,8	102,4	-343,4	-77,0%	104,6	102,4	-2,3	-2,2%
PG23	MANEJO DE REJEITOS	146,2	31,7	-114,4	-78,3%	27,3	31,7	4,4	16,1%
PG24	CONTENÇÃO DE REJEITOS	0,0	-0,3	-0,3		0,0	-0,3	-0,3	
PG25	RECUPERAÇÃO ÁREA AMBIENTAL 1	29,4	7,7	-21,7	-73,8%	7,4	7,7	0,3	3,9%
PG28	BIODIVERSIDADE	169,2	2,8	-166,4	-98,4%	49,7	2,8	-46,9	-94,4%
PG30	FAUNA E FLORA TERRESTRE	33,7	8,3	-25,3	-75,3%	9,3	8,3	-1,0	-10,8%
PG32	SISTEMAS DE ABASTECIMENTO ÁGUA	172,2	36,1	-136,2	-79,1%	39,9	36,1	-3,8	-9,6%
PG37	GESTÃO RISCOS AMBIENTAIS	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0%
PG38	MONITORAMENTO ÁGUA	31,5	7,5	-24,0	-76,2%	8,3	7,5	-0,8	-9,2%
PG39	CONSOLIDAÇÃO UCs	7,5	0,5	-7,0	-92,9%	0,5	0,5	0,1	13,5%
PG41	GESTÃO DOS PROGRAMAS	311,1	79,3	-231,8	-74,5%	77,3	79,3	2,0	2,6%
PG42	GASTOS PÚBLICOS EXTRAORDINÁRIOS	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0%
PG99	CONTINGÊNCIA	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0%
Total Reparatórios		7194,6	988,2	-6206,4	-86,3%	2101,9	988,2	-1113,7	-53,0%
Total Programas		7803,8	1116,6	-6687,2	-85,7%	2261,6	1116,6	-1145,0	-50,6%
ADM	DESPESAS GESTÃO ADMINISTRATIVAS	172,1	39,8	-132,3	-76,9%	42,2	39,8	-2,4	-5,6%
CG	CUSTEIO SISTEMA DE GOVERNANÇA	141,1	2,2	-138,9	-98,4%	49,7	2,2	-47,5	-95,5%
Total Despesas Administrativas		313,3	42,1	-271,2	-86,6%	91,9	42,1	-49,9	-54,3%
Total Geral		8117,1	1158,6	-6958,5	-85,7%	2353,5	1158,6	-1194,9	-50,8%

PG	Programas	Mensal				Anual Acumulado	
		Orçamento	Realizado	Varição	%	Justificativas da variação anual acumulada	
PG13	TURISMO CULTURA LAZER E ESPORTE	0,79	0,91	0,12	0,15	Fatores Internos Antecipação: Incentivo à Leitura: Antecipação/aceleração da entrega dos itens de modernização das bibliotecas no ano de 2022. Plano de Ação: Projetar a nova realidade orçamentária no Draft21.	
PG15	INOVAÇÃO	0,60	0,58	-0,02	-0,04	Fatores Internos: R\$ 0,03 M CHAMADA 09/2023: Antecipação de prestação de contas. Plano de Ação: N/A. (R\$ 0,14 M) Hub de Inovação: Antecipação de atividades em dez/2022 para melhoria na aderência financeira do Programa. Plano de Ação: Adequar atividades para ajustar os desembolsos nas medições do projeto. Prazo: 30/06/2023. (R\$ 0,07 M) Empreende Rio Doce: Antecipação de atividades em dez/2022 para melhoria na aderência financeira do Programa. Plano de Ação: Adequar atividades para ajustar os desembolsos nas medições do projeto. Prazo: 30/04/2023. R\$ 0,11 M UD Tumiritinga: Antecipação de Execução de atividades. Plano de Ação: N/A. (R\$ 0,01 M) Desenvolvimento de Escala TRL: Contratação finalizada com valor a menor que o previsto no Draft20. Plano de Ação: Ajustar no Draft21.	
PG18	DIVERSIFICAÇÃO ECONOMIA REGIONAL	0,63	0,73	0,10	0,16	Fatores Internos: R\$ 1,0 M Projeto Agroecológico MG: Antecipação de atividades relacionadas à agroindústria. Plano de Ação: N/A. (R\$ 0,1 M) Projeto Cadeia do Cacau: Atraso na prestação de contas pelo fornecedor. Plano de Ação: Ajustar Draft21.	
PG20	CONTRATAÇÃO LOCAL	0,35	0,44	0,09	0,27	Fatores externos: R\$ 0,2 M Estudos e Mapeamento: Estudo Mapeamento Mão de Obra Mariana e Prospecção de Fornecedores Locais. Valor acima do orçado para o período pois houve atraso para dar início no ano passado aos estudos devido parecer CTEI e Deliberação CIF. Contratos Expressão Socioambiental e DVF. Plano de Ação: Ajustar no Draft 21 (concluído).	

PG	Programas	Mensal				Anual Acumulado	
		Orçamento	Realizado	Varição	%	Justificativas da variação anual acumulada	
PG26	RECUPERAÇÃO DE APPs	14,59	11,83	-2,77	-0,19	<p>Fatores Internos</p> <p>(-R\$ 8,50 MM) Valores previstos para 2023 que foram medidos em dezembro/2022.</p> <p>(-R\$ 5,21 MM) Atraso na contratação do fornecimento de insumos para cercamento, curva de aprendizagem de contratadas mobilizadas recentemente, com baixa produtividade.</p> <p>(-R\$ 2,81 MM) Atraso na emissão do Relatório de Homologação do Edital da Bacia do Manhuaçu (7.332 hectares), e da Bacia do Suaçu com atraso no início do processo de contratação.</p> <p>Plano de Ação:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Recuperar a curva operacional a partir da mobilização.</li> <li>- Apoiar empresas novas nos processos de mobilização e engajamento, visando reduzir o impacto do atraso dos contratos.</li> </ul>	
PG27	RECUPERAÇÃO DE NASCENTES	2,42	2,88	0,46	0,19	<p>Fatores Internos</p> <p>R\$ 1,18 MM:</p> <p>Alteração das ações do CIAAT incorporando atividades de restauração ativa.</p> <p>Plano de ação:</p> <p>Revisão do planejamento do CIAAT.</p>	
PG29	ESTRUTURA TRIAGEM	0,51	0,77	0,26	0,50	<p>Economia</p> <p>Fatores Internos:</p> <p>R\$ 0,25 Medição indevida em DR de gerenciamento CETRAS-MG</p> <p>Gerenciamento CETRAS-ES contrato sob demanda (valor medido 100% maior)</p>	
PG31	SANEAMENTO BÁSICO	5,58	1,02	-4,56	-0,82	<p>Fatores Externos</p> <p>Economia</p> <p>Fatores Internos</p> <p>Fatores Externos: (R\$ 10,1MM)</p> <p>Os municípios apresentaram medições em desconformidade com o previsto em cronograma/orçamento.</p>	
PG32	SISTEMAS DE ABASTECIMENTO ÁGUA	0,91	11,67	10,76	11,87	<p>Economia</p> <p>Fatores Internos: R\$ 10,1 MM)</p> <p>Adutora - Dilação do prazo de execução com postergação de atividades que deveriam ter sido executadas em 2022.</p> <p>Fatores Externos:</p>	

PG	Programas	Mensal				Anual Acumulado
		Orçamento	Realizado	Varição	%	Justificativas da variação anual acumulada
PG33	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	8,89	0,56	-8,33	-0,94	Fatores Interno Postergação: R\$8,3 MM de desvio referente a postergação de repasse definitivo para o IFES Plano de Ação: Apresentar ao CIF manifestação conjunta do IFES, governo do Estado do ES e Fundação Renova, favorável ao repasse definitivo, para aprovação da estratégia e quitação das obrigações referentes ao projeto.
PG34	EMERGÊNCIA AMBIENTAL	0,29	0,29	-0,01	-0,03	Fatores Internos: ESCOLA SEGURA (R\$ 0,18 MM) Necessidade de mais horas técnica para atendimento às demandas e medição de dez/22 e lançada em jan/23. Plano de ação: Monitorar junto ao fornecedor as próximas medições.  CENSO POPULACIONAL (R\$ 0,07MM) Acumulo de medições de nov e dez/22 e antecipação de atividades de campo executadas em jan e fev/23. Plano de ação: Monitorar junto ao fornecedor as próximas medições.
PG35	INFORMAÇÃO PARA A POPULAÇÃO	1,28	0,00	-1,28	-1,00	Fatores Externos: Demora dos agentes externos (ICMBio e Prefeituras Municipais) para assinatura dos termos de parcerias. Postergação: (R\$ 3,4 MM) - CIT Mariana - Em fase de re-negociação da parceria com a Prefeitura Municipal para instalação do equipamento no Terminal Turístico em paralelo será realiado a instação temporária em espaço provisório até o termino da formalização da parceria PMM. - CIT GV - Projeto executivo finalizado, formalização da parceria com a PMGV realizada, aguardando contratação de empresa para execução das obras de instalação do equipamento. - CIT Linhares - Termo de Parceria em processo de finalização de assinatura pelo ICMBio. Processo concorrential de contratação da empresa responsável pelas obras realizada e aguardo da aprovação da Apro. * Implantado os pontos de acesso a Plataforma Interativa em todos as três localidades. Plano de Ação: O Programa está ampliando os pontos de acesso para mitigar o atraso na instalação dos CITs e melhorar ambiência com CT-PDCS. Devido aos atrasos decorrentes da não formalização da parceria com os entes, os orçamentos sofrem uma execução abaixo do planejado sendo replanejado na proposta já enviada do Draft21.
PG36	COMUNICAÇÃO NACIONAL INTERNACIONAL	0,20	0,17	-0,03	-0,16	Economia: R\$ 0,1 MM - Variação ocorreu devido ao processo concorrential do fee mensal negociado abaixo do orçamento. Fatores Internos: por critérios da própria Fundação Renova, o peso da proposta comercial em uma concorrência (70%) define a seleção do fornecedor. Um novo processo concorrential está em andamento, com previsão de conclusão até maio de 2023, e intenção de adequação da aderência.

PG	Programas	Mensal				Anual Acumulado
		Orçamento	Realizado	Varição	%	Justificativas da variação anual acumulada
PG39	CONSOLIDAÇÃO UCs	0,59	0,51	-0,08	-0,13	Economia  Fatores Internos  Fatores Externos R\$: 5,1 MM Causa: Repasse PERD Ano III - Pagamento de valor a maior devido a reajuste pelo índice IPCA. Plano de Ação: N/A
PG40	IMPLANTAÇÃO CAR E PRAS	0,51	0,41	-0,10	-0,20	Fatores Internos (-R\$ 0,041MM) Confecção do Manual de Análise do CAR, produto do ACT-IEF. Plano de ação: Revisar os desembolsos no Draft21 e acompanhar a aderência. (-R\$ 0,30MM) Diminuição de demanda no ARD, em função da paralisação das inbras (rateio). Elaboração do PRA = Redução do público-alvo do PRA (Redução de escopo). Plano de ação: Realizar aditivo no contrato para absorver outras atividades para garantir a aderência financeira. (-R\$ 0,147MM) Gestão da Implantação dos PRAS. Apropriação indevida de contratos neste diagrama de rede. Consultoria Ambiental PG40 - Atraso na contratação de consultoria do PRA/ES. Plano de ação: Ajuste dos diagramas já realizado por suprimentos. Acompanhar o novo cronograma refletindo atraso no início das atividades. (-R\$ 0,147MM) Variação devido a antecipação das atividades em período anterior (+Execução). Plano de ação: Revisar os desembolsos no Draft21 e acompanhar a aderência.
PG43	MEDIDAS COMPENSATÓRIAS	0,05	0,03	-0,02	-0,44	Fatores Internos: (R\$ 0,07 MM): Gerenciamento Escritório Forum Prefeitos  Fatores Externos: (R\$ 10,0 MM): Por definição externa, o repasse planejado para obra do SAA Degredo não será realizado. Caberá a Fundação Renova a execução dessa obra.
PG97	PROJETOS COMP - SALDO A ALOCAR	0,00	0,00	0,00	0,00	Economia  Fatores Internos
Total Compensatórios		38,20	32,79	-5,41	-0,14	

PG	Programas	Mensal				Anual Acumulado	
		Orçamento	Realizado	Varição	%	Justificativas da variação anual acumulada	
PG00	MEDIDAS MITIGATÓRIAS EMERGENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	Economia	
PG01	CADASTRO	4,65	5,82	1,17	0,25	Fatores Internos Fatores Externos (R\$ 1,9 MM) - Antecipação frente a contratação (Em andamento a regularização e o aditivo do contrato 414 cadastro com gravação de áudio).	
PG02	PIM - INDENIZAÇÃO ATINGIDOS	456,72	77,78	-378,95	-0,83	Fatores Externos Postergação: (- R\$ 469,8) Novel: baixa qualificação dos casos novos.(- R\$ 108,5) Aba Recursal: pendência na entrega de Laudo por parte do Perito.(- R\$ 77,8) Definitividade Lucro Cessante: projeto está on hold devido as decisões recentes do judiciário.(- R\$ 77,5) Demais indenizações: Lucro Cessante pago em 2023, provisionado em 2022 conforme procedimentos contábeis.(- R\$ 63,2) Dano Água: acordos na fase de protocolo para homologação.(- R\$ 43,5) – Infra e Serviços: reabertura dos escritórios de atendimento para atender SPA, despesa menor que o previsto.(- R\$ 0,4) – Mariana ACP: adiantamento no atendimento previsto.	

PG	Programas	Mensal				Anual Acumulado	Justificativas da variação anual acumulada
		Orçamento	Realizado	Variação	%		
PG03	POVOS INDÍGENAS	26,45	9,12	-17,34	-0,66	<p><b>Economia:</b></p> <p>(R\$ 1,0 M) Alimentação animal Resplendor. Valor desembolso do contrato foram estimados a maior. Foram planejados dois reajustes no contrato, mas ocorreu uma única vez durante o período da previsão. Plano de Ação: Remanejar o valor para a contingência na Draft 21.</p> <p>(R\$ 3,0 M) Auxílio Subsistência Emergencial TG, Comboios e Krenak. O valor estimado foi considerando um salário-mínimo maior do que o praticado no mês de março/23, o que justifica o desembolso abaixo do previsto. Em TG e Comboios ainda ocorre que o quantitativo de titulares e dependentes já está considerando 10% de inclusão de famílias referente ao acordo vigente e o valor da cesta básica foi estimado a maior. Plano de Ação: Adequar o orçamento no Draft 21.</p> <p><b>Fatores Internos:</b></p> <p>(R\$ 1,0 M) Fornecimento de Água Krenak. Para os contratos desse DR, o valor de desembolso foi estimado a maior que o praticado atualmente, principalmente referente aos caminhões pipa. Plano de Ação: Seguir com o monitoramento dos contratos e a curva de desembolso será ajustada no Draft 21.</p> <p>(R\$ 2,7 M) Gerenciamentos, Estudos e outros. Contratos sob demanda. Plano de Ação: Adequar o orçamento no Draft 21.</p> <p>(R\$ 0,9 M) Outras despesas Krenak. Os contratos dessa atividade não possuem uma média regular, pois estão associados às condições climáticas, que interferem na degradação das vias e, consequentemente, demandam maior ou menor uso de agregados, a depender do período. Plano de Ação: Acompanhar as medições dos contratos junto ao ponto focal.</p> <p><b>Fatores Externos:</b></p> <p>(R\$ 11,6 M) Retomada Econômica TG e Comboios: O aditamento do acordo será definido após a audiência de conciliação que ocorrerá em maio/23, uma vez que as próximas parcelas estão vinculadas à assinatura e homologação do termo de execução do PBAI. Plano de ação: Acompanhar a audiência de conciliação, em maio/23.</p> <p>(R\$ 1,5 M) Execução do PBA e SAA Comboios e TG. As ações tiveram o seu cronograma alterado devido a reprogramação dos prazos de construção e detalhamento do PBAI. Plano de Ação: Adequar o orçamento no Draft 21.</p> <p>(R\$ 2,00 M) SAA Krenak. Ação replanejada pela coordenação, tendo em vista o cenário na TI Krenak. Plano de Ação: Adequar orçamento no Draft 21.</p>	

PG	Programas	Mensal				Anual Acumulado	
		Orçamento	Realizado	Varição	%	Justificativas da variação anual acumulada	
PG04	POVOS TRADICIONAIS	0,13	0,54	0,40	3,00	<p>Fatores Internos (R\$0,1 M) Despesas com gerenciamento do programa e PBAQ Plano de Ação: Continuar com o processo de revisão do programa até a entrega do produto final. Acompanhar a reclassificação de despesa indevida realizada na DR de indenização coletiva.</p>	
PG05	PROTEÇÃO SOCIAL	1,25	5,58	4,33	3,47	<p>Fatores Externos: R\$ 6,2 M - Planos Municipais em Proteção Social: Antecipação de baixas contábeis para o plano de demais municípios que estavam previstas no orçamento para os meses de julho e dezembro. Plano de ação: acompanhar sistematicamente o processo de prestação de contas dos Planos Municipais.</p>	
PG06	PARTICIPAÇÃO E DIÁLOGO	6,13	6,53	0,40	0,07	<p>Fatores Internos Postergação: (R\$ 1,1 MM) - Canais de Relacionamento: Execução a menor nos itens relacionados a manutenção dos 13 escritórios dos CIAS, principalmente naqueles gastos que são geridos por outras áreas como ADM, TI, Segurança. Plano de ação: Revisão dos gastos previstos para a manutenção dos espaços já inseridos no Draft 21, alinhamento com as áreas suporte para entendimento dos gastos e estudo de ações para melhoria da aderência. Postergação: (R\$ 1,1 MM) - Participação e Diálogo: Execução a menor que o previsto para a empresa responsável pela execução das ações de Diálogo Social. Reprogramação das ações relativas a plataforma interativa. Processo de contratação de empresa para suporte aos fóruns de prestação de contas reiniciado. Plano de ação: Revisar a curva orçamentária do programa baseado na atual realidade das ações em implementação. Dados já propostos no Draft21. Postergação: (R\$ 0,5 MM) - Comunicação: Processos concorrenciais de contratação de serviços de distribuição de materiais impressos e disparo de mensagens whatsapp em andamento. Plano de Ação: Acompanhamento/Conclusão do processo de contratação junto a suprimentos, garantindo início da execução orçamentária prevista no draft.20. Avaliação de TAC de valor no contrato de Produção de conteúdo nos territórios. Antecipação: R\$ 0,3 MM - Vivência Territórios: Aumento da demanda em função da ampliação do Vimver para todos os territórios atendidos pela Fundação Renova. Plano de ação: Ajustes de orçamento foram projetados no draft21 para que haja equilíbrio entre o orçado e realizado.</p> <p>Fatores Externos R\$ 0,5 MM - Assessorias técnicas: Pagamento de acordo judicial ASPERQ DEGREDO conforme homologação. Orçamento estava contemplado para 2022 no draft 20; e (R\$ 2,3 MM) - Devolução de valor levantado em relação ao lançamento de maio/22 referente ao saldo bloqueado na ACP Mariana. Plano de ação: Valores serão ajustados no próximo draft.</p>	
PG07	ASSISTÊNCIA AOS ANIMAIS	1,39	0,55	-0,84	-0,60	<p>Fatores Internos: Postergação de custos de: a. emissão de nota fiscal de medição fora do prazo; b. para aquisição de animais em função de alteração da estratégia de priorização para apresentação de propostas aos atingidos proprietários de animais: i. Casos que estão em fase de encerramento atendimento de reassentamento via pecúnia global; ii. Casos com expectativa de mudanças para 2023; iii. Casos de apresentação de pecúnia para autogestão de benfeitorias não reprodutivas associadas à aquisição de animais; e iv. Casos com possibilidade de antecipação de encerramento de atendimento do Programa 07;</p> <p>Fatores Externos: Postergação de custos para aquisição de animais em função de: i. Propostas apresentadas sem retorno de aceite ou não; ii. Tempo de homologação junto à CEJUS das propostas aceitas.</p>	

PG	Programas	Mensal				Anual Acumulado	
		Orçamento	Realizado	Varição	%	Justificativas da variação anual acumulada	
PG08	REASSENTAME NTO	154,96	114,81	-40,15	-0,26	Economia (R\$0,0) Fatores internos (- R\$ 160,1) (- R\$ 20,1) Novas moradias Bento: redef. de estratégia; (-R\$ 17,4) Novas moradias Fam. Atrasos Obras F1, F2, F3. (-R\$ 16,5) Assist. Impact. Atraso pacote atratividades (- R\$ 15,4) Atraso contratação (Camar, SAA Furquim, Ecoponto); (-R\$ 10,7) Equip públicos Bento. Interrupção de Id's; (-R\$ 10,5) Equip públicos Paracatu. Empreiteira não performando; (-R\$ 9,0) Novas moradias Demais custos Pag. Pecunia abaixo do prev. (-R\$ 8,6) Infra Sítiantes. Reprogramação das atividades. (-R\$ 7,4) Contenções Familiar. Custos lançados em novas moradias (-R\$ 7,2) Contenções Bento. Frentes em mobilização (-R\$ 6,7) Infra Bento variação nos itens de adm local, id28 e man. cant. (-R\$ 30,6 MM) Outras atividades reprogramadas. Fatores Externos (R\$0,0)	
PG09	UHE CANDONGA	20,22	29,69	9,47	0,47	Economia Fatores Internos: (32,6MM) Desembolso menor que o previsto nos serviços de Dragagem, Ponto de Apoio, Remoção de Sedimentos, Infraestrutura das Pilhas e Empilhamento. Atraso de medições devido a negociações de aditivos e revisões contratuais. Fatores Externos	
PG10	INFRAESTRUTURA IMPACTADA	7,82	6,46	-1,36	-0,17	Economia Fatores Internos: (R\$ 5,9MM) (R\$ 2,4MM): 1,8MM Pontes já finalizadas antes do previsto. 0,6MM Escopos sob demanda. Ações: Novo Draft em andamento para correção do previsto. Escopos sob demanda em andamento. (R\$ 3,5MM): Pacote Novas Obras - Postergação por mudança de aditivo para nova contratação. Ações: Pacote de novas contratações em avanço pelo Suprimentos. Fatores Externos: (R\$ 4,5MM) (R\$ 4,5MM): Postergação de pagamento do Pacote de Repasse para Prefeitura de Barra Longa. Aguardando finalização do acordo judicial. Ações: Setor jurídico da FR acompanhando junto ao judiciário.	
PG11	RECUPERAÇÃO ESCOLAS	0,73	0,81	0,08	0,11	Fatores Internos Antecipação: Transporte Escolar(R\$ 0,06 MM) refere-se a "não- antecipação de medição em dezembro", o valor do serviço prestado foi pago integralmente em 2022 (Aderência do PG11 ficou em 104%); Plano de Ação: O orçamento previsto para janeiro será gasto ao longo da execução contratual, uma vez que os valores contratuais negociados pelo Suprimentos, ficou acima do previsto pelo PG. Postergação: Psicopedagógico Institucional (0,2MM), refere-se ao atraso no processo de contratação concorrential do novo fornecedor para o apoio Psicopedagógico. O processo foi aberto no Ariba em outubro/2022 (para ser finalizado no final de fevereiro), porém a previsão do compras para o kickoff com o ganhador é dia 12/04. Plano de ação: Engajar as escolas e SME para que o processo de oficinas e formações inicie já em maio com uma periodicidade maior que a prevista inicialmente.	

PG	Programas	Mensal				Anual Acumulado
		Orçamento	Realizado	Varição	%	Justificativas da variação anual acumulada
PG12	MEMÓRIA HISTÓRICA	1,04	0,69	-0,34	-0,33	<p>Fatores Internos</p> <p>Postergação: (R\$ 0,4MM) Variação de medição de ações do eixo imaterial em função de atraso na medição de 3 meses da parceria da UNESCO, devido a problema no pedido com outros programas que impediu a realização a medição dentro do Mês de fevereiro e erro identificado na medição no mês de março que impediu as medições acumuladas. (R\$ 0,3) Diferença de medição em função do contrato da Casa dos Saberes que teve uma execução inferior no início do ano e atividades do plano de reparação aberta via PU que ainda não foram concluída para realizar medição.</p> <p>(R\$ 0,1MM) Variação de medição no eixo materail devido a suspensão na revisao de projetos, acordo judicial em andamento, ações sob demanda e falta de medição da gerenciadora.</p> <p>Plano de Ação: As ações da parceria com a UNESCO serão medidas de forma conjunta até junho (final do contrato) por se tratar de prestações de contas de parceria. Os PUs em aberto serão medidos até maio. Será realizada adiantamento de atividades para compensar. Ações de manutenção serão debitadas na DR do programa em maio.</p>
PG13	TURISMO CULTURA LAZER E ESPORTE	0,17	0,28	0,12	0,68	<p>Fatores Internos</p> <p>Antecipação: Antecipação das prestações de contas de projetos aprovados na Modalidade 2 do Edital Doce (Reparação do Lazer)</p> <p>Plano de Ação: N/A seguir com o processo de aceleração das prestações de contas.</p>
PG14	SAÚDE	0,05	0,06	0,01	0,15	N/A - Não há desvios relevantes.
PG16	PESCA	1,87	0,46	-1,42	-0,76	<p>Fatores Internos:</p> <p>(R\$ 0,6 M) Projetos da Foz Rampa de Subida de Barco e Edificação de Povoação: Pendente a obtenção da licença ambiental para iniciar as obras. Plano de ação: Concluir processo de licenciamento. Prazo: 07/23.</p> <p>(R\$ 0,4 M) Painel de Especialistas: Reprogramação de entregas e desembolso. Plano de Ação: Reprogramar valor no Draft 21. Prazo: 04/23</p> <p>(R\$ 0,2 M) Cultivando para Pescar: Baixa performance do fornecedor. Plano de ação: Alinhamento junto ao parceiro sobre a execução mensal.</p>

PG	Programas	Mensal				Anual Acumulado
		Orçamento	Realizado	Varição	%	
PG17	ATIVIDADE AGROPECUÁRIA	7,04	8,38	1,34	0,19	<b>Justificativas da variação anual acumulada</b> Fatores Internos R\$ 0,15MM - Gerenciamento: aumento de efetivo de gerenciamento devido ao Plano de Aceleração (PAR II). Plano de ação: Revisar os desembolsos no Draft21; Acompanhar a aderência às medições. (-R\$ 1,22MM) - Ações da Infraestrutura rural Plano de ação: N/A R\$ 4,86MM - Alavancagem das operações. Plano de Ação: N/A (-R\$ 0,32MM) - Contratos sob demanda. Plano de ação: N/A (-R\$ 0,02MM) - Baixa aderência dos produtores nos eventos. Plano de ação: Fomentar junto à Fundagres e instituições de ATER um plano de ação para atividades. (-R\$ 0,04MM) - Atrasos em algumas medições, por parte da apresentação da nota pelo produtor, e saída de alguns produtores do projeto. Plano de ação: N/A (-R\$ 0,40MM) - Capacitação Técnica para aumento da PROD - Apropriação indevida em diagrama de rede; Contrato da OCA em processo de aditivo/revisão contratual. FLORESTAL = Atraso em medições e contratação de aditivo e PU's. Plano de ação: Avaliar junto ao gestor e suprimentos o contrato da OCA; Acompanhar junto a suprimentos a efetivação do aditivo e abrir as PU's programadas. (-R\$ 0,36MM) - Saneamento e Unidades Demonstrativas - Saving. Plano de ação: N/A contra medida para recuperação do saldo. (-R\$ 0,18MM) - Monitoramento da Efetividade das Ações - Estava previsto para este mês parcela da Parceria Funarbe/UFV. PSA - Cronograma de pagamentos revistos e em execução. Plano de ação: Revisar os desembolsos no Draft21 e acompanhar a aderência.
PG19	RECUPERAÇÃO NEGÓCIOS	0,76	0,84	0,09	0,11	N/A.
PG21	AFE - AUXÍLIO FINANCEIRO	34,04	33,12	-0,93	-0,03	Fatores Externos Postergação: (- R\$ 2,3) – AFE: retomada dos AFEs cancelados por decisão judicial e atraso da operação do Novo PIM Convencional (SPA).
PG23	MANEJO DE REJEITOS	9,51	12,00	2,49	0,26	Fatores Internos (-R\$ 3,37) MM: VARRIÇÃO E CAMINHÃO PIPA, DEFINITIVIDADE DE QUINTAIS, MANUTENÇÃO DA BIOENGENHARIA, AUDITORIA PG23, MONITORAMENTO ÁRVORE DE INDICADORES, ESTUDOS COMPLEMENTARES R\$ 2,11MM: AÇÕES DE INFRA R\$ 3,20MM: PERÍCIA SEGURANÇA ALIMENTAR EIXO6 (ARSH e ARE). Fatores Externos (-R\$ 0,309 M) BARRAMENTOS; (-R\$ 0,29MM): ARSH e ARE; R\$ 2,97MM: CONSULTORIA AMBIENTAL PG23, ESTUDOS HIDROSEDIMENTOLÓGICOS, GERENCIAMENTO PG23, GESTÃO DA QUALIDADE DO AR, SERVIÇOS DE ENGENHARIA Plano de Ação ARSH e ARE: Acompanhar junto ao jurídico e refletir cenários/estratégias no DRAFT21; PERÍCIA SEGURANÇA ALIMENTAR EIXO6 (ARSH e ARE): Corrigir distribuição no DRAFT21; VARRIÇÃO E CAMINHÃO PIPA, DEFINITIVIDADE DE QUINTAIS, MANUTENÇÃO DA BIOENGENHARIA, AUDITORIA PG23, MONITORAMENTO ÁRVORE DE INDICADORES, ESTUDOS COMPLEMENTARES: Corrigir distribuição no DRAFT21; BARRAMENTO: Atuar junto ao jurídico para definição das ações do barramento; INFRA: Corrigir distribuição no DRAFT21;

PG	Programas	Mensal				Anual Acumulado	
		Orçamento	Realizado	Varição	%	Justificativas da variação anual acumulada	
PG24	CONTENÇÃO DE REJEITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	Economia  Fatores Internos: (0,3MM) Reclassificação de valores realizados em 2022, consultoria do descomissionamento do Dique S4. Fatores Externos: Projeto encerrado no CIF conforme deliberação nº 555.	
PG25	RECUPERAÇÃO ÁREA AMBIENTAL 1	2,58	2,67	0,09	0,03	Fatores Internos (-R\$ 0,17MM) - Desembolso Restauro Barra Longa (Ambiência) medição dez22 teve que ser estornada e foi feito este estorno em jan23, gerando um valor negativo (provisão de dez, baixada em jan). (Financeiro) E medição mar23 só vai entrar em abr23. Plano de ação: Fazer plano de ação e replanejar com a contratada para recuperar o desvio. (-R\$ 0,15MM) - Desembolso Insumos Cerca e Restauro PU's (GARAVINI) não ocorreu este ano de 2023 ainda, aditivo aprovado em Mar/23 (Suprimentos) Plano de ação: Contratação do aditivo para sequência do contrato aprovado, programar entrega dos materiais junto à contratada. (-R\$ 0,13MM) - Novo contrato Alocação de mão de obra (BIOKRATOS) menor que o previsto, devido dificuldade contratação de novas equipes. Plano de ação: Cobrar o retorno do plano de ação de mobilização das equipes planejadas. R\$ 0,15MM - Desembolso Gerenciamento maior que o previsto. Plano de ação: NA	
PG28	BIODIVERSIDADE	45,82	1,95	-43,87	-0,96	Economia  Fatores Internos R\$: (43,87) Causa: Alteração da periodicidade dos repasses, de trimestral para semestralmente, com próximo desembolso previsto pra jun/23. Plano de Ação: Efetuar desembolso ATC-FEST.  R\$: (0,30) Causa: Outros - Valores que serão compensados ao longo do projeto ou readequados no Draft 21. Plano de Ação: N/A  Fatores Externos R\$: (2,77) Causa: Decisão Judicial paralisou os pagamentos da Perícia até avaliação dos avanços planejados. Plano de Ação: Planejar novo formato de pagamento da perícia por meio de desembolsos no início e final do projeto.	
PG30	FAUNA E FLORA TERRESTRE	2,79	3,04	0,25	0,09	Economia  Fatores Internos (R\$ 1,0 MM) Atraso na emissão de licença para coleta de animais silvestres emitida pelo IBAMA (Abio) em janeiro, atrasou em aproximadamente 30 dias o início das coletas do monitoramento. Previsão de redução do desvio anual até abril. Ação: Atuar junto à contratada para minimizar atraso.  Fatores Externos	

PG	Programas	Mensal				Anual Acumulado
		Orçamento	Realizado	Varição	%	
PG32	SISTEMAS DE ABASTECIMENTO ÁGUA	12,44	19,24	6,80	0,55	<p><b>Justificativas da variação anual acumulada</b></p> <p>Economia: (R\$ 1,3MM)</p> <p>Infra RD: A implementação de estratégias de redução de caminhões pipa em diversas localidades, vem promovendo a redução do consumo dos contratos e consequente economia.</p> <p>Em função da judicialização, diversos processos de contratação de obras e serviços foram postergados, paralisados ou sofreram mudanças na estratégia de execução, o que vem impactando nos desembolsos, para menor que o planejado no período acumulado anual.</p> <p>A execução desses contratos e consequente desembolso conforme orçado, ainda depende de decisões externas e/ou judicialização.</p> <p>Algumas medições foram entregues fora do prazo contratual, acarretando não desembolso no prazo previsto.</p> <p>Infra LI: Atrasos na contratação e execuções abaixo do esperado</p> <p>Fatores Internos: (R\$ 1,3MM)</p> <p>Adutora - Dilação do prazo de execução com postergação de atividades que deveriam ter sido executadas em 2022</p> <p>Fatores Externos: (R\$1,2MM)</p> <p>IGV - Impacto da não aprovação do Termo de Compromisso de Tumiritinga (Sede), acarretando o atraso de 2 obras programadas para o período. Infra RD: Devido a não concretização das estratégias de retirada de caminhões pipa das localidades, em função da judicialização, diversos contratos tiveram postergados seu início ou sofreram uma mudança na estratégia de execução, o que vem promovendo realização de desembolsos menores que o planejado no realizado acumulado anual.</p>
PG37	GESTÃO RISCOS AMBIENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	<p>Economia</p> <p>Fatores Internos</p>
PG38	MONITORAMENTO ÁGUA	2,82	2,52	-0,30	-0,11	<p>Fatores Internos</p> <p>CONVENIO UNESCO</p> <p>(R\$ 0,46MM) Atraso no início da mobilização 2ª fase do MHP UNESCO, consequentemente, atraso na prestação de contas.</p> <p>Plano de ação: Cobrar prestação de contas.</p> <p>CONSULTORIA MONITORAMENTO ÁGUA</p> <p>(R\$ 0,29MM) Serviço orçado sob demanda, com utilização abaixo do previsto.</p> <p>Plano de ação: Cobrar finalização das ordens de serviço</p> <p>MONITORAMENTO SOB DEMANDA</p> <p>(R\$ 0,01MM) Serviço orçado sob demanda, com utilização abaixo do previsto. Serviços foram planejados para o novo contrato.</p> <p>Plano de ação: Acompanhar as solicitações do novo contrato.</p>
PG39	CONSOLIDAÇÃO UCs	0,01	0,53	0,51	44,80	<p>Economia</p> <p>Fatores Internos</p> <p>(R\$ 0,1 MM)</p> <p>Causa: Readequação do cronograma de entregas das avaliações de impacto e elaboração dos planos de ação de reparação.</p> <p>Plano de Ação: N/A</p> <p>Fatores Externos</p>

PG	Mensal					Anual Acumulado
	Programas	Orçamento	Realizado	Varição	%	Justificativas da variação anual acumulada
PG41	GESTÃO DOS PROGRAMAS	25,40	27,46	2,06	0,08	Economia Fatores Internos (+R\$ 3,3 MM) valor realizado a maior com Licenças e Sistemas, em jan/23, em virtude de atraso no processo de entrada da NF do fornecedor em dezembro/2022. (+R\$ 1,2 MM) Despesas Finalísticas; (+R\$3,4MM) Despesas com pessoal; (-R\$ 2,0MM) com Serviços Contratados; e (-R\$0,2MM) com Despesas de Viagem e Outros. (-R\$ 2,0 MM) PMO - Contrato sob demanda de Gestão de Portfólio do Plano de Recuperação fornecedor Accenture e equipe mobilizada menor que prevista nos contratos Progesys e G4F. (-R\$ 0,5 MM) Em Auditoria - contrato sob demanda do fornecedor EY e Contratação de Mão de Obra. Fatores Externos
PG42	GASTOS PÚBLICOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	Economia Fatores Internos
Total Reparatórios		826,81	370,93	-455,88	-0,55	
Total Programas		865,01	403,72	-461,29	-0,53	

**\*Valores em milhões de reais.**

PG	Mensal					Anual Acumulado
	Programas	Orçamento	Realizado	Varição	%	Justificativas da variação anual acumulada
ADM	DESPESAS GESTÃO ADMINISTRATI VAS	13,90	13,01	-0,88	-0,06	<p>Economia: (- R\$ 0,44) (- R\$ 0,14) despesas de viagem (- R\$ 0,30) serviços de impressão</p> <p>Fatores Internos: (- R\$ 1,93 ) (+ R\$ 0,78): Despesas com pessoal - é principalmente devido ao pagamento de horas extras relativas ao 2º semestre/2022, que ficaram acima do orçamento e encargos incidentes. Variação também acima do orçado para férias e adiantamento 13º salário e encargos incidentes. (+ R\$ 0,54): Despesas Diversas e Materiais - +R\$ 0,69 MM seguro de TI planejado para dez/22 e realizado em jan/23 e postergação de R\$ 0,15 MM na Gerência Financeira referente a correios e malotes, devido menor volume de informes de rendimentos remetidos via postagem física. (- R\$ 3,25): Serviços Contratados - é principalmente devido a postergação de consultoria jurídica (contratos sob demanda; serviços de auditoria e compliance (atividades plano 2023 não iniciadas), consultorias para Gestão de Pessoas e para Riscos, serviços não realizados em TI, no escritório de Belo Horizonte, serviços não realizados devido ao processo de substituição das contratadas. Serviços de comunicação institucional realizados acima do orçamento devido realização de publicidades mais expressivas no período.</p>
CG	CUSTEIO SISTEMA DE GOVERNANÇA	16,57	0,86	-15,72	-0,95	<p>Economia: (R\$ 4,0 MM) Câmaras Técnicas, Custeio Atingidos Reuniões, CIF e Gerenciadora CIF: Baixa execução orçamentária reflete o reduzido número de reuniões e atividades do sistema CIF no início do ano, em função do período de férias e das mudanças na composição do CIF e CTs. Fatores Internos: (R\$ 8,0 MM) Custeio Atingidos Novo Escopo: Processo de contratação em análise. A curva de desembolso tem início em janeiro/23 até agosto/23. (R\$ 1,1 M) Gerenciadora Atingidos: Processo de contratação em análise. A curva de desembolso tem início em janeiro/23 até agosto/23. Fatores Externos: (R\$ 34,4 MM) Assessorias Técnicas: Antecipação dos custos com Assessorias Técnicas Independentes em 2022 quando foi realizado o repasse no valor de R\$ 62,8 MM segundo decisão judicial. O valor pago corresponde aos 6 (seis) primeiros meses de trabalho das ATIs autorizadas para dar início aos planos de trabalho.</p>
Total Despesas Administrativas		30,47	13,87	-16,60	-0,54	
Total Geral		895,48	417,59	-477,89	-0,53	

**\*Valores em milhões de reais.**
