

FUNDAÇÃO
renova

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

Janeiro/2023

Sumário

Apresentação	<u>5</u>
PG001 Levantamento e Cadastro dos Impactados	<u>6</u>
PG002 Ressarcimento e Indenização dos Impactados	<u>13</u>
PG003 Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida dos Povos Indígenas	<u>19</u>
PG004 Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida de Outros Povos e Comunidades Tradicionais	<u>26</u>
PG005 Programa de Proteção Social	<u>32</u>
PG006 Comunicação, Participação, Diálogo e Controle Social	<u>41</u>
PG007 Programa de Assistência aos Animais	<u>85</u>
PG008 Reconstrução de Vilas	<u>94</u>
PG009 Recuperação do Reservatório da UHE Risoleta Neves	<u>108</u>
PG010 Programa de recuperação das demais comunidades e infraestruturas impactadas entre Fundão e Candonga	<u>123</u>
PG011 Recuperação das Escolas Impactadas e Fortalecimento da Educação Pública na Bacia do Rio Doce	<u>131</u>
PG012 Programa de Memória Histórica, Cultural e Artística	<u>140</u>
PG013 Programa de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer	<u>145</u>

PG014 Programa de Apoio à Saúde Física e Mental da População Impactada	<u>152</u>
PG015 Promoção da Inovação	<u>161</u>
PG016 Retomada das Atividades Aquícolas e Pesqueiras	<u>167</u>
PG017 Retomada das Atividades Agropecuárias	<u>173</u>
PG018 Desenvolvimento e Diversificação Econômica	<u>183</u>
PG019 Recuperação de Micro e Pequenos Negócios	<u>190</u>
PG020 Estímulo à Contratação Local	<u>196</u>
PG021 Auxílio Financeiro Emergencial	<u>205</u>
PG023 Manejo de Rejeitos	<u>210</u>
PG025 Programa de Recuperação da Área Ambiental 1	<u>218</u>
PG026 Programa de Recuperação de Áreas de Preservação Permanente (APPs) e Recargas Hídricas	<u>224</u>
PG027 Programa de Recuperação de Nascentes	<u>231</u>
PG028 Conservação da Biodiversidade	<u>237</u>
PG029 Recuperação da Fauna Silvestre	<u>243</u>
PG030 Fauna e Flora terrestre	<u>248</u>
PG031 Coleta e Tratamento de Esgoto e Destinação de Resíduos Sólidos	<u>253</u>
PG032 Melhoria dos Sistemas de Abastecimento de Água	<u>265</u>

PG033 Programa de Educação para Revitalização da Bacia do Rio Doce (Educação Ambiental)	<u>272</u>
PG034 Preparação para Emergências Ambientais	<u>277</u>
PG035 Programa de Informação para a População	<u>284</u>
PG036 Comunicação Nacional e Internacional	<u>289</u>
PG038 Monitoramento da Bacia do Rio Doce	<u>296</u>
PG039 Unidades de Conservação	<u>305</u>
PG040 Programa de Fomento ao CAR e PRA	<u>311</u>
PG042 Ressarcimento dos Gastos Públicos Extraordinários	<u>317</u>
Glossário	<u>323</u>
Gestão Econômica*	<u>330</u>

Apresentação

O presente documento cumpre com a CLÁUSULA 192 do TERMO DE TRANSAÇÃO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TTAC), que determina a elaboração de relatório mensal sobre o andamento de todos os PROGRAMAS – SOCIOAMBIENTAIS e SOCIOECONÔMICOS desenvolvidos e executados pela FUNDAÇÃO RENOVA – e envio do documento ao COMITÊ INTERFEDERATIVO (CIF), sempre no décimo dia útil de cada mês. Os programas têm como objetivo recuperar o meio ambiente e as condições socioeconômicas da área de abrangência impactada pelo rompimento da barragem de Fundão, em novembro de 2015, de forma a restaurar a situação anterior ao rompimento, como está disposto na CLÁUSULA 05, INCISO I do referido termo.

PG001 Levantamento e Cadastro dos Impactados

Eixo Pessoas e Comunidade

Objetivo

Levantar informações quanto às perdas materiais e das atividades econômicas impactadas através da realização do cadastro individualizado de pessoas físicas e jurídicas (apenas micro e pequenas empresas) e famílias diretamente atingidas pelo rompimento da barragem de Fundão na área de abrangência socioeconômica do TTAC. As informações levantadas pelo cadastro serão utilizadas para a realização de estudos e avaliações socioeconômicas voltados para apoiar a implementação de ações de reparação e compensação dos impactos socioeconômicos. Esse programa abrange as cláusulas 19 a 30 do TTAC.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	19	Caput	Judicializada
Cláusula	20	Caput	Judicializada
Cláusula	22	Caput	Em andamento
Cláusula	25	Caput	Em andamento
Cláusula	26	Caput	Em andamento
Cláusula	28	Caput	Em andamento
Deliberação	127	1.2 e 2	Judicializada
Deliberação	127	1.3	Concluída Internamente
Deliberação	141	1	Judicializada
Deliberação	141	2	Concluída Internamente
Deliberação	141	3	Concluída Internamente
Deliberação	141	5	Concluída Internamente
Deliberação	19	n/a	Concluída Internamente
Deliberação	234	3	Concluída Internamente
Deliberação	251	1	Concluída Internamente
Deliberação	277	único	Judicializada
Deliberação	346	2	Concluída Internamente
Deliberação	58	2	Judicializada
Deliberação	58	3	Judicializada
Deliberação	71	n/a	Concluída Internamente
Deliberação	93	2	Concluída Internamente
Deliberação	93	3	Concluída Internamente
Deliberação	93	4	Concluída Internamente
Deliberação	93	6	Concluída Internamente

Entregas do ano de 2023

Excepcionalmente este mês não iremos reportar a timeline referente ao programa, pois estamos em fase de atualização de datas. No próximo ciclo os dados serão reportados.

Progressos do Mês

Fatos Relevantes

Atendimento a 9.152 solicitantes no mês de Janeiro/23.

Grandes Números

- 176.857 solicitações de cadastro, desde o início do programa até o momento.
- 35.317 cadastros enviados ao CIF, correspondente a 30.821 famílias e 99.553 pessoas, desde o início do programa até o momento.

Indicadores

I01 – Taxa de Atendimento aos Manifestantes

Meta Global:100%
Percentual %

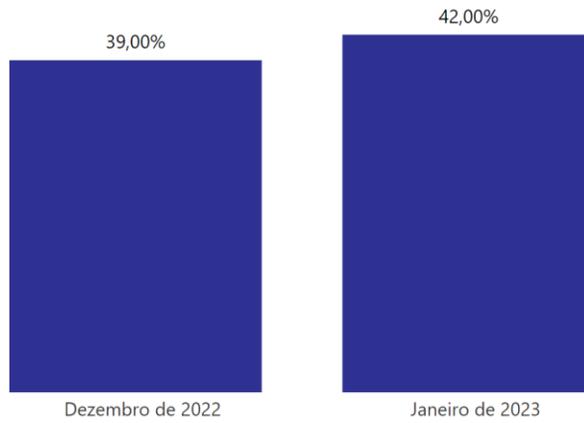


Gráfico 1: I01 – Taxa de Atendimento aos Manifestantes - Frequência Mensal

I02 – Taxa de Atendimento ao Cadastro Emergencial

Meta Global:100%
Percentual %

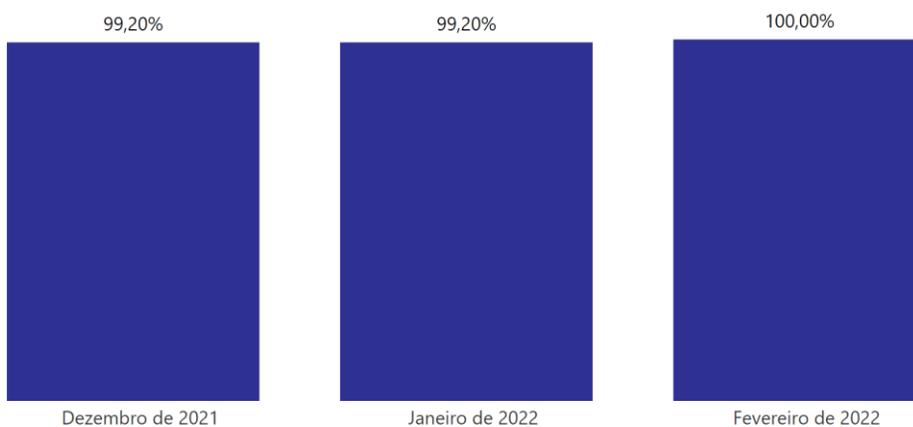


Gráfico 2: I02 – Taxa de Atendimento ao Cadastro Emergencial - Frequência Mensal

Indicadores

I04 – Taxa de solicitantes de cadastro não localizados

Meta Global:100%
Percentual %




Gráfico 3: I04 – Taxa de solicitantes de cadastro não localizados - Frequência Mensal

Indicadores de Acompanhamento

Cadastro Mariana - Fase 1

Meta Global: 1.175

Número de entrevistas

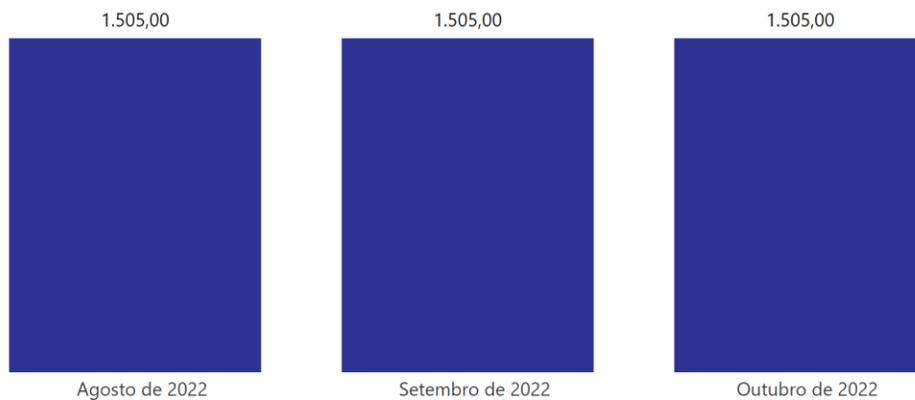


Gráfico 4: Cadastro Mariana - Fase 1 - Frequência Mensal

Cadastro Mariana - Fase 2

Meta Global: 770

Número de vistorias

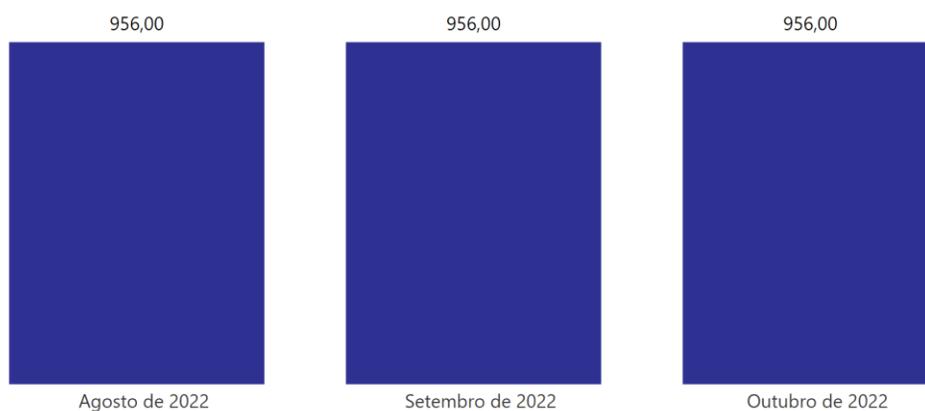


Gráfico 5: Cadastro Mariana - Fase 2 - Frequência Mensal

PG002 Ressarcimento e Indenização dos Impactados

Eixo Pessoas e Comunidade

Objetivo

Ressarcir pessoas físicas ou jurídica (neste último caso, apenas micro e pequenas empresas) que tenham sofrido danos materiais, lucro cessante e/ou morais, bem como perdas referentes às suas atividades econômicas, em consequência direta do rompimento da barragem de Fundão, de forma justa, célere, simples, transparente e sem a burocracia e os ônus de uma ação judicial. Cláusulas 31 a 38 do Termo de Transação e Ajustamento de Conduta - TTAC.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	38	Caput(ação 1)	Judicializada
Cláusula	38	Caput(ação 2)	Judicializada
Deliberação	111	3-a (ação 1)	Judicializada
Deliberação	111	3-a (ação 2)	Judicializada
Deliberação	111	3-b (ação 1)	Judicializada
Deliberação	111	3-b (ação 2)	Judicializada
Deliberação	118	2	Judicializada
Deliberação	119	10	Concluída Internamente
Deliberação	119	2	Concluída Internamente
Deliberação	119	5-a	Judicializada
Deliberação	119	5-b	Judicializada
Deliberação	181	5	Em Andamento
Deliberação	181	6	Judicializada
Deliberação	181	7	Judicializada
Deliberação	181	8	Em Andamento
Deliberação	182	1	Concluída Internamente
Deliberação	182	3	Judicializada
Deliberação	211	2	Judicializada
Deliberação	236	único	Concluída Internamente
Deliberação	469	2	Concluída Internamente

Entregas do ano de 2023

A Fundação Renova entende que o Planejamento deste Programa tem sido determinado por decisões judiciais (a exemplo da decisão de 30/11/2021), e, em função disso, não é possível precisar o Planejamento 2023 em sede administrativa.

Progressos do Mês

Fatos Relevantes

Até o momento, foi realizado o pagamento de 811 indenizações em Mariana na Fase de Negociação Extrajudicial – FNE, o que representa 98,2% do total das 826 propostas aceitas. Foram 04 indenizações pagas no mês.

Até o momento, 76.450 requerentes tiveram seus acordos homologados junto à 4ª Vara Federal, no âmbito do Sistema Indenizatório Simplificado.

Grandes Números

Para Dano Água, até o momento foram atendidas 320.179 pessoas, sendo que 270.372 aceitaram propostas. Destas, 264.988 propostas já foram pagas (98,01% das propostas aceitas). Os pagamentos somam R\$ 305,25 Mi.

Para Danos Gerais, 10.837 núcleos familiares cadastrados aceitaram as propostas de indenização, sendo que 10.780 já foram pagos (99,47 % dos casos). Os pagamentos de Danos Gerais somam R\$ 1.916,66 Mi.

Para a Campanha de Mariana, até o momento foi realizado o pagamento de 811 indenizações, o que representa 98,18% do total das 826 propostas aceitas.

Indicadores

I02 – Taxa de atendimento – Dano Geral

Meta Global: 80%
Percentual(%)

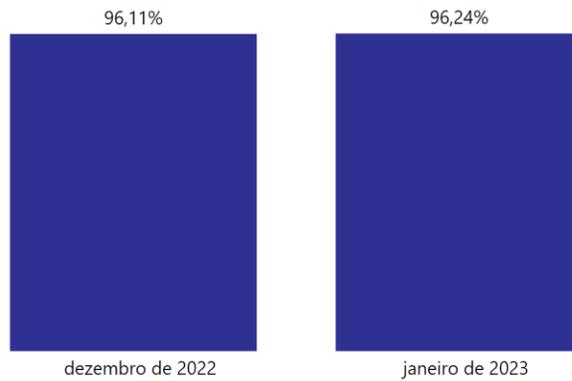


Gráfico 1: I02 – Taxa de atendimento – Dano Geral - Frequência Mensal

I04 – Taxa de adesão – Dano Geral

Meta Global: 60%
Percentual(%)

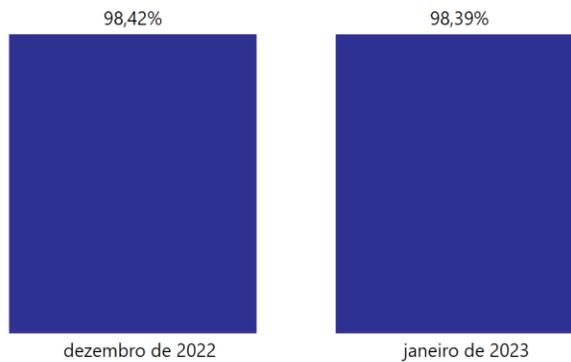


Gráfico 2: I04 – Taxa de adesão – Dano Geral - Frequência Mensal

Indicadores

I06 – Taxa de pagamentos realizados – Dano Geral

Meta Global: 100%
Percentual(%)

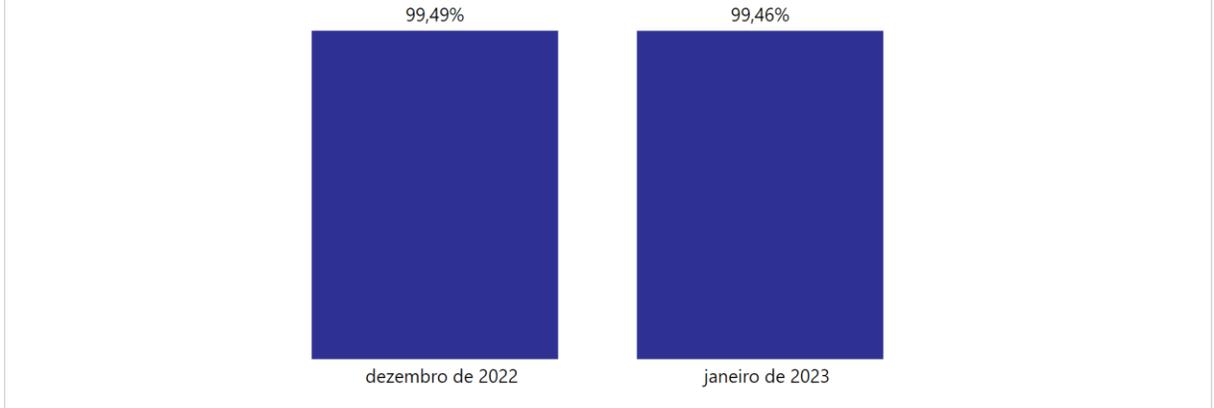


Gráfico 3: I06 – Taxa de pagamentos realizados – Dano Geral - Frequência Mensal

PG003 Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida dos Povos Indígenas

Eixo Pessoas e Comunidade

Objetivo

Implementar as ações mitigatórias, reparatórias e compensatórias para povos indígenas Tupiniquim, Guarani e Krenak em acordo com os impactos identificados conforme cláusulas 39 a 45 do Termo de Transação e Ajustamento de Conduta - TTAC.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	39	Caput	Em andamento
Cláusula	43	§1º	Em andamento
Cláusula	43	Inc I	Em andamento
Cláusula	43	Inc II	Em andamento
Cláusula	43	Inc III	Concluída Internamente
Cláusula	43	Inc IV	Em andamento
Cláusula	43	Inc V	Em andamento
Cláusula	44	Inc I (ação 1)	Concluída Internamente
Cláusula	44	Inc I (ação 2)	Concluída Internamente
Cláusula	44	Inc II	Em andamento
Cláusula	44	Inc III e §3º	Concluída Internamente
Cláusula	44	Inc IV	Em andamento
Cláusula	44	Inc V	Em andamento
Deliberação	201	2	Concluída Internamente
Deliberação	206	1	Em andamento
Deliberação	227	1	Concluída Internamente
Deliberação	227	2	Concluída Internamente
Deliberação	299	único	Concluída Internamente
Deliberação	335	3	Concluída Internamente
Deliberação	360	1 e 1.1	Concluída Internamente
Deliberação	445	1.1	Em andamento
Deliberação	445	2.1	Concluída Internamente
Deliberação	445	2.2	Concluída Internamente
Deliberação	445	2.3	Concluída Internamente
Deliberação	445	2.4	Concluída Internamente
Deliberação	445	2.5	Concluída Internamente

Entregas do ano de 2023

Excepcionalmente este mês não iremos reportar a timeline referente ao programa, pois estamos em fase de atualização de datas. No próximo ciclo os dados serão reportados.

Progressos do Mês

Grandes Números

600 pessoas abastecidas com água mineral Povos Indígenas de Resplendor (total de 93.000 litros);

142 pontos de abastecimento de água mineral Povos Indígenas de Resplendor;

174 pontos de abastecimento de água potável Povos Indígenas de Resplendor (total de 4.123 m³);

65 pontos de abastecimento de água bruta Povos Indígenas de Resplendor (total de 916,6m³).

Progressos do Mês

Fatos Relevantes

Comboios

Distribuição de água mineral para a Comunidade de Comboios – 37100 litros distribuídos nos dias 22 e 29 de dezembro de 2022 e, 05, 13 e 19 de janeiro de 2023 (total de 1855 galões de 20 litros).

Resplendor

A Fundação Renova pagou no mês corrente, através de transferência eletrônica, um total de R\$ 1.494.396,00 das associações indígenas (UATU; ATORÃN; BAKÃN; BURUM ERERRÉ-AIBE; KRENAK; NÁKNENUK; NAKRERRÉ; e BURUM TAKRUK), registradas sob os números de CNPJ (08.882.323/0001-80; 07.864.625/0001-40; 30.862.050/0001-49; 23.675.495/0001-54; 03.640.055/0001-54; 07.918.506/0001-23; 12.078.678/0001-76 e 20.076203/0001-79 respectivamente), para ser distribuído pelas Associações Indígenas às 137 famílias indígenas da terra de Resplendor. As 137 famílias indígenas estão distribuídas nas 8 associações conforme segue: 31 famílias da Associação Indígena ATORÃN, 10 famílias da Associação Indígena BAKÃN, 17 famílias da Associação Indígena BURUM ERERRE, 20 famílias da Associação Indígena KRENAK, 12 famílias da Associação Indígena NAKNENUK, 10 famílias da Associação Indígena NAKRERRE, 12 famílias da Associação Indígena TAKRUK e 25 famílias da Associação Indígena UATU. O total de R\$ 1.494.396,00, compreende o pagamento mensal de R\$ 10.908,00 para cada uma das 137 famílias.

Distribuição de Água Mineral para os Povos Indígenas de Resplendor – total de 5 litros por pessoa por dia (600 pessoas) de 21/12/2023 até 20/01/2023 no total diário de 3000 litros. (total de 93.000 litros).

Distribuição de ração na Terra Indígenas de Resplendor – 2.268 sacos de 40kg para 108 famílias de 21/12/2023 até 20/01/2023.

Distribuição de sal mineral para bovinos na Terra Indígenas de Resplendor – 300 sacos de 25 kg para 100 famílias de 21/12/2023 até 20/01/2023.

Distribuição de silagem de milho na Terra Indígenas de Resplendor – 240 toneladas para 100 famílias de 21/12/2023 até 20/01/2023.

Progressos do Mês

Fatos Relevantes

Tupiniquim-Guarani

A Fundação Renova pagou no mês corrente, através de transferência bancária à Associação Indígena Tupiniquim de Comboios inscrita no CNPJ 02.536.221/0001-04, um total de R\$1.295.356,24, referente ao pagamento de auxílio subsistência emergencial do mês de janeiro para 293 titulares da Comunidade Indígena de Comboios, esse valor, compreende o pagamento de 2,5 salários-mínimos mensal por família, acrescido de 20% sobre o valor de 1 salário-mínimo por dependente, mais o valor de uma cesta básica e 5% de taxa administrativa para as Associação.

A Fundação Renova pagou no mês corrente, através de transferência eletrônica, um total de R\$3.443.344,55 para as associações indígenas (ASSOCIAÇÃO INDIGENA GUARANI MB; ASSOCIAÇÃO INDIGENA TUPINIKIN DE IRAJÁ; ASSOCIAÇÃO INDIGENA TUPINIKIN DE AREAL; ASSOCIAÇÃO INDIGENA TUPINIKIN AITG; ASSOCIAÇÃO TUPINIKIN GUARANY D ATUGUAA ; ASSOCIAÇÃO INDIGENA TUPINIKIN PAU BRASIL), registradas sob os números de CNPJ (10.300.205/0001-46; 15.829.241/0001-15; 19.266.784/0001-22; 02.551.517/0001-02; 34.444.555/0001-44; e 09.569.165/0001-53 respectivamente), para ser distribuído pelas Associações Indígenas às 1349 famílias indígenas das terras Tupiniquim – Guarani. As 1349 famílias indígenas estão distribuídas nas 7 associações conforme segue: 56 famílias da ASSOCIAÇÃO INDIGENA GUARANI AIG, 278 famílias da ASSOCIAÇÃO INDIGENA TUPINIKIN PAU BRASIL, 165 famílias da ASSOCIAÇÃO INDIGENA TUPINIKIN DE IRAJÁ, 56 famílias ASSOCIAÇÃO INDIGENA TUPINIKIN DE AREAL, 718 famílias da ASSOCIAÇÃO INDIGENA TUPINIKIN AITG, 19 famílias da ASSOCIAÇÃO TUPINIKIN GUARANY CAIEIRAS VELHAS e 57 famílias da ASSOCIAÇÃO TUPINIKIN GUARANY AMARELOS. O total de R\$ R\$3.443.344,55 compreende o pagamento mensal do mês de janeiro acrescido de 20% sobre o valor de 1 salário-mínimo por dependente, adicionado o valor de uma cesta básica do DIEESE/ES, 5% de taxas administrativas para as Associações.

Indicadores

Os indicadores do Programa estão em revisão.

PG004 Proteção e Recuperação da Qualidade de Outros Povos e Comunidades Tradicionais

Eixo Pessoas e Comunidade

Objetivo

Implantar as ações mitigatórias, reparatórias e compensatórias para povos e comunidades tradicionais em acordo com os impactos identificados conforme Cláusulas 46 a 53 do Termo de Transação e Ajustamento de Conduta - TTAC.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	46	§1º	Concluída Internamente
Cláusula	46	§2º	Concluída Internamente
Cláusula	46	§3º	Concluída Internamente
Cláusula	46	Caput	Concluída Internamente
Cláusula	50	Caput	Em andamento
Deliberação	280	1	Concluída Internamente
Deliberação	281	1	Concluída Internamente
Deliberação	298	1	Concluída Internamente
Deliberação	329	1	Concluída Internamente
Deliberação	430	1	Concluída Internamente
Deliberação	494	1	Concluída Internamente
Deliberação	356	1; 1.1 e 1.2	Concluída Internamente
Deliberação	256	2	Concluída Internamente
Deliberação	298	2	Concluída Internamente
Deliberação	430	2	Concluída Internamente
Deliberação	494	2	Concluída Internamente
Deliberação	256	3	Concluída Internamente
Deliberação	281	3	Concluída Internamente
Deliberação	423	3	Concluída Internamente
Deliberação	281	4	Concluída Internamente
Deliberação	423	4	Concluída Internamente
Deliberação	280	4 (ação 1)	Concluída Internamente
Deliberação	280	4 (ação 2)	Concluída Internamente
Deliberação	355	1	Em andamento
Deliberação	300	1	Judicializada
Deliberação	300	2	Judicializada
Deliberação	333	2	Judicializada
Deliberação	493	2	Judicializada
Deliberação	493	3	Judicializada
Deliberação	501	3	Judicializada

Deliberação	154	1	Concluída Internamente
Deliberação	155	2	Concluída Internamente
Deliberação	161	1	Concluída Internamente
Deliberação	161	2	Concluída Internamente
Deliberação	161	3	Concluída Internamente
Deliberação	202	1	Concluída Internamente
Deliberação	202	2c	Concluída Internamente
Deliberação	202	3	Concluída Internamente
Deliberação	202	4	Concluída Internamente
Deliberação	202	5	Concluída Internamente
Deliberação	256	1	Concluída Internamente

Entregas do ano de 2023

Excepcionalmente este mês não iremos reportar a timeline referente ao programa, pois estamos em fase de atualização de datas. No próximo ciclo os dados serão reportados.

Progressos do Mês

Fatos Relevantes

Quilombolas

Análise do Livro de Referências Culturais do Degredo pela Comissão Quilombola do Degredo.

Retomada das atividades com o Comitê Gestor do PBAQ, com a Comissão Quilombola de Degredo e a ASPERQD.

Indicadores

Os indicadores do programa estão em revisão

PG005 Programa de Proteção Social

Eixo Pessoas e Comunidade

Objetivo

Desenvolver e executar ações para promover a proteção social, por meio de ações socioassistenciais, incluindo ações socioculturais e apoio psicossocial, desenvolvendo o acompanhamento às famílias e aos indivíduos impactados pelo EVENTO, priorizando os IMPACTADOS com deslocamento físico, e considerando os agravos das vulnerabilidades decorrentes do evento, segundo a CLÁUSULA 54 e demais cláusulas do TTAC.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	54	Caput	Em andamento
Deliberação	141	4	Concluída Internamente
Deliberação	167	1	Concluída Internamente
Deliberação	167	2	Concluída Internamente
Deliberação	167	3	Judicializada
Deliberação	180	1	Concluída Internamente
Deliberação	192	2	Concluída Internamente
Deliberação	234	4	Concluída Internamente
Deliberação	234	5	Concluída Internamente
Deliberação	278	1.1	Concluída Internamente
Deliberação	278	1.2	Concluída Internamente
Deliberação	278	1.3	Concluída Internamente
Deliberação	292	2	Concluída Internamente
Deliberação	307	1	Concluída Internamente
Deliberação	307	2a	Concluída Internamente
Deliberação	330	único	Concluída Internamente
Deliberação	332	único	Concluída Internamente
Deliberação	422	2	Concluída Internamente
Deliberação	533	4	Judicializada

Entregas do ano de 2023

Excepcionalmente este mês não iremos reportar os dados da timeline referente ao programa, pois estamos em fase de atualização de datas. No próximo ciclo os dados serão reportados.

Progressos do Mês

Grandes Números

- Disponibilização de recursos para a suplementação de 146 profissionais (assistentes sociais, psicólogos, motoristas e oficinairos) em 13 municípios atingidos e no Estado do Espírito Santo, para promover a proteção social, por meio de ações socioassistenciais, incluindo ações socioculturais e apoio psicossocial, desenvolvendo o acompanhamento às famílias e aos indivíduos atingidos pelo rompimento, priorizando as famílias com deslocamento físico;
- Repasse financeiro de RS 22.06M, além da contratação dos profissionais, compra de equipamentos e insumos nos demais municípios da Calha, conforme previsto nos termos pactuados, para realização de atividades coletivas com o objetivo de fortalecer vínculos familiares e comunitários das famílias atingidas;
- Disponibilização de 20 veículos com cartão combustível, para transporte das equipes profissionais suplementadas, garantindo acesso às famílias e comunidades atingidas;
- 23370 famílias cadastradas pela Fundação a serem beneficiadas por meio dos Planos de Proteção Social implementados pelos municípios atingidos com o apoio da Fundação Renova.

Progressos do Mês

Fatos Relevantes

Pactuação dos aditivos para definitividade dos planos de reparação em proteção social dos seguintes municípios: Aimorés; Belo Oriente; Fernandes Tourinho; Ipatinga; Linhares; Pingo D'Água; Rio Casca; Rio Doce; São José do Goiabal.

Indicadores

I01 - % de Municípios/Estados aderentes com recursos repassados/disponibilizados pela Fundação Renova para implementação do plano de reparação em proteção social

Meta Global: 100%
Percentual(%)



Gráfico 1: I01 - % de Municípios/Estados aderentes com recursos repassados/disponibilizados pela Fundação Renova para implementação do plano de reparação em proteção social - Frequência Anual

I02 – % Ofertar vagas pela Fundação Renova para os técnicos contratados para suplementar o RH pelos municípios/estados atingidos

Meta Global: 100%
Percentual(%)

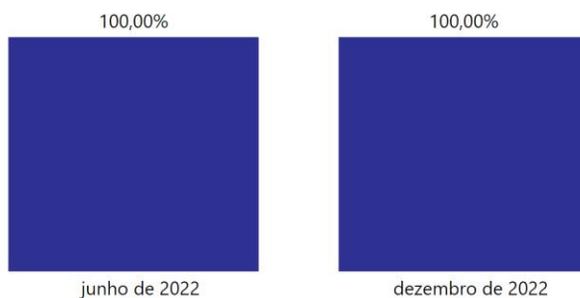


Gráfico 2: I02 – % Ofertar vagas pela Fundação Renova para os técnicos contratados para suplementar o RH pelos municípios/estados atingidos - Frequência Semestral

Indicadores

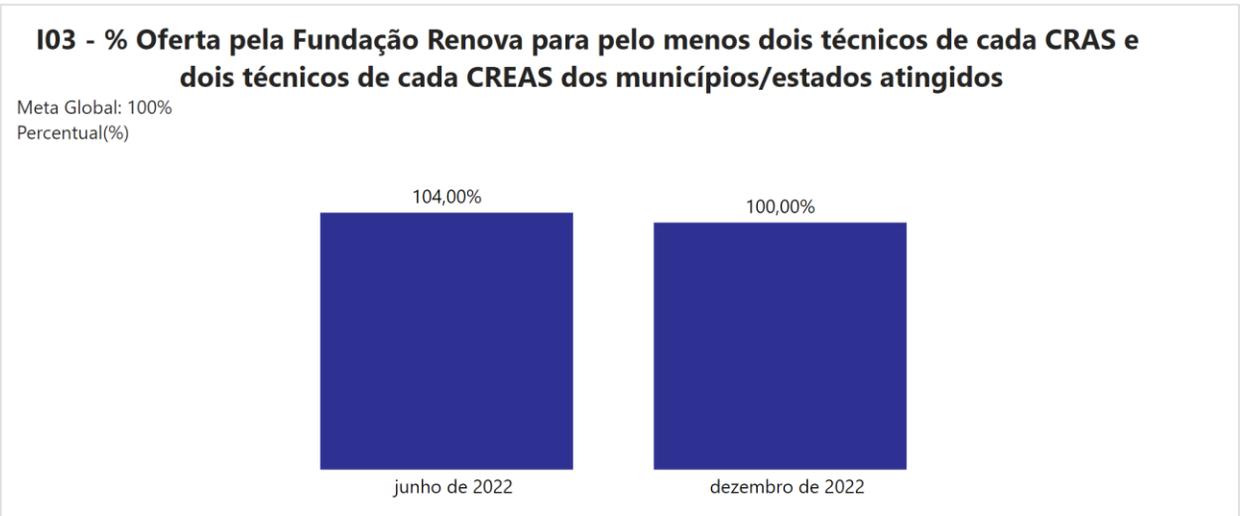


Gráfico 3: I03 - % Oferta pela Fundação Renova para pelo menos dois técnicos de cada CRAS e dois técnicos de cada CREAS dos municípios/estados atingidos - Frequência Semestral



Gráfico 4: I04 - % Oferta de pelo menos duas vagas pela Fundação Renova para técnicos do órgão gestor dos municípios/estados atingidos - Frequência Semestral

Indicadores

I05 – % de indivíduos vulneráveis elegíveis às políticas da Fundação Renova identificados e encaminhados para priorização junto aos programas aos quais têm direito

Meta Global: 100%
Percentual(%)

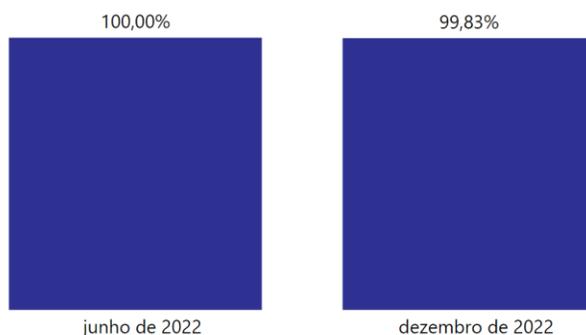


Gráfico 5: I05 – % de indivíduos vulneráveis elegíveis às políticas da Fundação Renova identificados e encaminhados para priorização junto aos programas aos quais têm direito - Frequência Semestral

I06 – % de indivíduos vulneráveis elegíveis com a rota de reparação concluída pelos programas da Fundação Renova

Meta Global: 100%
Percentual(%)




Gráfico 6: I06 – % de indivíduos vulneráveis elegíveis com a rota de reparação concluída pelos programas da Fundação Renova - Frequência Semestral

Indicadores

I07 – % de famílias com deslocamento físico que tenham anuído ao acompanhamento social até a entrega das residências concluídas ou retorno às suas residências de origem ou entrega da solução reparatória acordada (Mariana, Barra Longa, Sooretama e Linhares)

Meta Global: 100%
Percentual(%)




Gráfico 7: I07 – % de famílias com deslocamento físico que tenham anuído ao acompanhamento social até a entrega das residências concluídas ou retorno às suas residências de origem ou entrega da solução reparatória acordada (Mariana, Barra Longa, Sooretama e Linhares) - Frequência Semestral

PG006 Programa de Comunicação, Participação, Diálogo e Controle Social

Eixo Pessoas e Comunidade

Objetivo

- (i) Assegurar canais de interação, diálogo e relacionamento contínuo com a população atingida e demais públicos interessados, zelando sempre pela transparência e integridade, junto a todos os grupos e territórios.
- (ii) Garantir acesso à informação ampla, transparente, acessível e contínua a todos os atingidos e interessados, de modo a favorecer a participação esclarecida da sociedade nos processos de reparação e compensação.
- (iii) Assegurar os processos de participação social e garantir espaços de diálogos em todos os programas, projetos e ações de reparação e compensação executados pela Fundação Renova no que tange à promoção de participação social e comunicação no desenvolvimento e implementação dos projetos socioeconômicos e socioambientais previstos no TTAC e deliberações do CIF.
- (iv) Assegurar os processos de participação social e garantir espaços de diálogos em todos os programas, projetos e ações de reparação e compensação.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	59	Caput	Em andamento
Cláusula	63	§único	Em andamento
Cláusula	63	Caput	Em andamento
Cláusula	68	Caput	Encerrada
Cláusula	71	Caput	Em andamento
Cláusula	72	Caput	Em andamento
Deliberação	105	1.1	Concluída Internamente
Deliberação	105	1.2	Concluída Internamente
Deliberação	105	1.3	Concluída Internamente
Deliberação	105	1.4	Concluída Internamente
Deliberação	105	1.6	Concluída Internamente
Deliberação	140	1	Concluída Internamente
Deliberação	228	2	Concluída Internamente
Deliberação	230	1	Concluída Internamente
Deliberação	506	2	Concluída Internamente
Deliberação	506	2.2	Concluída Internamente
Deliberação	506	3	Concluída Internamente
Deliberação	506	4	Concluída Internamente
Deliberação	506	5	Concluída Internamente
Deliberação	506	6	Concluída Internamente

Entregas do ano de 2023

Excepcionalmente este mês não iremos reportar a timeline referente ao programa, pois estamos em fase de atualização de datas. No próximo ciclo os dados serão reportados.

Progressos do Mês

Grandes Números

Em janeiro de 2023 foram realizadas 16 reuniões em Minas Gerais somando um acumulado de 3.924 reuniões. No Espírito Santo foram realizadas 7, somando um acumulado de 1.199 reuniões, e, há um acumulado de 11 reuniões realizadas em outras localidades. O total acumulado de participantes em reuniões é 133.958.

Progressos do Mês

Fatos Relevantes

Em Mariana, foi realizada ação com a comunidade de Antônio Pereira para discussão, esclarecimento de dúvidas e acolhimento de pleitos sobre o impacto das obras no distrito em Ouro Preto (MG). Em Mariana (MG) foi realizada também ação junto a comunidade de Pedras e Borba para apresentação de projeto sobre a reconstrução do campo de futebol. Foi realizado Fórum de Prestação de Contas em Paracatu de Baixo (MG) fiscalização de obras do Reassentamento Coletivo no município de Mariana (MG).

No Médio Rio Doce ações foi realizada ação em Belo Oriente (MG) junto a pescadores, lideranças e Comissão de Atingidos de Cachoeira Escura para continuidade de apresentação de proposta de Curso de Capacitação em Monitor de Turismo de Pesca. Em Conselheiro Pena (MG) e em Turimitinga (MG) foram realizadas ações junto a produtores rurais do município para esclarecimento e acolhimento de dúvidas junto a Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER). Ação com a Associação de Pescadores e Ilheiros de Pedra Corrida (Periquito) para discussão de projetos alternativas de pesca junto ao Programa de Retomada das Atividades Aquícolas e Pesqueiras (PG016); Encontro para apresentação de ações de Contratação e Empreendedorismo Local; Ação com moradores do Assentamento Liberdade (Periquito) também para apresentação da atuação de Contratação e Empreendedorismo local e Reunião com membros da Associação de Cooperação Agrícola do Assentamento Liberdade (Acoal) para apresentação da composição de nova diretoria foram realizadas em Conselheiro Pena (MG). Ação realizada junto moradores de Cachoeira Escura para apresentação de ações de Contratação e Empreendedorismo Local em Belo Oriente (MG).

Realização da Pesquisa Anual de Comunicação e Diálogo para avaliação das estratégias de engajamento, participação e comunicação junto às comunidades atingidas.

Progressos do Mês

Fatos Relevantes

No Espírito Santo, no município de Linhares (ES) foram realizadas ações junto a comunidade de Regência e Povoação para repasse de informações sobre o Projeto Rio Doce, Doce Mar; Encontro com a Associação de Pescadores e Assemelhados de Povoação – APAP, com a Associação de Moradores de Regência – AMOR e com a Associação de Pescadores de Regência – ASPER com o intuito de esclarecer dúvidas sobre as ações do PG016 e apresentar curso de capacitação de condutores do turismo de pesca esportiva, por meio da Igarapesca; Ação com lideranças do Assentamento Sezínio Fernandes de Jesus, para mapeamento de público com interesse nas ações do Programa de Retomada das Atividades Aquícolas e Pesqueiras previstas para 2023 e Ação com representantes da Associação de Piscicultura e Associação de Moradores de Guaxe para discussão sobre ações na comunidade.

Indicadores

I03 - Pilar diálogo - Média mensal de espaços de diálogo coletivo nos territórios

Quantidade absoluta




Gráfico 1: I03 - Pilar diálogo - Média mensal de espaços de diálogo coletivo nos territórios - Frequência Mensal

I01 - Pilar diálogo - Apresentação dialógica dos programas nos territórios

Percentual(%)



Gráfico 2: I01 - Pilar diálogo - Apresentação dialógica dos programas nos territórios- Frequência Trimestral

Indicadores

I02 - Pilar diálogo - Nível de compreensão da população atingida sobre as decisões resultantes dos processos participativos

Pontos



Gráfico 3: I02 - Pilar diálogo - Nível de compreensão da população atingida sobre as decisões resultantes dos processos participativos - Frequência Trimestral

I04 - Pilar diálogo - Disponibilidade de informações sobre as tratativas dos encaminhamentos definidos em Diálogos Coletivos

Pontos



Gráfico 4: I04 - Pilar diálogo - Disponibilidade de informações sobre as tratativas dos encaminhamentos definidos em Diálogos Coletivos - Frequência Semestral

Indicadores



Gráfico 5: I05 - Pilar diálogo - Compreensão dos atingidos em relação às informações sobre o andamento dos encaminhamentos definidos em diálogos coletivos - Frequência Semestral




Gráfico 6: I06 - Pilar diálogo - Avaliação dos espaços de participação e controle social - Frequência Semestral

Indicadores

I08 - Pilar diálogo - Percepção de efetividade dos espaços de participação e controle social

Percentual(%)

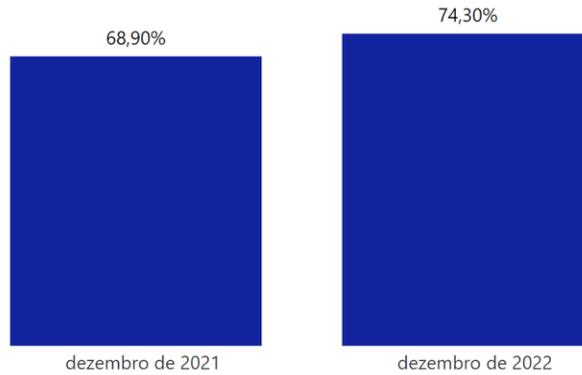


Gráfico 7: I08 - Pilar diálogo - Percepção de efetividade dos espaços de participação e controle social - Frequência Anual

I07 - Pilar diálogo - Satisfação com a transparência das ações da Fundação Renova

Percentual(%)




Gráfico 8: I07 - Pilar diálogo - Satisfação com a transparência das ações da Fundação Renova - Frequência Anual

Indicadores



Gráfico 9: I10 - Pilar de Diálogo - Satisfação Com o Processo De Construção Coletiva Dos Encaminhamentos Em Diálogos Coletivos - Frequência Mensal




Gráfico 10: I09 - Pilar de Diálogo - Número De Encaminhamentos Definidos Em Diálogos Coletivos Realizados Nos Territórios - Frequência Trimestral

Progressos do Mês

Grandes Números

Desde 2015, a ouvidoria recebeu 16.087 manifestações. Desse total, 15.994 foram finalizadas até o final de janeiro de 2023 e 93 estão em tratamento.

Em janeiro de 2023 a ouvidoria recebeu 150 novas manifestações.

A média mensal em 2023 é de 150 manifestações recebidas e a média acumulada desde 2015 até janeiro de 2023 é de 184,91.

Indicadores




Gráfico 9: I01 - Pilar ouvidoria - Proporção de respostas disponibilizadas pela ouvidoria dentro do prazo - Frequência Mensal




Gráfico 10: I02 - Pilar ouvidoria - Média de tempo para disponibilização de respostas pela ouvidoria - Frequência Mensal

Indicadores

I03 - Pilar ouvidoria - Avaliação do atendimento pela ouvidoria

Percentual(%)

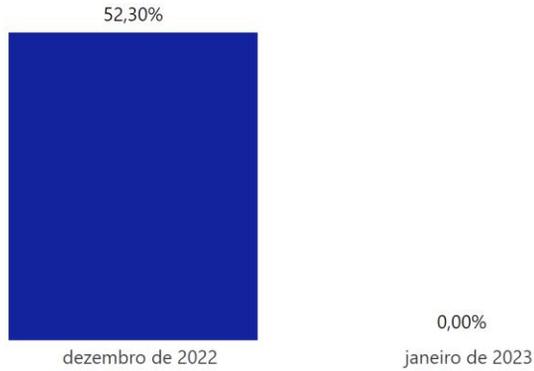


Gráfico 11: I03 - Pilar ouvidoria - Avaliação do atendimento pela ouvidoria - Frequência Mensal

Apesar de na definição do programa esse indicador constar com medições mensais, as pesquisas serão realizadas semestralmente. O programa está providenciando a formalização dessa informação com CTPDCS e CIF.

Progressos do Mês

Grandes Números

Número de total de manifestações registradas nos diversos Canais existentes em valores acumulados de 2015 a janeiro de 2023 de 1.330.747 manifestações. Dentro deste valor, 1.272.152 foram de manifestações respondidas e 58.595 de manifestações em tratamento.

O canal 0800 contabilizou em valores acumulados 985.128 manifestações; o canal do CIAs (Centros de Informação e Atendimento) 172.449; pelo Portal do Usuário 92.233 manifestações; pelo Fale Conosco foram registrados 14.832 acumuladas; pelo canais que atribuímos como Outros (Abordagem presencial, E-mail, Eventos, Fórum, Mobilização, Ofício, Ouvidoria, Redes Sociais, Reunião de Diálogo, Telefone) contabilizou-se um total de 66.105 manifestações.

Finalizando tivemos um total também acumulado de pessoas registradas no SGS (que fizeram contato com os Canais) 328.662 e apenas no mês de Janeiro de 2023, 8 manifestações encaminhadas à Ouvidoria no mês.

Progressos do Mês

Fatos Relevantes

Ao longo do mês de janeiro, destaque para a realização de 07 CIAs Móveis.: Na comunidade de Baguari (Governador Valadares/MG) dia 18/01; na comunidade de Povoação no dia 18/01, e na comunidade de Regência em (Linhares/ES) em 19/01. No município de Córrego Novo (MG) no dia 24/01, Periquito (MG) em 25/01, Pingo D'Água em 26/01 e na comunidade de Barra do Riacho (Aracruz/ES) em 31/01. Durante as ações realizadas foram atendidos diversos públicos das comunidades e regiões vizinhas, essas ações contaram com acolhimento, registro de manifestações e esclarecimento de dúvidas relacionadas ao processo de reparação.

Continuidade do trabalho de acolhimento e esclarecimento de dúvidas nos Centros de Informação e Atendimento; monitoramento, pelos atendentes CIAs, de manifestações registradas que estão pendentes de respostas intermediárias ou finais.

Discussão e levantamento das pautas para envio a pedido da equipe de Comunicação Fundação Renova para elaboração da 7ª Edição do Jornal Mural.

Participação dos Atendentes CIAs no treinamento "Lucro Cessante 2022", realizado no dia 11/01. Participação dos Atendentes CIAs no treinamento sobre nova aba de consulta no SGS para Lucro Cessante 2022 em 27/01.

Pesquisa de Opinião 0800

Q2: O quanto você está satisfeito?

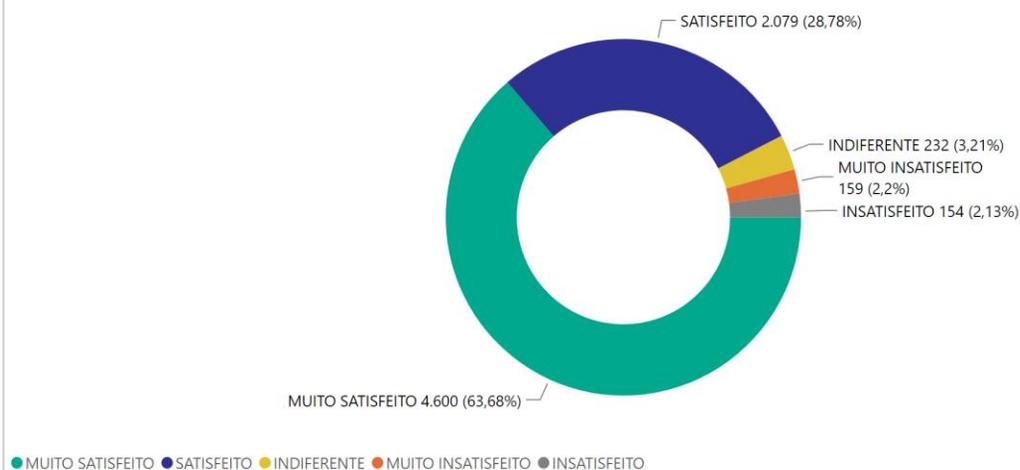


Gráfico 11: Pesquisas de Satisfação 0800 - Q2

Q1: Você obteve a informação de que precisava neste atendimento?

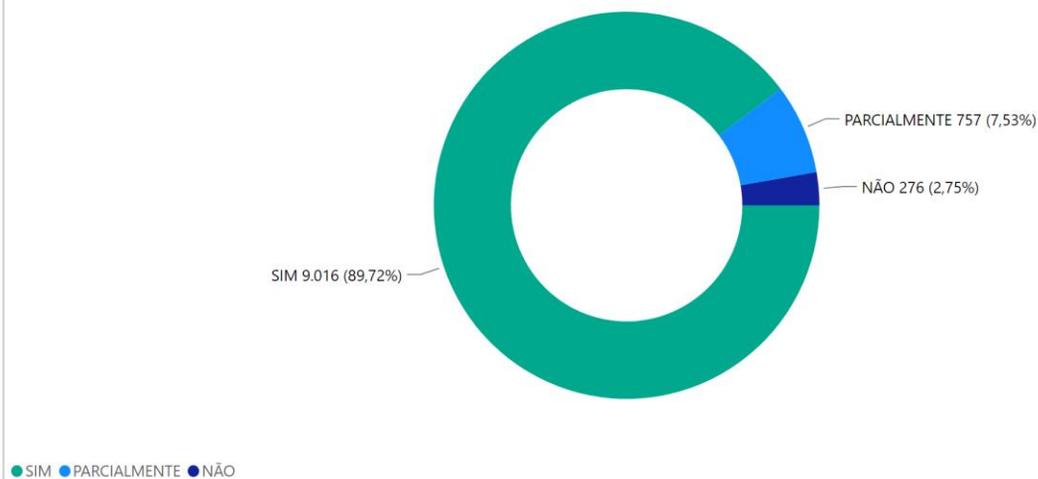


Gráfico 12: Pesquisas de Satisfação 0800 - Q1

Pesquisa de Opinião 0800

Q3: Como você avalia o atendimento que acabou de receber? Q1 = Sim




Gráfico 13: Pesquisas de Satisfação 0800 - Q3 , Q1 = Sim.

Q3: Como você avalia o atendimento que acabou de receber? Q1 = Parcialmente





Gráfico 14: Pesquisas de Satisfação 0800 - Q3, Q1= Parcialmente.

Pesquisa CIAs


Como você avalia o profissional que lhe atendeu hoje?

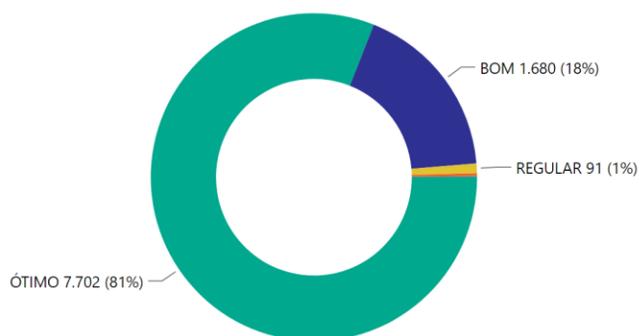

Legenda ● ÓTIMO ● BOM ● REGULAR ● PÉSSIMO ● RUIM

Gráfico 15: Como você avalia o profissional que lhe atendeu hoje? - Frequência Mensal


Em relação às informações recebidas neste atendimento, você ficou?

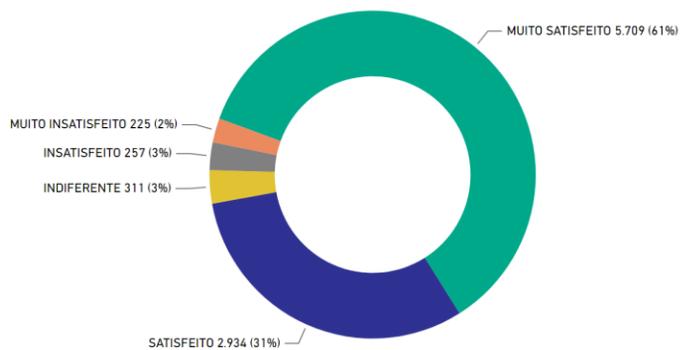

Legenda ● MUITO SATISFEITO ● SATISFEITO ● INDIFERENTE ● INSATISFEITO ● MUITO INSATISFEITO

Gráfico 16: Em relação às informações recebidas neste atendimento, você ficou? - Frequência Mensal


Você recebeu a informação que solicitou neste atendimento?

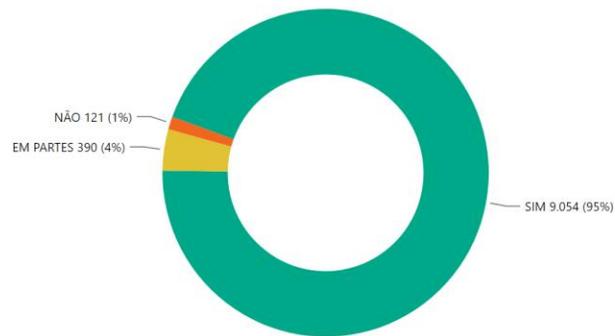

Legenda ● SIM ● EM PARTES ● NÃO

Gráfico 17: Você recebeu a informação que solicitou neste atendimento? - Frequência Mensal

Avalie o Conforto e qualidade do espaço



Legenda ● ÓTIMO ● BOM ● REGULAR ● PÉSSIMO ● RUIIM

Gráfico 18: Avalie o Conforto e qualidade do espaço - Frequência Mensal

Indicadores

I01 - Pilar canais - Taxa de manifestações reincidentes

Percentual(%)




Gráfico 19:I01 - Pilar canais - Taxa de manifestações reincidentes - Frequência Mensal

I02 - Pilar canais - Proporção de manifestações respondidas

Percentual(%)




Gráfico 20: I02 - Pilar canais - Proporção de manifestações respondidas - Frequência Mensal

Indicadores

I03 - Pilar canais - Proporção de manifestações respondidas no prazo estipulado

Percentual(%)




Gráfico 21: I03 - Pilar canais - Proporção de manifestações respondidas no prazo estipulado - Frequência Mensal

I04 - Pilar canais - Avaliação do atendimento pelos usuários dos cias

Percentual(%)

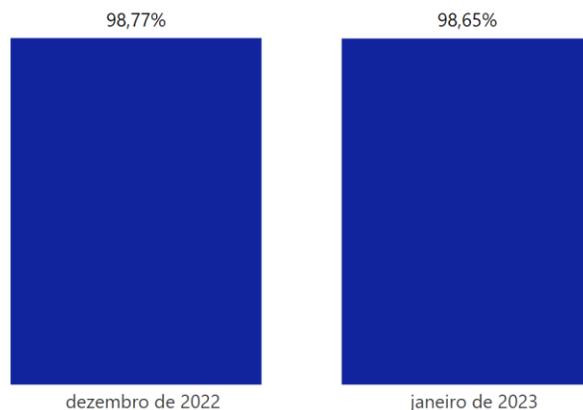


Gráfico 22: I04 - Pilar canais - Avaliação do atendimento pelos usuários dos cias - Frequência Mensal

Indicadores

I06 - Pilar canais - Satisfação com a resolução das solicitações

Percentual(%)

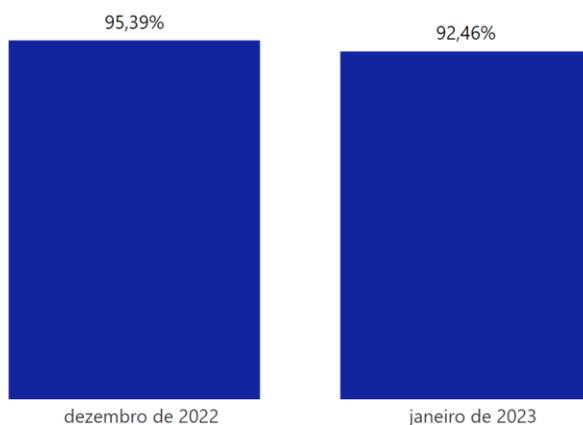


Gráfico 24: I06 - Pilar canais - Satisfação com a resolução das solicitações - Frequência Mensal

I05 - Pilar canais - Avaliação do atendimento pelos usuários da central 0800 e fale conosco

Percentual(%)




Gráfico 23: I05 - Pilar canais - Avaliação do atendimento pelos usuários da central 0800 e fale conosco - Frequência Mensal

Indicadores

I07 - Pilar canais - Oferta das informações solicitadas nos cias

Percentual(%)

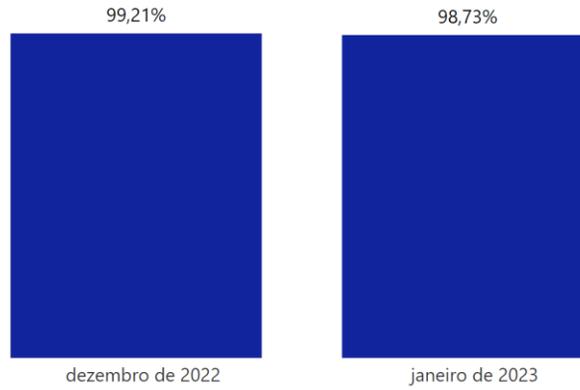


Gráfico 25: I07 - Pilar canais - Oferta das informações solicitadas nos cias - Frequência Mensal

I08 - Pilar canais - Oferta das informações solicitadas na central 0800 e fale conosco

Percentual(%)




Gráfico 26: I08 - Pilar canais - Oferta das informações solicitadas na central 0800 e fale conosco - Frequência Mensal

Indicadores

I09 - Pilar canais - Satisfação com a estrutura física dos cias

Percentual(%)

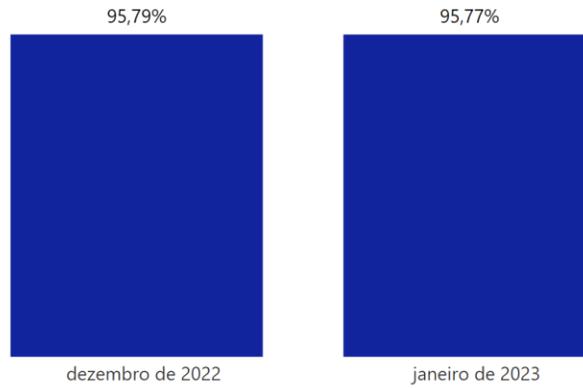


Gráfico 27: I09 - Pilar canais - Satisfação com a estrutura física dos cias - Frequência Mensal


Progressos do Mês

Grandes Números

No mês de janeiro de 2023 houve 156 produções de conteúdo. Foram produzidas 44 matérias para o Jornal Mural CIA, 31 matérias para o Jornal da Comunidade, 31 pílulas de WhatsApp, 32 produções para programas de rádio, 7 vídeos e 2 Informes do Reassentamento entre outros.

Produção por Território

Canais ● Áudio ● Cartilha ● Informe do Reassentamento ● Jornal da Comunidade ● Matéria – Jornal Mura... ● Newsletter ● Outros ● Pílula ● Rádio ● Vídeo

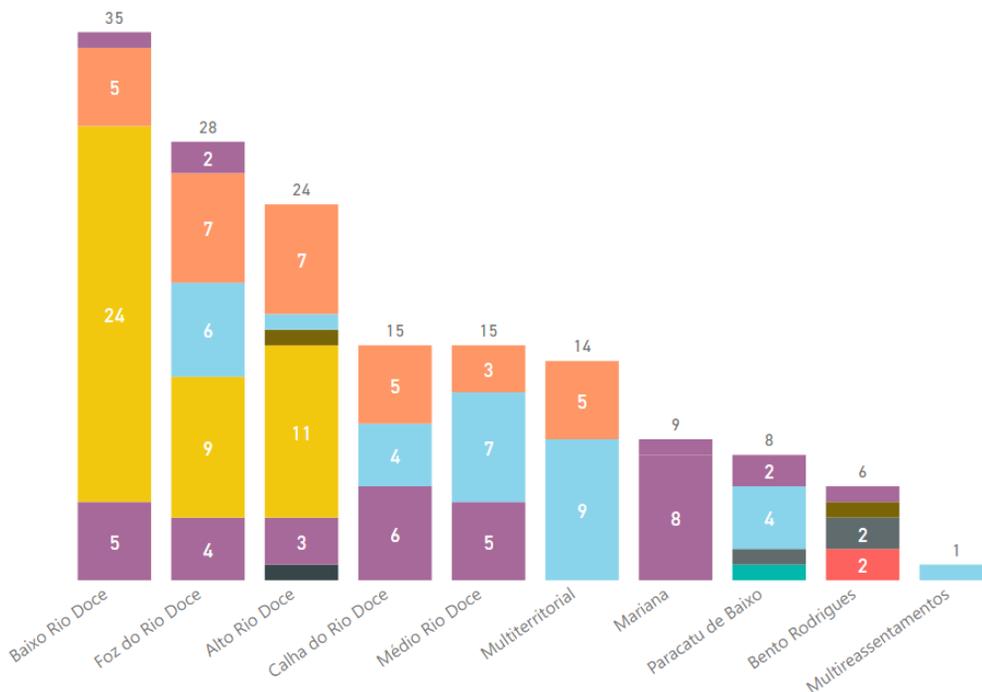


Observação: os números apresentados nas colunas dos reassentamentos de Bento Rodrigues, Gesteira e Paracatu de Baixo não são contabilizados na coluna do território de Mariana.

Progressos do Mês

Grandes Números

Temas mais publicados



Progressos do Mês

Território

Fatos Relevantes

Alto Rio Doce

Produção de conteúdo sobre as ações do Programa de Memória Artística e Cultural para a região de Ipatinga.

Produção de programa de rádio (Momento da Reparação) sobre os cuidados com as chuvas.

Baixo Rio Doce

Produção de matéria para o programa de rádio Momento da Reparação sobre os canais de comunicação existentes no território e com depoimento de uma integrante do grupo de comunicação local

Produção de matéria sobre o portal da transparência para a edição de janeiro do Jornal Mural de Aimorés

Produção de matéria sobre o portal da transparência para a edição de janeiro do Jornal Mural de Baixo Guandu

Produção de matéria sobre o portal da transparência para a edição de janeiro do Jornal Mural de Colatina

Produção de matéria sobre o portal da transparência para a edição de janeiro do Jornal Mural de Resplendor

Produção de vídeo resumo para divulgar a edição de janeiro do boletim do território Baixo, Repara Cidadão

Mariana

Produção de matéria para a edição 26 do Voz da Comunidade sobre distribuição do Voz da Comunidade

Produção de vídeo resumo para divulgar a edição de janeiro do Voz da Comunidade

Progressos do Mês

Território

Fatos Relevantes

Calha do Rio Doce

Produção de pílula de WhatsApp convidando moradores de Córrego Novo para CIA Móvel no dia 24/01.

Produção de pílula de WhatsApp convidando moradores de Pingo-d'Água para CIA Móvel no dia 26/01.

Produção de pílula de WhatsApp convidando moradores de Rio Casca para o Fórum Resulta, no dia 26/01.

Produção de pílula de WhatsApp convidando moradores de São José do Goiabal para o Fórum Resulta, no dia 25/01.

Produção de programa de rádio (Momento da Reparação) sobre o minidoc da plataforma Expedição Rio Doce que fala do monitoramento de ecossistemas na bacia do rio Doce.

Foz do Rio Doce

Produção de matéria para o Momento da Reparação sobre a capacitação em monitoramento hídrico, promovida pela Unesco.

Produção de pílula, informando sobre o alteamento da ensecadeira, localizada no rio Pequeno.

Produção de pílula, informando sobre o rebaixamento da ensecadeira, localizada no rio Pequeno.

Produção de vídeo com o resumo as principais notícias abordadas na edição de janeiro do Jornal Voz da Foz.

Produção de vídeo sobre o período chuvoso e impactos em Patrimônio da Lagoa

Progressos do Mês

Território

Fatos Relevantes

Médio Rio Doce

Produção de pílula de WhatsApp convidando moradores da comunidade de Ilha Brava para CIA Móvel no dia 02/02.

Produção de pílula de WhatsApp convidando moradores de Baguari, comunidade de Governador Valadares, para CIA Móvel no dia 18/01.

Produção de pílula de WhatsApp convidando moradores de Periquito para CIA Móvel no dia 26/01.

Produção de spot para som volante convidando moradores de Baguari, comunidade de Governador Valadares, para CIA Móvel no dia 18/01.

Progressos do Mês

Imprensa

Fatos Relevantes

Edição virtual do Encontro de Negócios incentiva parcerias entre fornecedores e compradores no Vale do Aço.

Edição virtual do Encontro de Negócios incentiva parcerias entre fornecedores e compradores.

Encontro de Negócios virtual conecta comerciantes a grandes compradores do ES.

Festival de verão agita a vila Regência com programação até o Carnaval.

Festival de verão movimenta o balneário de Povoação até o Carnaval.

Fundação Renova inicia pagamento de lucros cessantes referentes a 2022.

Gestão de restauração florestal e recuperação ambiental na Bacia do rio Doce é eleita uma das melhores do país.

Novo distrito de Bento Rodrigues tem infraestrutura para receber moradores.

Plataforma Recoloca Rio Doce tem cerca de 470 vagas de emprego para Mariana e região.

Plataforma Recoloca Rio Doce tem cerca de 480 vagas de emprego para Mariana e região.

Plataforma Recoloca Rio Doce tem cerca de 540 vagas de emprego para Mariana e região.

Plataforma Recoloca Rio Doce tem cerca de 600 vagas de emprego para Mariana e região.

Recoloca Rio Doce tem 73 vagas de emprego para os Vales do Aço, Mucuri e Rio Doce.

Progressos do Mês

Suporte aos Programas

Fatos Relevantes

Suporte à Relações Institucionais

Produção de matéria para a edição de Janeiro do mural sobre o curso de monitoramento hídrico participativo, em parceria com a Unesco.

Produção de matéria para a edição de Janeiro do Voz da Foz sobre o curso de monitoramento hídrico participativo, em parceria com a Unesco.

Produção de pílula, informando sobre o alteamento da enseadeira, localizada no rio Pequeno.

Suporte ao PG001 Levantamento e Cadastro dos Impactados

Matéria para o boletim do Baixo Rio Doce, Repara Cidadão, do mês de janeiro explicando como funciona o programa nº 01 da Renova, Levantamento e Cadastro dos Impactados.

Suporte ao PG004 Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida de Outros Povos e Comunidades Tradicionais

Produção de convite para reunião ampliada na comunidade de Degredo.

Suporte ao PG006 Pilar de Ouvidoria

Produção de programa de rádio (Momento da Reparação) sobre o funcionamento da Ouvidoria.

Suporte ao PG008 Reconstrução de Vilas

Produção de matéria para a edição 26 do Voz da Comunidade novos nascimentos nas comunidades a serem reassentadas

Suporte ao PG010 Recuperação das Demais Comunidades e Infraestruturas Impactadas

Produção de matéria para a edição 26 do Voz da Comunidade sobre obras nas duas pontes em Santa Rita Durão

Progressos do Mês

Suporte aos Programas

Fatos Relevantes

Suporte ao PG008 Reconstrução de Vilas - Bento Rodrigues

Convite às famílias de Bento Rodrigues para a inauguração dos marcos da Estrada Real no novo distrito

Informativo digital para as famílias de Bento Rodrigues sobre prontidão do novo distrito com foco no funcionamento de internet e telefonia.

Informativo digital para as famílias de Bento Rodrigues sobre prontidão do novo distrito com foco no funcionamento do mercado temporário.

Produção de matéria para a edição 26 do Voz da Comunidade o Serviço de Atendimento ao Morador

Produção de matéria para a edição 26 do Voz da Comunidade sobre os preparativos das famílias para a mudança para o novo distrito

Produção de matéria para a edição 26 do Voz da Comunidade sobre Posto de Saúde em Bento Rodrigues

Produção de matéria para a edição 26 do Voz da Comunidade sobre transporte coletivo em Bento Rodrigues

Produção do informativo mensal, em formato digital, com informações sobre os avanços do processo de reassentamento para as famílias de Bento Rodrigues.

Produção do informativo mensal, em formato impresso, com informações sobre os avanços do processo de reassentamento para as famílias de Bento Rodrigues. Boletim entregue nas casas das famílias e público institucional.

Produção do vídeo mensal com informações sobre os avanços do processo de reassentamento para as famílias de Bento Rodrigues.

Progressos do Mês

Suporte aos Programas

Fatos Relevantes

Suporte ao PG008 Reconstrução de Vilas - Paracatu

Produção áudiozap com reforço no convite para as famílias de Paracatu de Baixo participarem do evento Memórias afetivas e reencontros, realizado no dia 29/01.

Produção de convite para as famílias de Paracatu de Baixo participarem do evento Memórias afetivas e reencontros, realizado no dia 29/01

Produção de convite reforço com a programação para as famílias de Paracatu de Baixo participarem do evento Memórias afetivas e reencontros, realizado no dia 29/01.

Produção de pílula de WhatsApp em atendimento à condicionante do reassentamento com o tema: Dia do combate da Poluição por Agrotóxicos.

Produção de pílula de WhatsApp em atendimento à condicionante do reassentamento com o tema: Dia Mundial das Zonas Úmidas

Produção de vídeo com as manchetes do Informe de Paracatu de Baixo Edição 47.

Produção de vídeo sobre a confraternização de final ano com as famílias de Paracatu de Baixo.

Produção do Informe de Paracatu de Baixo, edição 47, com conteúdo e fotos sobre os avanços das obras, atendimentos às famílias, entre outros.

Produção do vídeo em 1 minuto com os principais avanços das obras e ações realizadas com as famílias de Paracatu de Baixo no mês.

Suporte ao PG012 Memória Histórica, Cultural e Artística

Produção de matéria para a edição 26 do Voz da Comunidade sobre as formações dos educadores do tempo integral de Mariana

Produção de matéria para a edição 28 do boletim Terra da Gente sobre a tradição das folias de reais, patrimônios imateriais do território do Alto.

Progressos do Mês

Suporte aos Programas

Fatos Relevantes

Suporte ao PG013 Turismo, Cultura, Esporte e Lazer

Produção de matéria para a edição de Janeiro do mural sobre como é feita a análise dos projetos que participam do edital.

Produção de matéria para a edição de Janeiro do mural sobre os projetos apoiados pelo Edital Doce que estão movimentando o verão.

Produção de matéria para a edição de Janeiro do Voz da Foz sobre como é feita a análise dos projetos que participam do edital.

Produção de matéria para a edição de Janeiro do Voz da Foz sobre os projetos apoiados pelo Edital Doce que estão movimentando o verão.

Produção de matéria para o Momento da Reparação sobre a programação de verão na Foz do Rio Doce, que inclui diversos projetos apoiados pelo Edital Doce.

Produção de matéria para o programa de rádio Momento da Reparação sobre o projeto aprovado na segunda edição do edital doce e como será a execução do projeto

Produção de programa de rádio (Momento da Reparação) sobre o início da entrega dos kits do projeto de Incentivo à Leitura nos municípios do território Calha do Rio Doce.

Publicação de matéria na 7ª edição do boletim Vozes do Território sobre o início das entregas dos kits do projeto de Incentivo à Leitura.

Suporte ao PG014 Apoio à Saúde Física e Mental da População Impactada

Publicação de matéria na 7ª edição do boletim Vozes do Território sobre a realização de capacitação de profissionais do SUS nos municípios atingidos.

Suporte ao PG016 Retomada das Atividades Aquícolas e Pesqueiras

Produção de matéria para o Programa de Rádio, Momento da Reparação, sobre o monitoramento pesqueiro realizado na Foz do Rio Doce.

Suporte ao PG023 Manejo de Rejeitos

Produção de matéria para o programa de rádio Momento da Reparação sobre o rejeito, suas características e estudos que vem sendo desenvolvidos sobre o tema

Progressos do Mês

Suporte aos Programas

Fatos Relevantes

Suporte ao PG015 Promoção à Inovação

Produção de pílula de WhatsApp divulgado o projeto Rio Doce LABS para os municípios de Ipatinga, Governador Valadares e Linhares.

Produção de programa de rádio divulgando o projeto Rio Doce LABS para o município de Governador Valadares.

Produção de programa de rádio divulgando o projeto Rio Doce LABS para o município de Ipatinga.

Publicação de matéria na 6ª edição do boletim Voz do Rio Doce sobre o projeto Rio Doce LABS.

Suporte ao PG017 Retomada das Atividades Agropecuárias

Produção de matéria para a edição 28 do boletim Terra da Gente sobre a reparação ambiental no território Alto Rio Doce.

Produção de matéria sobre a reparação ambiental - PG17 - no território para a edição de janeiro do Jornal Mural de Rio Doce.

Produção de programa de rádio (Momento da Reparação) sobre as ações realizadas no Alto Rio Doce referentes à retomada de atividades agropecuárias.

Suporte ao PG019 Programa de Recuperação de Micro e Pequenos Negócios

Produção de matéria para a edição 28 do boletim Terra da Gente sobre a recuperação de micro e pequenos negócios no território Alto Rio Doce.

Produção de matéria para o programa de rádio (Momento da Reparação) sobre o primeiro evento do ano do Projeto Mais Gestão, em Governador Valadares.

Produção de matéria para o programa de rádio (Momento da Reparação) sobre o primeiro evento do ano do Projeto Mais Gestão, em Ipatinga.

Produção de matéria para o Programa de Rádio, Momento da Reparação, sobre o primeiro evento do ano do Projeto Mais Gestão, em Linhares.

Produção de matéria, para a atualização do mural, sobre o retorno da consultoria do IEL aos comerciantes da Foz do Rio Doce.

Produção de pílula informando sobre o retorno da consultoria do IEL aos comerciantes da Foz.

Progressos do Mês

Suporte aos Programas

Fatos Relevantes

Suporte ao PG020 Estímulo à Contratação Local

Produção de matéria para a edição de Janeiro do Voz da Foz sobre a oferta de vagas de empregos na plataforma Recoloca Rio Doce.

Produção de matéria para o Momento da Reparação sobre o programa de Estímulo à Contratação Local

Produção de matéria sobre a plataforma Recoloca Rio Doce para a edição de janeiro do Jornal Mural de Barra Longa.

Produção de matéria sobre a plataforma Recoloca Rio Doce para a edição de janeiro do Jornal Mural de Rio Doce.

Produção de matéria sobre oportunidades de emprego na região para a edição de janeiro do Jornal Mural de Barra Longa.

Produção de matéria sobre oportunidades de emprego na região para a edição de janeiro do Jornal Mural de Rio Doce.

Produção de matéria, para a atualização do mural, sobre as vagas de emprego disponíveis no Recoloca Rio Doce.

Produção de pílula de WhatsApp sobre a reunião de entrega de certificado aos participantes do curso de Bolos Artesanais, no dia 24/01, no Assentamento Liberdade.

Produção de pílula de WhatsApp sobre a reunião de entrega de certificado aos participantes do curso de Iniciação em Processos Administrativos, no dia 25/01, em Cachoeira Escura.

Produção de pílula de WhatsApp sobre a reunião de entrega de certificado aos participantes dos cursos de Informática e Administrativo, no dia 24/01, em Pedra Corrida.

Produção de pílula de WhatsApp sobre as oportunidades de emprego em Barra Longa.

Produção de pílula de WhatsApp sobre as oportunidades de emprego nas obras dos reassentamentos.

Publicação de matéria na 6ª edição do boletim Voz do Rio Doce sobre vagas disponíveis via plataforma Recoloca Rio Doce.

Progressos do Mês

Suporte aos Programas

Fatos Relevantes

Suporte ao PG021 Auxílio Financeiro Emergencial

Produção de pílula de WhatsApp informando que o Auxílio Financeiro Emergencial (AFE) é um programa da Fundação Renova e se difere do Sistema Indenizatório Simplificado.

Produção de programa de rádio explicando que o Auxílio Financeiro Emergencial (AFE) é um programa da Fundação Renova e se difere do Sistema Indenizatório Simplificado.

Suporte ao PG025 Recuperação Ambiental Área 1

Produção de conteúdo para cartilha sobre a importância do Pagamento por Serviços Ambientais (PSA).

Produção de matéria sobre a reparação ambiental - PG25 - no território para a edição de janeiro do Jornal Mural de Rio Doce.

Suporte ao PG026 Recuperação de Áreas de Preservação Permanente APP

Publicação de matéria na 6ª edição do boletim Voz do Rio Doce sobre o projeto Rede de Sementes e Mudas.

Publicação de matéria na 7ª edição do boletim Vozes do Território sobre o projeto Rede de Sementes e Mudas.

Suporte ao PG027 Recuperação de Nascentes

Publicação de matéria na 7ª edição do boletim Vozes do Território sobre o convênio entre Fundação Renova e CBH-Doce para ações de recuperação de nascentes.

Suporte ao PG035 Informação para a População

Produção de programa de rádio (Momento da Reparação) sobre o Portal de Transparência da Fundação Renova.

Publicação de matéria na 6ª edição do boletim Voz do Rio Doce sobre o Portal da Transparência.

Publicação de matéria na 7ª edição do boletim Vozes do Território sobre o Portal da Transparência.

Progressos do Mês

Suporte aos Programas

Fatos Relevantes

Suporte ao PG038 Monitoramento da Bacia do Rio Doce

Matéria para o boletim do Baixo Rio Doce, Repara Cidadão, do mês de janeiro sobre como acompanhar a qualidade da água do rio Doce no Portal do Monitoramento.

Produção de matéria para a edição de Janeiro do Voz da Foz sobre a segunda edição da Expedição Rio Doce.

Produção de matéria para o programa de rádio Momento da Reparação sobre o portal do monitoramento e como acompanhar os dados de qualidade da água do rio Doce

Produção de matéria para o Programa de Rádio, Momento da Reparação, sobre as novidades e facilidades do Portal Monitoramento Rio Doce.

Produção de matéria sobre o Portal do Monitoramento para a edição de janeiro do Jornal Mural de Barra Longa.

Produção de matéria sobre o Portal do Monitoramento para a edição de janeiro do Jornal Mural de Rio Doce.

Produção de matéria sobre qualidade da água disponível no portal do monitoramento para a edição de janeiro do Jornal Mural de Aimorés

Produção de matéria sobre qualidade da água disponível no portal do monitoramento para a edição de janeiro do Jornal Mural de Baixo Guandu

Produção de matéria sobre qualidade da água disponível no portal do monitoramento para a edição de janeiro do Jornal Mural de Colatina

Produção de matéria sobre qualidade da água disponível no portal do monitoramento para a edição de janeiro do Jornal Mural de Resplendor

Produção de programa de rádio (Momento da Reparação) sobre as funcionalidades do Portal do Monitoramento.

Produção de programa de rádio (Momento da Reparação) sobre monitoramento da água e o projeto de Monitoramento Hídrico Participativo realizado em Cava Grande (Marliéria)

Publicação de matéria na 6ª edição do boletim Voz do Rio Doce sobre a reformulação do Portal do Monitoramento da Água.

Publicação de matéria na 7ª edição do boletim Vozes do Território sobre a reformulação do Portal do Monitoramento da Água.

Progressos do Mês

Suporte aos Programas

Fatos Relevantes

Suporte ao PG002 Ressarcimento e Indenização dos Impactados

Produção de matéria para programa de rádio com esclarecimentos sobre inconsistências de contas bancárias para recebimento do retroativo dos honorários advocatícios e nota sobre o fim do recesso forense.

Produção de matéria sobre as diferenças entre o Portal do Usuário e o Portal do Advogado para a edição de janeiro do Jornal Mural de Barra Longa.

Produção de matéria sobre Lucro Cessante para a edição de janeiro do Jornal Mural de Barra Longa.

Produção de matéria sobre Lucro Cessante para a edição de janeiro do Jornal Mural de Rio Doce.

Produção de matéria sobre o lucro cessante para a edição de janeiro do Jornal Mural de Aimorés

Produção de pílula de WhatsApp com esclarecimentos sobre a lista do Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA) para pescadores profissionais.

Produção de programa de rádio (Momento da Reparação) com informações sobre o início dos pagamentos dos honorários advocatícios aos atingidos que assinaram acordo no Novel.

Produção de programa de rádio (Momento da Reparação) sobre os honorários dos advogados (Sistema Indenizatório Simplificado).

Produção de programa de rádio sobre o pagamento de honorários advocatícios no Sistema Indenizatório Simplificado.

Produção de programa de rádio sobre o pagamento de lucros cessantes referentes ao ano de 2022.

Progressos do Mês

Suporte aos Programas

Fatos Relevantes

Suporte ao PG002 Ressarcimento e Indenização dos Impactados

Matéria para o boletim do Baixo Rio Doce, Repara Cidadão, do mês de janeiro sobre o pagamento do Lucro Cessante de 2022 em 2023.

Matéria para o boletim do Baixo Rio Doce, Repara Cidadão, do mês de janeiro sobre o pagamento dos honorários advocatícios.

Produção de matéria sobre dados bancários para a edição de janeiro do Jornal Mural de Aimorés

Produção de matéria sobre dados bancários para a edição de janeiro do Jornal Mural de Baixo Guandu

Produção de matéria sobre dados bancários para a edição de janeiro do Jornal Mural de Colatina

Produção de matéria sobre dados bancários para a edição de janeiro do Jornal Mural de Resplendor

Produção de matéria sobre o lucro cessante para a edição de janeiro do Jornal Mural de Baixo Guandu

Produção de matéria sobre o lucro cessante para a edição de janeiro do Jornal Mural de Colatina

Produção de matéria sobre o lucro cessante para a edição de janeiro do Jornal Mural de Resplendor

Produção de matéria, para a atualização do mural, sobre a declaração de imposto de renda 2023 para quem recebeu indenização.

Produção de pílula de WhatsApp com esclarecimentos sobre inconsistências de contas bancárias para recebimento do retroativo dos honorários advocatícios.

Produção de pílula de WhatsApp com informações sobre o pagamento dos lucros cessantes referentes ao ano de 2022.

Produção de pílula de WhatsApp com orientações sobre o envio do Informe de Rendimentos para a Declaração do Imposto de Renda (DIRF) 2023.

Produção de pílula de WhatsApp sobre o fim do prazo de adesão ao Sistema Indenizatório Simplificado para os municípios de Baixo Guandu e Naque.

Produção de programa de rádio (Momento da Reparação) sobre o Lucro Cessante.

Produção de programa de rádio (Momento da Reparação) sobre o Portal do Advogado.

Progressos do Mês

Suporte aos Programas

Fatos Relevantes

Suporte ao PG032 Melhoria dos Sistemas de Abastecimento de Água

Matéria para o boletim do Baixo Rio Doce, Repara Cidadão, do mês de janeiro sobre a obra de abastecimento de água no distrito de Boninsegna, distrito de Marilândia.

Indicadores




Gráfico 28: I01 - Pilar comunicação - Nível de acesso da população a informações sobre os programas atuantes no território - Frequência Anual




Gráfico 29: I02 - Pilar comunicação - Grau de compreensão dos atingidos sobre os programas executados pela Fundação Renova no território - Frequência Anual

Indicadores




Gráfico 30: I03 - Pilar comunicação - Conhecimento das ações de comunicação com o território - Frequência Anual

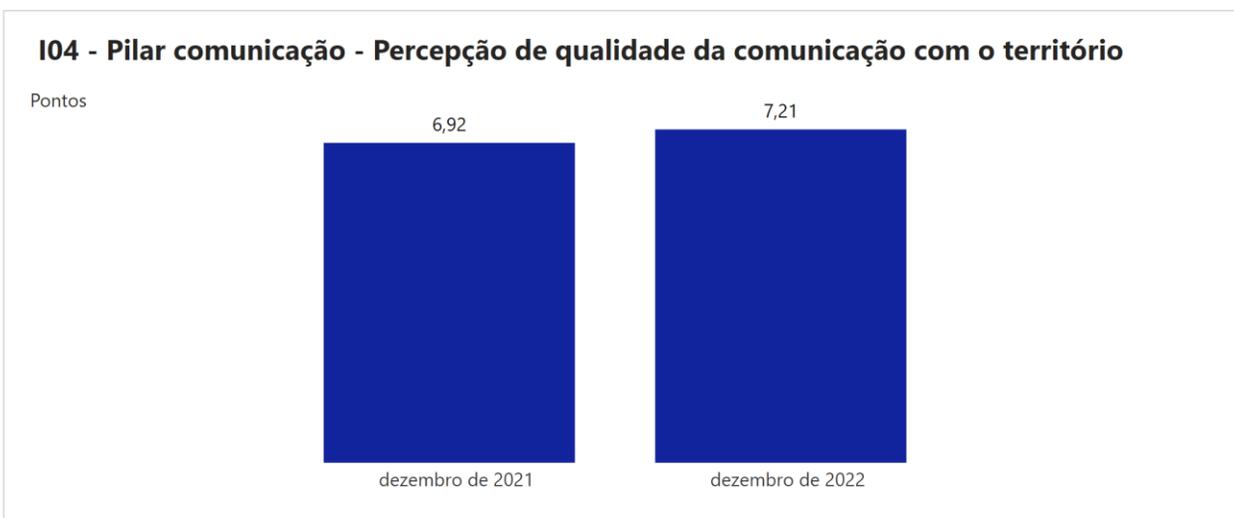


Gráfico 31: I04 - Pilar comunicação - Percepção de qualidade da comunicação com o território - Frequência Anual

PG007 Programa de Assistência aos Animais

Eixo Terra e Água

Objetivo

Assistência aos animais domésticos extraviados e desalojados pelo evento de rompimento da barragem de Fundão, na região de Mariana e Barra Longa, na forma prevista nas cláusulas 73 à 75 do TTAC.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	73	Caput	Em andamento
Cláusula	74	a	Encerrada
Cláusula	74	b	Encerrada
Cláusula	74	c	Em andamento
Cláusula	74	d	Em andamento
Cláusula	74	e	Encerrada
Cláusula	74	f	Em andamento
Cláusula	74	g	Em andamento
Deliberação	226	2	Em andamento
Deliberação	328	1	Em andamento
Deliberação	328	2	Concluída Internamente
Deliberação	328	3	Em andamento
Deliberação	563	4	Planejada

Entregas do ano de 2023

Excepcionalmente este mês não iremos reportar a timeline referente ao programa, pois estamos em fase de atualização de datas. No próximo ciclo os dados serão reportados.

Progressos do Mês

Grandes Números

1319 registros de prontuários de atendimentos interno, sendo 162 adoções, 458 restituições, 199 óbitos, 13 extravios, 30 registros de dados insuficientes de destinação e 457 animais sob a guarda temporária da Fundação Renova; Atualmente existem 350 bovinos, 62 equinos, 23 caninos, 18 suínos, 4 muares sob a guarda temporária da Fundação Renova nos Centros de Acolhimento Temporário de Animais 1 e 2; No âmbito de atendimentos externos do programa, foram registrados 1844 prontuários médicos para animais atendidos nas propriedades de origem ou em situação de moradia temporária.

Indicadores

I01 - Porcentagem de conformidade em bem-estar animal nos Centros de Acolhimento Temporário de Animais (CATA 1 e 2)

Meta Global: 80%
Percentual(%)



Gráfico 1:I01 - Porcentagem de conformidade em bem-estar animal nos Centros de Acolhimento Temporário de Animais (CATA 1 e 2) - Frequência Trimestral

Os resultados apontados nos gráficos 1 e 2 são referentes à aferição do indicador de conformidade em bem-estar animal no período da estação de primavera (novembro de 2022).

O reporte de resultados deste indicador para a estação de verão 2022-2023 está previsto para o relatório de março de 2023 (ref. fevereiro/23).

Indicadores de Acompanhamento

O resultado por espécie para o indicador Porcentagem de conformidade em bem-estar animal nos CATA 1 e 2 está apresentado a seguir:

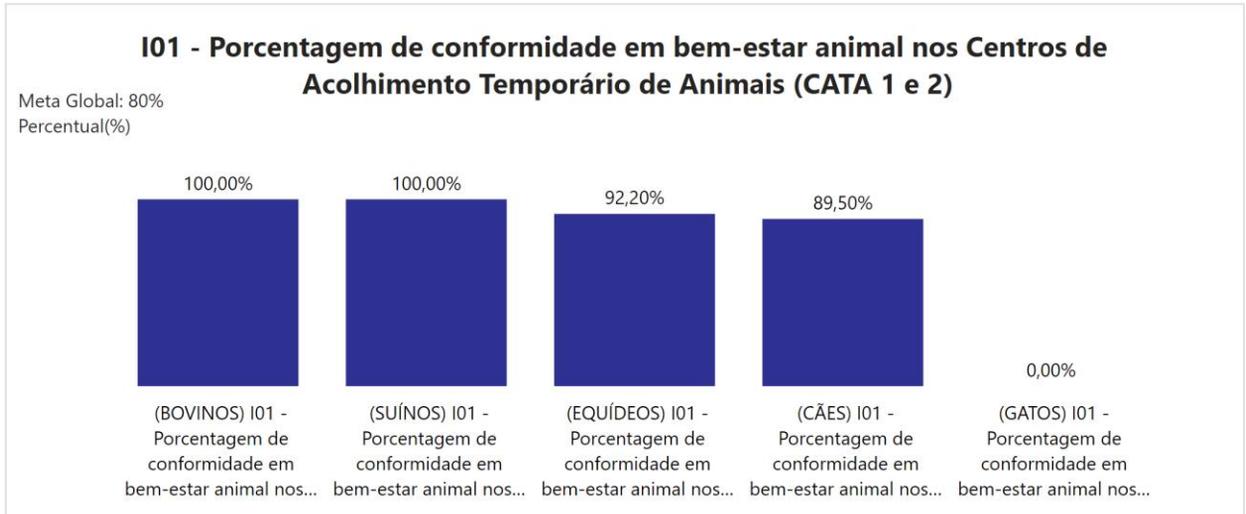


Gráfico 2: I01 - Porcentagem de conformidade em bem-estar animal nos Centros de Acolhimento Temporário de Animais (CATA 1 e 2) - Frequência Trimestral

Os desvios apresentados em relação à meta não são significativos do ponto de vista de atendimento aos quesitos mínimos de bem-estar animal. A metodologia utilizada prevê um padrão no escalonamento dos diferentes graus, de modo que ações possam ser tomadas prioritariamente em formato preventivo.

GRAU DE BEM-ESTAR	REFERÊNCIA EM %
Muito Alto	≥ 90%
Alto	≥ 80%
Regular	≥ 60%
Baixo	≥ 30%
Muito Baixo	≤ 29%

Quadro 1: Percentuais de referência para os 5 graus de bem-estar

Indicadores

I02 - Porcentagem de animais em processos adotivos finalizados

Meta Global: 100%
Percentual(%)



Gráfico 3: I02 - Porcentagem de animais em processos adotivos finalizados - Frequência Bimestral

No bimestre de novembro e dezembro de 2022 houve uma ocorrência de finalização de adoção, alterando o valor identificado no mês anterior para 98,7%. A próxima verificação deste está prevista para o mês de março de 2023 (referência ao bimestre jan./fev. de 2023).

Indicadores

I03 - Porcentagem de animais sob guarda temporária restituídos na fase de reassentamento

Meta Global: 100%

Percentual(%)



Gráfico 4: I03 - Porcentagem de animais sob guarda temporária restituídos na fase de reassentamento- Frequência Bimestral

No bimestre de novembro e dezembro de 2022, não houve ocorrências de novas restituições definitivas de animais. A próxima verificação deste está prevista para o mês de março de 2023 (referência ao bimestre jan./fev. de 2023). A variação entre os dois últimos bimestres se deu em função de novos registros de animais sob guarda da Fundação Renova provenientes de nascimentos e/ou recolhimentos, conforme previsto no indicador.

Indicadores

I04 - Porcentagem de finalização dos acompanhamentos pós-ocupação

Meta Global: 100%
Percentual(%)




Gráfico 5: I04 - Porcentagem de finalização dos acompanhamentos pós-ocupação - Frequência Bimestral

No bimestre de novembro e dezembro de 2022, não houve ocorrências de novas restituições definitivas de animais. A próxima verificação deste está prevista para o mês de março de 2023 (referência ao bimestre jan./fev. de 2023).

PG008 Reconstrução de Vilas

Eixo Reconstrução e Infraestrutura

Objetivo

Reconstrução, recuperação e realocação das famílias que sofreram deslocamento físicos e/ou econômicos das localidades de Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo, Gesteira e famílias impactadas residentes na área rural às margens do Rio Gualaxo do Norte com projetos específicos por localidade. Após a conclusão da reconstrução e do reassentamento será realizado o monitoramento dos reassentamentos com abrangência dos programas sociais nas localidades por até 36 meses.

Projeto Reconstrução de Vilas

Status Cláusulas e Deliberações

Cláusula	76	Caput	Judicializada
Deliberação	257	1	Concluída Internamente
Deliberação	96	2	Concluída Internamente
Deliberação	96	4	Concluída Internamente

Projeto Reconstrução de Bento Rodrigues

Entregas acumuladas até o ano de 2023

“Excepcionalmente esse mês não será reportada a timeline referente ao programa, pois as datas estão em atualização. No próximo ciclo os dados serão reportados.”

 Concluído  Planejado  Reprogramado

Progressos do Mês de Bento Rodrigues

Grandes Números

Obras:

- 32 construções de edificações (casa, comércio e misto) com obras iniciadas (nota: 2 ID's cujas edificações tiveram suas obras iniciadas em períodos anteriores, encontram se paralisados);
- 122 edificações (casa, comércio e misto) concluídas (com TERP);
- 3 construções de bens coletivos com obras iniciadas;
- 7 construções de bens coletivos concluídas (com TERP);
- 4 estruturações de lotes vagos com obras iniciadas;
- 15 estruturações de lotes vagos com obras concluídas (com TERP);
- 46 habite se obtidos para edificações (casas, comércios e mistos).

Progressos do Mês de Bento Rodrigues

Grandes Números

Pecúnia:

- 17 termos de aceite - Pecúnia – assinados.

Social:

- 195 famílias atendidas (com novos núcleos);
- 193 atendimentos com termos de opção ao reassentamento assinados (TOR);
- 16 atendimentos para bens de uso coletivo;
- 188 atendimentos para casas;
- 28 atendimentos para lotes vagos;
- 2 bens coletivos interrompidos;
- 19 construções edificações (casa, comércio e misto) interrompidas;
- 4 estruturações de lotes vagos interrompidas.

Progressos do Mês de Bento Rodrigues

Fatos Relevantes

- Finalização de obra do ID 133.
- Finalização de obra do ID 182.
- Finalização de obra do ID 213.
- Finalização de obra do ID 24.
- Finalização de obra do ID 25.
- Finalização de obra do ID 56.
- Finalização de obra do ID 84.
- Finalização do serviço de estruturação de lote - ID 94.
- Finalização do serviço de estruturação do lote - ID 172.

Projeto Reconstrução de Paracatu de Baixo

Entregas acumuladas até o ano de 2023

“Excepcionalmente esse mês não será reportada a timeline referente ao programa, pois as datas estão em atualização. No próximo ciclo os dados serão reportados.”

 Concluído  Planejado  Reprogramado

Progressos do Mês de Paracatu de Baixo

Grandes Números

Obras:

- 20 construções de edificações (casa, sítio, comércio e misto) com obras iniciadas;
- 41 edificações (casa, sítio, comércio e misto) concluídas (com TERP);
- 11 construções de bens coletivos com obras iniciadas;
- 0 construções de bens coletivos concluídas (com TERP);
- 0 estruturações de lotes vagos com obras iniciadas;
- 2 estruturações de lotes vagos com obras concluídas (com TERP);
- 13 habite se para edificações (casas, sítios, comércios e mistos) obtidos.

Pecúnia:

- 5 termos de aceite - Pecúnia – assinados.

Social:

- 76 famílias atendidas (com novos núcleos);
- 68 atendimentos com termos de opção ao reassentamento assinados (TOR);
- 13 atendimentos para bens de uso coletivo;
- 68 atendimentos para casas;
- 7 atendimentos para lotes vagos;
- 0 bens coletivos interrompidos;
- 10 construções edificações (casa, sítio, comércio e misto) interrompidas;
- 3 estruturações de lotes vagos interrompidas.

Progressos do Mês de Paracatu de Baixo

Fatos Relevantes

Finalização de obra do ID 84.

Finalização de obra do ID 80.

Finalização de obra do ID 50.

Finalização de obra do ID 39.

Finalização de obra do ID 65.

Finalização de obra do ID 89.

Projeto Reconstrução de Gesteira

Entregas acumuladas até o ano de 2022

Devido a Judicialização do Reassentamento de Gesteira, não há entregas previstas

Progressos do Mês de Gesteira

Grandes Números

Social:

- 37 famílias atendidas;
- 31 famílias com acordos homologados;
- 24 edificações adquiridas;
- 6 pagamentos de acordos (sem aquisição de imóvel).

Projeto Reassentamento Familiar e Reconstruções

Entregas acumuladas até o ano de 2023

“Excepcionalmente esse mês não será reportada a timeline referente ao programa, pois as datas estão em atualização. No próximo ciclo os dados serão reportados.”

 Concluído  Planejado  Reprogramado

Progressos do Mês de Familiar e Reconstruções

Grandes Números

Moradia Temporária:

- 266 atendimentos temporários disponibilizados (compensação financeira, aluguel e hotel).

Obras:

- 0 reconstruções de edificações com obras iniciadas;
- 0 reconstruções de edificações com obras interrompidas;
- 15 reconstruções de edificações com obras concluídas;
- 16 edificações da modalidade de reconstrução;
- 17 edificações (casa nova e reforma) com obras iniciadas;
- 35 edificações (casa nova e reforma) com obras concluídas (com TERP, TRR e autogestão);
- 0 estruturações de lotes vagos com obras iniciadas;
- 8 estruturações de lotes vagos com obras concluídas (com TERP, TRR e autogestão);
- 16 habite se para edificações (casa nova, reforma, comércios e mistos) obtidos.

Pecúnia:

- 167 termos de aceite - Pecúnia – assinados.

Progressos do Mês de Familiar e Reconstruções

Grandes Números

Social:

- 105 famílias atendidas (com novos núcleos);
- 6 construções edificações (casa nova e reforma) interrompidas;
- 2 estruturações de lotes vagos interrompidos;
- 13 famílias atendidas na modalidade reconstrução;
- 93 imóveis adquiridos.

PG009 Recuperação do Reservatório da UHE Risoleta Neves

Eixo Terra e Água


Objetivo

Restabelecimento das condições de operação da Usina Hidrelétrica Risoleta Neves por meio da implantação de ações de desassoreamento na área de alagamento da hidrelétrica e de reparo de infraestrutura.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	79	Caput	Judicializado
Cláusula	150	§3º	Judicializado
Deliberação	30	N/A	Concluído internamente
Deliberação	80	2.1	Judicializado
Deliberação	80	2.2	Concluído internamente
Deliberação	80	4.1	Concluído internamente
Deliberação	80	4.2	Concluído internamente
Deliberação	225	2	Judicializado
Deliberação	286	3	Concluído internamente

Entregas do Ano de 2023

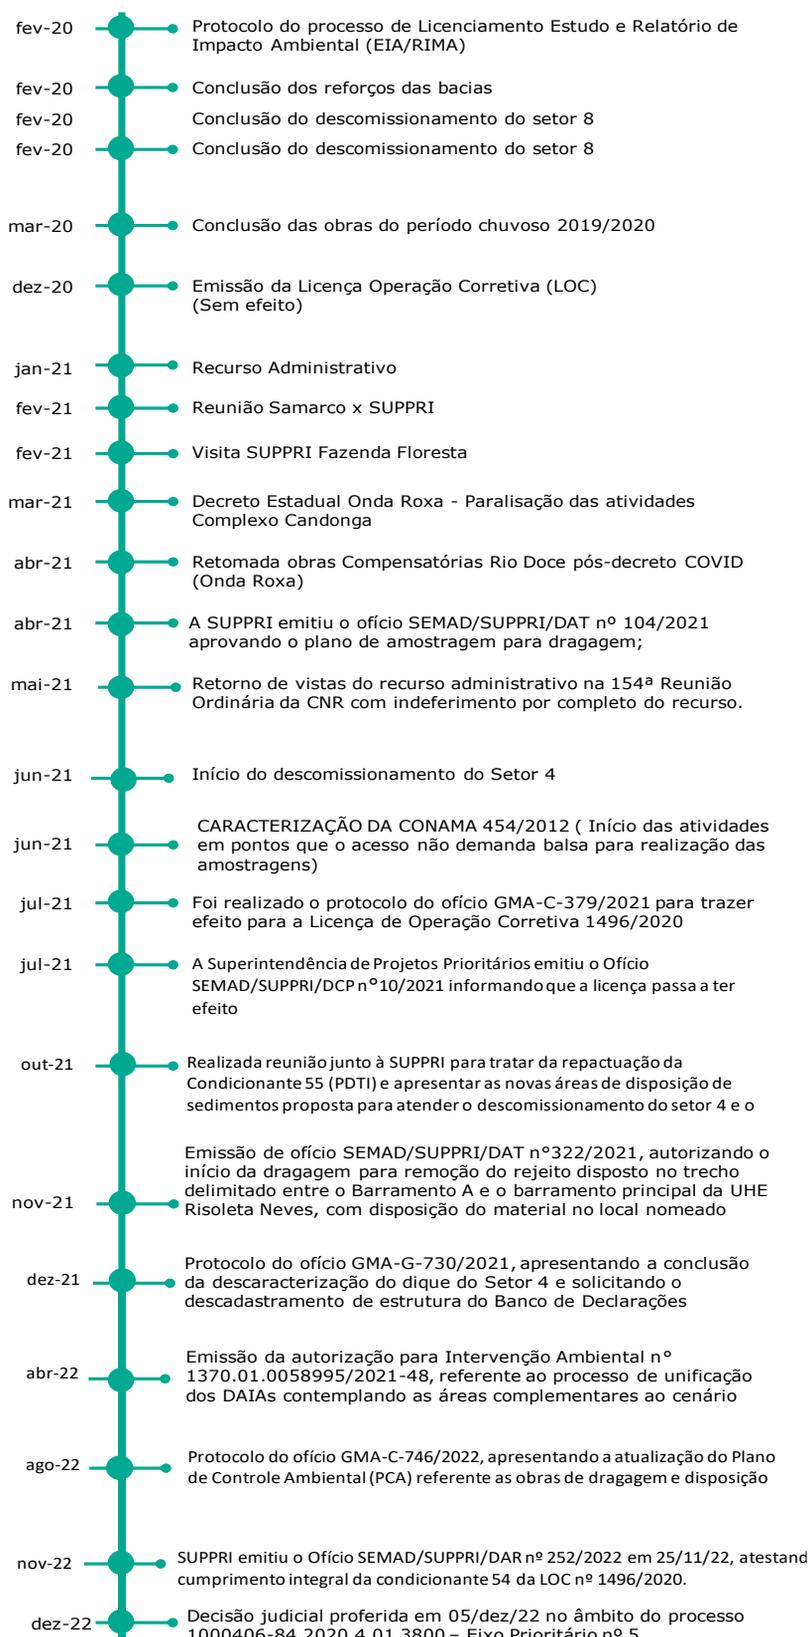

Progressos do Mês

Grandes números

- **1ª fase** – período emergencial 959 mil m³ de material foram bombeados do reservatório da Usina Risoleta Neves para as áreas de disposição.
- **2ª fase** – Em cumprimento da LOC 1496/2020, após analisados resultados da cond. 38 (caracterização dos sedimentos conforme CONAMA 454/2012), foi autorizada pela SUPPRI a retomada na remoção dos sedimentos nas proximidades do barramento principal, considerando as informações conhecidas e descritas no EIA/RIMA, visando num primeiro momento a retomada da UHE Risoleta Neves.

Até a data de 25/12/2022:

- O volume de sedimentos removidos do reservatório foi de **505.837 m³**.
- Na obra de reforço do barramento principal da UHE Risoleta Neves, foram executados **19.600 m³** de concreto distribuídos entre os blocos BME1, BME2, BME3, BME4, BME5, BME6, BMD1, BMD3, BMD4, BMD5, BMD6 e BML.

Progressos do Mês

Fatos Relevantes

Disposição de Sedimentos Provenientes do Reservatório da UHE (área dos 400m)

- Áreas de Desaguamento Primário e Definitivo



Figura 1 – Remoção de sedimentos da estrutura ADP1 para Bacia 2



Figura 2 - Disposição de sedimentos Bacia 2

Plano de Chuvas 2022/2023



Figura 3 - Implantação canal CP – Bacia 4



Figura 4 –Limpeza de Sumps e Leiras Drenante



Figura 5 – Bioengenharia (hidro + biomanta) – DP1



Figura 6 - Proteção com lona - ADME A



Figura 7 – Concretagem canal à jusante do contrapilamento OE



Figura 8 - Melhoria dos acessos- Acesso Principal

Reservatório UHE – Retirada de material vegetal



Figura 9 – Reservatório UHERN



Figura 10 - Disposição no Setor 11 de material vegetal

UHE Candonga

•Atividades de Reabilitação das UGs:

ATIVIDADES	Avanço Físico
UHE CANDONGA	91,34%
Contrato Base	88,68%
Mobilização	
Canteiro	100,00%
Engenharia e Suprimentos	100,00%
Materiais de Fornecimento	100,00%
Limpeza do Tubo Sucção - UG01 a UG03	100,00%
BOP - Tubulação sistema do filtro autolimpante	100,00%
TA - Comporta vagão da tomada D'água - UG 01	100,00%
TA - Comporta vagão da tomada D'água - UG 02	100,00%
TA - Comporta vagão da tomada D'água - UG 03	87,00%
Grades e Comporta Ensecadeira da Tomada D'água - UG 01	0,00%
Grades e Comporta Ensecadeira da Tomada D'água - UG 02	0,00%
Grades e Comporta Ensecadeira da Tomada D'água - UG 03	0,00%
UG1- Atividades na Casa de Força	100,00%
UG2- Atividades na Casa de Força	100,00%
UG3- Atividades na Casa de Força	99,00%
UG1 - Retirada das Pêndencias	100,00%
UG2 - Retirada das Pêndencias.	100,00%
Vertedouro	91,00%
Comissionamento sem água	68,00%
Comissionamento com água	40,00%
Comportas ensecadeiras montante - Tomada D'água	0,00%
Comportas ensecadeiras jusante - Tubo de Sucção	0,00%
OS Adicional	100,00%

Figura 11 – Atividades de Reabilitação das Ugs

•Atividades de Limpeza das UGs

Status atual:

As atividades de limpeza da tomada d'água e da saída d'água foram concluídas.

Em relação ao canal de fuga, as atividades foram interrompidas em virtude do volume de chuvas. Ao término do período chuvoso 2022/23 será realizada nova batimetria para avaliar a necessidade de prosseguir com a atividade.

Atividade Jusante	Avanço
Mergulho para Limpeza das ranhuras (Jusante)	100,0%
Dragagem do acesso aos tuneis saída d'água (Jusante)	100,0%
Mergulho para Limpeza dos tuneis saída d'água (Jusante)	100,0%
Dragagem do canal de fuga (Jusante)	55,1%
Geral	88,0%
Atividade Montante	Avanço
Mergulho para limpeza da tomada d'água (Montante)	100,0%
Retirada das grades da tomada d'água (Montante)	100,0%
Geral	100,0%

Figura 12 – Limpeza das Unidades de Geração

Na presente data, estamos trabalhando no comissionamento a seco e com carga d'água das unidades geradoras, conforme abaixo demonstrando nas tabelas de avanço.

Comissionamento sem água	UG1	UG2	UG3
Unidade de Geração Geral	92%	100%	0%
Pré-requisitos	100%	100%	0%
Comissionamento a Seco	92%	100%	0%
Sistemas Auxiliares da Turbina	100%	100%	0%
Sistema de Resfriamento	100%	100%	0%
Gerador	100%	100%	0%
Regulador de Velocidade	63%	100%	0%
Distribuidor e Rotor	0%	100%	0%
Regulador de Tensão	100%	100%	0%
Proteção	100%	100%	0%
SDSC - Controle	95%	100%	0%
Comporta Tomada d'água	0%	100%	0%
Comissionamento com água	UG1	UG2	UG3
Unidade de Geração Geral	0%	69%	0%
Ensaio de Trip	0%	100%	0%
Ensaio prévio aos Dinâmicos	0%	100%	0%
Ensaio Sistema de Resfriamento com	0%	100%	0%
Giro Mecânico	0%	18%	0%
Sincronismo	0%	0%	0%
Rejeição de Carga	0%	0%	0%
Ensaio em Carga	0%	0%	0%
Gateway ONS		95%	

Figura 13 – Status comissionamento das Unidades de Geração em 30/01/2023

➤ MONITORAMENTO DAS ESTRUTURAS

Nota: As informações apresentadas não coincidem necessariamente com o mês de referência do reporte em função dos prazos necessários ao tratamento dos dados.

✓ **Destques:**

- Conforme sinalizado, o reenchimento do lago foi realizado entre os dias 10 e 22 de dezembro de 2022. Após essa data, os três barramentos encontram-se totalmente submersos. Nesse cenário, as pressões hidráulicas estão equilibradas entre montante e jusante, o que torna a condição de carregamento dos barramentos mais favorável.
- Os sensores SAT dos barramentos metálicos foram descomissionados no dia 13 de dezembro de 2022. O monitoramento será mantido através de batimetrias periódicas.
- Está em andamento uma nova calibração dos levantamentos geofísicos e/ou topográficos para monitoramento dos barramentos considerando o cenário de lago cheio.
- Foi identificada elevação dos níveis d'água monitorados em dois instrumentos na área da antiga Pilha 2, em decorrência das chuvas. Importante observar que nas proximidades desses instrumentos há nascentes cadastradas, por isso é esperado um lençol mais elevado na região.
- O monitoramento dos deslocamentos na Fazenda Floresta não apresentou pontos de destaque. O marco da ADME A permanece com comportamento distinto dos demais instrumentos instalados na mesma seção transversal.
- Não foram observadas novas anomalias que pudessem caracterizar processos de instabilidade nas estruturas do complexo Candonga no período.

➤ **MONITORAMENTO AMBIENTAL**

Nota: Informações de monitoramento e fotos apresentadas referem-se ao período da campanha, o qual não adere completamente ao mês de referência do reporte em função dos prazos necessários ao tratamento dos dados. As imagens visam representar os locais quando da realização das amostragens.

✓ **Monitoramento de Efluentes – Bacia 2**

- Ponto seco, haja vista que não havia efluente chegando à bacia 2.

✓ **Monitoramento de Efluentes – Bacia 1**

- Entrada: Ponto seco, haja vista que não havia efluente chegando à bacia 1.
- Saída: Ponto seco, haja vista que não houve bombeamento para o rio Doce no período.

✓ **Monitoramento Hídrico Superficial (Qualidade da água superficial)**

Conforme relatado no relatório anterior:

Conclusões / considerações:

- O ponto de monitoramento Córrego Micaela Montante, proposto nos planos de monitoramento dos estudos de licenciamento localiza-se dentro da Área Diretamente Afetada (ADA). Por conceito esse ponto poderá sofrer impactos provenientes do empreendimento e a qualidade deve ser garantida à jusante da ADA (que se finda no Dique Micaela).
- Especificamente no que tange aos parâmetros Ferro, Manganês e Alumínio, Candonga está localizada a menos de 5 km do cinturão do grupo Dom Silvério, composto por rochas ultramáficas, o que reforça fortemente o indicativo de que os índices encontrados no monitoramento refletem o background da região.
- Os estudos de valores de referência concluirão sobre essas hipóteses.

- Síntese conclusiva – Córrego Micaela:
 - Desvios de Manganês nos pontos de montante e jusante. O manganês se configura como background da região e a turbidez foi devido ao alto índice pluviométrico do período.

- Síntese conclusiva – Córrego dos Borges
 - Desvios de Alumínio dissolvido e cor verdadeira nos pontos de montante e jusante, ferro dissolvido no ponto de jusante e nitrato no ponto de montante. Não há atividades da Samarco na região e, portanto, os desvios não guardam nexos causal com o empreendimento.

- Síntese conclusiva – Rio de Peixe:
 - Desvios de Alumínio dissolvido no ponto de montante, cor verdadeira, fósforo, manganês, sólidos suspensos totais e turbidez nos pontos de montante e jusante. Não há drenagens do empreendimento direcionadas para o rio de Peixe e portanto os desvios não guardam nexos causal com o empreendimento.

- Síntese conclusiva – Ponto de Monitoramento Fazenda Jerônimo
 - Desvio de cor verdadeira, fósforo, manganês, sólidos suspensos totais e turbidez. Este monitoramento é feito em área brejosa estagnada de terceiros. Foi proposto na atualização do PCA a retirada deste da relação de pontos de monitoramento devido à interferência de áreas de terceiros entre a disposição passada e a área brejosa supracitada.

- ✓ **Monitoramento Atmosférico**
 - Sem registros. Caso venham a ocorrer eventos que ultrapassem o limite permitido, será realizada análise de causa do incidente. Nestes casos, a Samarco irá comunicar a investigação do incidente via ofício à SUPRAM à FEAM/GESAR e também acusará o evento no relatório CIF.

Monitoramento Subterrâneo



Figura 14 - Localização Nascente 2



Figura 15 - Nascente 2

Conclusões / considerações finais

A Nascente 2 apresentou desvios Ferro, Manganês e Níquel no período no monitoramento.

Nota: Os estudos em desenvolvimento avaliarão os valores de referência para se confirmar ou refutar a hipótese de background.

Monitoramento futuro: Instalação dos Poços de Monitoramento

- Foram perfurados os 4 poços de monitoramento na Fazenda Fervedouro. (FER-PM-PROP-01, FER-PM-PROP-02, FER-PM-PROP-03 e FER-PM-PROP-04). As atividades de desenvolvimento desses poços estão programadas para Fev/2023.
- Foram perfurados e instalados dois poços na Fazenda Floresta (FLOR-PM-PROP-05 e FLOR-PM-PROP-04). As atividades de desenvolvimento desses poços estão programadas para Mar/2023.
- As atividades estão paralisadas em revisão das metodologias utilizadas em campo.

Monitoramento de Ruídos e Vibração

- Não foram identificados registros de ocorrências de desvios dos níveis de ruído e vibração nas comunidades monitoradas (rurais: Viana, Gerônimo, Florestinha, Pedra do Escalvado, Marimbondo, Funil, Buraco, área rural de Rio Doce e área rural de Santa Cruz do Escalvado). Predominantemente residenciais: Santana do Deserto, Tapera, Sede Rio Doce, Pontal, Novo Soberbo e Porto Plácido).

Indicadores

Os indicadores do PG009 que foram implementados e estão em medição, encontram-se apresentados nos gráficos a seguir:

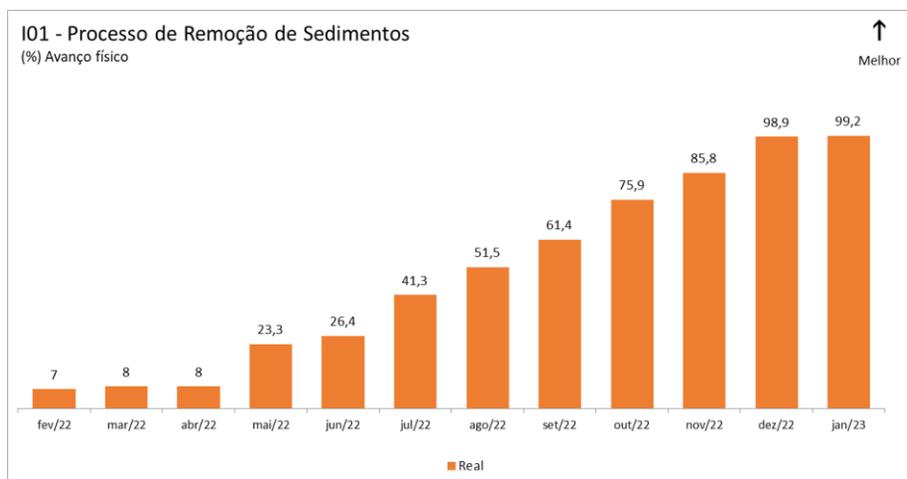


Gráfico 1 - Avanço físico do processo de remoção de sedimentos. Gráfico Acumulado.

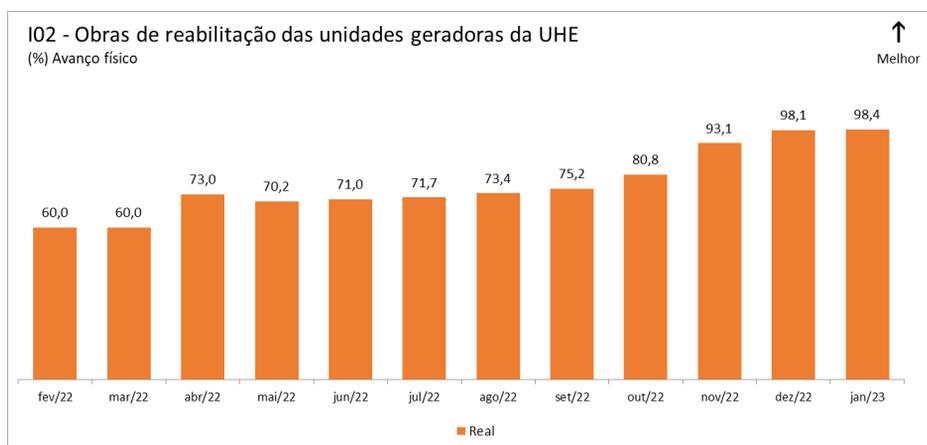


Gráfico 2 - Obras de reabilitação das unidades geradoras da UHE. Gráfico Acumulado.

Indicadores



Gráfico 3 - Avanço físico as obras de recuperação das margens. Gráfico Acumulado.

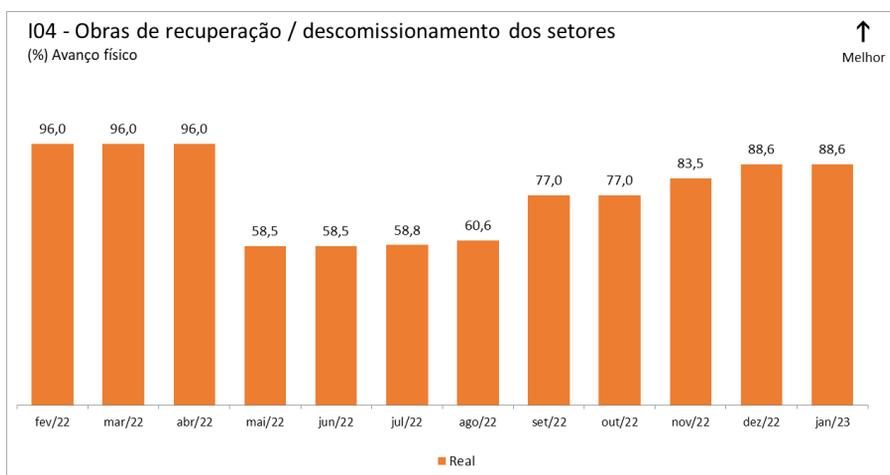


Gráfico 4 - Avanço físico obras de descaracterização/descomissionamento dos setores

Nota: A partir do mês de maio/22, os indicadores apresentados são compatíveis com o Cronograma-Cenário de Retomada da UHE, no qual estão contempladas todas as atividades necessárias para que sejam atingidas as condições operacionais da UHE, tendo em vista que a LOC 1496/2020 autorizou prioritariamente todas as atividades previstas para retomada da usina.

Errata: No relatório mensal de janeiro de 2023 (período de 21/11/2022 a 25/12/2022), por engano foram reportados indicadores dos pacotes de obras relacionados ao objetivo de **reenchimento do reservatório da UHE**, concluídos em sua totalidade. Contudo, considerando que os indicadores rotineiramente apresentados abordam o escopo mais amplo, de restabelecimento das condições de operação da Usina Hidrelétrica Risoleta Neves por meio da implantação de ações de desassoreamento na área de alagamento da usina e de reparo de sua infraestrutura, retificamos o dado e informamos que deve-se tomar como corretos os indicadores **I01**, **I02** e **I04** apresentados neste relatório, mantendo assim a sequência dos indicadores apresentados anteriormente a jan/23.

PG010 Recuperação das Demais Comunidades e Infraestruturas Impactadas

Eixo Reconstrução e Infraestrutura

Objetivo

Executar as atividades de recuperação e reconstrução das infraestruturas danificadas pelo evento tais como: reestabelecimentos de acessos, limpeza e retirada de resíduos nas estruturas impactadas, entulho e detritos decorrentes do evento de rompimento da barragem de Fundão, demolição de estruturas comprometidas remanescentes e consequente limpeza, reconstrução de pontes, reconstrução ou reforma de cercas, currais e paiol, drenagem, reconstrução ou reforma de igrejas e outros templos religiosos, reconstrução ou reforma de campos de futebol e espaços de prática esportiva de acesso público, reconstrução ou reforma de centros comunitários, praças e locais públicos de lazer, reconstrução ou reforma de poços artesianos e pinguelas, recuperação ou reforma das vias de acessos impactadas pelo evento, contenções de taludes e encostas para acessos, reconstrução ou reforma das unidades habitacionais impactadas, reconstrução e recuperação das estruturas de educação e saúde impactadas. Cláusulas: 82 a 88.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	82	§2º	Judicializada
Cláusula	82	§3º	Judicializada
Cláusula	82	Caput	Judicializada
Cláusula	84	a	Em andamento
Cláusula	84	b	Em andamento
Cláusula	84	c	Em andamento
Cláusula	84	d	Em andamento
Cláusula	84	e	Em andamento
Cláusula	84	f	Em andamento
Cláusula	84	g	Em andamento
Cláusula	84	h	Em andamento
Cláusula	84	i	Em andamento
Cláusula	84	j	Em andamento
Cláusula	84	k	Em andamento
Cláusula	84	l	Em andamento
Cláusula	84	m	Judicializada
Cláusula	84	n	Em andamento
Cláusula	84	o	Em andamento
Cláusula	84	p	Em andamento
Cláusula	84	q	Em andamento
Cláusula	84	r	Em andamento
Cláusula	84	s	Em andamento
Cláusula	87	Caput	Em andamento
Cláusula	88	Caput	Judicializada

Deliberação	127	1.1	Concluída Internamente
Deliberação	127	1.4	Concluída Internamente
Deliberação	127	1.5	Concluída Internamente
Deliberação	127	1.6	Concluída Internamente
Deliberação	190	1	Concluída Internamente
Deliberação	190	2	Judicializada
Deliberação	191	1	Concluída Internamente
Deliberação	207	1	Judicializada
Deliberação	207	2	Judicializada
Deliberação	217	2	Em andamento
Deliberação	217	3	Em andamento
Deliberação	217	4	Concluída Internamente
Deliberação	23	2	Em andamento
Deliberação	24	2	Em andamento

Entregas do ano de 2023

Excepcionalmente este mês não será reportada a timeline referente ao programa, pois as datas estão em atualização. No próximo ciclo os dados

Progressos do Mês

Grandes Números

Geral Infraestrutura e Reconstrução: 1810 obras concluídas (projetos e processos), sendo que, desse total:

- 1004 correspondem a manutenção/recuperação de acessos e cercamentos que totalizam: 2110,57 km de manutenções realizadas, 142,20 km de acessos recuperados e 214,20 km de cercamentos de propriedades rurais executados;
- 109 correspondem a Residências e Propriedades recuperadas;
- 16 correspondem a Casas reconstruídas;
- 28 correspondem a Comércios reformados;
- 189 correspondem a Quintais e lotes reformados.

Barra Longa:

- Residências e Propriedades recuperadas: 105
- Casas reconstruídas: 9
- Comércios reformados: 27
- Quintais e lotes reformados: 189

Mariana:

- Residências e Propriedades recuperadas: 4
- Casas reconstruídas: 7
- Comércios reformados: 1
- Quintais e lotes reformados: 0

Termos de entrega para Moradias

Moradias Barra Longa:

- Concluído com termo: 83
- Concluído sem termo: 06
- Paralisado: 03
- Pendente: 147
- Total: 239

Termos de entrega para Comércio:

Comércio Barra Longa:

- Concluído com termo: 17
- Concluído sem termo: 05
- Paralisado: 01
- Pendente: 04
- Total: 27

Progressos do Mês

Fatos Relevantes

Barra Longa:

- Montagem da estrutura metálica e concretagem do tabuleiro da ponte Santa Rita;
- Instalação da passarela e dos guarda corpo da ponte Santa Rita;
- Realização de visita técnica para contratação do escopo de construção de sistema de drenagem e bueiro, contenção em gabião e implantação de aterro de resíduos de construção civil

Mariana:

- Campo de Pedras - Escritura Lavrada;
- Campo de Pedras - Aprovação do projeto em reunião com a Comunidade e PMM;
- Bens Públicos Ponte do Gama - Finalização da conformação do talude e hidrossemeadura no acesso ao Cruzeiro;
- Bens Públicos Ponte do Gama - Finalização da estrutura metálica principal da quadra e instalação de telhas.

Indicadores

I01 – Obras entregues – Diagnóstico total

Meta Global: 100%

Percentual(%)

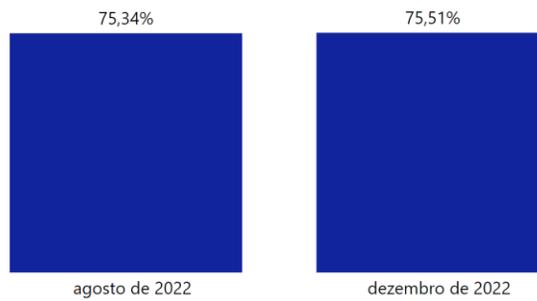


Gráfico 1: I01 – Obras entregues – Diagnóstico total - Frequência Quadrimestral

I02 – Obras entregues – Temporal

Meta Global: 100%

Percentual(%)

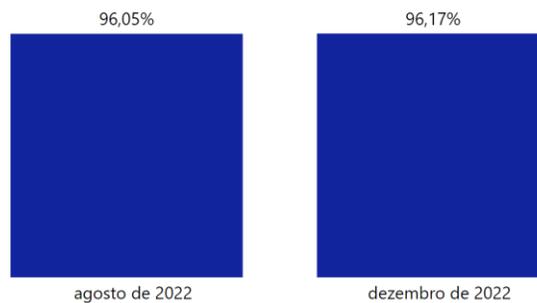


Gráfico 2: I02 – Obras entregues – Temporal - Frequência Quadrimestral

Indicadores

I03 – Termos de aceite oficiais de obras entregues – Diagnóstico total

Meta Global: 100%

Percentual(%)




Gráfico 3: I03 – Termos de aceite oficiais de obras entregues – Diagnóstico total - Frequência Quadrimestral

I04 – Termos de aceite oficiais de obras entregues – Temporal

Meta Global: 100%

Percentual(%)

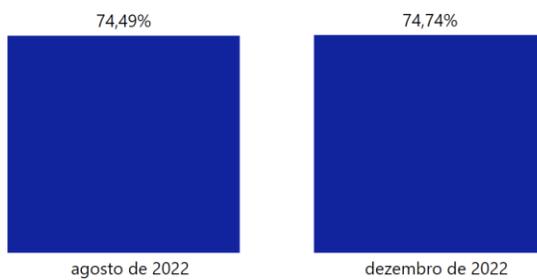


Gráfico 4: I04 – Termos de aceite oficiais de obras entregues – Temporal - Frequência Quadrimestral

PG011 Recuperação das Escolas e Reintegração da Comunidade Escolar

Eixo Pessoas e Comunidade

Objetivo

Reparar os danos causados às comunidades escolares atingidas de Fundão até Candonga, nas dimensões impactadas, por meio da reconstrução das condições materiais, estruturais, pedagógicas, institucionais, psicopedagógicas e sócio comunitárias, observadas as características anteriores ao rompimento da barragem para que o poder público possa garantir a manutenção do direito à educação, de acordo com as determinações do TTAC (cláusulas 89 a 94).

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	89	Caput	Em andamento
Cláusula	91	Caput	Em andamento
Cláusula	92	Caput	Em andamento
Cláusula	93	Caput	Em andamento
Deliberação	183	2	Concluída Internamente
Deliberação	183	3	Concluída Internamente
Deliberação	238	1	Concluída Internamente
Deliberação	390	3	Concluída Internamente
Deliberação	508	2	Em andamento
Deliberação	587	2	Concluída Internamente

Entregas do ano de 2023

Excepcionalmente este mês não iremos reportar a timeline referente ao programa, pois estamos em fase de atualização de datas. No próximo ciclo os dados serão reportados.

Progressos do Mês

Fatos Relevantes

Entre os dias 17 e 27 de janeiro, acontece o #PartiuFérias para as crianças de Mariana (Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo) e Barra Longa.

A ação oferece atividades no período de férias escolares com o objetivo de valorizar o brincar, a criatividade, a construção de novos conhecimentos e a integração criativa. Além disso, as atividades buscam fortalecer a identidade e o sentimento de pertencimento ao território, integrando as experiências do curso de férias e vivências conectadas aos valores culturais, patrimoniais e de educação ambiental.

Ao todo, mais de 80 crianças foram contempladas com a ação.

Indicadores

I01 - Atendimento às solicitações de reposição de equipamentos e materiais das escolas temporárias de Mariana e Barra Longa

Meta Global: 100%
Percentual(%)

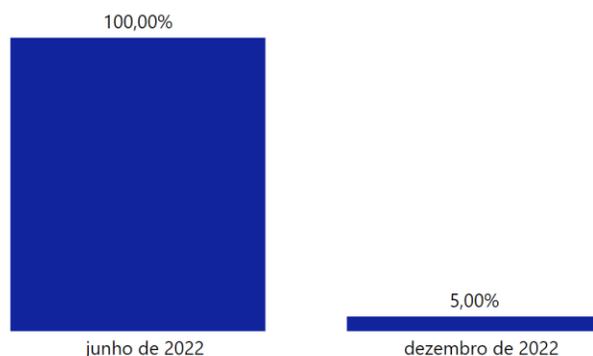


Gráfico 1: I01 - Atendimento às solicitações de reposição de equipamentos e materiais das escolas temporárias de Mariana e Barra Longa - Frequência Semestral

A medição do indicador segue o calendário escolar, os dados serão consolidados em janeiro no retorno do recesso.

I02 - Cumprimento do Plano de Manutenção e demandas de manutenção predial das escolas temporárias

Meta Global: 100%
Percentual(%)

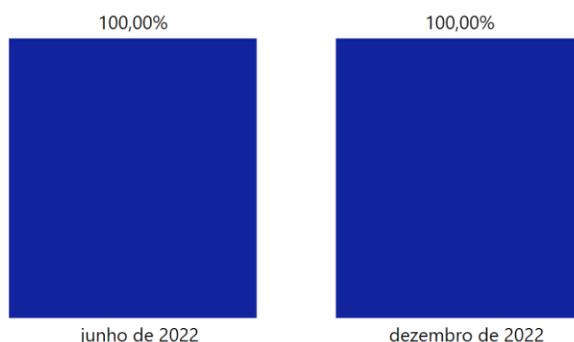


Gráfico 2: I02 - Cumprimento do Plano de Manutenção e demandas de manutenção predial das escolas temporárias - Frequência Semestral

A medição do indicador segue o calendário escolar, os dados serão consolidados em janeiro no retorno do recesso.

Indicadores

I03 - Disponibilidade de vagas para transporte de estudantes

Meta Global: 100%
Percentual(%)



Gráfico 3: I03 - Disponibilidade de vagas para transporte de estudantes - Frequência Anual

I04 - Atendimento das demandas sobre transporte escolar aderentes ao escopo

Meta Global: 100%
Percentual(%)



Gráfico 4: I04 - Atendimento das demandas sobre transporte escolar aderentes ao escopo - Frequência Anual

A medição do indicador segue o calendário escolar, os dados serão consolidados em janeiro no retorno do recesso.

Indicadores

I05 - Cumprimento das atividades de convivência das comunidades atingidas

Meta Global: 100%
Percentual(%)



Gráfico 5: I05 - Cumprimento das atividades de convivência das comunidades atingidas - Frequência Semestral

A medição do indicador segue o calendário escolar, os dados serão consolidados em janeiro no retorno do recesso.

I06 - Satisfação do público alvo com as ações realizadas

Meta Global: 75
Pontos




Gráfico 6: I06 - Satisfação do público alvo com as ações realizadas - Frequência Anual

Indicadores

I07 - Atendimento ao público alvo

Meta Global: 100%
Percentual(%)

0,00%
junho de 2022

Gráfico 7: I07 - Atendimento ao público alvo - Frequência Semestral

A CTECLET enviará nota técnica ao CIF solicitando a retirada do I07 da lista de indicadores de monitoramento do PG11, conforme ofício FR.2023. 0047.

I12 - Verificação de realização de atendimento pelo projeto de apoio psicopedagógico clínico

Meta Global: 100%
Percentual(%)



Gráfico 8: I12 - Verificação de realização de atendimento pelo projeto de apoio psicopedagógico clínico - Frequência Anual

A medição do indicador segue o calendário escolar, os dados serão consolidados em janeiro no retorno do recesso.

Indicadores

I13 - Escolas atendidas pelo apoio psicopedagógico institucional

Meta Global: 100%

Percentual(%)



Gráfico 9: I13 - Escolas atendidas pelo apoio psicopedagógico institucional - Frequência Anual

A medição do indicador segue o calendário escolar, os dados serão consolidados em janeiro no retorno do recesso.

PG012 Memória Histórica, Cultural e Artística

Eixo Pessoas e Comunidade

Objetivo

Garantir, em parceria com a comunidade e poder público, a reparação, restauração, preservação, fortalecimento e restituição do patrimônio cultural histórico e artístico dos territórios impactados, assegurando suas condições de existência, realização e reprodução autônoma, e criando espaços de sociabilidade, convivência e fortalecimento de vínculos comunitários.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	95	Caput	Em andamento
Cláusula	96	Caput	Em andamento
Cláusula	97	Caput	Em andamento
Cláusula	98	a	Em andamento
Cláusula	98	b	Em andamento
Cláusula	98	c	Em andamento
Cláusula	98	d	Em andamento
Cláusula	99	Caput	Em andamento
Deliberação	349	2	Concluída Internamente
Deliberação	547	2	Concluída Internamente
Deliberação	547	3	Em andamento

Entregas do ano de 2023

Excepcionalmente este mês não iremos reportar a timeline referente ao programa, pois estamos em fase de atualização de datas. No próximo ciclo os dados serão reportados.

Progressos do Mês

Fatos Relevantes

O projeto “Memórias do Rio Doce” tem como objetivo utilizar o conceito, a experiência, as ferramentas e plataformas do Museu da Pessoa, um museu virtual de histórias de vida, para contribuir com o programa. A proposta inclui ações de formação de jovens na tecnologia social da memória criada e desenvolvida pelo Museu da Pessoa e no registro de memórias e narrativas dos diversos atores envolvidos. O processo contribuirá com o fortalecimento das comunidades e com a valorização das pessoas da localidade, de forma a possibilitar a construção de diálogos que levem à participação e ao protagonismo das comunidades para a constituição dos espaços de memória.

Serão formadas 20 pessoas que irão realizar entrevistas de algumas das referências culturais dessas localidades garantindo o direito à memória coletiva e individual, sobre o que foi vivido pelas comunidades atingidas pelo rompimento da barragem.

Indicadores

Revisão dos indicadores do Programa de Preservação da Memória Histórica, Cultural e Artística (PG12) em processo de aprovação pelo CIF (Deliberação CIF nº 547, de 22 de outubro de 2021).

PG013 Turismo, Cultura, Esporte e Lazer

Eixo Pessoas e Comunidade

Objetivo

Promover ações nas áreas de turismo, cultura, esporte e lazer, visando contribuir para a melhoria da qualidade de vida nos municípios atingidos e fomentar o desenvolvimento turístico dos polos definidos.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	101	Caput	Concluída Internamente
Cláusula	102	Caput	Concluída Internamente
Cláusula	103	Caput	Em andamento
Cláusula	104	a	Em andamento
Cláusula	104	b	Concluída Internamente
Cláusula	104	c	Em andamento
Cláusula	104	d	Em andamento
Cláusula	104	e	Em andamento
Cláusula	104	f	Em andamento
Cláusula	104	g	Em andamento
Deliberação	239	1a	Concluída Internamente
Deliberação	239	1b	Concluída Internamente
Deliberação	239	1c	Concluída Internamente
Deliberação	239	3	Concluída Internamente
Deliberação	239	4	Concluída Internamente
Deliberação	239	5	Concluída Internamente
Deliberação	287	3	Concluída Internamente
Deliberação	287	4	Concluída Internamente
Deliberação	321	2	Em andamento
Deliberação	321	3	Concluída Internamente
Deliberação	377	3.1	Concluída Internamente
Deliberação	377	3.2	Concluída Internamente
Deliberação	377	4	Concluída Internamente
Deliberação	377	5	Concluída Internamente
Deliberação	454	2	Concluída Internamente
Deliberação	454	3	Concluída Internamente
Deliberação	462	3	Concluída Internamente

Entregas do ano de 2023

Excepcionalmente este mês não iremos reportar a timeline referente ao programa, pois estamos em fase de atualização de datas. No próximo ciclo os dados serão reportados.

Progressos do Mês

Fatos Relevantes

Realização do Festival de Verão da Foz, por meio da modalidade de Reparação do Lazer do Edital Doce.

Indicadores

I01 – Disponibilização de ferramentas para a Institucionalização do Turismo no Município

Meta Global: 100%
Percentual(%)



Gráfico 1: I01 – Disponibilização de ferramentas para a Institucionalização do Turismo no Município - Frequência Anual

I04 – Índice de Iniciativas realizadas a partir da formação em fortalecimento organizacional

Meta Global: 100%
Percentual(%)



Gráfico 2: I04 – Índice de Iniciativas realizadas a partir da formação em fortalecimento organizacional - Frequência Anual

Indicadores

I04.1 – Índice de conclusão do Processo formativo em relação ao número de selecionados

Meta Global: 100%

Percentual(%)



Gráfico 3: I04.1 – Índice de conclusão do Processo formativo em relação ao número de selecionados - Frequência Anual

I05 – Percentual de implementação do plano de empreendedorismo Turístico

Meta Global: 100%

Percentual(%)



Gráfico 4: I05 – Percentual de implementação do plano de empreendedorismo Turístico - Frequência Anual

As metas de execução são anuais.

Indicadores

I07.1 – Percentual de Servidores que concluíram a formação em relação ao número de indicados

Meta Global: 80%
Percentual(%)

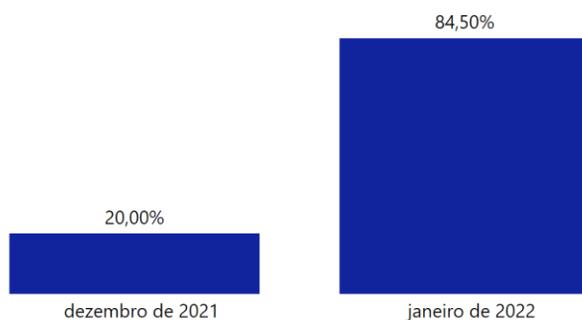


Gráfico 5: I07.1 – Percentual de Servidores que concluíram a formação em relação ao número de indicados - Frequência Anual

I08 – Percentual de capacitação dos gestores em relação ao número de inscritos

Meta Global: 70%
Percentual(%)



Gráfico 6: I08 – Percentual de capacitação dos gestores em relação ao número de inscritos - Frequência Anual

A ficha de indicadores do PG13 passou por revisão e atualização no indicador I07.1, sendo atualizado o resultado final do indicador e realizado novo report para atualização do mesmo.

PG014 Apoio à Saúde Física e Mental da População Impactada

Eixo Pessoas e Comunidade

Objetivo

Prestar apoio técnico à elaboração e implantação de estudos, dos protocolos de monitoramento da saúde da população exposta aos efeitos do rompimento e elaboração de programa para prestar apoio técnico para o atendimento às prefeituras de municípios atingidos na execução dos planos de ação de saúde ou das ações de saúde já pactuadas em função dos efeitos decorrentes do rompimento – conforme cláusulas 106, 107 e 111 do TTAC.*

* A Fundação Renova ajuizou, em 17/01/2022, Incidente de Divergência que visa à declaração de nulidade da Deliberação do Comitê Interfederativo (“CIF”) nº 551/2021, que aprovou a definição do Programa de Apoio à Saúde Física e Mental da População Impactada (PG-14).

A Fundação Renova demonstrou que a definição de escopo aprovada na Deliberação CIF nº 551 está em manifesto desacordo com o Termo de Transação e de Ajustamento de Conduta celebrado em 02/03/2016 (“TTAC”) e com deliberações prévias do próprio CIF. Várias de suas disposições carecem de fundamentos técnicos, pois não foram disponibilizadas informações essenciais para a execução do Programa (como avaliação de risco e correlações decorrentes do rompimento da barragem de Fundão, prazos, orçamentos e monitoramento de indicadores) ou dos seus subprogramas.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	106	Caput	Em andamento
Cláusula	107	Caput	Judicializada
Cláusula	108	Caput	Em andamento
Cláusula	111	Caput	Judicializada
Deliberação	266	2	Concluída Internamente
Deliberação	386	3	Concluída Internamente
Deliberação	416	3	Judicializada
Deliberação	416	4	Judicializada
Deliberação	435	1	Judicializada
Deliberação	436	1	Judicializada
Deliberação	452	2	Judicializada
Deliberação	487	7	Judicializada
Deliberação	492	1a, 1b,1c	Judicializada
Deliberação	504	2	Judicializada
Deliberação	504	3	Judicializada
Deliberação	504	4	Judicializada
Deliberação	598	1	Judicializada
Deliberação	599	1	Judicializada
Deliberação	611	3	Em andamento
Deliberação	611	4	Concluída Internamente
Deliberação	620	2	Judicializada
Deliberação	621	1	Judicializada
Deliberação	622	1	Judicializada
Deliberação	73	1	Em andamento

Deliberação	106	3	Concluída Internamente
Deliberação	130	4	Concluída Internamente
Deliberação	189	1	Concluída Internamente
Deliberação	189	2	Concluída Internamente
Deliberação	197	1 e 2	Concluída Internamente
Deliberação	219	4	Concluída Internamente
Deliberação	220	2	Concluída Internamente
Deliberação	220	3	Concluída Internamente
Deliberação	252	2	Concluída Internamente
Deliberação	264	4	Concluída Internamente
Deliberação	434	1	Judicializada
Deliberação	624	1	Judicializada

Entregas do ano de 2023

Excepcionalmente este mês não iremos reportar a timeline referente ao programa, pois estamos em fase de atualização de datas. No próximo ciclo os dados serão reportados.

Progressos do Mês

Grandes Números

48 profissionais (entre médicos, enfermeiros, assistentes sociais, psicólogos e psiquiatras) atuaram nos municípios de Mariana/MG (34 profissionais) e Barra Longa/MG (14 profissionais).

Progressos do Mês

Grandes Números

Barra Longa

Desde o rompimento da Barragem de Fundão, o município de Barra Longa tem recebido apoio ao SUS para atendimento à população atingida. Por meio de ACP homologada pela 12ª Vara para um período de 24 meses foram disponibilizados recursos financeiros para a contratação de 2 médicos plantonistas, 2 enfermeiros plantonistas, 2 técnicos de enfermagem, 1 médico psiquiatra, 1 psicólogo e, para o Departamento de Vigilância em Saúde, 2 profissionais de nível médio, 2 profissionais de nível técnico e 2 profissionais de nível superior.

A Secretaria de Saúde relatou o importante trabalho desenvolvido pelos profissionais da Vigilância em Saúde na atualização dos sistemas de informação do SUS (agravos de notificação, SIM, plataformas Covid-19, entre outros), monitoramento de dados do Sistema de monitoramento da qualidade da água para consumo humano (SISAGUA), fiscalização e orientação aos comerciantes e população referente medidas sanitárias a serem seguidas para combate ao COVID-19 e inspeção sanitária em estabelecimentos comerciais, dentre outras.

Para o apoio logístico, a Fundação Renova disponibilizou 02 veículos para a Secretaria Municipal de Saúde de Barra Longa, com os respectivos cartões-combustível, que são utilizados para o transporte de pacientes, atendimento à Estratégia da Saúde da Família, atendimento à equipe de Vigilância em Saúde para execuções de ações de prevenção, promoção e recuperação à saúde, entre outros.

A Fundação Renova também apoiou o município com o valor de R\$ 175.000,00 (dois repasses anuais em 2020 e 2021) para complementação de exames e consultas especializadas, aquisição de material médico, insumos e medicamentos. Além disso, foram adquiridos 04 notebooks e 04 desktops e entregou Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e uniformes para o Departamento de Vigilância em Saúde.

O município de Barra Longa solicitou dilação de prazo da ACP com apresentação de plano de trabalho. O processo se encontra em análise pelo Jurídico da Fundação Renova.

Progressos do Mês

Grandes Números

Mariana

Desde o rompimento da Barragem de Fundão, o município de Mariana tem recebido apoio para atendimento à população atingida. A partir da primeira quinzena de janeiro/22, todos os profissionais atuantes pela empresa Contexto foram substituídos por profissionais contratados diretamente pela Prefeitura, com financiamento da Fundação Renova, conforme preconizado no Acordo Judicial homologado pela 2ª Vara Cível. Ao todo, como previsto no Plano de Trabalho, são 34 profissionais de saúde que atuam nos seguintes equipamentos municipais de saúde:

- Espaço Conviver, que presta serviços à população atingida na área de Saúde Mental, oferecendo atendimentos psicológicos e psiquiátricos especializados e acompanhamento psicossocial. O aluguel deste espaço é financiado pela Fundação Renova, que também financiou a compra de móveis e equipamentos para seu funcionamento adequado.
- CAPS e CAPSAD, nos quais os atendimentos são realizados por equipe multiprofissional que atua de forma interdisciplinar e realiza prioritariamente atendimento às pessoas em sofrimento mental, incluindo aquelas com necessidades decorrentes do uso abusivo de álcool e outras drogas, em sua área territorial, seja em situações de crise ou nos processos de reabilitação psicossocial.
- UBS de Bento Rodrigues e Paracatu, onde são oferecidos atendimentos com Nutricionista, Fisioterapeuta, Odontóloga, Médico ESF, Médico Psiquiatra, Enfermeiro e Psicóloga. O objetivo desta Unidade de Saúde é atender até 80% dos problemas de saúde da população atingida, sem que haja a necessidade de encaminhamento para outros serviços, como emergências e hospitais. Nesta UBS, assim como em outras UBS do Município, as famílias atingidas podem ter acesso a ações de promoção, prevenção e tratamento relacionadas a saúde da mulher, da criança, saúde mental, planejamento familiar, prevenção a câncer, pré-natal e cuidado de doenças crônicas como diabetes e hipertensão, fazer curativos, inalações, tomar vacinas, coletar amostras para exames laboratoriais, ter tratamento odontológico, receber medicação básica e ser encaminhado para atendimentos com especialistas.

A Fundação Renova também apoia o município de Mariana com 05 veículos para atendimento à população atingida, visando a reforçar o trabalho nas áreas de atenção primária, atenção especializada, saúde mental, vigilância em saúde, assistência farmacêutica, entre outros.

Progressos do Mês

Fatos Relevantes

Depósito judicial para suplementação de RH em Mariana - 5º depósito.

Indicadores

Os indicadores do programa estão em revisão

PG015 Promoção à Inovação

Eixo Pessoas e Comunidade

Objetivo

Fomentar e financiar a produção de conhecimento relacionado à recuperação socioeconômica e socioambiental das áreas impactadas pelo rompimento, por meio da criação e fortalecimento de linhas de pesquisa de tecnologias aplicadas, fortalecimento de capital humano e internalização das tecnologias geradas para o processo de reparação, de acordo com as cláusulas 113 a 115 do TTAC.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	113	Caput	Em andamento
Cláusula	114	a	Em andamento
Cláusula	114	b	Em andamento
Deliberação	100	1	Concluída Internamente
Deliberação	126	2	Concluída Internamente
Deliberação	126	3	Concluída Internamente
Deliberação	20	n/a	Concluída Internamente
Deliberação	31	a	Concluída Internamente
Deliberação	338	4	Concluída Internamente

Entregas do ano de 2023

Excepcionalmente este mês não iremos reportar a timeline referente ao programa, pois estamos em fase de atualização de datas. No próximo ciclo os dados serão reportados.

Progressos do Mês

Fatos Relevantes

Realização do Demoday do Programa de Aceleração de Negócios Mariana Labs (Rodada Complementar), com apresentação da evolução e desenvolvimento dos negócios acelerados.

Indicadores

I01 – Número de projetos de pesquisa e inovação financiados pelo programa

Meta Global: 40
Número




Gráfico 1: I01 – Número de projetos de pesquisa e inovação financiados pelo programa - Frequência Anual

I02 – Número de bolsas de formação educacional/profissional financiadas

Meta Global: 220
Número




Gráfico 2: I02 – Número de bolsas de formação educacional/profissional financiadas - Frequência Anual

Indicadores

I03 – Índice de recurso destinado a pesquisas aportado na formação de pessoas

Meta Global: 100%
Percentual(%)

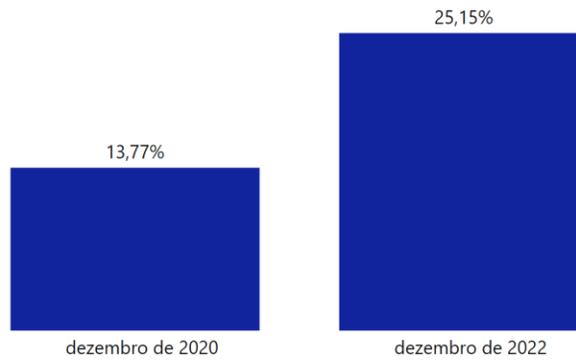


Gráfico 3:I03 – Índice de recurso destinado a pesquisas aportado na formação de pessoas - Frequência Bianual

PG016 Retomada das Atividades Aquícolas e Pesqueiras

Eixo Pessoas e Comunidade

Objetivo

Possibilitar a retomada das atividades aquícolas e pesqueiras conforme condições anteriores ao rompimento através da aprendizagem e diálogo com as comunidades pesqueiras atingidas, proporcionando oportunidades de renda e qualificação.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	116	Caput	Em andamento
Cláusula	117	Caput	Em andamento
Cláusula	118	Caput	Em andamento
Cláusula	119	Caput	Em andamento
Cláusula	122	Caput	Judicializada
Cláusula	123	Caput	Em andamento
Deliberação	121	2	Concluída Internamente
Deliberação	20	n/a	Concluída Internamente
Deliberação	480	4	Concluída Internamente
Deliberação	480	5	Concluída Internamente
Deliberação	542	1	Concluída Internamente
Deliberação	542	1.1	Concluída Internamente
Deliberação	542	2	Concluída Internamente

Entregas do ano de 2023

Excepcionalmente este mês não iremos reportar a timeline referente ao programa, pois estamos em fase de atualização de datas. No próximo ciclo os dados serão reportados.

Progressos do Mês

Grandes Números

Articulação Junto aos Órgãos Públicos e Comunidades

o 3 Caravanas Devolutivas para apresentação de resultados ambientais nos territórios da Calha e Médio Rio Doce;

o 246 Participantes das Oficinas Devolutivas nos municípios de Governador Valadares, Rio Casca e Ipatinga.

Caracterização Socioeconômica da Pesca e Aquicultura e Monitoramento Pesqueiro

o 14.106 formulários de coletas de dados primários e de desembarque pesqueiro aplicados, com pescadores e aquicultores;

o 7 informes trimestrais, 3 semestrais e 1 anual entregues sobre a produção pesqueira e perfil socioeconômico dos pescadores no rio Doce e litoral do ES.

Fomento e Fortalecimento do Associativismo e Cooperativismo:

o 197 beneficiários atendidos nos estados de MG e ES;

o 3 municípios beneficiados, Rio Doce e Periquito em MG e Linhares no ES;

o 4 associações beneficiadas:

- 30 ASPERDOCE (Rio Doce)

- 77 ASPIPEC (Pedra Corrida)

- 38 APIGUA (Guaxe)

- 52 APAP (Povoação);

o 2 associações formalizadas em MG (ASPIPEC e ASPERDOCE);

o 40 capacitações em gestão e rotinas administrativas, funcionalidades e elaboração de plano de negócios, estratégias de vendas e negociação (APERDOCE e ASPIPEC);

o 4 Planos de negócio entregues.

Projeto Cultivando para Pescar:

o 4 comunidades atendidas (Areal, Entre Rios, Regência e Povoação), sendo 170 pessoas beneficiadas;

o 10 capacitações realizadas, 3 temas abordados (Hidroponia, Piscicultura Superintensiva e Processamento do Pescado);

o 2 visitas técnicas em 1 tema abordado (Piscicultura Superintensiva);

o 187 Materiais Virtuais produzidos e disponibilizados no período de distanciamento social.

Progressos do Mês

Fatos Relevantes

Contratação de consultoria/assessoria técnica para dimensionamento para ATER.

Indicadores

Os indicadores não iniciaram suas medições, encontram-se em revisão na CTEI, onde foi encaminhada nova proposta de indicadores finalísticos.

PG017 Retomada das Atividades Agropecuárias

Eixo Terra e Água

Objetivo

Reparar os danos socioeconômicos e ambientais aos produtores rurais ao longo da calha do rio Doce em virtude do rompimento da barragem de Fundão, bem como oferecer apoio técnico de modo a viabilizar ao público-alvo o restabelecimento da rotina produtiva em condição pré-existente ao evento. Ainda, para além da reparação propriamente dita, serão fornecidos serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural, que fomentarão a utilização de técnicas produtivas sustentáveis.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	125	a	Judicializada
Cláusula	125	b	Judicializada
Cláusula	125	c	Judicializada
Cláusula	125	d	Judicializada
Cláusula	125	e	Em andamento
Cláusula	125	f	Em andamento
Cláusula	125	g	Judicializada
Cláusula	125	h	Judicializada
Cláusula	125	i	Em andamento
Cláusula	125	j	Judicializada
Deliberação	145	3	Concluída Internamente
Deliberação	20	n/a	Concluída Internamente
Deliberação	263	2	Concluída Internamente
Deliberação	263	3	Concluída Internamente
Deliberação	341	1	Concluída Internamente
Deliberação	343	1.4	Concluída Internamente
Deliberação	354	1 e 2	Concluída Internamente

Entregas do ano de 2023

Excepcionalmente este mês não iremos reportar a timeline referente ao programa, pois estamos em fase de atualização de datas. No próximo ciclo os dados serão reportados.

Progressos do Mês

Grandes Números

Alto Rio Doce

246 propriedades elegíveis ao programa, sendo 49 direcionados ao reassentamento e 197 ao Plano de Adequação Socioeconômico e Ambiental (PASEA), 197 são do PASEA planejados sendo que 196 devolutivas foram realizadas, e a diferença dos 1 refere-se à pendência de CAR ou problema fundiário. Até o presente momento, 162 propriedades aderiram à implantação do PASEA, 34 não aderiram e 0 estão em análise pelo produtor;

52.990,01, toneladas acumuladas de silagem entregues para produtores impactados, sendo 0 toneladas no mês;

22.548,46 horas de Assistência Técnica e Extensão Rural para 140 propriedades;

461 barraginhas realizadas;

900 infraestruturas rurais simples e complexas concluídas;

238 nascentes cercadas e 58 nascentes com plantio florestal realizado;

2643 hectares de reestruturação produtiva executados.

Elaborados e implantados os projetos de 79 hortas e 84 pomares, nos municípios de Mariana, Barra Longa, Ponte Nova, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado, no Alto Rio Doce.

Progressos do Mês

Grandes Números

Baixo Rio Doce

1.000 horas individuais de Assistência Técnica e Extensão Social (ATES) no Lote 4 – Linhares/ES (Assentamento Sezínio Fernandes de Jesus);
1.051 horas coletivas de Assistência Técnica e Extensão Social (ATES) no Lote 4 – Linhares/ES (Assentamento Sezínio Fernandes de Jesus);
1 feira de apoio à comercialização de produtos para o Lote 4 - Linhares/ES (Assentamento Sezínio Fernandes de Jesus);
98 Indicadores de Sustentabilidade em Agroecossistemas (ISA) elaborados para o Lote 4 - Linhares/ES (Assentamento Sezínio Fernandes de Jesus);
7.488 toneladas acumuladas de silagem para produtores impactados, sendo 216 toneladas no mês.

Médio Rio Doce

8.492 horas individuais de Assistência Técnica e Extensão Social (ATES) no Lote 3 – Tumiritinga/MG (1º Junho, Terra Prometida e Águas da Prata I e II) e Periquito/MG (Liberdade);
15.440 horas coletivas de Assistência Técnica e Extensão Social (ATES) no Lote 3 – Tumiritinga/MG (1º Junho, Terra Prometida e Águas da Prata I e II) e Periquito/MG (Liberdade);
2 feiras de apoio á comercialização de produtos realizadas para o Lote 3 - Tumiritinga/MG (1º Junho, Terra Prometida e Águas da Prata I e II) e Periquito/MG (Liberdade);
159 Indicadores de Sustentabilidade em Agroecossistemas (ISA) elaborados para o Lote 3 - Tumiritinga/MG (1º Junho, Terra Prometida e Águas da Prata I e II) e Periquito/MG (Liberdade);
67.789 toneladas acumuladas de silagem para produtores impactados, sendo 1.928 toneladas no mês.

Progressos do Mês

Grandes Números

Parcerias

59 capacitações técnicas presenciais realizadas pela EMATER – MG;
30 capacitações técnicas online realizadas pela EMATER – MG;
18 Unidades Demonstrativas implantadas e propriedades localizadas no território Alto Rio Doce. Sendo 16 Unidades Demonstrativas implantadas em parceria com World Resources Institute (WRI), Fazenda Ecológica e Centro Internacional de Pesquisa Agroflorestal (ICRAF) e 2 Unidades Demonstrativas em parceria com a Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais (EPAMIG).

Progressos do Mês

Fatos Relevantes

Médio Rio Doce

Validação junto à CTEI com o atendimento de ATER sob demanda.

Indicadores

I01 – Taxa de reposição de alimentação animal

Meta Global: 100%
Percentual(%)

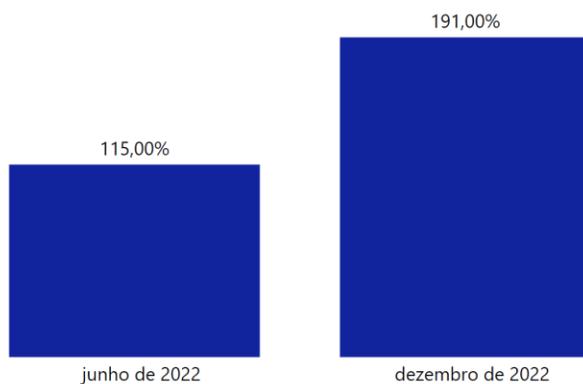


Gráfico 1: I01 – Taxa de reposição de alimentação animal - Frequência Semestral

I02 – Taxa de Reconstrução de Benfeitorias Impactadas

Meta Global: 100%
Percentual(%)

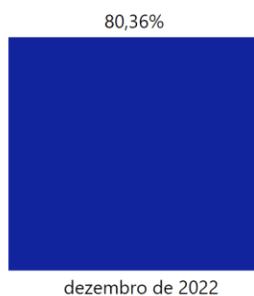


Gráfico 2: I02 – Taxa de Reconstrução de Benfeitorias Impactadas - Frequência Anual

Indicadores

I04 – Taxa da evolução do índice de sustentabilidade das propriedades rurais

Meta Global: 100%
Percentual(%)




Gráfico 3: I04 – Taxa da evolução do índice de sustentabilidade das propriedades rurais - Frequência Semestral

Indicadores

Tabela 1. Indicadores que não iniciaram a medição.

INDICADOR	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDADE DE MEDIDA	INÍCIO PREVISTO DE MEDIÇÃO
I01 – Taxa de reposição de alimentação animal	$I01 = \frac{\text{Plantio Substitutivo (t/ano)} + \text{forragem fornecida (t/ano)} + \text{pastagem alugada (t/ano)}}{\text{produção de forragem impactada (t/ano)}}$	%	janeiro/2017
I02 – Taxa de Reconstrução de Benfeitorias Impactadas	$I02 = \frac{\text{Quantitativo de benfeitoria Construídas/instaladas}}{\text{Quantitativo de benfeitorias danificadas para adequação, de propriedades que aderiram ao Programa}}$	%	setembro/2020
I03 – Taxa de assistência técnica a produtores rurais	$I03 = \frac{\text{número total de horas de assistência técnica e extensão rural para as famílias atendidas}}{\text{Número de famílias atendidas participantes do Programa e que aderiram a ATER}}$	Horas	dezembro/2022
I04 – Taxa da evolução do índice de sustentabilidade das propriedades rurais	$I04 = \frac{\text{Número de propriedades com ISA maior ou igual a 0,7}}{\text{Número de propriedades participantes do Programa}}$	%	março/2021
I05 - Taxa de assistência técnica individual a produtores rurais	$I05 = \frac{\text{Número total de horas de assistência técnica individual no ano de referência}}{\text{Número de famílias atendidas participantes do programa e que aderiram a ATER}}$	Horas/ano	junho/2022
I06 - Taxa de assistência técnica coletiva a produtores rurais	$I06 = \frac{\text{Número total de horas de assistência técnica coletiva no ano de referência}}{\text{Número de famílias atendidas que aderiram a ATER}}$	Horas	junho/2022
I07 – Recomposição e/ou adequação das áreas produtivas impactadas por Unidade de Área	$I07 = \frac{\text{Hectares reparados ou compensados dentro da propriedade}}{\text{Hectares atingidos em propriedades aderidas e atendidas pela ATER}}$	%	agosto/2021
I08 – Reconstrução e/ou Reforma dos equipamentos danificados	$I08 = \frac{\text{Equipamentos recuperados ou repostos em imóveis atendidos pela ATER}}{\text{Equipamentos danificados}}$	%	agosto/2021

PG018 Desenvolvimento e Diversificação Econômica

Eixo Pessoas e Comunidade

Objetivo

Promover o surgimento de novos negócios e o fortalecimento de negócios existentes, de forma a contribuir para o desenvolvimento econômico dos municípios impactados.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	129	Caput	Em andamento
Cláusula	130	a	Em andamento
Cláusula	130	b	Em andamento
Cláusula	130	c	Concluída Internamente
Cláusula	130	d	Em andamento
Cláusula	130	e	Em andamento
Cláusula	130	f	Em andamento
Deliberação	109	n/a	Concluída Internamente
Deliberação	163	3	Concluída Internamente
Deliberação	20	n/a	Concluída Internamente
Deliberação	343	1.4	Concluída Internamente
Deliberação	463	3	Concluída Internamente
Deliberação	503	2	Concluída Internamente
Deliberação	503	3	Concluída Internamente
Deliberação	589	2	Em andamento

Entregas do ano de 2023

Excepcionalmente este mês não iremos reportar os dados da timeline referente ao programa, pois estamos em fase de atualização de datas. No próximo ciclo os dados serão reportados.

Progressos do Mês

Fatos Relevantes

Projeto Agroecológico MG

Conclusão de segunda etapa da obra em janeiro.

Projeto Bancos Comunitários

Protocolo dos Planos de Sustentabilidade dos Bancos Comunitários Nova Esperança (Cachoeira Escura) e Foz do Rio Doce (Regência) e, por consequência, o início da concessão de crédito por meio destes bancos.

Projeto de Fortalecimento da Cadeia do Cacau ES

Realizada a capacitação de técnicos multiplicadores em Linhares dia 30 e 31/01/23.

Grandes Números

Fundo Compete Rio Doce

Em Minas Gerais, R\$ 7,20 milhões foram desembolsados para 225 contratos e 127 empresas.

Fundo Desenvolve Rio Doce

R\$ 101,37 milhões emprestados para negócios em Minas Gerais e Espírito Santo. Em Minas Gerais, R\$ 80,60 milhões foram desembolsadas para 1.994 contratos e 1.453 empresas.

No Espírito Santo, R\$ 20,76 milhões foram desembolsadas para 562 contratos e 519 empresas.

Fundo Diversifica Mariana

R\$ 55,00 milhões em linhas de crédito.

Indicadores

I01 – Promoção de ações de desenvolvimento

Meta Global: 100%
Percentual(%)




Gráfico 1: I01 – Promoção de ações de desenvolvimento - Frequência Semestral

I02 – Diversificação Econômica de Mariana - MG

Meta Global: 100%
Percentual(%)




Gráfico 2: I02 – Diversificação Econômica de Mariana - MG - Frequência Anual

Indicadores

I03 – Financiamento – Acesso ao Crédito

Meta Global: 7500

Contratos

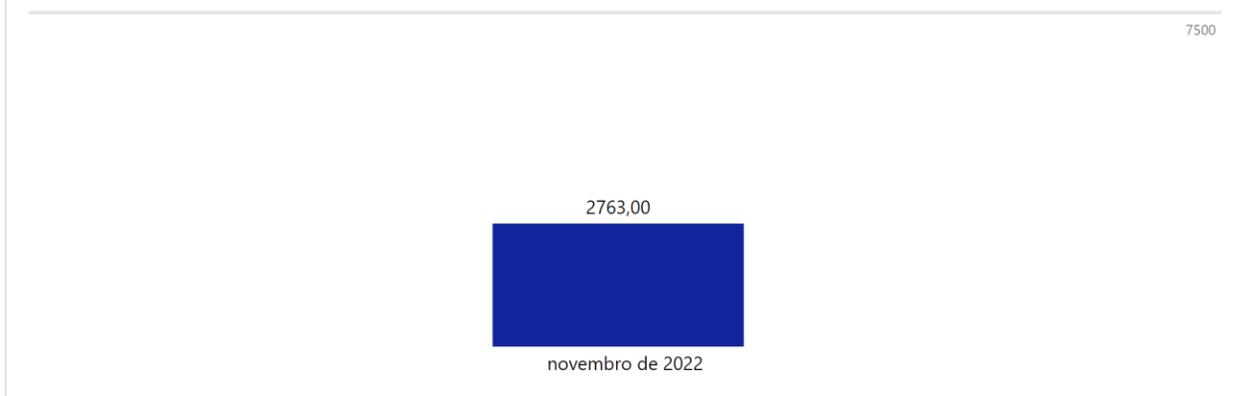


Gráfico 3: I03 – Financiamento – Acesso ao Crédito - Frequência Mensal

I04 - Distribuição dos atendimentos do Eixo 2 – Financiamento nos territórios

Meta Global: 90%

Percentual(%)




Gráfico 4: I04 - Distribuição dos atendimentos do Eixo 2 – Financiamento nos territórios - Frequência Mensal

Indicadores

I05 - Número de atendimentos realizados com foco na Geração de Renda

Meta Global: 1850

Atendimentos




Gráfico 5: I05 - Número de atendimentos realizados com foco na Geração de Renda - Frequência Semestral

I07 - Número de empreendedores atendidos no PG 18

Meta Global: 7650

Atendimentos




Gráfico 6: I07 - Número de empreendedores atendidos no PG 18 - Frequência Semestral

PG019 Programa de Recuperação de Micro e Pequenos Negócios

Eixo Pessoas e Comunidade

Objetivo

Elaborar e executar um programa específico para a recuperação de micro e pequenos negócios no setor de comércio, serviços e produtos, localizados de Fundão até Candonga em Minas Gerais, e Regência e Povoação no Espírito Santo, áreas diretamente atingidas pelo EVENTO (Cláusulas 132 a 133 do TTAC).

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	132	Caput	Em andamento
Cláusula	133	Caput	Em andamento
Deliberação	20	n/a	Concluída Internamente
Deliberação	342	2	Concluída Internamente

Entregas do ano de 2023

Excepcionalmente este mês não iremos reportar os dados da timeline referente ao programa, pois estamos em fase de atualização de datas. No próximo ciclo os dados serão reportados.

Progressos do Mês

Grandes Números

1046 atendimentos realizados a 457 micro e pequenos negócios, por meio de 740 ações de assessoramento e planejamento de negócios, 17 locações de espaços comerciais, 279 reposições de insumos e equipamentos e 10 reformas e/ou adequação de infraestrutura.

Indicadores

I01 - % de negócios impactados com condições de produção recuperadas

Meta Global: 100%
Percentual(%)



Gráfico 1: I01 - % de negócios impactados com condições de produção recuperadas - Frequência Semestral

I02 - % de novos negócios em substituição ao anterior que acessaram consultoria/assessoria especializada

Meta Global: 100%
Percentual(%)




Gráfico 2: I02 - % de novos negócios em substituição ao anterior que acessaram consultoria/assessoria especializada - Frequência Semestral

Indicadores

I03 - % de negócios impactados adequados à novas condições de mercado

Meta Global: 100%
Percentual(%)



Gráfico 3: I03 - % de negócios impactados adequados à novas condições de mercado - Frequência Semestral

PG020 Estímulo à Contratação Local

Eixo Pessoas e Comunidade

Objetivo

Estabelecer e executar um processo de desenvolvimento de ações que auxiliem na priorização de contratação local, com ênfase na população atingida, visando capacitar e estimular o uso da força de trabalho e redes de fornecedores locais para as ações que forem desenvolvidas na área de atuação da Fundação Renova, conforme cláusulas 134 a 136 do TTAC.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	134	Caput	Em andamento
Cláusula	135	a	Em andamento
Cláusula	135	b	Em andamento
Cláusula	136	Caput	Em andamento
Deliberação	146	1	Concluída Internamente
Deliberação	20	n/a	Concluída Internamente
Deliberação	352	5	Concluída Internamente
Deliberação	84	n/a	Concluída Internamente

Entregas do ano de 2023

Excepcionalmente este mês não iremos reportar os dados da timeline referente ao programa, pois estamos em fase de atualização de datas. No próximo ciclo os dados serão reportados.

Progressos do Mês

Grandes Números

- R\$ 3.531.882,47 de Geração de Renda para os atingidos, oportunizados pelo poder de compra da Fundação Renova.

Ações em andamento

- Nos cursos de qualificação presencial foram ofertadas 311 turmas, abertas 9241 vagas, 8347 pessoas matriculadas, 6019 concluintes, 572 reprovadas e 1641 evadidos.

Ações realizadas

- 10.504 vagas foram abertas nos cursos de qualificação on-line ofertados pela Fundação Renova, 7.335 pessoas matriculadas, 1566 concluintes, 1208 reprovadas e 2.617 evadidos. As atividades dos cursos on-line foram encerradas em 27/08/2021.

Progressos do Mês

Fatos Relevantes

Desenvolvimento de Fornecedor | +Gestão:

Encontro de Negócios virtual, realizado pelo Projeto +Gestão, nos dias 24 e 25/01/22 cujo o objetivo de aproximar pequenas e médias empresas locais das grandes empresas (compradoras) que atuam nos municípios atingidos. Tivemos a participação de 108 representantes das empresas, que ao longo dos dois dias realizaram 144 rodadas de negócios.

Monitoramento de Contratações Locais:

Realizada a contratação de 213 pessoas pelos fornecedores da Fundação Renova, sendo 156 contratações locais e 57 contratações não locais. Dessas 213 contratações, 180 profissionais são de Minas Gerais, 06 do Espírito Santo e 27 dos demais estados.

"Por meio da Plataforma "Recoloca Rio Doce", foram cadastrados 675 currículos e prospectadas 489 vagas de emprego no mês. No acumulado, 9.084 currículos estão cadastrados e 7.693 vagas já foram captadas"

Qualificação Profissional e Preparação para o Mercado de Trabalho:

RECOLOCA: Conclusão da capacitação "Como se preparar para o Mercado de Trabalho" para 21 recuperandas da APAC (Associação de Proteção e Assistência aos Condenados) de Governador Valadares, no dia 19/01/2023.

SENAI: No mês de janeiro 33 pessoas concluíram os cursos de capacitação profissional em Mariana, nos temas: Assistente Administrativo e Controle de Qualidade. Além das conclusões, foram realizados 03 encontros para a entrega de certificados para 42 pessoas que concluíram os cursos em dezembro/22. Em Periquito, 17 pessoas da comunidade de Pedra Corrida e 16 pessoas do Assentamento Liberdade. Em Belo Oriente 09 pessoas da comunidade de Cachoeira Escura.

Indicadores

I01 – Utilização da rede local de fornecedores – MG e ES

Meta Global: 70%
Percentual(%)



Gráfico 1: I01 – Utilização da rede local de fornecedores – MG e ES - Frequência Trimestral

I02 – Utilização da rede local de fornecedores – 39 Municípios

Meta Global: 30%
Percentual(%)



Gráfico 2: I02 – Utilização da rede local de fornecedores – 39 Municípios - Frequência Trimestral

Indicadores

I03 – Relação de profissionais admitidos em cada região – MG e ES

Meta Global: 70%
Percentual(%)

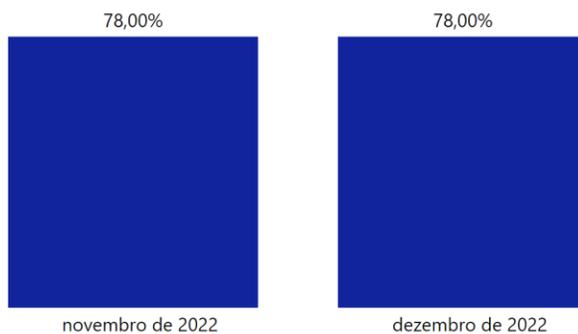


Gráfico 3: I03 – Relação de profissionais admitidos em cada região – MG e ES - Frequência Mensal

I04 – Relação de profissionais admitidos em cada região – 39 Municípios

Meta Global: 50%
Percentual(%)




Gráfico 4: I04 – Relação de profissionais admitidos em cada região – 39 Municípios - Frequência Mensal

Indicadores

I05 – Quantidade de profissionais que finalizaram os cursos de aperfeiçoamento profissional

Meta Global: 4000
Quantidade



Gráfico 5: I05 – Quantidade de profissionais que finalizaram os cursos de aperfeiçoamento profissional - Frequência Semestral

I06 –Número de Empresas Capacitadas

Meta Global: 400
Quantidade



Gráfico 6: I06 –Número de Empresas Capacitadas - Frequência Anual

Indicadores




Gráfico 7: IC -Total de recursos recolhidos (ISS/ICMS) por estado na área de atuação da Renova - Frequência Mensal




Gráfico 8: Ic – Valor Total de recursos aplicados em compras de materiais, realizadas pela Fundação Renova nos estados de MG e ES - Frequência Semestral

PG021 Auxílio Financeiro Emergencial

Eixo Pessoas e Comunidade

Objetivo

Fornecer auxílio financeiro emergencial à população impactada que tenha tido comprometimento de sua renda em razão de interrupção comprovada de suas atividades produtivas ou econômicas em decorrência do Rompimento, conforme as Cláusulas de 137 a 140 e 21 a 24 do TTAC.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	137	Caput	Judicializada
Deliberação	111	6	Concluída Internamente
Deliberação	141	4	Concluída Internamente
Deliberação	167	1	Concluída Internamente
Deliberação	167	2	Concluída Internamente
Deliberação	167	3	Judicializada
Deliberação	210	único	Concluída Internamente
Deliberação	234	4	Concluída Internamente
Deliberação	234	5	Concluída Internamente
Deliberação	292	2	Concluída Internamente
Deliberação	307	2b	Concluída Internamente
Deliberação	35	n/a	Concluída Internamente
Deliberação	420	3-a	Judicializada
Deliberação	422	2	Concluída Internamente
Deliberação	457	1 e 2	Judicializada
Deliberação	48	n/a	Concluída Internamente
Deliberação	485	1 e 2	Concluída Internamente

Entregas do ano de 2023

A Fundação Renova entende que o Planejamento deste Programa tem sido determinado por decisões judiciais (a exemplo da decisão de 30/11/2021), e, em função disso, não é possível precisar o Planejamento 2023 em sede administrativa.

Progressos do Mês

Fatos Relevantes

Inclusão de 04 auxílios;
Exclusão de 22 auxílios.

Grandes Números

Atualmente há 14.380 titulares que recebem auxílio financeiro emergencial. Considerando titulares e dependentes, são 32.099 pessoas assistidas pelo programa;

Até o momento foram pagos R\$ 2.315.051.827,38 .

Indicadores

I01 – Adimplência dos pagamentos de auxílio financeiro emergencial

Meta Global: 99%
Percentual(%)



Gráfico 1: I01 – Adimplência dos pagamentos de auxílio financeiro emergencial - Frequência Trimestral

I02 – Percentual de pagamento de Programa de Auxílio Financeiro Emergencial

Meta Global: 100%
Percentual(%)



Gráfico 2:I02 – Percentual de pagamento de Programa de Auxílio Financeiro Emergencial - Frequência Trimestral

PG023 Manejo de Rejeitos

Eixo Terra e Água

Objetivo

Apresentar diretrizes, conceitos, metodologias, técnicas, critérios e indicadores para tomada de decisão quanto ao manejo dos rejeitos para elaboração e execução de projetos aplicáveis a cada fração territorial nas áreas afetadas pelo rompimento da Barragem de Fundão.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	150	Caput	Concluída Internamente
Cláusula	151	Caput	Judicializada
Cláusula	180	§único	Judicializada
Cláusula	180	Caput	Em andamento
Deliberação	142	2	Concluída Internamente
Deliberação	164	1	Concluída Internamente
Deliberação	165	1	Concluída Internamente
Deliberação	165	2	Concluída Internamente
Deliberação	173	3	Concluída Internamente
Deliberação	180	2	Concluída Internamente
Deliberação	194	2	Em andamento
Deliberação	222	1	Concluída Internamente
Deliberação	222	1.1	Concluída Internamente
Deliberação	222	1.2	Concluída Internamente
Deliberação	222	1.3	Concluída Internamente
Deliberação	222	1.4	Concluída Internamente
Deliberação	222	1.5	Concluída Internamente
Deliberação	222	1.6	Concluída Internamente
Deliberação	222	1.7	Concluída Internamente
Deliberação	245	1	Em andamento
Deliberação	245	1.1	Concluída Internamente
Deliberação	245	1.2	Concluída Internamente
Deliberação	245	1.3	Concluída Internamente
Deliberação	245	1.4	Em andamento
Deliberação	246	2	Concluída Internamente
Deliberação	246	3	Concluída Internamente
Deliberação	261	1.13	Concluída Internamente
Deliberação	261	1.14	Concluída Internamente
Deliberação	261	1.15	Concluída Internamente

Deliberação	261	1	Em andamento
Deliberação	261	1.1	Concluída Internamente
Deliberação	261	1.10	Em andamento
Deliberação	261	1.11	Em andamento
Deliberação	261	1.12	Em andamento
Deliberação	261	1.16	Concluída Internamente
Deliberação	261	1.17	Concluída Internamente
Deliberação	261	1.18	Concluída Internamente
Deliberação	261	1.19	Concluída Internamente
Deliberação	261	1.2	Concluída Internamente
Deliberação	261	1.3	Concluída Internamente
Deliberação	261	1.4	Concluída Internamente
Deliberação	261	1.5	Concluída Internamente
Deliberação	261	1.7	Concluída Internamente
Deliberação	261	1.8	Judicializada
Deliberação	261	1.9	Em andamento
Deliberação	273	1	Em andamento
Deliberação	273	1.1	Em andamento
Deliberação	273	1.2	Concluída Internamente
Deliberação	273	1.3	Em andamento
Deliberação	273	1.6	Em andamento
Deliberação	323	1	Em andamento
Deliberação	324	2	Concluída Internamente
Deliberação	345	2	Concluída Internamente
Deliberação	358	1	Concluída Internamente
Deliberação	358	2	Concluída Internamente
Deliberação	358	3	Judicializada
Deliberação	362	2	Reprogramada
Deliberação	363	1	Concluída Internamente
Deliberação	364	1	Concluída Internamente
Deliberação	378	5	Concluída Internamente
Deliberação	378	6	Concluída Internamente

Deliberação	273	1.4	Em andamento
Deliberação	273	1.5	Em andamento
Deliberação	273	1.7	Em andamento
Deliberação	284	1	Concluída Internamente
Deliberação	284	2	Concluída Internamente
Deliberação	285	3	Concluída Internamente
Deliberação	285	4	Concluída Internamente
Deliberação	285	5	Concluída Internamente
Deliberação	3	n/a	Concluída Internamente
Deliberação	304	2	Judicializada
Deliberação	384	1	Concluída Internamente
Deliberação	431	2	Concluída Internamente
Deliberação	45	n/a	Concluída Internamente
Deliberação	453	3	Concluída Internamente
Deliberação	488	2	Judicializada
Deliberação	488	4	Judicializada
Deliberação	497	1	Concluída Internamente
Deliberação	497	2	Concluída Internamente
Deliberação	497	3	Concluída Internamente
Deliberação	516	2	Concluída Internamente
Deliberação	516	3	Concluída Internamente
Deliberação	544	2	Concluída Internamente
Deliberação	544	3	Concluída Internamente
Deliberação	590	2	Concluída Internamente
Deliberação	592	2	Concluída Internamente
Deliberação	592	5	Em andamento
Deliberação	618	5	Planejada
Deliberação	619	1	Planejada
Deliberação	619	2	Planejada

Deliberação	630	3	Em andamento
Deliberação	630	4	Em andamento
Deliberação	632	1	Em andamento
Deliberação	633	1	Em andamento
Deliberação	633	2	Concluída Internamente
Deliberação	634	2	Em andamento
Deliberação	86	1-a	Concluída Internamente
Deliberação	86	1-c	Concluída Internamente
Deliberação	86	1-c (ação 1)	Concluída Internamente
Deliberação	86	e	Concluída Internamente
Deliberação	86	f	Concluída Internamente

Entregas do ano de 2023

Excepcionalmente este mês não iremos reportar a timeline referente ao programa, pois estamos em fase de atualização de datas. No próximo ciclo os dados serão reportados.

Progressos do Mês

Fatos Relevantes

Protocolo do relatório Integrado das Campanhas de Monitoramento do Trecho 09
- Expansão renaturalização

Indicadores

Conforme estabelecido pela Nota Técnica 12/2018/CTPDCS/CIF e Deliberação CIF nº230, os indicadores do Programa estão em discussão no âmbito da 12ª Vara Cível e Agrária, na Ação Civil Pública (ACP) 69758-91.2018.4.01.3400. Portanto, esse processo encontra-se em andamento.

PG025 Recuperação Ambiental Área 1

Eixo Terra e Água

Objetivo

Recuperação da área diretamente impactada pelo rompimento da barragem de Fundão (ÁREA AMBIENTAL 1) nos municípios de Mariana, Barra Longa, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado, em atendimento as cláusulas 158, 159 e 160 do TTAC, bem como do distrito de Chopotó, localizado no município de Ponte Nova, que foi parcialmente impactado.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	158	Caput	Encerrada
Cláusula	159	§único	Em andamento
Cláusula	159	Caput	Em andamento
Cláusula	160	Caput	Concluída Internamente
Deliberação	186	2	Concluída Internamente
Deliberação	223	3	Concluída Internamente
Deliberação	249	3	Concluída Internamente
Deliberação	26	n/a	Concluída Internamente
Deliberação	613	2.1	Planejada
Deliberação	613	2.2	Concluída Internamente
Deliberação	619	1	Planejada
Deliberação	619	2	Planejada
Deliberação	66	Ação 1	Concluída Internamente
Deliberação	66	Ação 3	Concluída Internamente

Entregas do ano de 2023

Excepcionalmente este mês não iremos reportar a timeline referente ao programa, pois estamos em fase de atualização de datas. No próximo ciclo os dados serão reportados.

Progressos do Mês

Grandes Números

808 hectares de plantio emergencial para controle de erosão;

113 afluentes recuperados;

542 hectares de restauração florestal implantados e em manutenção.

Fatos Relevantes

As atividades de manutenção da restauração florestal vem sendo desenvolvidas nos municípios atingidos

Indicadores

I08 - Índice de solo exposto – Cenários B e C

Percentual(%)

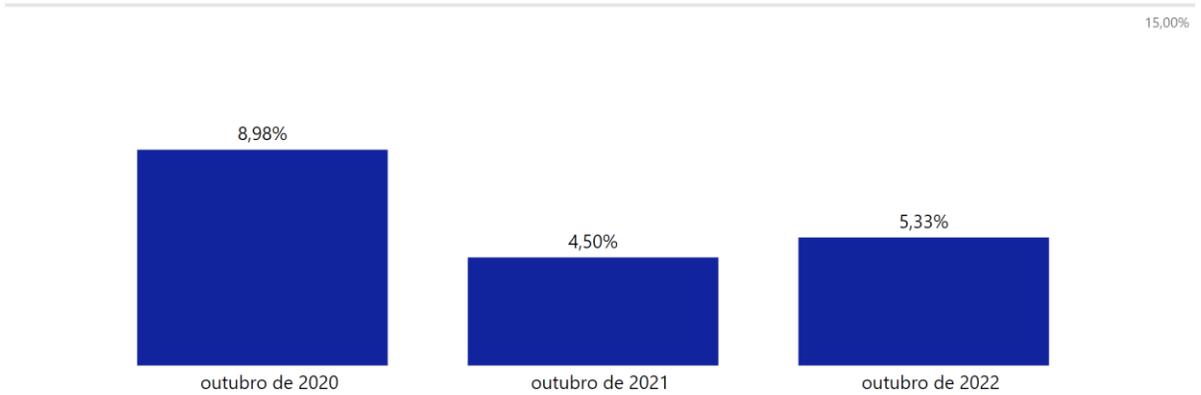


Gráfico 1: I08 - Índice de solo exposto – Cenários B e C - Frequência Bianual

Indicadores

Tabela 1. Indicadores do programa.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDADE DE MEDIDA
I01	Índice de Cobertura Vegetal	$(\text{Área total com cobertura vegetal herbácea - arbustiva} / \text{Área total passível de revegetação emergencial/inicial}) * 100$	%
I02	Índice de Solo Exposto	$(\text{Área total com solo exposto} / \text{Área total passível de revegetação emergencial/inicial}) * 100$	%
I03	Biomassa Total da Vegetação	$(0,011 * \text{banda } 2 * \text{NDVI2}) + (-0,008 * \text{Banda } 3 * \text{NDVI2})$	t/ha
I04	Índice de Redução de Perda de Solo	$(\text{Perda de solo [t/há] nas parcelas de monitoramento tratadas por bioengenharia} / \text{Perda de solo [t/há] nas parcelas de monitoramento e controle}) * 100$	%
I05	Diversidade de Espécies Nativas para Cenários A, B e C	$(\text{Diversidade de espécies nativas no sexto ano de intervenção} / \text{diversidade de espécies nativas do ecossistema de referência}) * 100$	%
I06	Densidade Total de Espécies Nativas (Mudas + Regenerantes) – Cenários A, B e C	Número de indivíduos / área amostral	Nº de indivíduos/ha
I07	Controle de Espécies Invasoras – Cenários B e C	$(\text{Área total com espécie invasora} / \text{Total das áreas em recuperação florestal (cenários B e C)}) * 100$	%

PG026 Recuperação de Áreas de Preservação Permanente APP

Eixo Terra e Água

Objetivo

Promover a recuperação de APPs e áreas de recarga hídrica degradadas do Rio Doce e tributários preferencialmente, mas não se limitando, nas sub-bacias dos rios definidos como fonte superficial de abastecimento alternativo para os municípios e distritos listados nos parágrafos segundo e terceiro da CLÁUSULA 171 deste acordo, conforme as prioridades definidas pelo COMITÊ INTERFEDERATIVO, através da deliberação 196/2018, numa extensão de 40.000 ha em 10 anos.

Este programa será executado diretamente pela Fundação Renova e/ou em cooperação com os governos dos estados de Minas Gerais e Espírito Santo.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	161	Caput	Judicializada
Deliberação	108	2	Concluída Internamente
Deliberação	108	3	Concluída Internamente
Deliberação	11	n/a	Concluída Internamente
Deliberação	133	2	Concluída Internamente
Deliberação	134	2	Concluída Internamente
Deliberação	14	n/a	Concluída Internamente
Deliberação	143	3	Concluída Internamente
Deliberação	143	5	Concluída Internamente
Deliberação	143	6	Concluída Internamente
Deliberação	144	1	Concluída Internamente
Deliberação	196	4	Concluída Internamente
Deliberação	270	4	Em Andamento
Deliberação	343	1.4	Concluída Internamente
Deliberação	44	n/a	Concluída Internamente
Deliberação	490	1	Concluída Internamente
Deliberação	490	2	Concluída Internamente
Deliberação	62	n/a	Concluída Internamente
Deliberação	65	n/a	Concluída Internamente
Deliberação	88	3	Concluída Internamente
Deliberação	89	3	Concluída Internamente
Deliberação	90	3	Concluída Internamente

Entregas do ano de 2023

Excepcionalmente este mês não iremos reportar a timeline referente ao programa, pois estamos em fase de atualização de datas. No próximo ciclo os dados serão reportados.

Progressos do Mês

Grandes Números

- 10.723,35 hectares com processo de recuperação iniciada;
- 26.101,2 hectares validados;
- 328 propriedades rurais parceiras nas ações de recuperação das áreas de preservação permanente (APP) e áreas de recarga hídrica (ARH);
- 35.818 hectares inscritos no edital;
- R\$ 1.463.830,47 pagos de PSA aos produtores rurais;

Nota:

- Redução de área no cercamento (hectares com processo de recuperação iniciada) se deve ao fato de termos realizados ajustes nas áreas efetivamente elegíveis.
- Redução nas áreas de validação (hectares validados) e de número de propriedades (propriedades rurais parceiras) se devem ao fato de termos uma grande quantidade de áreas que deixaram de fazer parte do programa devido a desistência de produtores rurais.
- Os avanços mensais (PSA pagos aos produtores rurais) reportados sofreram alteração devido aos seguintes fatores: valores que anteriormente eram considerados com base na data de lançamento e agora estão sendo considerados com base na data de compensação; e valor considerado para avanço, mas que posteriormente foi considerado como estornado.

Progressos do Mês

Fatos Relevantes

Auditoria dos dados do Monitoramento Ecológico realizado pela empresa Ambipar - Campanário/Jampruca_ PGs 26 e 27;

Doação de Sementes para o viveiro Ouro Verde_ PGs 26 e 27;

Início da força tarefa de mobilização de produtores rurais na bacia. Cerca de 40 pessoas envolvidas e 20 carros, para correr 9 municípios. Meta de mobilizar 6 mil hectares até março/2023_PG 26.

Organização da casa de Sementes_ PGs 26 e 27;

Retirada de Sementes da coletora da comunidade Quilombola São Domingos_ PGs 26 e 27;

Reunião de Kick Off- Meio Biótico. Apresentação da empresa e descrição das atividades gerais do contrato - ARD. Participação dos representantes das equipes Meio Biótico, Fundação Renova e Progen (gestão documental). Participação da equipe de gestão documental para informar sobre a criação do login de acesso à base de dados Sharepoint, para armazenamento e controle documental das informações e segurança dos dados gerados pela contratada. Equipes Meio Biótico, Fundação Renova e Progen (gestão documental)_ PGs 26 e 27;

Vistoria da equipe projetos, monitoramento e GIS em áreas de plantio com mais 8 anos para trocas de experiências_ PGs 26 e 27;

Progressos do Mês

Retirada de Sementes na Comunidade Quilombola Barra de Santo Antônio_ PGs 26 e 27;

Reunião de Entendimento do Apoio a inscrição no CAR e da Elaboração de projetos_ PGs 26 e 27;

Reunião de handover_Empresa Meio Biótico_ PGs 26 e 27;

Treinamento com equipe Progen_Corrente para alinhamento e reciclagem dos PGs 26 e 27;

Treinamento da validação de áreas de novas contratadas – Manhauçu_ PGs 26 e 27;

Treinamento de novas contratadas – corrente_ PGs 26 e 27;

Treinamento sobre metodologia de validação com equipe Progen Corrente para força tarefa prevista até abril 2023_ PGs 26 e 27;

Treinamentos Virtuais com as novas contratadas: 1. PG RVA e PIP - 2 Metodologia Validação de Áreas, 2. Rede de Sementes e Mudas e 3. Portal GIS_ PGs 26 e 27;

Treinamentos Virtuais com as novas contratadas: 1. Taxonomia de documentos, abastecimento de pastas e coleta documental e 2. GIS - entregas e mapas_ PGs 26 e 27;

Visita técnica do pretendido_Empresa Regreen_PG 26;

Indicadores

Tabela 1. Indicadores que não iniciaram a medição.

INDICADOR	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDADE DE MEDIDA	INÍCIO PREVISTO DE MEDIÇÃO
I00 – APPs e recarga hídricas recuperadas	I00 - Hectare recuperado	ha	janeiro/2024
I01 - Riqueza de espécies	I01 - (riqueza de espécies nativas no sexto ano de intervenção / riqueza de espécies nativas do ecossistema de referência) * 100	%	janeiro/2024
I02 – Densidade de regenerantes	I02 - Número de indivíduos / total de área amostral	Nº indivíduos/ha	janeiro/2024
I03 - Cobertura do dossel	I03 - (total da área amostral com cobertura do dossel / total da área amostral) * 100	%	janeiro/2024

PG027 Recuperação de Nascentes

Eixo Terra e Água

Objetivo

Promover a recuperação de 5.000 (cinco mil) nascentes, a serem definidas pelo Comitê de Bacia Hidrográfica do Doce (CBH-Doce), iniciando a recuperação de 500 (quinhentas) nascentes por ano, a contar da assinatura do TTAC, em um período máximo de 10 (dez) anos, conforme estabelecido no Plano Integrado de Recursos Hídricos do CBH-Doce, podendo abranger toda área da Bacia do Rio Doce.

Este programa será executado diretamente pela Renova e/ou em cooperação com iniciativas correlatas na bacia do rio Doce.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	163	Caput (ação 1)	Judicializada
Deliberação	135	3	Concluída Internamente
Deliberação	135	4	Concluída Internamente
Deliberação	135	5	Concluída Internamente
Deliberação	490	1	Concluída Internamente
Deliberação	490	2	Concluída Internamente
Deliberação	87	3	Concluída Internamente

Entregas do ano de 2023

Excepcionalmente este mês não iremos reportar a timeline referente ao programa, pois estamos em fase de atualização de datas. No próximo ciclo os dados serão reportados.

Progressos do Mês

Grandes Números

R\$ 436.241,98 pagos de PSA aos produtores rurais.

539 propriedades rurais parceiras nas ações de recuperação das nascentes.

4852 nascentes inscritas no edital.

2773 Nascentes Validadas.

1754 nascentes com o processo de recuperação iniciada.

Nota:

- Redução do número de propriedades (propriedades rurais parceiras) se deve ao fato de termos uma grande quantidade de áreas que deixaram de fazer parte do programa devido a desistência de produtores rurais.
- Os avanços mensais (PSA pagos aos produtores rurais) reportados sofreram alteração devido aos seguintes fatores: valores que anteriormente eram considerados com base na data de lançamento e agora estão sendo considerados com base na data de compensação; valor considerado para avanço, mas que posteriormente foi considerado como estornado.

Progressos do Mês

Fatos Relevantes

Vistoria da equipe projetos, monitoramento e GIS em áreas de plantio com mais 8 anos para trocas de experiências_ PGs 26 e 27.

Treinamentos Virtuais com as novas contratadas: 1. Taxonomia de documentos, abastecimento de pastas e coleta documental e 2. GIS - entregas e mapas_PGs 26 e 27.

Treinamentos Virtuais com as novas contratadas: 1. PG RVA e PIP - 2 Metodologia Validação de Áreas, 2. Rede de Sementes e Mudanças e 3. Portal GIS_ PGs 26 e 27.

Treinamento sobre metodologia de validação com equipe Progen Corrente para força tarefa prevista até abril 2023_ PGs 26 e 27.

Treinamento de novas contratadas – corrente_ PGs 26 e 27.

Treinamento da validação de áreas de novas contratadas – Manhauçu_ PGs 26 e 27.

Treinamento com equipe Progen_Corrente para alinhamento e reciclagem dos PGs 26 e 27.

Reunião de Kick Off- Meio Biótico. Apresentação da empresa e descrição das atividades gerais do contrato - ARD. Participação dos representantes das equipes Meio Biótico, Fundação Renova e Progen (gestão documental). Participação da equipe de gestão documental para informar sobre a criação do login de acesso à base de dados Sharepoint, para armazenamento e controle documental das informações e segurança dos dados gerados pela contratada. Equipes Meio Biótico, Fundação Renova e Progen (gestão documental) PGs 26 e 27.

Reunião de handover_Empresa Meio Biótico.

Reunião de Entendimento do Apoio a inscrição no CAR e da Elaboração de projetos_ PGs 26 e 27.

Retirada de Sementes na Comunidade Quilombola Barra de Santo Antônio_ PGs 26 e 27.

Retirada de Sementes da coletora da comunidade Quilombola São Domingos_ PGs 26 e 27.

Organização da casa de Sementes_ PGs 26 e 27.

Doação de Sementes para o viveiro Ouro Verde_ PGs 26 e 27.

Auditoria dos dados do Monitoramento Ecológico realizado pela empresa Ambipar - Campanário/Jampruca_ PGs 26 e 27.

Indicadores

Tabela 1. Indicadores que não iniciaram a medição.

INDICADOR	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDADE DE MEDIDA	INÍCIO PREVISTO DE MEDIÇÃO
I00 – Nascentes recuperadas	I00 - Nascente Recuperada	ha	janeiro/2024
I01 - Riqueza de espécies	I01 - (riqueza de espécies nativas no sexto ano de intervenção / riqueza de espécies nativas do ecossistema de referência) * 100	%	janeiro/2024
I02A – Densidade de regenerantes (Plantio Total)	I02 - Número de indivíduos / total de área amostral	Nº indivíduos/ha	janeiro/2024
I02B – Densidade de regenerantes (Condução da regeneração)	I02 - Número de indivíduos / total de área amostral	Nº indivíduos/ha	janeiro/2024
I03 - Cobertura do dossel	I03 - (total da área amostral com cobertura do dossel / total da área amostral) * 100	%	janeiro/2024

PG028 Conservação da Biodiversidade

Eixo Terra e Água

Objetivo

Identificar, mensurar e monitorar os impactos agudos e crônicos sobre a biota e ambientes do rio Doce e tributários, da foz, costeiros, estuarinos e marinhos, implementar medidas para a recuperação e conservação desta biota nos ambientes potencialmente impactados pelo rompimento da barragem de Fundão e avaliar a efetividade dessas medidas.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	164	a (ação 1)	Encerrada
Cláusula	164	a (ação 2)	Encerrada
Cláusula	164	a (ação 3)	Encerrada
Cláusula	164	b	Encerrada
Cláusula	164	c (ação 1)	Concluída Internamente
Cláusula	164	c (ação 2)	Em andamento
Cláusula	165	Inc I - a-b	Concluída Internamente
Cláusula	165	Inc II - a	Concluída Internamente
Cláusula	165	Inc II - b	Concluída Internamente
Cláusula	165	Inc III - ES	Em andamento
Cláusula	165	Inc III - MG	Judicializada
Cláusula	166	§1º	Em andamento
Cláusula	166	§2º	Em andamento
Deliberação	102	2	Concluída Internamente
Deliberação	112	2	Concluída Internamente
Deliberação	113	2	Concluída Internamente
Deliberação	148	3	Concluída Internamente
Deliberação	148	4	Concluída Internamente
Deliberação	159	2	Concluída Internamente
Deliberação	159	3	Judicializada
Deliberação	212	3	Concluída Internamente
Deliberação	218	3	Concluída Internamente
Deliberação	218	4	Concluída Internamente
Deliberação	279	2	Concluída Internamente
Deliberação	279	3	Concluída Internamente
Deliberação	282	1	Concluída Internamente
Deliberação	282	2	Concluída Internamente
Deliberação	336	1	Concluída Internamente

Deliberação	337	1	Concluída Internamente
Deliberação	347	1.3	Concluída Internamente
Deliberação	347	1.4	Concluída Internamente
Deliberação	385	3.2	Concluída Internamente
Deliberação	385	3.3	Concluída Internamente
Deliberação	392	1	Concluída Internamente
Deliberação	447	1	Judicializada
Deliberação	450	2	Judicializada
Deliberação	450	5	Concluída Internamente
Deliberação	461	3	Concluída Internamente
Deliberação	578	2	Concluída Internamente
Deliberação	579	1	Concluída Internamente
Deliberação	607	2	Planejada
Deliberação	607	3	Planejada
Deliberação	631	2	Planejada
Deliberação	74	1	Concluída Internamente
Deliberação	79	n/a	Concluída Internamente

Entregas do ano de 2023

Excepcionalmente esse mês não iremos reportar a timeline referente ao programa, pois estamos em fase de atualização de datas. No próximo ciclo os dados serão reportados.

Progressos do Mês

Fatos Relevantes

Em 19 de janeiro de 2023 foi encaminhado o ofício FR.2023.0134 referente à apresentação de relatório e dados brutos do Subprojeto IIIA (Dinâmica populacional e evolutiva da ictiofauna na bacia do rio Doce - Análise populacional com uso de marcadores RADSeq). Esse Subprojeto compõe o “Estudo da Ictiofauna da bacia do rio Doce após o rompimento da barragem de rejeito da Samarco”, como parte do atendimento à Deliberação CIF nº 521 de 05 de agosto de 2021 e à Cláusula 165 do TTAC.

Em 20 de janeiro de 2023 foi encaminhado o ofício FR.2023.0147 referente ao Atendimento do Item 3 da Deliberação CIF nº 607, de 15 de setembro de 2022, bem como o Anexo I, “Plano de Conservação e Avaliação Contínua de Impactos sobre as Tartarugas Marinhas na Região da Foz do Rio Doce, Espírito Santo, Brasil”, proposta construída conjuntamente com a Fundação Projeto Tamar.

Em 26 de janeiro de 2023 foi encaminhado o ofício FR.2023.0195 referente à apresentação do Relatório Mensal de Atividades da FUNDAÇÃO PRÓ-TAMAR correspondente ao período de 16 dezembro de 2022 a 15 de janeiro de 2023, em atendimento à Cláusula 165 do TTAC.

Em 26 de janeiro de 2023 foi encaminhado o ofício FR.2023.0170 referente à apresentação do Plano de Trabalho do projeto “Diagnóstico e Análise Integrada da Biodiversidade Aquática Dulcícola do Rio Doce”.

Em 27 de janeiro de 2023 foi encaminhado o ofício FR.2023.0214 referente a Otimização dos Relatórios do PMBA a serem entregues, em resposta ao Ofício SEI nº 85/2022-CTBio/DIBIO/ICMBio.

Indicadores

I01 – Execução de campanhas de campo (Cláusulas 165)

Meta Global: 100%
Percentual(%)

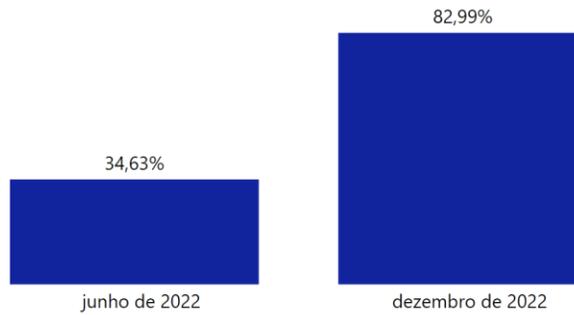


Gráfico 1: I01 – Execução de campanhas de campo (Cláusulas 165) - Frequência Semestral

PG029 Programa de Fortalecimento das Estruturas de Triagem e Reabilitação da Fauna Silvestre

Eixo Terra e Água

Objetivo

- Efetuar a construção e o aparelhamento de dois Centros de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS), um em Minas Gerais e outro no Espírito Santo; e
- Assegurar recursos para a manutenção operacional desses centros por um período de três anos, contados a partir de sua entrega, de acordo com o Plano de Gestão a ser estabelecido pelo órgão gestor responsável.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	167	Caput	Em andamento
Cláusula	167	§1º	Concluída Internamente
Cláusula	167	§2º	Em andamento
Deliberação	218	3	Concluída Internamente
Deliberação	218	4	Concluída Internamente
Deliberação	478	1	Concluída Internamente
Deliberação	484	1, 2 e 3	Concluída Internamente

Entregas do ano de 2023

Excepcionalmente este mês não iremos reportar a timeline referente ao programa, pois estamos em fase de atualização de datas. No próximo ciclo os dados serão reportados.

Progressos do Mês

Fatos Relevantes

Em 31/01/2023 foi concluído, pela Engenharia, o Projeto Básico de Utilidades do CETRAS-ES.

Indicadores

I05 – Aderência ao cronograma de elaboração de projetos do CETRAS ES

Meta Global: 100%
Percentual(%)



Gráfico 1: I05 – Aderência ao cronograma de elaboração de projetos do CETRAS ES - Frequência Semestral

O percentual de avanço do cronograma planejado para o período escalonado é de 28%. A meta de 100% de aderência ao cronograma foi cumprida.

PG030 Fauna e Flora Terrestre

Eixo Terra e Água

Objetivo

- Identificar e caracterizar os impactos do rompimento da barragem de Fundão sobre as espécies da biodiversidade terrestre na área de estudo;
- Apresentar e executar um plano de ação para conservação desta biota conforme resultados dos estudos de impacto;
- Demonstrar/indicar os efeitos da implementação do plano de ação sobre a biodiversidade terrestre.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	168	§1º	Encerrada
Cláusula	168	§2º	Em andamento
Cláusula	168	Caput	Encerrada
Deliberação	132	2	Concluída Internamente
Deliberação	218	3	Concluída Internamente
Deliberação	218	4	Concluída Internamente
Deliberação	449	3	Concluída Internamente
Deliberação	517	3	Concluída Internamente
Deliberação	91	2	Concluída Internamente
Deliberação	91	3	Concluída Internamente

Entregas do ano de 2023

Excepcionalmente esse mês não iremos reportar a timeline referente ao programa, pois estamos em fase de atualização de datas. No próximo ciclo os dados serão reportados.

Progressos do Mês

Fatos Relevantes

Em 10 de janeiro de 2023 foram iniciadas as amostragens de campo da Campanha Chuvosa do monitoramento da Fauna terrestre

Em 14 de janeiro de 2023 foi recebido o relatório semestral do Projeto de Conservação e manejo de espécies da fauna ameaçadas de extinção na bacia do rio Doce, executado por equipe de pesquisadores da UFV.

Grandes Números

10 grupos faunísticos, além da flora terrestre, monitorados na área de estudo

49 ações definidas no Plano de Ação para Conservação da Biodiversidade Terrestre

Indicadores

I01 – Execução do Plano de Ação

Meta Global: 100%

Percentual(%)



Gráfico 1: I01 – Execução do Plano de Ação - Frequência Sazonal

Em resposta ao questionamento apresentado no relatório de auditoria EY ACP.PG030.03 (Procedimento 4: Verificação de resultados e recálculo do indicador I01 aferido pela Fundação Renova), o respectivo indicador I01 será submetido a GMUD adequando o cálculo do indicador com a definição do programa a partir de 2023.

PG031 Coleta e Tratamento de Esgoto e Destinação de Resíduos Sólidos

Eixo Reconstrução e Infraestrutura

Objetivo

Objetivo Geral:

O objetivo geral do Programa é contribuir para “acelerar o processo de recuperação da Bacia do Rio Doce, regiões estuarinas, costeiras e marinha, em especial a qualidade e a quantidade de águas nos tributários e assim na calha principal impactada”; em conformidade com o Termo de Transação e de Ajustamento de Conduta (TTAC), por meio da disponibilização de recursos financeiros, no valor de R\$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais), provenientes da Cláusula nº 169 para os 39 municípios da Área Ambiental 2 e R\$ 17.000.000,00 (dezesete milhões de reais), provenientes da Cláusula 232 do TTAC, para atendimento ao pleito do Consórcio Público para o Tratamento e Destinação Final Adequada de Resíduos Sólidos da Região Doce Oeste do Estado do Espírito Santo (CONDOESTE), para ações de esgotamento sanitário e de destinação de resíduos sólidos.

Objetivos Específicos:

- Disponibilizar os recursos financeiros aos municípios para as ações de elaboração ou revisão de planos municipais de saneamento básico; elaboração de projetos de sistema de esgotamento sanitário; implementação de obras de coleta e tratamento de esgotos; erradicação de lixões; implantação de aterros sanitários regionais; implantação, ampliação e melhorias de programas de coleta seletiva, unidades de triagem de recicláveis, unidades de tratamento de orgânicos e estações de transbordo;
- Contratar instituições financeiras públicas para realizar o repasse do recurso financeiro, para o custeio da elaboração das ações de esgotamento sanitário e destinação de resíduos sólidos urbanos;
- Fornecer apoio técnico aos municípios na formulação dos pleitos, na análise da relevância, viabilidade e aderência ao Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) e Plano de Gestão Integrada e Resíduos Sólidos (PGIRS); na elaboração de termos de referência e editais dos processos licitatórios, contratação e acompanhamento da execução das ações estruturantes e estruturais, bem como na prestação de contas físico-financeira das soluções implementadas;
- Fornecer capacitação aos municípios, para subsidiá-los técnica e institucionalmente no andamento dos planos, projetos e obras previstos no programa.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	169	Caput	Em andamento
Cláusula	170	4ª Diretriz	Encerrada
Cláusula	170	Inc I	Encerrada
Cláusula	170	Inc II	Encerrada
Cláusula	170	Inc III	Encerrada
Cláusula	170	Inc IV	Encerrada
Cláusula	170	Inc V	Encerrada
Deliberação	122	n/a	Concluída Internamente
Deliberação	224	5	Concluída Internamente
Deliberação	259	2	Concluída Internamente
Deliberação	259	3	Em andamento
Deliberação	295	1	Concluída Internamente
Deliberação	295	2	Concluída Internamente
Deliberação	635	2	Planejada
Deliberação	638	1	Concluída Internamente
Deliberação	75	4-4.1	Concluída Internamente
Deliberação	75	4-4.2	Concluída Internamente
Deliberação	75	4-4.3	Concluída Internamente

Entregas do ano de 2023

Excepcionalmente este mês não iremos reportar a timeline referente ao programa, pois estamos em fase de atualização de datas. No próximo ciclo os dados serão reportados.

Progressos do Mês

Grandes Números

No mês de janeiro de 2023 a equipe técnica realizou 102 visitas e/ou reuniões de apoio técnico aos municípios.

No mês de janeiro de 2023 foram ofertadas 0 oficinas de capacitação para os municípios da Área Ambiental 2;

No mês de janeiro de 2023 foram repassados R\$3.080.266,51 para ações dos municípios de Aimorés, Colatina, Galileia, Governador Valadares, Ipaba, Periquito, Rio Casca, Sem Peixe e do Consórcio Condoeste;

Progressos do Mês

Fatos Relevantes

Em janeiro de 2023, foi realizado repasse ao Consórcio Condoeste, no valor de R\$ 871.783,55 referente a implantação da Central de Tratamento de Resíduos – CTR Colatina, incluindo a retirada da linha de transmissão de energia elétrica situada no terreno da CTR Colatina;

Em janeiro de 2023, foi realizado repasse ao município de Aimorés, no valor de R\$ 170.833,55, referente a elaboração do projeto de ampliação do aterro sanitário e reforma da Usina de Triagem e Compostagem – UTC e do projeto, incluindo levantamento topográfico e licenciamento para tratamento dos esgotos sanitários gerados somente na sede.

Em janeiro de 2023, foi realizado repasse ao município de Colatina, no valor de R\$ 83.438,37, referente a obra de complementação do SES do Lado Norte da sede municipal - EEEs, LRs e interceptor;

Em janeiro de 2023, foi realizado repasse ao município de Galileia, no valor de R\$ 697.100,00, referente a aquisição de terrenos para implantação do sistema de esgotamento sanitário da sede do município;

Em janeiro de 2023, foi realizado repasse ao município de Governador Valadares, no valor de R\$ 38.460,32, referente a elaboração de projetos de sistema de esgotamento sanitário da ETE Santos Dumont;

Em janeiro de 2023, foi realizado repasse ao município de Ipaba, no valor de R\$ 62.487,67, referente a elaboração de projetos de sistema de esgotamento sanitário da sede do município e distritos São Sebastião do Baixio, Pedra Corrida e Serraria;

Em janeiro de 2023, foi realizado repasse ao município de Rio Casca, no valor de R\$ 896.075,43, referente a execução de obras da segunda etapa do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) da sede do município;

Em janeiro de 2023, foi realizado repasse ao município de Sem Peixe, no valor de R\$ 227.614,90, referente a obra de implantação de tratamento de esgotos do Distrito de São Bartolomeu;

Em janeiro de 2023, foi realizado repasse ao município de Periquito, no valor de R\$ 32.472,72, referente a elaboração de projetos de sistema de esgotamento sanitário da sede do município e distritos São Sebastião do Baixio, Pedra Corrida e Serraria;

Indicadores de Resultados

I01 – Percentual do valor repassado total

Meta Global: 100%
Percentual(%)



Gráfico 1:I01 – Percentual do valor repassado total - Frequência Trimestral

I02 - Percentual do Valor repassado por município/consórcio

Meta Global: 100%
Percentual(%)

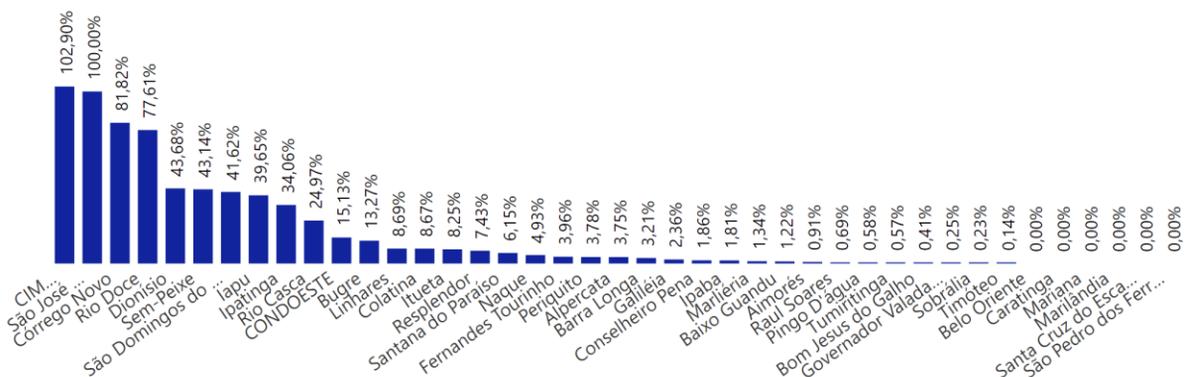


Gráfico 2: I02 - Percentual do Valor repassado por município/consórcio - Frequência Trimestral

Como premissa o valor de correção de IPCA utilizado para o cálculo foi do ano de 2021, o mesmo será atualizado na segunda quinzena de 2023, com relação ao ano de 2022.

Indicadores de Resultados

I03 – Percentual de Apoio Técnico disponibilizado aos Municípios/ Consórcios

Meta Global: 80%
Percentual(%)




Gráfico 3: I03 – Percentual de Apoio Técnico disponibilizado aos Municípios/ Consórcios - Frequência Trimestral

I04 – Percentual de avaliações qualitativas do Apoio Técnico

Meta Global: 80%
Percentual(%)

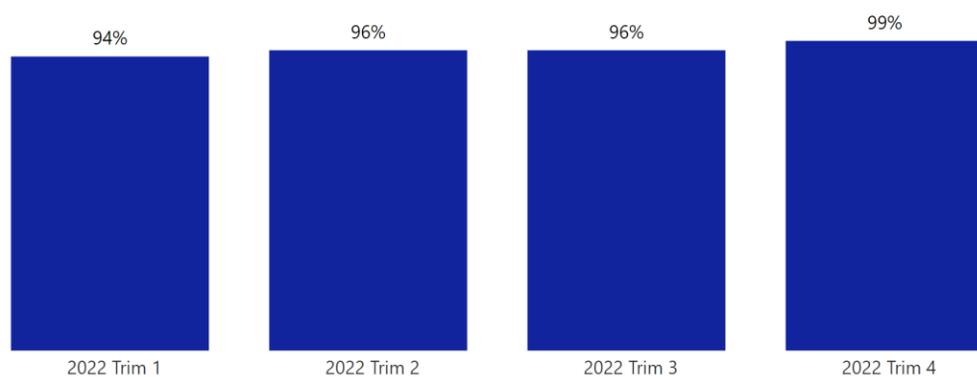


Gráfico 4: I04 – Percentual de avaliações qualitativas do Apoio Técnico - Frequência Trimestral

Indicadores de Resultados

I05 – Percentual de oficinas de capacitação ofertadas aos municípios/ consórcios

Meta Global: 80%

Percentual(%)




Gráfico 5: I05 – Percentual de oficinas de capacitação ofertadas aos municípios/ consórcios - Frequência Trimestral

I06 – Percentual de avaliações qualitativas das oficinas capacitação

Meta Global: 80%

Percentual(%)




Gráfico 6I06 – Percentual de avaliações qualitativas das oficinas capacitação - Frequência Trimestral

Indicadores Físicos e Qualidade da Água

I07- Percentual de Coleta de Esgoto

Percentual(%)



Gráfico 7: I07- Percentual de Coleta de Esgoto - Frequência Anual

I08 – Percentual de Tratamento de Esgoto

Percentual(%)




Gráfico 8: I08 – Percentual de Tratamento de Esgoto - Frequência Anual

- Data base 2020 Os dados referentes ao ano de 2021 ainda não foram divulgados pelo Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento SNIS;
- I 07 No SNIS havia dados disponíveis de 11 municípios, os demais não foram contabilizados na fórmula;
- I 08 No SNIS havia dados disponíveis de 25 municípios, os demais não foram contabilizados na fórmula.

Indicadores Físicos e Qualidade da Água

I09 – Percentual de municípios com coleta seletiva

Percentual(%)



Gráfico 9: I09 – Percentual de municípios com coleta seletiva - Frequência Anual

I10 - Percentual de municípios com presença de lixões ou aterros controlados

Percentual(%)




Gráfico 10: I10 - Percentual de municípios com presença de lixões ou aterros controlados - Frequência Anual

- Data base 2020 Os dados referentes ao ano de 2021 ainda não foram divulgados pelo Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento SNIS;
- I 09 No SNIS havia dados disponíveis de 32 municípios, os demais não foram contabilizados na fórmula;
- I 10 No SNIS havia dados disponíveis de 15 municípios, os demais não foram contabilizados na fórmula.

Indicadores Físicos e Qualidade da Água

I11 - Percentual das faixas do Índice de qualidade da água (IQA)

Percentual(%)

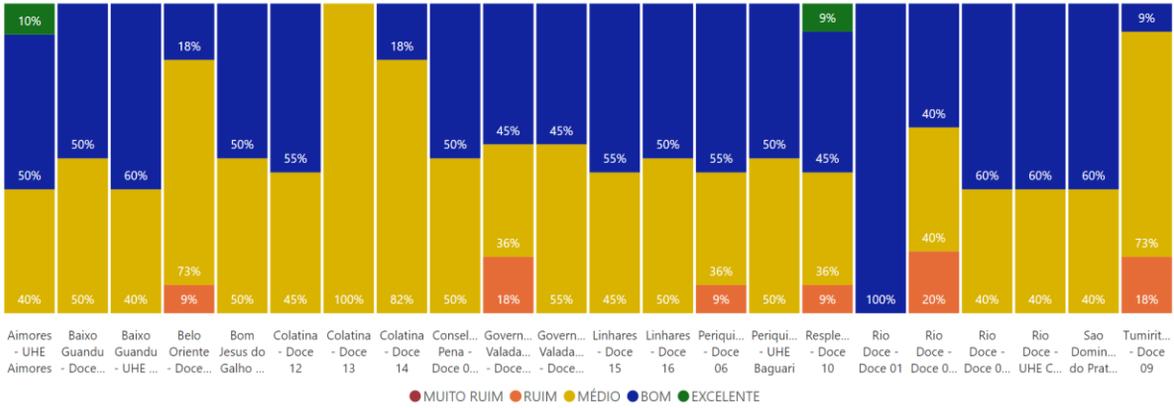


Gráfico 11: I11 - Percentual das faixas do Índice de qualidade da água (IQA)- Frequência Anual

I12 - Percentual das faixas do Índice para Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO)

Percentual(%)

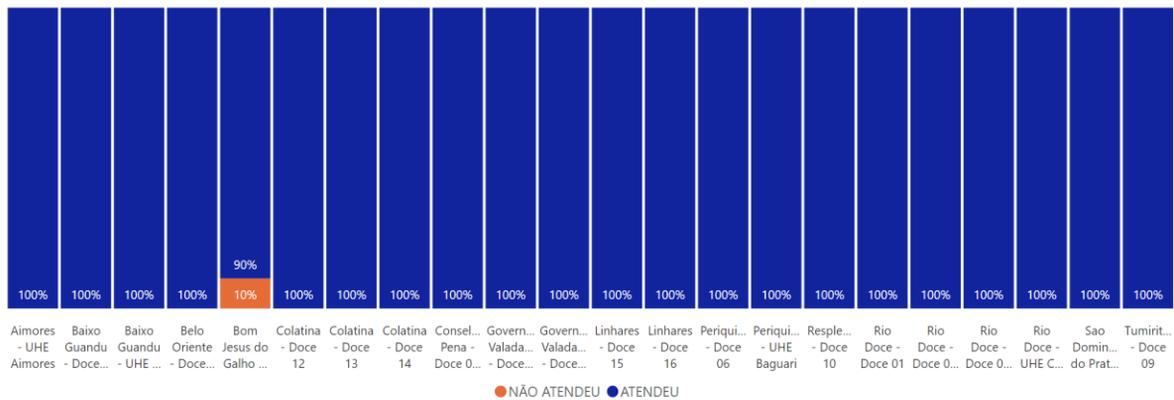


Gráfico 12: I12 - Percentual das faixas do Índice para Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) - Frequência Anual

Indicadores Físicos e Qualidade da Água

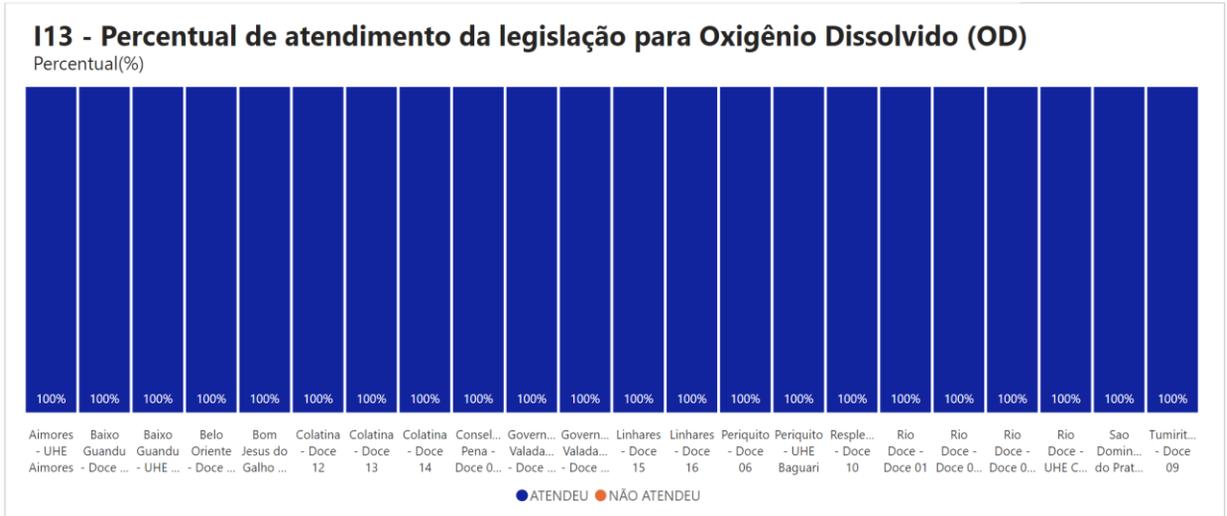


Gráfico 13: I13 - Percentual de atendimento da legislação para Oxigênio Dissolvido (OD) - Frequência Anual

PG032 Melhoria dos Sistemas de Abastecimento de Água

Eixo Reconstrução e Infraestrutura

Objetivo

Promover alternativas de captação e adução de água, visando garantir, em parte, o reestabelecimento do abastecimento de água com a redução de dependência relativa ao rio Doce, e promover melhorias referentes a tratamentos de água para abastecimento público, por meio de medidas de cunhos reparatório e compensatório, em municípios/localidades que tiveram seus sistemas de abastecimento temporariamente inviabilizados.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	171	Caput (obra)	Judicializada
Cláusula	171	Caput (projeto)	Judicializada
Deliberação	10	n/a	Concluída Internamente
Deliberação	107	3.1	Concluída Internamente
Deliberação	107	4	Concluída Internamente
Deliberação	123	2	Concluída Internamente
Deliberação	123	3	Judicializada
Deliberação	124	2	Concluída Internamente
Deliberação	124	4	Concluída Internamente
Deliberação	16	n/a	Judicializada
Deliberação	185	2	Concluída Internamente
Deliberação	185	3	Concluída Internamente
Deliberação	185	4	Judicializada
Deliberação	185	5	Judicializada
Deliberação	185	6	Judicializada
Deliberação	2	1	Em Andamento
Deliberação	258	2	Judicializada
Deliberação	258	4	Concluída Internamente
Deliberação	258	5	Concluída Internamente
Deliberação	308	2	Judicializada
Deliberação	315	1	Concluída Internamente
Deliberação	325	1	Judicializada
Deliberação	33	1	Concluída Internamente
Deliberação	33	i e ii	Em Andamento
Deliberação	378	5	Concluída Internamente
Deliberação	378	6	Concluída Internamente
Deliberação	379	1	Concluída Internamente
Deliberação	379	2	Concluída Internamente
Deliberação	379	3	Concluída Internamente
Deliberação	4	n/a	Judicializada

Deliberação	443	a	Concluída Internamente
Deliberação	76	3	Concluída Internamente
Deliberação	76	4	Concluída Internamente
Deliberação	76	5	Concluída Internamente
Deliberação	98	1	Concluída Internamente

Entregas do Ano de 2023

Excepcionalmente este mês não iremos reportar a timeline referente ao programa, pois estamos em fase de atualização de datas. No próximo ciclo os dados serão reportados.

Progressos do Mês

Fatos Relevantes

Em 05 de janeiro de 2023 foi emitida a licença ambiental para a execução da obra de implantação de 06 reservatórios de água na ETA Columbia, cidade de Colatina/ES.

Em 05 de janeiro de 2023, a equipe de perícia juntou aos autos do processo judicial o Laudo complementar – Esclarecimento aos Quesitos das Partes Interessadas da Etapa 1.2 (Análise dos Cronogramas e Projetos) para a localidade Pedras, município de Mariana/MG (ID 1321912882).

Em 09 de janeiro de 2023, em reunião por videoconferência via Microsoft Teams, a Fundação Renova apresentou para a equipe da perícia a atualização do resumo do status dos projetos e obras das 25 localidades relacionadas no Item 1 da Decisão Judicial do Eixo Prioritário N° 9.

Em 19 de janeiro de 2023, a equipe de perícia juntou aos autos do processo judicial o Laudo complementar – Esclarecimento aos Quesitos das Partes Interessadas da Etapa 1.2 (Análise dos Cronogramas e Projetos) para a localidade Sede do município de Tumiritinga/MG (ID 1326005395).

Nos dias 10 e 11 de janeiro de 2023, a equipe de perícia realizou visita técnica para acompanhamento do andamento das obras em execução pela Fundação Renova e subcontratados, atividades correlatas à Etapa 1.3 – Obras, Comissionamento e Monitoramento do Plano de Trabalho, nas seguintes localidades:

- Pedra Corrida, município de Periquito/MG;
- Sede do município de Governador Valadares/MG;
- Sede do município de Tumiritinga/MG;
- Sede do município de Galiléia/MG;
- Boninsegna, município de Marilândia/ES.

Grandes Números

17 sistemas de tratamento de água concluídos, entre Estações de Tratamento de Água (ETAs), convencionais e tratamentos simplificados.

18 Adutoras concluídas (entre concluídas e reformadas)

Indicadores



Gráfico 1: I03 A – Índice de Localidades com Termos de Entrega e Recebimento - Captações Alternativas - Frequência Mensal

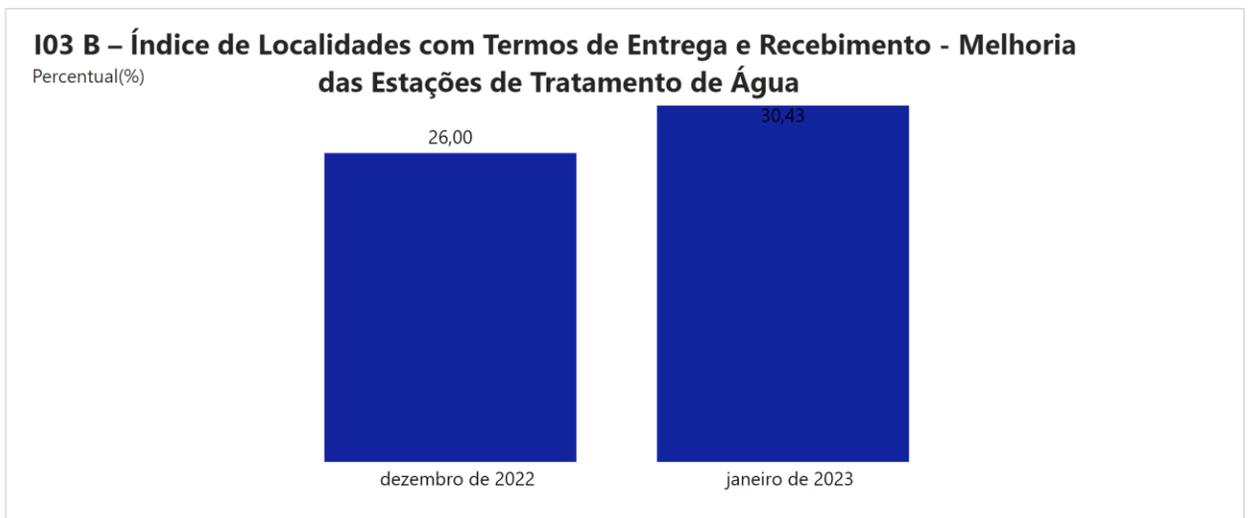


Gráfico 2: I03 B – Índice de Localidades com Termos de Entrega e Recebimento - Melhoria das Estações de Tratamento de Água - Frequência Mensal

Indicadores

I04 - Índice de Localidades com Captações Alternativas Concluídas e Aptas a Operar

Meta Global: 100%
Percentual(%)



Gráfico 3: I04 - Índice de Localidades com Captações Alternativas Concluídas e Aptas a Operar - Frequência Trimestral

I05 - Índice de Localidades com Melhorias das Estações de Tratamento de Água Concluídas

Meta Global: 100%
Percentual(%)




Gráfico 4: I05 - Índice de Localidades com Melhorias das Estações de Tratamento de Água Concluídas - Frequência Trimestral

PG033 Programa de Educação Ambiental

Eixo Pessoas e Comunidade

Objetivo

Implementar processos de educação socioambiental que desenvolvam competências e habilidades para engajar pessoas e coletivos no desenvolvimento de iniciativas para a revitalização dos territórios atingidos.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	172	Caput	Em andamento
Deliberação	136	1	Concluída Internamente
Deliberação	240	1	Concluída Internamente
Deliberação	288	1	Concluída Internamente
Deliberação	288	2	Em andamento
Deliberação	343	1.4	Concluída Internamente
Deliberação	549	2	Planejada

Entregas do ano de 2023

Excepcionalmente este mês não iremos reportar os dados da timeline referente ao programa, pois estamos em fase de atualização de datas. No próximo ciclo os dados serão reportados.

Progressos do Mês

Não houve progressos neste mês

Indicadores

I01 – Número de bolsas de estudo disponibilizadas para o Curso de Aperfeiçoamento em Minas

Meta Global: 3000
Inteiro




Gráfico 1: I01 – Número de bolsas de estudo disponibilizadas para o Curso de Aperfeiçoamento em Minas - Frequência Semestral

I19 – Número de vagas disponibilizadas para a capacitação de Lideranças Jovens

Meta Global: 1000
Quantidade



Gráfico 2: I19 – Número de vagas disponibilizadas para a capacitação de Lideranças Jovens - Frequência Anual

PG034 Programa de Preparação para Emergências Ambientais

Eixo Pessoas e Comunidade

Objetivo

Implantação de ações de incremento às estruturas de apoio para os sistemas de emergências ambientais nos Municípios de Mariana, Barra Longa, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado, de forma integrada com a Defesa Civil, conforme previsto na Cláusula 173 do TTAC, promovendo a ampliação da percepção das comunidades e a autonomia da defesa civil para atuação, gestão e convivência em cenários de riscos e desastres.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	173	§1º	Encerrada
Cláusula	173	§2º	Encerrada
Cláusula	173	Caput (ação 1)	Concluída Internamente
Cláusula	173	Caput (ação 2)	Em andamento
Deliberação	128	2	Concluída Internamente
Deliberação	303	2	Concluída Internamente
Deliberação	357	2	Concluída Internamente
Deliberação	357	3	Concluída Internamente
Deliberação	439	2	Concluída Internamente
Deliberação	623	3	Em andamento

Entregas do ano de 2023

Excepcionalmente este mês não iremos reportar a timeline referente ao programa, pois estamos em fase de atualização de datas. No próximo ciclo os dados serão reportados.

Progressos do Mês

Não houve progressos neste mês

Indicadores

I02 - Taxa de resposta às demandas de Promoção à capacitação da Defesa Civil

Meta Global: 100%
Percentual(%)



Gráfico 1: I02 - Taxa de resposta às demandas de Promoção à capacitação da Defesa Civil - Frequência Anual

I03 - Índice de Fortalecimento do Sistema de Proteção e Defesa Civil

Meta Global: 80%
Percentual(%)



Gráfico 2: I03 - Índice de Fortalecimento do Sistema de Proteção e Defesa Civil - Frequência Anual

Indicadores

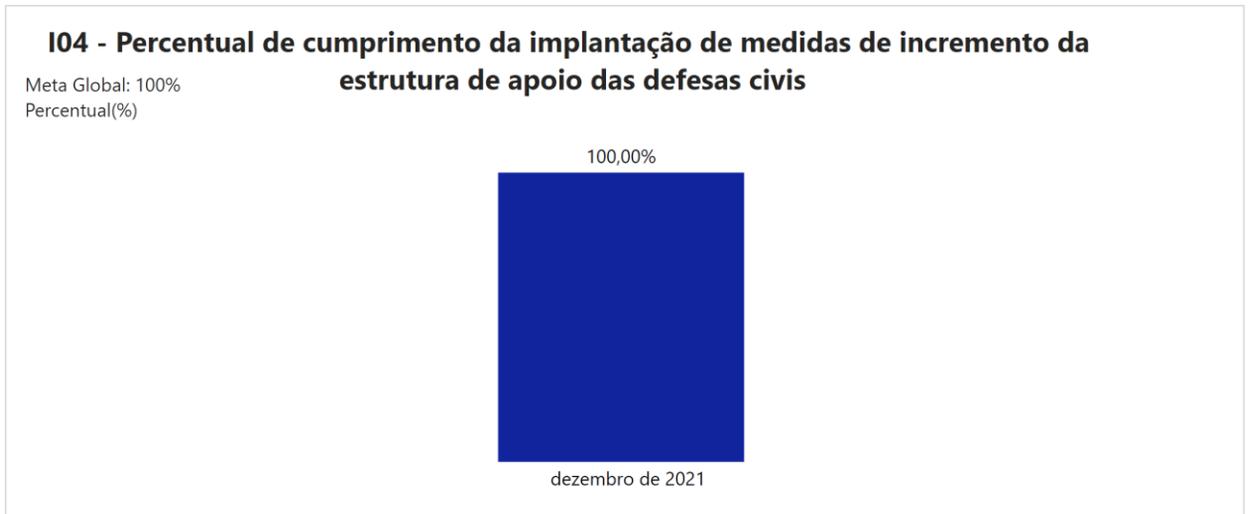


Gráfico 3: I04 - Percentual de cumprimento da implantação de medidas de incremento da estrutura de apoio das defesas civis - Frequência Anual

Os indicadores do programa foram aprovados pelo CIF, porém ainda estão fora do período de medição.

Tabela 1. Indicadores que não iniciaram a medição.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	INÍCIO DA MEDIÇÃO
I01	Percentual de indivíduos capacitados (cursos de longa duração)	%	Junho/25

PG035 Informação para a População

Eixo Pessoas e Comunidade

Objetivo

O Programa de Informação para a População tem como objetivo salvaguardar e disponibilizar, de modo descentralizado e acessível, um acervo de dados e informações sobre o rompimento da barragem de Fundão e seus desdobramentos. O acervo deverá incluir: (i) a memória, o modo de vida e os processos socioeconômicos e socioambientais relacionados às comunidades e municípios atingidos; e (ii) estudos técnicos e ações de reparação e compensação. O acesso por moradores locais, pessoas atingidas, poder público, comunidade acadêmica e outros públicos será promovido por meio de espaços físicos e digitais e estratégias itinerantes que constituem o Centro de Informação Técnica.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	174	§1º	Em andamento
Cláusula	174	Caput	Em andamento
Cláusula	65	Caput	Em andamento
Deliberação	229	3	Concluída Internamente
Deliberação	229	4	Concluída Internamente
Deliberação	229	5	Concluída Internamente
Deliberação	306	2	Concluída Internamente
Deliberação	306	4.1	Concluída Internamente
Deliberação	306	4.2	Concluída Internamente
Deliberação	376	2	Concluída Internamente
Deliberação	437	1- a	Concluída Internamente
Deliberação	437	1- b	Concluída Internamente
Deliberação	437	1- c	Concluída Internamente
Deliberação	437	1- d	Concluída Internamente
Deliberação	437	1- e	Concluída Internamente
Deliberação	437	1- f	Concluída Internamente
Deliberação	437	1- g	Concluída Internamente
Deliberação	437	1- h	Concluída Internamente
Deliberação	437	1- i	Concluída Internamente
Deliberação	437	1- j	Concluída Internamente
Deliberação	437	1- k	Concluída Internamente
Deliberação	437	1- l	Concluída Internamente
Deliberação	500	I	Concluída Internamente
Deliberação	500	II	Concluída Internamente
Deliberação	500	III	Concluída Internamente
Deliberação	500	IV	Concluída Internamente
Deliberação	500	V	Concluída Internamente

Entregas do ano de 2023

Excepcionalmente este mês não iremos reportar a timeline referente ao programa, pois estamos em fase de atualização de datas. No próximo ciclo os dados serão reportados.

Progressos do Mês

Fatos Relevantes

A equipe do PG35 realizou, em Monsenhor Horta/MG, a Oficina Trilhas de Memórias, no período de 23 a 27 de janeiro de 2023. Estavam previstos 5 dias de atividades mas por falta de luz no distrito, a ação prevista para o dia 24 de janeiro, terça-feira, foi suspensa. A oficina foi realizada na sede da Banda musical, rua Benigno Ildelfonso Corrêa, nº 60, e direcionada para o público jovem local. Houve divulgação em estabelecimentos comerciais da comunidade e a mobilização foi feita pela equipe do Diálogo por meio das lideranças. O PG35 entrou em contato por telefone com jovens indicados por elas para realizar o convite. Foram realizadas 12 horas de atividades com o objetivo de registrar as memórias afetivas dos participantes de maneira artística e textual. Os trabalhos resultantes da oficina serão registrados em um livro e disponibilizados no site do CIT para constituírem o acervo da Coleção de "Registros dos territórios atingidos".

Grandes Números

A Plataforma Interativa www.citdoriodoce.org registrou 20.729 acessos no mês de janeiro/2023. As medições da Plataforma Interativa do CIF tiveram início em 25/11/2021 e até o dia 31/01/2023 já foram registrados 60.610 acessos. (Nota informativa: o relatório do Google Analytics computa os acessos agrupados por número de novos usuários, ou seja, apesar de termos 20.729 acessos totais, o número de acessos apontados como 21mil é referente aos 20.706 usuários novos que realizaram acessos à plataforma)

Em janeiro de 2023 foi realizada 01 atividade de Descentralização e Itinerância. No total já foram realizadas 16 atividades pelo programa.

Indicadores

Os indicadores do Programa foram construídos, revisados e apresentados à CT-PDCS que não apresentou restrição ou divergência. A aprovação definitiva deles está condicionada à aprovação da Definição do Programa.

PG036 Comunicação Nacional e Internacional

Eixo Pessoas e Comunidade

Objetivo

- Estabelecer sítio eletrônico em no mínimo dois idiomas, para divulgar as ações e o andamento dos programas desenvolvidos em função do TTAC. (Cláusula 175 conforme anexo I, e Revisão Extraordinária número 3, de 30 de agosto de 2018);
- Comunicar à sociedade, às comunidades atingidas, aos órgãos reguladores e aos diversos públicos relacionados sobre as ações conduzidas pela Fundação Renova, também como forma de contrapor boatos e notícias de teor falso.
- Ampliar o alcance das informações e abrir espaço para discussão e construção coletiva de ideias relacionadas ao processo de reparação e compensação conduzidos pela Fundação Renova.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	175	Caput (ação 1)	Concluída Internamente
Cláusula	175	Caput (ação 2)	Em andamento
Deliberação	506	2.2	Concluída Internamente
Deliberação	530	1	Concluída Internamente

Entregas do ano de 2023

Excepcionalmente este mês não iremos reportar a timeline referente ao programa, pois estamos em fase de atualização de datas. No próximo ciclo os dados serão reportados.

Progressos do Mês

Fatos Relevantes

Atualização das entregas e fatos relevantes do mês reportadas pelos demais programas no relatório mensal do CIF (Comitê Interfederativo) e nas páginas dos programas hospedados no site, nas versões em português e inglês.

Grandes Números

No mês de janeiro/2023 o volume de acessos no site foi de 86.959. Além disso foram publicados 31 documentos, 9 vídeos e 3 notícias em nossos canais digitais (site e/ou redes sociais).

Indicadores

I01 – Acessos das cidades prioritárias ao site

Meta Global: 15.000

Unidade




Gráfico 1: I01 – Acessos das cidades prioritárias ao site - Frequência Mensal

I02 – Visualizações de páginas de serviço

Meta Global: 20.000

Unidade




Gráfico 2: I02 – Visualizações de páginas de serviço - Frequência Mensal

Indicadores

I03 – Tempo de resposta

Meta Global: 24
Hora




Gráfico 3: I03 – Tempo de resposta - Frequência Mensal

I04 – Alcance Orgânico LinkedIn

Meta Global: 30.000
Unidade




Gráfico 4: I04 – Alcance Orgânico LinkedIn - Frequência Mensal

Indicadores

I05 – Alcance Orgânico Facebook

Meta Global: 45.000

Unidade




Gráfico 5: I05 – Alcance Orgânico Facebook- Frequência Mensal

Conforme já reportado anteriormente, o Facebook não entrega mais os dados de alcance orgânico estratificados no seu gerenciador de anúncios. Este cálculo vem sendo feito manualmente pelo PG 36 com a subtração de alcance total – alcance pago (mídia). Porém, por uma falha técnica, os posts pagos e classificados não foram computados no período de janeiro de 2023, o que impossibilitou o cálculo do alcance orgânico.

I06 – Visualizações no Youtube

Meta Global: 1.400

Unidade




Gráfico 6: I06 – Visualizações no Youtube - Frequência Mensal

PG038 Monitoramento da Bacia do Rio Doce

Eixo Terra e Água

Objetivo

Investigar e monitorar a Bacia do Rio Doce, áreas estuarinas e costeiras (isóbata 10 metros), gerando informações sobre a qualidade da água e sedimentos para subsidiar a tomada de decisão e desenvolvimento dos programas e ações correlatos.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	177	§1º	Encerrada
Cláusula	177	Caput	Em andamento
Cláusula	178	Caput	Em andamento
Deliberação	107	3.1	Concluída Internamente
Deliberação	107	4	Concluída Internamente
Deliberação	129	1	Em andamento
Deliberação	198	1	Em andamento
Deliberação	198	2	Concluída Internamente
Deliberação	198	3	Em andamento
Deliberação	247	1	Concluída Internamente
Deliberação	247	2	Em andamento
Deliberação	265	1	Concluída Internamente
Deliberação	265	2	Concluída Internamente
Deliberação	301	único	Em andamento
Deliberação	310	3.1	Concluída Internamente
Deliberação	310	3.2	Concluída Internamente
Deliberação	313	2	Concluída Internamente
Deliberação	378	5	Concluída Internamente
Deliberação	378	6	Concluída Internamente
Deliberação	381	1	Concluída Internamente
Deliberação	409	2	Concluída Internamente
Deliberação	432	1, 2,3	Concluída Internamente
Deliberação	455	1	Concluída Internamente
Deliberação	458	2	Concluída Internamente
Deliberação	458	3	Concluída Internamente
Deliberação	511	2	Concluída Internamente
Deliberação	511	3	Concluída Internamente
Deliberação	512	1	Concluída Internamente
Deliberação	512	2	Concluída Internamente
Deliberação	512	3	Concluída Internamente

Deliberação	513	1	Concluída Internamente
Deliberação	53	n/a	Concluída Internamente
Deliberação	572	3	Concluída Internamente
Deliberação	572	4	Concluída Internamente
Deliberação	625	2	Concluída Internamente
Deliberação	76	3	Concluída Internamente
Deliberação	76	4	Concluída Internamente
Deliberação	76	5	Concluída Internamente
Deliberação	95	1	Em andamento
Deliberação	99	2	Concluída Internamente
Deliberação	99	3	Em andamento
Deliberação	638	1	Concluída Internamente

Entregas do ano de 2023

Excepcionalmente este mês não iremos reportar a timeline referente ao programa, pois estamos em fase de atualização de datas. No próximo ciclo os dados serão reportados.

Progressos do Mês

Grandes Números

Em 2023 está aprovado um orçamento de R\$ 31.517.144,40 para ações de continuidade dos programas de monitoramento de água e sedimentos da bacia do Rio Doce e zona costeira e estuarina.

Plano de Monitoramento Quali-quantitativa Sistemático (PMQQS)

- Atualmente são gerados aproximadamente 1,7 milhão de dados pelo programa de monitoramento. Todos os dados e informações disponíveis em www.monitoramentoriodoce.org;
- 691 quilômetros de monitoramento de rios, 244 quilômetros de monitoramento ao longo da zona costeira e estuarina;
- 82 pontos de monitoramento distribuídos na bacia do Rio Doce e na zona costeira e estuarina;
- 22 estações automáticas formam uma rede de alerta que gera informações em tempo real;
- 103 parâmetros físicos, químicos e biológicos são analisados na água e 38 nos sedimentos.

Plano de Monitoramento da Qualidade da Água para Consumo Humano (PMQACH)

- Atualmente são monitorados 95 pontos, sendo 31 com tratamento e 64 sem tratamento em 24 municípios. Os pontos com tratamento são monitorados quinzenalmente no período chuvoso e mensalmente no período seco. Os pontos sem tratamento são monitorados mensalmente.

Progressos do Mês

Fatos Relevantes

Protocolo de ofício contendo informações complementares para atendimento à Deliberação CIF nº625/2022.

Protocolo do documento referente a Segunda Revisão Bianual do PMQQS, em atendimento as considerações feitas pelo GTA-PMQQS repassadas na reunião virtual ocorrida no dia 04/01/2023.

Protocolo dos Boletins do PMQACH, em atendimento à Deliberação CIF nº 513 e a NT54/2021 da CT-Saúde (sétimo boletim dos pontos que captam água do rio Doce, segundo boletim dos sistemas com tratamento que captam água de outras fontes e segundo boletim das soluções alternativas sem tratamento).

Indicadores

I01 - Aderência ao plano de coletas e análises laboratoriais

Meta Global: 90%
Percentual(%)

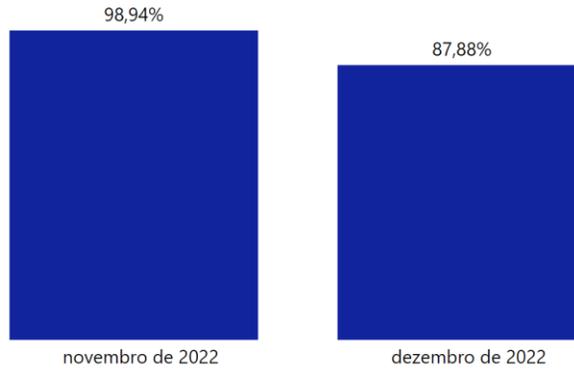


Gráfico 1: I01 - Aderência ao plano de coletas e análises laboratoriais - Frequência Mensal

I02 - Disponibilização dos dados quantitativos do monitoramento das estações automáticas

Meta Global: 90%
Percentual(%)

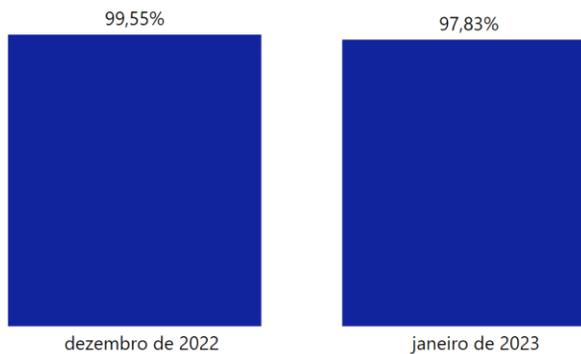


Gráfico 2: I02 - Disponibilização dos dados quantitativos do monitoramento das estações automáticas - Frequência Mensal

Indicadores

I03 - Disponibilização dos dados qualitativos do monitoramento das estações automáticas

Meta Global: 80%
Percentual(%)

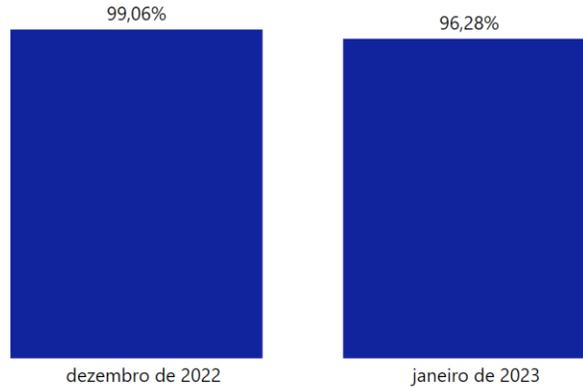


Gráfico 3: I03 - Disponibilização dos dados qualitativos do monitoramento das estações automáticas- Frequência Mensal

I04 - Percentual de dados validados em função de amostras analisadas passíveis de validação

Meta Global: 90%
Percentual(%)

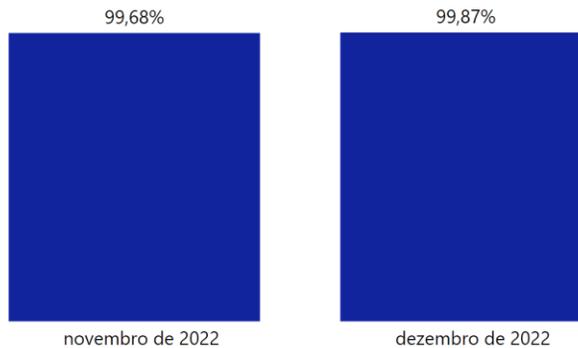


Gráfico 4: I04 - Percentual de dados validados em função de amostras analisadas passíveis de validação - Frequência Mensal

Indicadores

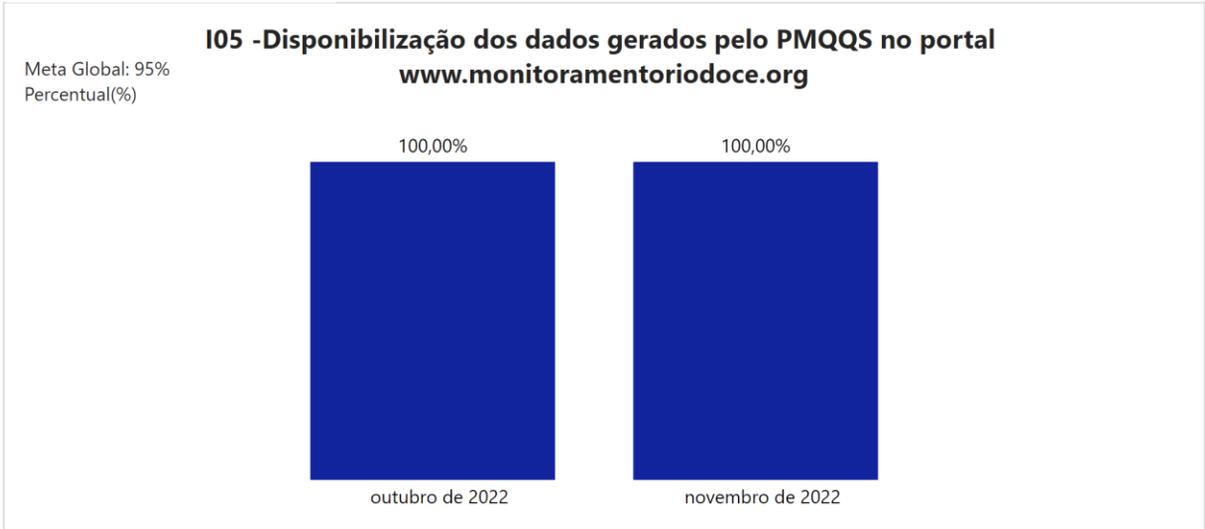


Gráfico 5: I05 -Disponibilização dos dados gerados pelo PMQQS no portal www.monitoramentorioce.org - Frequência Mensal

PG039 Unidades de Conservação

Eixo Terra e Água

Objetivo

- Avaliar os impactos nas Unidades de Conservação diretamente e/ ou potencialmente afetadas pelo rompimento da barragem de Fundão;
- Implementar ações de reparação e mitigação que se façam necessárias, para os danos causados pelo rompimento da barragem de Fundão que forem identificados nos resultados dos estudos de avaliações de impacto;
- Custear e viabilizar a implementação das ações referentes à consolidação do Parque Estadual do Rio Doce e o Refúgio de Vida Silvestre de Santa Cruz, adotando conceitos, diretrizes e mecanismos definidos na Nota Técnica nº 18/2018/CTBio/DIBIO/ICMBio, planos de trabalho e acordos de cooperação celebrados com os órgãos gestores; e
- Viabilizar a elaboração e implementação do Plano de Manejo, bem como construir a sede da Área de Proteção Ambiental na foz do rio Doce, a ser criada pelo poder público.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	181	Caput	Em andamento
Cláusula	182	Caput	Em andamento
Deliberação	114	2	Concluída Internamente
Deliberação	138	2	Concluída Internamente
Deliberação	218	3	Concluída Internamente
Deliberação	218	4	Concluída Internamente
Deliberação	221	1	Concluída Internamente
Deliberação	283	3	Concluída Internamente
Deliberação	318	3	Concluída Internamente
Deliberação	36	n/a	Concluída Internamente
Deliberação	472	3	Em andamento
Deliberação	472	5	Concluída Internamente
Deliberação	535	5	Concluída Internamente
Deliberação	535	6	Planejada
Deliberação	584	2	Concluída Internamente
Deliberação	596	1	Concluída Internamente
Deliberação	596	2	Concluída Internamente

Entregas do ano de 2023

Excepcionalmente esse mês não iremos reportar a timeline referente ao programa, pois estamos em fase de atualização de datas. No próximo ciclo os dados serão reportados.

Progressos do Mês

Não houve progressos neste mês

Indicadores

I01 – Quantidade de UCs com avaliação concluída

Meta Global: 100%
Percentual(%)



Gráfico 1: I01 – Quantidade de UCs com avaliação concluída - Frequência Mensal

I04 - Execução das ações para consolidação do Refúgio de Vida Silvestre de Santa Cruz (REVIS)

Meta Global: 100%
Percentual(%)



Gráfico 2: I04 - Execução das ações para consolidação do Refúgio de Vida Silvestre de Santa Cruz (REVIS) - Frequência Semestral

Indicadores

I05 - Execução das ações para consolidação do Parque Estadual do Rio Doce (PERD)

Meta Global: 100%
Percentual(%)




Gráfico 3: I05 - Execução das ações para consolidação do Parque Estadual do Rio Doce (PERD) - Frequência Mensal

PG040 CAR e PRAs

Eixo Terra e Água

Objetivo

Prestar suporte e apoio técnico para o cadastramento dos imóveis rurais no CAR, além de fomentar a elaboração e a implementação dos respectivos PRA's conforme previsto na Cláusula 183 do TTAC.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	183	Caput	Em andamento
Deliberação	28	n/a	Concluída Internamente

Entregas do ano de 2023

Excepcionalmente este mês não iremos reportar a timeline referente ao programa, pois estamos em fase de atualização de datas. No próximo ciclo os dados serão reportados.

Progressos do Mês

Grandes Números

599 imóveis rurais elegíveis ao Fomento do CAR. Deste total, 63 (10,5%) imóveis declinaram e 536 (89,5) aderiram à proposta do Programa por meio da assinatura dos termos de autorização de uso e coleta de dados, os demais ainda dependem de retorno sobre a adesão. Dos aderidos, 466 CAR já foram retificados ou elaborados pela Fundação Renova.

Fatos Relevantes

Iniciado o contrato com a CIGTA para construção do curso de EAD de análise do CAR.

Indicadores

I01 – Percentual de CAR elaborados, retificados e/ou ratificados pela Fundação Renova

Meta Global: 100%
Percentual(%)

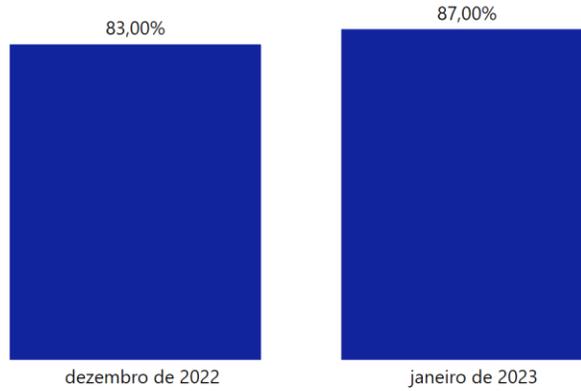


Gráfico 1: I01 – Percentual de CAR elaborados, retificados e/ou ratificados pela Fundação Renova - Frequência Mensal

Tabela 1. Indicadores que não iniciaram a medição. Fonte: Definição do Programa.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDADE DE MEDIDA
102	Percentual de Projetos de Restauração de Áreas Degradadas e Alteradas (PRADAs) elaborados em relação aos imóveis que aderiram ao programa	Quantidade de PRADAs elaborados / Quantidade de imóveis que aderiram ao programa	%
103	Percentual de Termos de Compromissos assinados pelos proprietários/ posseiros com o órgão gestor do CAR/PRA em relação aos imóveis que aderiram ao programa	Quantidade de Termos de Compromisso assinados / Quantidade de imóveis que aderiram ao programa	%

PG042 Ressarcimento dos Gastos Públicos Extraordinários

Eixo Pessoas e Comunidade

Objetivo

Ressarcir os compromitentes do TTAC e os municípios impactados, que compreendem sua área de abrangência, pelos gastos públicos extraordinários decorrentes do evento, através da comprovação por meio de documentos oficiais, observada a política de compliance da Fundação, conforme cláusulas 141 a 143 do TTAC.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	141	Caput	Concluída Internamente
Cláusula	142	Caput	Concluída Internamente
Cláusula	143	§único	Em andamento
Deliberação	171	2	Concluída Internamente
Deliberação	180	3	Concluída Internamente
Deliberação	20	n/a	Concluída Internamente
Deliberação	208	6	Concluída Internamente
Deliberação	208	8	Concluída Internamente
Deliberação	254	2	Concluída Internamente
Deliberação	291	2	Concluída Internamente
Deliberação	428	1	Concluída Internamente
Deliberação	49	caput (ação 1)	Concluída Internamente
Deliberação	49	caput (ação 2)	Em andamento
Deliberação	69	n/a	Concluída Internamente
Deliberação	78	n/a	Concluída Internamente
Deliberação	85	3	Concluída Internamente

Entregas do ano de 2023

Excepcionalmente este mês não iremos reportar os dados da timeline referente ao programa, pois estamos em fase de atualização de datas. No próximo ciclo os dados serão reportados.

Progressos do Mês

Grandes Números

- Até o momento foram ressarcidas 40 Prefeituras e 19 Órgãos Compromitentes;
- Os ressarcimentos somam R\$ 53,97 milhões pagos para às prefeituras e R\$ 29,95 milhões pagos aos Órgãos Compromitentes;
- No âmbito da cláusula 143 do TTAC, foram ressarcidos um valor total de R\$ 654,72 mil referente a 02 órgão comprometentes e 01 município (ressarcimento de aluguéis sociais de Linhares).

Indicadores

I01 – % de ressarcimento aos comprometentes (cláusula 141)

Meta Global: 100%

Percentual(%)

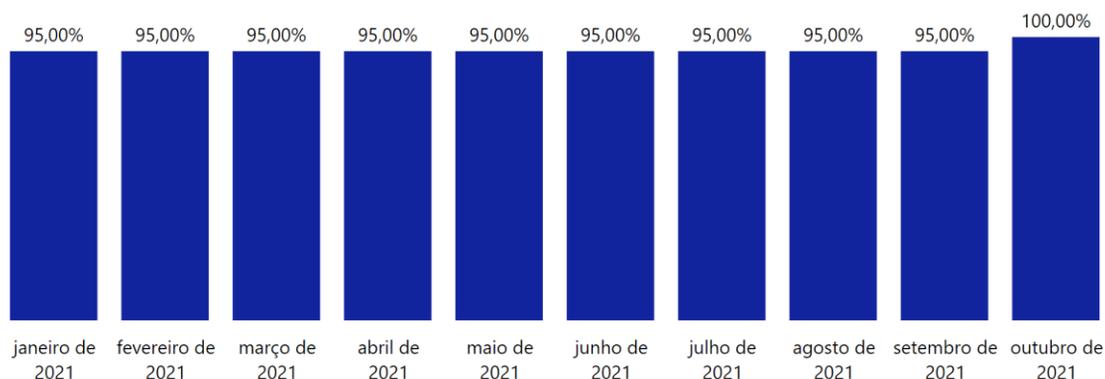


Gráfico 1: I01 – % de ressarcimento aos comprometentes (cláusula 141) - Frequência Mensal

I02 – % de ressarcimento às prefeituras

Meta Global: 100%

Percentual(%)



Gráfico 2: I02 – % de ressarcimento às prefeituras - Frequência Mensal

Indicadores

I03 – % de ressarcimento aos Compromitentes (cláusula 143)

Meta Global: 100%
Percentual(%)



Gráfico 2: I03 – % de ressarcimento aos Compromitentes (cláusula 143) - Frequência Mensal

Glossário

- I. IMPACTADOS: as pessoas físicas ou jurídicas, e respectivas comunidades, que tenham sido diretamente afetadas pelo rompimento da barragem de Fundão nos termos das alíneas abaixo e do TTAC:
- a. perda de cônjuge, companheiro, familiares até o segundo grau, por óbito ou por desaparecimento;
 - b. perda, por óbito ou por desaparecimento, de familiares com graus de parentesco diversos ou de pessoas com as quais coabitavam e/ou mantinham relação de dependência econômica;
 - c. perda comprovada pelo proprietário de bens móveis ou imóveis ou perda da posse de bem imóvel;
 - d. perda da capacidade produtiva ou da viabilidade de uso de bem imóvel ou de parcela dele;
 - e. perda comprovada de áreas de exercício da atividade pesqueira e dos recursos pesqueiros e extrativos, inviabilizando a atividade extrativa ou produtiva;
 - f. perda de fontes de renda, de trabalho ou de autossustentância das quais dependam economicamente, em virtude da ruptura do vínculo com áreas atingidas;
 - g. prejuízos comprovados às atividades produtivas locais, com inviabilização de estabelecimento ou das atividades econômicas;
 - h. inviabilização do acesso ou de atividade de manejo dos recursos naturais e pesqueiros, incluindo as terras de domínio público e uso coletivo, afetando a renda e a subsistência e o modo de vida de populações;

i. danos à saúde física ou mental; e

j. destruição ou interferência em modos de vida comunitários ou nas condições de reprodução dos processos socioculturais e cosmológicos de populações ribeirinhas, estuarinas, tradicionais e povos indígenas.

II. **INDIRETAMENTE IMPACTADOS:** as pessoas físicas e jurídicas, presentes ou futuras, que não se enquadrem nos incisos anteriores, que residam ou venham a residir na **ÁREA DE ABRANGÊNCIA** e que sofram limitação no exercício dos seus direitos fundamentais em decorrência das consequências ambientais ou econômicas, diretas ou indiretas, presentes ou futuras, do rompimento da barragem de Fundão, que serão contemplados com acesso à informação e a participação nas discussões comunitárias, bem como poderão ter acesso aos equipamentos públicos resultantes dos PROGRAMAS.

III. **ÁREA AMBIENTAL 1:** as áreas abrangidas pela deposição de rejeitos nas calhas e margens dos rios Gualaxo do Norte, Carmo e Doce, considerando os respectivos trechos de seus formadores e afluentes, bem como as regiões estuarinas, costeiras e marinha na porção impactada pelo rompimento da barragem de Fundão.

IV. **ÁREA AMBIENTAL 2:** os municípios banhados pelo Rio Doce e pelos trechos impactados dos rios Gualaxo do Norte e Carmo, a saber: Mariana, Barra Longa, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado, Sem-Peixe, Rio Casca, São Pedro dos Ferros, São Domingos do Prata, São José do Goiabal, Raul Soares, Dionísio, Córrego Novo, Pingo d'Água, Marliéria, Bom Jesus do Galho, Timóteo, Caratinga, Ipatinga, Santana do Paraíso, Ipaba, Belo Oriente, Bugre, Iapu, Naque, Periquito, Sobrália, Fernandes Tourinho, Alpercata, Governador Valadares, Tumiritinga, Galileia, Conselheiro Pena, Resplendor, Itueta, Aimorés, Baixo Guandu, Colatina, Marilândia e Linhares.

V. ÁREA DE ABRANGÊNCIA SOCIOECÔNÔMICA: localidades e comunidades adjacentes à calha dos rios Doce, Carmo e Gualaxo do Norte e Córrego Santarém e a áreas estuarinas, costeira e marinha impactadas.

VI. MUNICÍPIOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA SOCIOECÔNÔMICA: Mariana, Barra Longa, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado, Rio Casca, Sem-Peixe, São Pedro dos Ferros, São Domingos do Prata, São José do Goiabal, Raul Soares, Dionísio, Córrego Novo, Pingo-D'Água, Marliéria, Bom Jesus do Galho, Timóteo, Caratinga, Ipatinga, Santana do Paraíso, Ipaba, Belo Oriente, Bugre, Iapu, Naque, Periquito, Sobrália, Fernandes Tourinho, Alpercata, Governador Valadares, Tumiritinga, Galiléia, Conselheiro Pena, Resplendor, Itueta e Aimorés

VII. MUNICÍPIOS E LOCALIDADES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA SOCIOECÔNÔMICA: Baixo Guandu, Colatina, Barra do Riacho em Aracruz, Marilândia e Linhares, além das áreas estuarinas, costeira e marinha impactadas.

VIII. PROGRAMAS SOCIOECONÔMICOS: conjunto de medidas e de ações a serem executadas de acordo com um plano tecnicamente fundamentado, necessárias à reparação, mitigação, compensação e indenização pelos danos socioeconômicos decorrentes do rompimento da barragem de Fundão, fiscalizadas e supervisionadas pelo PODER PÚBLICO, nos termos do TTAC.

IX. PROGRAMAS SOCIOAMBIENTAIS: conjunto de medidas e de ações a serem executadas de acordo com um plano tecnicamente fundamentado, necessárias à reparação e compensação pelos danos socioambientais decorrentes do rompimento da barragem de Fundão, fiscalizadas e supervisionadas pelo PODER PÚBLICO, nos termos do TTAC.

X. PROGRAMAS: são os PROGRAMAS SOCIOAMBIENTAIS e os PROGRAMAS SOCIOECONÔMICOS quando referidos em conjunto.

XI. **PROJETOS SOCIOAMBIENTAIS:** são as ações e medidas aprovadas pela FUNDAÇÃO, nos termos do TTAC, para a implementação de determinados PROGRAMAS SOCIOAMBIENTAIS.

XII. **PROJETOS SOCIOECONÔMICOS:** são as ações e medidas aprovadas pela FUNDAÇÃO, nos termos do TTAC, para a implementação de determinados PROGRAMAS SOCIOECONÔMICOS.

XIII. **PROJETOS:** são os PROJETOS SOCIOAMBIENTAIS e os PROJETOS SOCIOECONÔMICOS quando referidos em conjunto.

XIV. **PODER PÚBLICO:** órgãos e entidades públicos integrantes ou vinculados aos COMPROMITENTES e que, em razão de suas atribuições institucionais, tenham competência legal para regulamentar e/ou fiscalizar ações relacionadas a um determinado PROGRAMA.

XV. **ÓRGÃOS AMBIENTAIS:** Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama); Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio); Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Seama-ES); Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf); Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad-MG); Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Espírito Santo (Iema-ES); Instituto Estadual de Florestas (IEF-MG); Fundação Estadual de Meio Ambiente (Feam-MG).

XVI. **ÓRGÃOS DE GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS:** Agência Nacional de Águas (ANA); Agência de Gestão de Recursos Hídricos do Espírito Santo (AGERH-ES); e Instituto de Gestão das Águas de Minas (Igam-MG).

XVII. **PROGRAMAS REPARATÓRIOS:** compreendem medidas e ações de cunho reparatório que têm por objetivo mitigar, remediar e/ou reparar impactos socioambientais e socioeconômicos advindos do rompimento da barragem de Fundão.

XVIII. PROGRAMAS COMPENSATÓRIOS: compreendem medidas e ações que visam a compensar impactos não mitigáveis ou não reparáveis advindos do rompimento da barragem de Fundão, por meio da melhoria das condições socioambientais e socioeconômicas das áreas impactadas, cuja reparação não seja possível ou viável, nos termos dos PROGRAMAS.

XIX. FUNDAÇÃO: fundação de direito privado, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei, a ser instituída pela SAMARCO e pelas ACIONISTAS com o objetivo de elaborar e executar todas as medidas previstas pelos PROGRAMAS SOCIOAMBIENTAIS e PROGRAMAS SOCIOECONÔMICOS.

XX. EXPERT: pessoa física ou jurídica, ou grupo de pessoas físicas ou jurídicas, legalmente habilitadas e contratadas pela FUNDAÇÃO RENOVA para gestão, avaliação, elaboração e/ou implantação dos PROGRAMAS e/ou PROJETOS, total ou parcialmente.

XXI. SITUAÇÃO ANTERIOR: situação socioambiental e socioeconômica imediatamente anterior a 05/11/2015.



XXII. PRADA: Projeto de Restauração de Áreas Degradadas e Alteradas.

XXIII. Ação para itens cláusulas do TTAC e deliberações são as ações a serem cumpridas pela Fundação Renova, os status reportados no presente relatório são descritas a seguir:

- a. Concluída internamente, o item foi concluído pela Fundação Renova mas ainda deverá ser validado pelo CIF ou já foi declarado seu descumprimento;
- b. Em andamento, itens cujo atendimento já foi iniciado ou que possuem uma obrigação recorrente;

- c. Encerrado, item concluído e aprovado oficialmente pelo CIF;
- d. Judicializado, não houve consenso entre Fundação Renova e CIF sobre o atendimento ao item, que passa a ser acompanhado através das decisões na 12ª Vara;
- e. Pendente, a conclusão do item não depende somente da Fundação Renova, mas de outros fatores externos;
- f. Planejada, itens que estão no prazo, porém o seu atendimento ainda não foi iniciado;
- g. Reprogramado, item não foi concluído no prazo e precisou ser replanejado;

Taxa de acidentes registrados

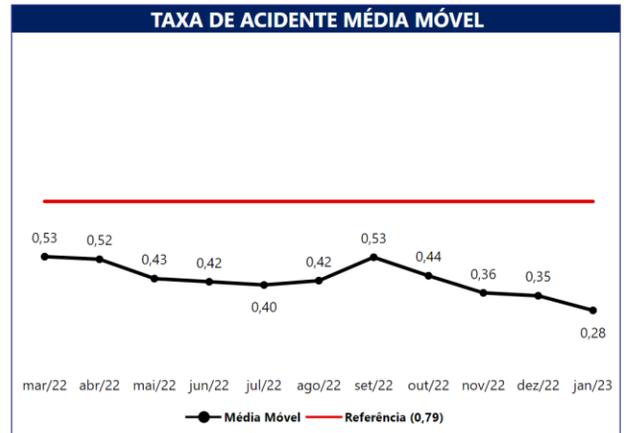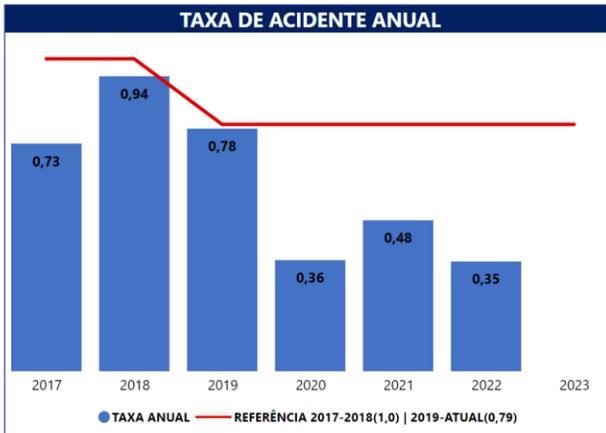

(Número de acidentes registrados x 1.000.000/horas trabalhadas)

* Acidentes registrados = acidentes com afastamento mais acidentes sem afastamento.

Como ler o gráfico

Coluna cor azul: taxa de acidentes acumulada no ano. Toma-se o número de acidentes acumulados no ano, multiplica-se por um milhão e divide-se pelo número de horas trabalhadas no ano. Coluna cor verde: representa a taxa de acidentes referente ao mês. Toma-se o número de acidentes ocorridos no mês, multiplica-se por um milhão e divide-se pelo número de horas trabalhadas no mês.

Linha vermelha: valor de referência 1. Esse valor foi adotado devido ao pouco tempo de trabalho da Fundação Renova. É o valor mínimo para uma empresa. A média nacional para essa referência, por exemplo, é 7.

Ponto preto: esse valor corresponde à média dos últimos doze meses. Caso o número de acidentes continue o mesmo no período e as horas trabalhadas aumentem, esse valor pode cair.

Gestão Econômica*

PG	Programas	Anual Total				Anual Acumulado			
		Orçamento	Realizado	Variação	%	Orçamento	Realizado	Variação	%
PG13	TURISMO CULTURA LAZER E ESPORTE	16,0	0,6	-15,3	-96,0%	0,9	0,6	-0,3	-31,9%
PG15	INOVAÇÃO	5,4	0,3	-5,2	-95,1%	0,3	0,3	0,0	0,0%
PG18	DIVERSIFICAÇÃO ECONOMIA REGIONAL	4,0	0,1	-4,0	-98,1%	0,2	0,1	-0,1	-62,8%
PG20	CONTRATAÇÃO LOCAL	4,1	0,3	-3,8	-93,4%	0,3	0,3	0,0	6,1%
PG26	RECUPERAÇÃO DE APPs	232,9	15,9	-216,9	-93,2%	20,1	15,9	-4,2	-20,8%
PG27	RECUPERAÇÃO DE NASCENTES	40,0	4,1	-35,9	-89,8%	2,6	4,1	1,5	56,6%
PG29	ESTRUTURA TRIAGEM	4,1	0,9	-3,2	-77,2%	0,6	0,9	0,3	55,7%
PG31	SANEAMENTO BÁSICO	58,7	6,1	-52,7	-89,7%	5,6	6,1	0,5	9,2%
PG32	SISTEMAS DE ABASTECIMENTO ÁGUA	13,4	2,3	-11,1	-82,8%	5,3	2,3	-3,0	-56,3%
PG33	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	25,2	0,0	-25,2	-100,1%	0,0	0,0	0,0	-382,0%
PG34	EMERGÊNCIA AMBIENTAL	4,4	0,3	-4,0	-92,0%	0,2	0,3	0,2	122,6%
PG35	INFORMAÇÃO PARA A POPULAÇÃO	12,9	0,0	-12,9	-99,7%	0,9	0,0	-0,9	-96,1%
PG36	COMUNICAÇÃO NACIONAL INTERNACIONAL	2,7	0,2	-2,5	-93,6%	0,2	0,2	0,0	-16,3%
PG39	CONSOLIDAÇÃO UCs	58,1	0,1	-58,0	-99,9%	0,6	0,1	-0,5	-87,5%
PG40	IMPLANTAÇÃO CAR E PRAS	4,1	0,2	-3,9	-94,1%	0,5	0,2	-0,2	-47,3%
PG43	MEDIDAS COMPENSATÓRIAS	123,2	0,0	-123,2	-100,0%	0,1	0,0	0,0	-46,7%
PG97	PROJETOS COMP - SALDO A ALOCAR	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0%
Total Compensatórios		609,3	31,5	-577,8	-94,8%	38,2	31,5	-6,8	-17,7%
PG00	MEDIDAS MITIGATÓRIAS EMERGENCIAIS	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0%
PG01	CADASTRO	85,7	4,8	-80,9	-94,4%	2,8	4,8	2,1	74,4%
PG02	PIM - INDENIZAÇÃO ATINGIDOS	3228,7	108,0	-3120,8	-96,7%	282,0	108,0	-174,1	-61,7%
PG03	POVOS INDÍGENAS	227,3	9,6	-217,7	-95,8%	13,5	9,6	-3,9	-28,8%
PG04	POVOS TRADICIONAIS	3,2	0,1	-3,1	-97,1%	0,1	0,1	0,0	-29,6%
PG05	PROTEÇÃO SOCIAL	27,3	2,5	-24,8	-91,0%	0,8	2,5	1,7	214,2%
PG06	PARTICIPAÇÃO E DIÁLOGO	75,5	5,0	-70,5	-93,4%	6,1	5,0	-1,2	-19,3%
PG07	ASSISTÊNCIA AOS ANIMAIS	14,0	0,7	-13,4	-95,2%	1,4	0,7	-0,8	-53,3%
PG08	REASSENTAMENTO	1642,6	67,7	-1574,9	-95,9%	133,0	67,7	-65,3	-49,1%
PG09	UHE CANDONGA	262,9	14,9	-247,9	-94,3%	38,6	14,9	-23,7	-61,4%
PG10	INFRAESTRUTURA IMPACTADA	118,9	5,9	-113,0	-95,0%	8,8	5,9	-2,9	-32,7%
PG11	RECUPERAÇÃO ESCOLAS	10,1	0,1	-9,9	-98,6%	0,4	0,1	-0,2	-60,9%
PG12	MEMÓRIA HISTÓRICA	16,6	0,5	-16,1	-97,2%	0,8	0,5	-0,4	-45,4%
PG13	TURISMO CULTURA LAZER E ESPORTE	6,6	0,2	-6,4	-96,5%	0,3	0,2	-0,1	-26,0%
PG14	SAÚDE	6,6	1,6	-5,0	-75,3%	1,6	1,6	0,0	0,5%
PG16	PESCA	20,1	1,7	-18,4	-91,6%	0,7	1,7	1,0	157,0%
PG17	ATIVIDADE AGROPECUÁRIA	88,2	7,4	-80,8	-91,6%	6,7	7,4	0,7	11,2%
PG19	RECUPERAÇÃO NEGÓCIOS	13,7	0,8	-12,9	-94,4%	0,7	0,8	0,1	13,6%
PG21	AFE - AUXÍLIO FINANCEIRO	445,8	35,4	-410,4	-92,1%	36,4	35,4	-1,0	-2,8%
PG23	MANEJO DE REJEITOS	146,2	10,2	-135,9	-93,0%	9,2	10,2	1,1	11,7%
PG24	CONTENÇÃO DE REJEITOS	0,0	-0,3	-0,3		0,0	-0,3	-0,3	
PG25	RECUPERAÇÃO ÁREA AMBIENTAL 1	29,4	1,9	-27,4	-93,4%	2,3	1,9	-0,3	-15,2%
PG28	BIODIVERSIDADE	169,2	0,6	-168,6	-99,6%	1,6	0,6	-1,0	-63,1%
PG30	FAUNA E FLORA TERRESTRE	33,7	1,9	-31,8	-94,3%	3,3	1,9	-1,4	-41,9%
PG32	SISTEMAS DE ABASTECIMENTO ÁGUA	172,2	6,9	-165,3	-96,0%	14,9	6,9	-8,0	-53,6%
PG37	GESTÃO RISCOS AMBIENTAIS	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0%
PG38	MONITORAMENTO ÁGUA	31,5	2,4	-29,1	-92,3%	2,8	2,4	-0,4	-13,5%
PG39	CONSOLIDAÇÃO UCs	7,5	0,0	-7,5	-100,0%	0,0	0,0	0,0	-95,5%
PG41	GESTÃO DOS PROGRAMAS	311,1	28,5	-282,6	-90,8%	26,0	28,5	2,6	9,9%
PG42	GASTOS PÚBLICOS EXTRAORDINÁRIOS	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0%
PG99	CONTINGÊNCIA	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0%
Total Reparatórios		7194,6	319,0	-6875,5	-95,6%	594,8	319,0	-275,7	-46,4%
Total Programas		7803,8	350,5	-7453,3	-95,5%	633,0	350,5	-282,5	-44,6%
ADM	DESPESAS GESTÃO ADMINISTRATIVAS	172,1	15,3	-156,8	-91,1%	15,4	15,3	0,0	-0,1%
CG	CUSTEIO SISTEMA DE GOVERNANÇA	141,1	0,9	-140,2	-99,3%	16,6	0,9	-15,6	-94,3%
Total Despesas Administrativas		313,3	16,3	-297,0	-94,8%	31,9	16,3	-15,6	-49,0%
Total Geral		8117,1	366,8	-7750,3	-95,5%	664,9	366,8	-298,2	-44,8%

PG	Programas	Mensal				Anual Acumulado
		Orçamento	Realizado	Varição	%	Justificativas da variação anual acumulada
PG13	TURISMO CULTURA LAZER E ESPORTE	0,93	0,63	-0,30	-0,32	Fatores Internos Antecipação: (R\$ 0,3MM) - Incentivo à Leitura: Antecipação das entregas que foram lançadas no ano de 2022. Plano de Ação: Valor do desvio será compensado no orçamento dos próximos meses.
PG15	INOVAÇÃO	0,27	0,27	0,00	0,00	N/A - Não há desvios relevantes.
PG18	DIVERSIFICAÇÃO ECONOMIA REGIONAL	0,20	0,08	-0,13	-0,63	Fatores Internos (R\$ 0,1 M) - Custos com Engenharia: Erro do planejamento financeiro ou investigar economia. Plano de Ação: Verificar se é desvio de medição ou economia quando o projeto Casa do Empreendedor estiver concluído e encerrado.
PG20	CONTRATAÇÃO LOCAL	0,25	0,27	0,02	0,06	N/A - Não há desvios relevantes.

PG	Programas	Mensal				Anual Acumulado	
		Orçamento	Realizado	Varição	%	Justificativas da variação anual acumulada	
PG26	RECUPERAÇÃO DE APPs	20,14	15,95	-4,19	-0,21	<p>Fatores Internos (R\$ 4,19 MM):</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1,29 MM - Atraso na contratação do fornecimento de insumos para cercamento, curva de aprendizagem de contratadas mobilizadas recentemente, baixa produtividade de contratadas. - 1,6 MM - Alteração do resultado do Edital da Bacia do Manhuaçu (7.332 hectares), necessidade de ajustes referentes à capacidade operacional das empresas selecionadas. - 0,6 MM - Contratos com atraso na contratação/mobilização. - 0,7MM - Substituição do fornecedor dos drones (distrato por parte do fornecedor inicial necessitando realizar nova contratação). <p>Plano de Ação:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fazer gestão do processo de contratação junto ao Suprimentos, bem como, recuperar a curva operacional a partir da mobilização. - Apoiar empresas novas no processo de mobilização. - Monitorar junto ao novo fornecedor contratado a possibilidade de antecipação da entrega dos drones, visando reduzir o impacto do atraso.. 	
PG27	RECUPERAÇÃO DE NASCENTES	2,61	4,08	1,47	0,57	<p>Fatores Internos R\$ 1,47 MM:</p> <p>Alteração das ações do CIAAT incorporando atividades de restauração ativa..</p> <p>Plano de ação: Revisão do planejamento do CIAAT.</p>	
PG29	ESTRUTURA TRIAGEM	0,61	0,94	0,34	0,56	<p>Economia</p> <p>Fatores Internos: Fatores Internos: Realizações de medições pendentes de Dez/22 gerando maior demanda da equipe de gerenciamento dos projetos.</p> <p>Ação: Atuar junto a equipe da Engenharia para maior assertividade das medições planejadas.</p>	
PG31	SANEAMENTO BÁSICO	5,56	6,07	0,51	0,09	<p>Fatores Externos</p> <p>Economia</p> <p>Fatores Internos</p> <p>Fatores Externos: 0,5MM</p> <p>Os municípios apresentaram medições em desconformidade com o previsto em cronograma/orçamento.</p>	
PG32	SISTEMAS DE ABASTECIMENTO ÁGUA	5,27	2,30	-2,97	-0,56	<p>Economia</p> <p>Fatores Internos: (R\$ 3,0MM)</p> <p>Adutora - Atraso no faturamento da medição dos fornecedores com impacto no realizado do mês.</p> <p>Fatores Externos:</p>	

PG	Programas	Mensal				Anual Acumulado	
		Orçamento	Realizado	Varição	%	Justificativas da variação anual acumulada	
PG33	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,01	-0,02	-0,02	-3,82	<p>Fatores Internos</p> <p>Ajuste Contábil: (R\$ 0,02 MM) – Valor referente à devolução de rendimentos financeiros de uma das parcerias finalizadas.</p> <p>Plano de Ação: Lançamento em análise pela área financeira e contabilidade. Entendemos que este valor não deveria ser creditado no DR do programa.</p>	
PG34	EMERGÊNCIA AMBIENTAL	0,16	0,35	0,19	1,23	<p>Fatores Internos:</p> <p>CENSO POPULACIONAL (R\$ 0,09 MM) Acumulo de medições de nov e dez/22 e antecipação de atividades de campo executadas em jan/23. Plano de ação: Monitorar junto ao fornecedor as próximas medições.</p> <p>SPCI (R\$ 0,03 MM) Verbas não previstas no orçamento para algumas despesas administrativas. Plano de ação: Monitorar próximas medições e, caso necessário, inclui-las na próxima revisão orçamentária.</p> <p>ESCOLA SEGURA (R\$ 0,07 MM) Necessidade de mais horas técnica para atendimento às demandas e medição de dez/22 e lançada em jan/23. Plano de ação: Monitorar junto ao fornecedor as próximas medições.</p>	
PG35	INFORMAÇÃO PARA A POPULAÇÃO	0,94	0,04	-0,91	-0,96	<p>Fatores Externos: Demora dos agentes externos (ICMBio e Prefeituras Municipais) para assinatura dos termos de parcerias.</p> <p>Postergação: (R\$ 0,9 MM)</p> <ul style="list-style-type: none"> - CIT Mariana - Em fase de re-negociação da parceria com a Prefeitura Municipal para instalação do equipamento no Terminal Turístico. - CIT GV - Projeto executivo finalizado, formalização da parceria com a PMGV realizada, aguardando início da contratação de obras para instalação do equipamento. - CIT Linhares - Termo de Parceria em processo de finalização de assinatura pelo ICMBio. <p>* Implantado os pontos de acesso a Plataforma Interativa em todos as três localidades. Plano de Ação: O Programa está ampliando os pontos de acesso para mitigar o atraso na instalação dos CITs e melhorar ambiência com CT-PDCS. Devido aos atrasos decorrentes da não formalização da parceria com os entes, os orçamentos sofrem uma execução abaixo do planejado.</p>	
PG36	COMUNICAÇÃO NACIONAL INTERNACIONAL	0,20	0,17	-0,03	-0,16	<p>Economia: (R\$ 0,03 MM) - Variação ocorreu devido ao processo concorrencial do fee mensal negociado abaixo do orçamento. Plano de Ação: o orçamento será adequado no próximo Draft.</p>	

PG	Programas	Mensal				Anual Acumulado
		Orçamento	Realizado	Varição	%	Justificativas da variação anual acumulada
PG39	CONSOLIDAÇÃO UCs	0,58	0,07	-0,51	-0,88	Economia Fatores Internos Fatores Externos R\$: (0,51 MM) Causa: Atraso no recebimento dos termos de referência, impossibilitaram as contratações previstas no período e, conseqüentemente, geraram a postergação de atividades/medições do RVS. Plano de Ação: Executar as contratações referentes aos termos recebidos.
PG40	IMPLANTAÇÃO CAR E PRAS	0,47	0,25	-0,22	-0,47	Fatores Internos (-R\$ 0,02MM) Baixa performance da Instituição Humanas na elaboração dos CAR; Atraso operacional na elaboração das cartilhas dos povos tradicionais. Plano de ação: Notificar a Instituição, e Avaliar a continuidade do contrato.Finalizar a elaboração da cartilha." (-R\$ 0,02) Medição aquém devido as atividades planejadas para o mês de janeiro serem antecipadas nos meses anteriores (2022), dessa forma diminuindo a demanda para o mês. Plano de ação: N/A (-R\$ 0,02MM) Redução de escopo, devido redução de público alvo da elaboração dos projetos. Plano de ação: N/A R\$ 0,0004MM Apropriação contábil indevida. Plano de ação: Solicitar alteração do DR no sistema. (-R\$ 0,07MM) Atraso no processo de contratação da Agroicone (Marco Legal dos PRA's -ES) devido a necessidade de revisão dos preços; e demora da definição de necessidade de APRO convencional ou simplificada pela governança/compliance; impactando nos SLA's de suprimentos. Plano de ação: Replanejar as atividades de cronograma junto ao fornecedor. (-R\$ 0,02MM) Gerenciamento
PG43	MEDIDAS COMPENSATÓRIAS	0,05	0,03	-0,03	-0,47	Economia Fatores Internos: (R\$ 0,03 MM): Gerenciamento Escritório Forum Prefeitos
PG97	PROJETOS COMP - SALDO A ALOCAR	0,00	0,00	0,00	0,00	Economia Fatores Internos
Total Compensatórios		38,24	31,47	-6,77	-0,18	

PG	Programas	Mensal				Anual Acumulado	
		Orçamento	Realizado	Varição	%	Justificativas da variação anual acumulada	
PG00	MEDIDAS MITIGATÓRIAS EMERGENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	Economia	
PG01	CADASTRO	2,76	4,81	2,05	0,74	Fatores Internos Fatores Externos (R\$ 2,1 MM) - Antecipação frente a contratação (Em andamento a regularização e o aditivo do contrato 414 cadastro com gravação de áudio).	
PG02	PIM - INDENIZAÇÃO ATINGIDOS	282,03	107,97	-174,06	-0,62	Fatores Externos Antecipação: (+ R\$ 9,42) PIM Convencional: pagamentos dos laudos fase 1. (+ R\$ 5,62) Outras indenizações: processos de DG com laudos abaixo do previsto. (+ R\$ 3,12) Dano Água: liberação de Atendimento de processos de GV conforme sentença 4ª vara Federal. (+ R\$ 0,38) Mariana ACP: qtde de pagamentos acima do previsto em orçamento. Postergação: (- R\$ 179,54) Novel: atraso na homologação dos processos com acordos fechados devido ao recesso forense. (- R\$ 13,07) Infra e Serviços: reabertura dos escritórios de atendimento para atender SPA, despesa menor que o previsto.	
PG03	POVOS INDÍGENAS	13,49	9,61	-3,88	-0,29	Economia (R\$ 1,3 MM) - Alimentação animal Resplendor. Reajuste contratual abaixo do previsto. (R\$ 1,2 MM) - Auxílio Subsistência Emergencial TG, Comboios e Krenak. O valor estimado foi considerando um salário-mínimo maior do que o praticado no mês de janeiro/23, o que justifica o desembolso abaixo do previsto. Plano de Ação: Adequar o orçamento no próximo Draft. Fatores Internos (R\$ 0,9 MM) - Fornecimento de Água - Krenak. Não houve medição em janeiro/23 com a Copasa e o contrato com nova empresa para a disponibilização de água mineral está em andamento. Plano de Ação: Monitorar a contratação do novo fornecedor e a medição da Copasa. (R\$ 0,4 MM) - Execução do PBA e SAA Comboios e TG. As ações tiveram o seu cronograma alterado devido a reprogramação dos prazos de construção e detalhamento do PBAI Plano de Ação: Adequar o orçamento no próximo Draft. (R\$ 0,8 MM) - Gerenciamentos, Estudos e outros. Contratos sob demanda. Plano de Ação: Adequar o orçamento no próximo Draft. R\$ 0,7 MM- Outras despesas Krenak. Os contratos dessa atividade não possuem uma média regular, pois estão associados às condições climáticas, que interferem na degradação das vias e, conseqüentemente, demandam maior ou menor uso de agregados, a depender do período. Plano de Ação: Acompanhar as medições dos contratos junto ao ponto focal.	

PG	Programas	Mensal				Anual Acumulado
		Orçamento	Realizado	Varição	%	Justificativas da variação anual acumulada
PG04	POVOS TRADICIONAIS	0,13	0,09	-0,04	-0,30	Fatores Internos (R\$0,03 MM): Despesas com gerenciamento do programa e PBAQ Plano de Ação: Continuar com o processo de revisão do programa até a entrega do produto final. Acompanhar a reclassificação de despesa indevida realizada na DR do PBAQ.
PG05	PROTEÇÃO SOCIAL	0,78	2,46	1,67	2,14	Fatores Externos: R\$ 1,7 MM - Planos Municipais em Proteção Social. Antecipação de baixa contábil para o plano de demais municípios que estava prevista no orçamento para os meses de fevereiro, junho e dezembro; e baixa no 4º adiantamento sobre o repasse financeiro ao município de Mariana. Plano de ação: acompanhar sistematicamente o processo de prestação de contas dos Planos Municipais.
PG06	PARTICIPAÇÃO E DIÁLOGO	6,15	4,96	-1,19	-0,19	Fatores Internos Postergação: (R\$ 0,37 MM) - Canais de Relacionamento: Execução a menor nos itens relacionados a manutenção dos 13 escritórios dos CIAS, principalmente naqueles gastos que são geridos por outras áreas como ADM, TI, Segurança. Plano de ação: Revisão dos gastos previstos para a manutenção dos espaços. Postergação: (R\$ 0,35 MM) - Participação e Diálogo: Execução a menor que o previsto para a empresa responsável pela execução das ações de Diálogo Social, Ações de inteligência de responsabilidade da área de segurança empresarial, reprogramação das ações relativas a plataforma interativa. Plano de ação: revisar junto as áreas responsáveis a execução financeira dos contratos. Postergação: (R\$ 0,71 MM) - Comunicação: Contratos sob demanda com execução abaixo do orçamento e processos concorrenciais de contratação em andamento. Plano de Ação: Contratação de fornecedores de serviço de distribuição de jornais e disparo de mensagens whatsapp. Fatores Externos R\$ 0,25 MM - Assessorias técnicas: Pagamento de acordo judicial ASPERQ DEGREDO conforme homologação. Orçamento estava contemplado para 2022 no draft 20. Plano de ação: Valores serão ajustados no próximo draft.
PG07	ASSISTÊNCIA AOS ANIMAIS	1,44	0,67	-0,77	-0,53	Economia: Não se aplica. Fatores Internos: Postergação de custos para aquisição de animais em função de alteração de estratégia de apresentação de propostas aos atingidos proprietários de animais: Priorização de casos que estão em fase de encerramento atendimento de reassentamento via pecúnia global. Fatores Externos: Postergação de custos para aquisição de animais em função de: i. Propostas apresentadas sem retorno de aceite ou não; ii. Tempo de homologação junto à CEJUSC das propostas aceitas.

PG	Programas	Mensal				Anual Acumulado
		Orçamento	Realizado	Varição	%	Justificativas da variação anual acumulada
PG08	REASSENTAME NTO	133,01	67,70	-65,31	-0,49	Economia (R\$0,0) +AA30' (- R\$ 9,6) Novas moradias Bento: redef. de estratégia; (- R\$ 6,9) Atraso contratação (Camar, SAA Furquim, Ecoponto); (- R\$ 5,1) Novas moradias Paracatu. Início novo pacote (-R\$ 4,8) Equip públicos Paracatu. Empreiteira não performando; (-R\$ 4,4) Equip públicos Bento. Interrupção de Id's; (-R\$ 3,1) Adut. ETA/ETE Paracatu. Atraso na finalização. (-R\$ 31,4 MM) Outros Fatores Externos (R\$0,0)
PG10	INFRAESTRUTU RA IMPACTADA	8,78	5,91	-2,88	-0,33	Economia Fatores Internos: (2,1MM) Campo de futebol Ponte do Gama - Postergação por baixa performance da contratada e aliado ao excesso de chuvas. Pontes - Postergação de somente duas pontes já em finalização por intervenção arqueológica e mudança de solução. Fatores Externos (0,8MM) Postergação de demandas como Manutenção de Vias e Manutenção de Edificações em função do excesso de chuvas na região.
PG09	UHE CANDONGA	38,64	14,93	-23,72	-0,61	Economia Fatores Internos: (23,7MM) Desembolso menor que o previsto nos serviços de Dragagem, Ponto de Apoio, Remoção de Sedimentos, Infraestrutura das Pilhas e Empilhamento pois as medições da GMaia e Piacentini não foram liberadas devido a pendências e a medição do Consorcio Rio Doce não foi liberada pois o aditivo contratual está em elaboração. Fatores Externos
PG11	RECUPERAÇÃO ESCOLAS	0,36	0,14	-0,22	-0,61	Fatores Internos Postergação: (R\$ 0,08 MM) Transporte Escolar: O Draft 20 foi planejado utilizando como premissa que a medição de dezembro seria realizada contemplando 20 dias de execução de serviços. Os 10 dias restantes seriam pagos em janeiro como de costume. Porém não houve antecipação de medição em dezembro, e o valor do serviço prestado foi pago integralmente em 2022. Postergação (R\$ 0,12 MM) Sociabilidade: A medição do CIEDS não foi finalizada por problemas na geração da FRS. Será pago em fevereiro Plano de Ação: Garantir o pagamento do fornecedor em fevereiro/23.

PG	Programas	Mensal				Anual Acumulado	
		Orçamento	Realizado	Varição	%	Justificativas da variação anual acumulada	
PG12	MEMÓRIA HISTÓRICA	0,84	0,46	-0,38	-0,45	<p>Fatores Internos</p> <p>Postergação: (R\$ 0,4 MM) Variação de medição de ações do eixo imaterial em função do final e início de 2023 período em que as ações da Casa dos Saberes e Plano de Reparação aconteceram de forma reduzida. E variação da medição da Parceria com a UNESCO que acontece por meio de prestação de contas mensais após entrega de produtos por consultores (atraso na entrega de produtos)</p> <p>Plano de Ação: As ações da parceria com a UNESCO serão medidas nos próximos meses compensando o desvio e as ações do Plano de reparação e casa dos saberes também foram reprogramadas sendo compensadas nos próximos 3 meses.</p>	
PG13	TURISMO CULTURA LAZER E ESPORTE	0,31	0,23	-0,08	-0,26	<p>Fatores Externos</p> <p>Postergação: (R\$ 0,1 MM) Torneio de Pesca: Postergação do cronograma de execução do projeto em virtude da turbidez da água seguindo a recomendação do Relacionamento Institucional</p> <p>Plano de Ação: Executar as formações relacionadas a 1ª e 2ª Edição do Torneio de Pesca no ES ano de 2023.</p>	
PG14	SAÚDE	1,62	1,63	0,01	0,01	<p>Fatores Internos</p> <p>(R\$ 0,01 MM) -Pequeno desvio referente às medições de aluguel de carros e cartão combustível no município de Barra Longa.</p>	
PG16	PESCA	0,65	1,68	1,03	1,57	<p>Fatores Internos</p> <p>+ R\$ 1,0 M Caracterização Social e Monitoramento Pesqueiro: Antecipação da medição.</p>	

PG	Programas	Mensal				Anual Acumulado	
		Orçamento	Realizado	Variação	%	Justificativas da variação anual acumulada	
PG19	RECUPERAÇÃO NEGÓCIOS	0,67	0,76	0,09	0,14	Fatores Internos +R\$ 0,1 M Locação de Espaços Comerciais - Reassentamento: Pagamento não previsto de compensação financeira retroativa pela equipe do Reassentamento para 03 empreendedores.	
PG21	AFE - AUXÍLIO FINANCEIRO	36,40	35,38	-1,03	-0,03	Fatores Externos Postergação: (- R\$ 1,03) AFE: processos de DG com laudos abaixo do previsto e novo PIM Convencional não iniciado	
PG23	MANEJO DE REJEITOS	9,16	10,23	1,07	0,12	Fatores Internos R\$ 0,15MM: GESTÃO DA QUALIDADE DO AR e MANUTENÇÃO DA BIOENGENHARIA R\$ 1,15MM: Ações de Infra R\$ 1,01MM: PERÍCIA SEGURANÇA ALIMENTAR EIXO6 (ARSH e ARE). Fatores Externos (-R\$ 1,26 MM) Barramentos; (-R\$ 0,54MM): ARSH e ARE; R\$ 0,56MM: CONSULTORIA AMBIENTAL PG23 devido a solicitações da CT-GRSA; Plano de Ação ARSH e ARE: Acompanhar junto ao jurídico; Perícia Segurança Alimentar EixoO6 (ARSH e ARE): Corrigir distribuição na próxima janela de revisão orçamentária. Gestão da Qualidade do Ar e Manutenção da Bioengenharia: Notificar a contratada nos ritos de gestão, a necessidade de apresentar as medições dentro do mês. Barramento: Atuar junto ao jurídico para tentar definir as ações do barramento. Infra: Adequação feita no contrato. Recomposição financeira será feita no Draft21.	

PG	Programas	Mensal				Anual Acumulado		Justificativas da variação anual acumulada
		Orçamento	Realizado	Variação	%			
PG17	ATIVIDADE AGROPECUÁRIA	6,66	7,41	0,75	0,11			<p>Fatores Internos</p> <p>(-R\$ 0,05MM)- Gerenciamento</p> <p>Plano de ação: N/A</p> <p>(-R\$ 0,08MM)- Desembolso Restauo Florestal Pacote 1 (ERG) menor que o previsto, medição de jan23 (0,048MM) não entrou no mês (problema sistêmico no pedido - erro SAP) (-) 0,043MM; Desembolso Restauo Barra Longa (Ambiência) maior que o previsto, (+) 0,031MM; Desembolso Insumos Cerca e Restauo PU's (GARAVINI e demais) menor que o previsto, aditivo em aprovação (-) 0,066MM.</p> <p>Plano de ação: Cobrar o retorno do Plano de ação de mobilização das equipes planejadas.</p> <p>(-R\$ 0,53MM)- 5400000394 0030: Contrato principal desse DR, ENGELIG, foi encerrado em 06/09/22.Conforme planejamento da Infra. Valores Orçados não mais condizentes.</p> <p>5400000394 0040: A contratação inicial previa a execução da obra no período de seca, devido ao atraso no licenciamento, a estratégia de execução foi alterada sendo necessário incluir o plano de chuvas (emergencial) não previsto inicialmente.</p> <p>Plano de ação: N/A</p> <p>(-R\$ 0,01MM)- Contratos sob demanda.</p> <p>Plano de ação: N/A</p> <p>(-R\$ 0,12MM)- 'UNIDADES DEMONSTRATIVAS: Atraso no envio das sementes pela EPAMIG e alto volume de chuva no mês, impactando nas atividades de Unidades Demonstrativas;</p> <p>IMPLANTAÇÃO DAS MELHORIAS ALTERNATIVAS: Atraso na entrega de material por parte do fornecedor, impactado nas atividades de adequações hidráulicas e distribuição de água.</p> <p>FORNECIMENTO DE ÁGUA: Redução na demanda de recursos hídricos em função das chuvas ocorridas no mês, e tendência de redução do fornecimento dos caminhões pipa com o avanço do restabelecimento das estruturas hidráulicas;</p> <p>MELHORAMENTO GENÉTICO/QUALIDADE DO LEITE: Baixa performance dos fornecedores por gestão interna; além da baixa produção ligada a baixa escore corporal de animais no alto Rio doce, tornando-os inaptos a inseminação.</p> <p>Plano de ação: N/A</p> <p>R\$ 1,86MM- Avanço nas atividades de reestruturação produtiva e reparação dos danos (jusante), como reflexo do Plano de Aceleração da retomada.</p> <p>Avanço nas atividades de ATER e elaboração de projetos a jusante, como reflexo do Plano de Aceleração da Retomada (PAR). Foram feitos aditivos nos contratos para reajuste dos preços.</p> <p>Plano de ação: N/A</p> <p>(-R\$ 0,26MM)- O fornecedor está performando e aderente à média de medição, e a tendência é de que não será consumido todo o valor do contrato (ECONOMIA).</p> <p>Plano de ação: N/A</p> <p>R\$ 0,002MM- Atraso/antecipação na submissão de notas, não aparecendo no sistema para o mês de Janeiro/23.</p> <p>Plano de ação: N/A</p> <p>(-R\$ 0,11)- Medição aquém, devido atraso na apresentação da nota fiscal por parte de 3 produtores, e solicitação de suspensão no fornecimento por parte de um outro produtor;</p> <p>Prestação de contas parceria.</p> <p>Plano de ação: N/A</p> <p>R\$ 0,04MM- Contrato da Coopertrac (ATES) foi aditivado e desembolsos revistos.</p> <p>Plano de ação: N/A</p>

PG	Programas	Mensal				Anual Acumulado
		Orçamento	Realizado	Varição	%	Justificativas da variação anual acumulada
PG24	CONTENÇÃO DE REJEITOS	0,00	-0,28	-0,28		<p>Economia</p> <p>Fatores Internos: (0,3MM) Reclassificação de valores realizados em 2022, consultoria do descomissionamento do Dique S4. Fatores Externos: Projeto encerrado no CIF conforme deliberação nº 555.</p>
PG25	RECUPERAÇÃO ÁREA AMBIENTAL 1	2,28	1,93	-0,35	-0,15	<p>Fatores Internos (-R\$ 0,31MM) - Desembolso Restauo Florestal Pacote 1 (contrato ERG) maior que o previsto, mas a medição de jan23 (0,428MM) não entrou no mês devido a um problema sistêmico no pedido - erro SAP (suprimentos). Plano de ação: Monitorar junto à equipe de Contratos da GDS o ajuste no SAP da entrada da NF nos próximos meses. Sem previsão de desvios no próximo mês. (-R\$ 0,21MM) - Novo contrato Alocação de mão de obra (BIOKRATOS) menor que o previsto, atraso contratação nova equipe e desembolso Insumos Cerca e Restauo PU's (GARAVINI) menor que o previsto, aditivo em aprovação. Plano de ação: Cobrar o retorno do plano de ação de mobilização das equipes planejadas. (-R\$ 0,11MM) - Desembolso Restauo Barra Longa (Ambiência) medição dez22 teve que ser estornada e foi feito este estorno em jan23, gerando um valor negativo (provisão de dez, baixada em jan). Plano de ação: Replanejar com a Ambiência para recuperar o desvio. (R\$ 0,13MM) - Desembolso Convênio UFV (Fundação Arthur Bernardes) maior que o previsto. Plano de ação: NA (R\$ 0,15MM) - Desembolso Manutenção de Cercamento (Século XXI) e Restauo Barra Longa (Ambiência) maiores que o previsto. Plano de ação: NA</p>
PG28	BIODIVERSIDADE	1,64	0,60	-1,03	-0,63	<p>Economia</p> <p>Fatores Internos R\$: (0,92) Causa: Decisão Judicial paralisou os pagamentos da Perícia até avaliação dos avanços planejados. Plano de Ação: Planejar novo formato de pagamento da perícia por meio de desembolsos no início e final do projeto.</p> <p>R\$: (0,11) Causa: Contrato disponibilização de embarcação- 'Serviço orçado sob demanda, com utilização abaixo do previsto. Plano de Ação: 'Reajuste de verba ao longo do contrato.</p> <p>Fatores Externos</p>
PG30	FAUNA E FLORA TERRESTRE	3,30	1,92	-1,38	-0,42	<p>Economia</p> <p>Fatores Internos Atraso na emissão de licença para coleta de animais silvestres emitida pelo IBAMA (Abio), atrasando em aproximadamente 30 dias o início das coletas. Ação: Atuar junto à contratada para minimizar atraso e encerrar coletas ainda dentro do período chuvoso.</p> <p>Fatores Externos</p>

PG	Programas	Mensal				Anual Acumulado
		Orçamento	Realizado	Varição	%	Justificativas da variação anual acumulada
PG32	SISTEMAS DE ABASTECIMENTO ÁGUA	14,91	6,91	-8,00	-0,54	<p>Economia</p> <p>Fatores Internos: (R\$ 4,4MM) Adutora - Atraso no faturamento da medição dos fornecedores com impacto no realizado do mês. Fatores Externos: (R\$ 3,6MM) Adutora - Impacto de aumento do nível do Rio Corrente e do período chuvoso nas frentes de serviço. IGV - Impacto do aumento do nível do Rio Doce e do período chuvoso nas frentes de serviço. Infra RD: Devido a não concretização das estratégias de retirada de caminhões pipa das localidades, em função da judicialização, diversos contratos tiveram postergados seu início ou sofreram uma mudança na estratégia de execução, o que vem provomendo realização de desembolsos menores que o planejado no realizado acumulado anual.</p>
PG37	GESTÃO RISCOS AMBIENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	<p>Economia</p> <p>Fatores Internos</p>
PG38	MONITORAMENTO ÁGUA	2,80	2,42	-0,38	-0,14	<p>Fatores Internos</p> <p>CONVENIO UNESCO (R\$ -0,15MM) Atraso no inicio da mobilização 2ª fase do MHP UNESCO Plano de ação: Cobrar prestação de contas logo após a mobilização.</p> <p>CONSULTORIA MONITORAMENTO ÁGUA (R\$ -0,12MM) Serviço orçado sob demanda, com utilização abaixo do previsto. Plano de ação: Cobrar finalização das ordens de serviço</p> <p>MONITORAMENTO SOB DEMANDA (R\$ -0,11MM) Serviço orçado sob demanda, com utilização abaixo do previsto. Serviços foram planejados para o novo contrato. Plano de ação: Acompanhar as solicitações do novo contrato.</p>
PG39	CONSOLIDAÇÃO UCs	0,00	0,00	0,00	-0,96	<p>Economia</p> <p>Fatores Internos</p> <p>Fatores Externos</p>

PG	Mensal					Anual Acumulado
	Programas	Orçamento	Realizado	Varição	%	Justificativas da variação anual acumulada
PG41	GESTÃO DOS PROGRAMAS	25,95	28,51	2,56	0,10	Economia Fatores Internos R\$ 3,8 MM Valor realizado maior que o orçado em Licenças e Sistemas, trâmite interno não finalizado a tempo para entrada de nota do fornecedor Brasoftware em dezembro/2022, previsto ajuste na revisão orçamentária. (R\$ 0,6 MM) PMO - Contrato sob demanda de Gestão de Portfólio do Plano de Recuperação fornecedor Accenture e equipe mobilizada menor que prevista nos contratos Progesys e G4F. (R\$ 0,6 MM) Em Auditoria - contrato sob demanda do fornecedor EY. Fatores Externos
PG42	GASTOS PÚBLICOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	Economia Fatores Internos
Total Reparatórios		594,76	319,02	-275,74	-0,46	
Total Programas		633,01	350,50	-282,51	-0,45	

PG	Mensal				Anual Acumulado		Justificativas da variação anual acumulada
	Programas	Orçamento	Realizado	Variação	%		
ADM	DESPESAS GESTÃO ADMINISTRATI VAS	15,35	15,33	-0,02	0,00	Economia: sem variação Fatores Internos: sem variação	
CG	CUSTEIO SISTEMA DE GOVERNANÇA	16,57	0,95	-15,63	-0,94	Economia (R\$ 1,0 M) Câmaras Técnicas, Custeio Atingidos Reuniões, CIF e Gerenciadora CIF: Baixa execução orçamentária reflete o reduzido número de reuniões e atividades do sistema CIF em janeiro, em função do período de férias e das mudanças na composição do CIF e CTs. Fatores Internos (R\$ 2,7 MM) Custeio Atingidos Novo Escopo: Processo de contratação em análise. A curva de desembolso tem início em janeiro/23 até agosto/23. (R\$ 0,4 M) Gerenciadora Atingidos: Processo de contratação em análise. A curva de desembolso tem início em janeiro/23 até agosto/23. Fatores Externos (11,5 MM) Assessorias Técnicas: Antecipação dos custos com Assessorias Técnicas Independentes em 2022 quando foi realizado o repasse no valor de R\$ 62,8 MM segundo decisão judicial. O valor pago corresponde aos 6 (seis) primeiros meses de trabalho das ATIs autorizadas para dar início aos planos de trabalho.	
Total Despesas Administrativas		31,93	16,28	-15,65	-0,49		
Total Geral		664,93	366,78	-298,16	-0,45		

***Valores em milhões de reais.**
